

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2021.07.29 Nr. 45

Objektas Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas

Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

STATYBOS DALYVIAI - ATSTOVAI


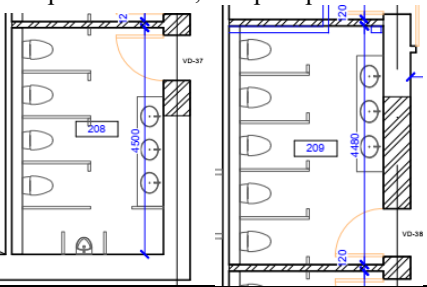
Dalyviai	Atstovai	Vardas pavardė, telefonas, el.paštas
Užsakovas:	Kauno rajono savivaldybės administracija	
Kauno rajono kultūros centras	Direktorė	Živilė Jurgaitienė 869928414
Techninės priežiūros inžinierius:	UAB „Gravis projectus“	Audrius Šulga 868642321 info@gravisprojectus.lt
Projektuotojas:	UAB „Panprojektas“	Elvyra Klimavičienė 869833720 elvyra@panprojektas.lt Giedrė Dubrovinienė 868728607 giedre@panprojektas.lt
Projektuotojas:	UAB „Smailusis skliautas“ (SK darbo projekto rengimas)	Narimantas Girčys 869913845 narimantaskaunas@gmail.com
Rangovas	UAB „Baltijos plienas“ Gamybos direktorius	Virginijus Marma 869872998 virginijus.marma@baltijosplienas.lt
Rangovas:	UAB „Baltijos plienas“ Projekto vadovas	Tomas Degutis 8650 82372 tomas.degutis@baltijosplienas.lt
Rangovas:	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas	Artūras Stepukonis 686 38774 arturas.stepukonis@baltijosplienas.lt
Rangovas:	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas	Žydrūnas Martišius 688 94555 zydrunas.martisius@baltijosplienas.lt

ARCHITEKTŪRA - KONSTRUKCIJOS

Kl. Nr.	Klausta/aparta	Progresas/Nutarta	Atsakingas	Atlikimo data
66.	Dėl patalpų pritaikymo ikimokyklinei/priešmokyklinei vaikų grupei. Patalpos Nr. 216	Nagrinėjimo eiga 2021-03-18: Susirinkime dalyvavęs Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos dir. pavaduotojas Saulius Simonauskas informavo, kad vienoje iš klasių planuojama steigti priešmokyklinę vaikų grupę. Rangovas informavo, jog normatyviniai teisės aktai yra skirtingi bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programoms, todėl lygiagrečiai reikalinga atlikti techninio projekto sprendinių pakeitimus. Nutarta: Užsakovas raštu pateiks prašymą dėl būtinų darbų atlikimo pritaikant patalpas priešmokyklinei vaikų grupei. Nagrinėjimo eiga 2021-03-25: Užsakovas raštu pateikė prašymą dėl patalpoje Nr. 216 planuojamos įkurti priešmokyklinės vaikų grupės. Projektuotojai atliko analizę ir pristatė reikalavimus, bei reikiamus atlikti projekto pakeitimus. Nutarta, kad Projektuotojai pateiks reikalavimus raštu. Nagrinėjimo eiga 2021-04-01: Projektuotojai 2021-03-31 raštu Nr. SR-21/45 „Dėl patalpų priešmokyklinei grupei“ išdėstė reikalavimus norint patalpose įrengti ikimokyklinę grupę ir daro išvadą, kad Ramučių kultūros centro pastatas ir projektiniai sprendiniai netenkina Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių 49 punkto reikalavimų.	Užsakovas	
			UAB Panprojektas	
			Užsakovas	

		Nutarta į sekančią susirinkimą pakviesti gimnazijos direktorių ir savivaldybės švietimo skyriaus atstovą sprendimo priėmimui.		
		Nagrinėjimo eiga 2021-04-08: Susirinkime dalyvavo Kauno rajono savivaldybės švietimo skyriaus atstovas ir Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė. Susirinkimo metu svarstyta alternatyvūs sprendimai: klasės iškėlimą į pirmą aukštą, o bibliotekos dalį įkelti į antrą aukštą. SK dalies projektuotojas nepritarė šiam sprendimui dėl nepaskaičiuotų apkrovų. Nutarta: Užsakovas pasitars su savivaldybės administracija dėl tolimesnių sprendimų priėmimo.	Užsakovas	
		Nagrinėjimo eiga 2021-04-15: Užsakovas informavo, kad reikalinga palikti klasės patalpą projekcinėje dokumentacijoje nurodytoje vietoje antrame aukšte. Klasės patalpą reikalinga minimaliai pritaikyti priešmokyklinės amžiaus vaikų grupės (būrelio) veiklai. Nutarta: SA dalies projektuotojai pateiks patalpos Nr. 216 planą su pakeitimais, nurodys keičiamų darbų kiekius, kurie tenkintų priešmokyklinės grupės (būrelio) reikalavimus	UAB Panprojektas	
		Nagrinėjimo eiga 2021-05-06: Projektuotojai informavo, kad nėra gavę užduoties iš Užsakovo.	Užsakovas	
		Nagrinėjimo eiga 2021-05-13: Užsakovas informavo, kad užduotis projektuotojams yra išsiųsta. Patalpos Nr. 216 planas su pakeitimais negautas.	UAB Panprojektas	
		Nagrinėjimo eiga 2021-05-27: Patalpos Nr. 216 planas su pakeitimais negautas. 2021.06.10 Pakartotinai aptartas klausimas dėl dokumentacijos pateikimo. Giedrė D. tikina ir žada el.paštu pateikti reikiamą informaciją. 2021.06.17 Elvyra K. pasitarimo metu pateikė patikslintą ir papildytą brėžinį, kurį dar papildė PVC lango gaminio suskaidymu. Pagal pateiktą informaciją Rangovas, parengs papildomų darbų sąmatą pagal pateiktus pakeitimus.	UAB Panprojektas UAB Baltijos plienas Tomas D.	Iki 2021.05.27 Iki 2021.06.03 Iki 2021.06.10 Iki 2021.06.11
75.	Dėl el. pavaros montavimo krepšinio lentai.	Nagrinėjimo eiga 2021-05-06: Rangovas informavo, kad krepšinio lenta su el. pavara nenumatoma montuoti, atsakymas pateiktas konkurso metu nagrinėjimuose klausimuose-atsakymuose (2020-05-28 klausimo Nr. 12 ir 2020-06-03 klausimo Nr. 1) tačiau pajungimas numatytas TP elektrotechninėje dalyje.		
		Nagrinėjimo eiga 2021-05-06: Susirinkimo metu Užsakovas informavo, kad krepšinio lenta su el. pavara reikalinga. Rangovas atliks sąmatinius skaičiavimus dėl krepšinio lentos su el. pavara darbų atlikimo.	Rangovas	
		2021.06.03 Rangovas informavo, kad pasitarimo metu dėl iškeltos klausimo, iš Užsakovo 2021.05.31 el.paštu yra gautas atsakymas, kad šis klausimas bus atsakytas vėliau.	Užsakovas	Iki 2021.06.10
		2021.06.10 Kadangi pasitarimo metu Užsakovo atstovas nedalyvavo, KC direktorė Živilė J. informavo,	KC Direktorė	Iki 2021.06.17

		kad susieks su Užsakovu ir pateiks atsakymą. 2021.06.17 Pasitarimo metu pakartotinai aptartas klausimas, KC direktorė Živilė J. informavo, kad su Užsakovo atstovu susisiekti nepavyko. Nutarta Rangovas el. paštu kreipsis į Kauno r. sav. administracijos aplinkos skyriaus vedėją Jurgitą Rakauskaitę kuri kuruoja papildomų darbų susitarimus, dėl 2021.05.31 siųsto laiško, klausimo Nr.11 atsakymo pateikimo.3 2021.07.01 Tomas D. informavo, kad 2021.06.21 el. paštu pakartotinai pasikreiptasi į Kauno r. sav. administracijos aplinkos skyriaus vedėją Jurgitą Rakauskaitę dėl neatsakyto klausimo. Iki šios dienos atsakymas negautas. 2021.07.08 pasitarimo metu dalyvavęs Kauno raj. Sav. atstovas Gediminas P. informavo, kad sekančiam pasitarimui bus pateiktas atsakymas 2021.07.15 pasitarime dalyvavusi Kauno raj. Sav. Jurgita Rakauskaitė pateikė atsakymą, kad Užsakovas perka krepšinio lentą su el. pavara ir prašo Rangovo pateikti sumas susiderinimui. Taip pat Jurgita Rakauskaitė paprašė Panprojekto Elvyros K. kuo skubiau pateikti brėžinius ir patikslinimą kokia lenta ir elektros vara turi būti nupirktas. (Technines specifikacijas ir brėžinius) 2021.07.22 pasitarime Panprojektas nedalyvavo, reikiama informacija 2021.07.20 nepateikta 2021.07.29 pasitarimo metu Giedrė D. informavo, kad yra išsiųstos užklausos tiekėjams dėl iškeltos klausimo. Reikiamą dokumentaciją planuoja pateikti artimiausiu metu.	Živilė J. Baltijos plienas Tomas D. Kauno raj. Sav. Administracija Kauno raj. Sav. Gediminas Pliskauskas UAB Panprojektas Elvyra K. UAB Panprojektas Giedrė D.	Iki: 2021.06.17 Iki: 2021.07.15 Iki 2021.07.20 Iki 2021.08.03
80	Aktualios ir parengtos SA, SP, darbo projektinės dokumentacijos pateikimas.	2021.06.17 Tomas D. prašo UAB Panprojekto Elvyros K. pateikti el. paštu aktualią parengtą darbo projekto dokumentaciją šioms projekto dalims: - Statinio architektūrai - Sklypo planui 2021.07.08 klausimas buvo aptartas pakartotinai, prašomi projektai nebuvo pateikti. Elvyra K. pažadėjo juos pateikti artimiausiu metu. 2021.07.22 pasitarime Panprojektas nedalyvavo, reikiama informacija 2021.07.21 nepateikta. 2021.07.29 pasitarimo metu Giedrė D. perdavė SA darbo projekto popierinę versiją. Perduota dokumentacija buvo priimta peržiūrai.	UAB Panprojektas Elvyra K. UAB Panprojektas Elvyra K. Bendra informacija.	Iki 2021.07.05 Iki 2021.07.13 Iki 2021.07.21
81	Turėklai: - Vidaus - Lauko	2021.07.01 pasitarimo metu aptarti lauko ir vidaus turėklų įrengimas: - Vidaus turėklų tvirtinimas: evakuacinė laiptinės turėklai tvirtinami iš šono į laiptų maršą, vidaus laiptinė ties ašimi 3, turėklai tvirtinami į pakopos viršų.	Bendra informacija.	

		- Lauko turėklai: bus tvirtinami iš viršaus į paruoštą pagrindą, išlaikant ne mažesnę kaip 1,2 m plotį. 2021.07.08 pasitarimo Tomas D. informavo, kad numatomų įrengti vidaus ir lauko turėklų kiekiai yra didesni nei buvo numatyta techniniame projekte. Nutarta kitam pasitarimui pateikti ir pristatyti aiškius kiekių pasikeitimus nurodant juos brėžiniuose. 2021.07.15 pasitarime Kauno raj. Sav. Atstovė Jurgita Rakauskaitė paminėjo, kad nepriklausomai dėl kiekio padidėjimo turėklai turi būti įrengti. Tomas D. informavo, kad turi paleisti turėklų gamybą ir klausia dėl finansavimo užtikrinimo. Jurgita R. paminėjo, kad Užsakovas užtikrina papildomą turėklų kiekio finansavimą. Pagal aptartą situaciją Rangovas, parengs papildomų darbų sąmatą ir pateiks Užsakovui.	UAB Baltijos plienas Tomas D. UAB Baltijos plienas Tomas D.	Iki 2021.07.15
82	Scenos sienos apdailos įrengimas. 	2021.07.01 Tomas D. informavo, kad KC direktorė Živilė J. 2021.06.30 dieną, elektroniniu laišku pateikė informaciją, kad yra gautas pritarimas iš administracijos vadovų dėl scenos sienos išlyginimo, kuri savo konstrukcijoje turi iškilusias pastato kolonas. Siena turi būti lygi ir balta, kuri turės tarnauti kaip ekranas projektoriui. Oficialų raštišką pranešimą, KC direktorė Živilė J. pateiks artimiausiu metu. Pagal pateiktą pranešimą Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą sienos įrengimui: įrengiant metalinį karkasą, aptaisant gipso kartonu, kuris bus nuglaistytas ir nudažytas balta spalva.	KC Direktorė Živilė J. UAB Baltijos plienas Tomas D.	Iki 2021.07.08
83	WC pertvaros 208, 209 patalpose 	2021.07.22 pasitarimo metu aptartos WC patalpų pertvaros. Antro aukšto WC patalpose numatytas pertvarų įrengimas, tačiau pertvarose durys nenurodytos. 2021.07.29 pasitarimo metu pakartotinai aptartas klausimas. Užsakovas informavo, kad antro aukšto WC patalpų pertvarose durys turi būti įrengtos ir prašo Rangovo jas įrengti. Projektuotojai aptartai situacijai neprieštaravo. Pagal aptartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.	Bendra informacija. UAB Baltijos plienas Tomas D.	
84	Informaciniai užrašai ant fasado	2021.07.29 pasitarime aptarta situacija dėl informacinių užrašų ant fasado. Tomas D. informavo, kad esama informacija projekte iki galo nėra aiški (raidžių tūriniai sprendiniai, matmenys, konkretus šriftas ir kt.), tam, kad būtų galima paleisti užsakymą. Užsakovas atstovas Gediminas P. prašo kuo skubiau pateikti Panprojekto Giedrės D. aiškias technines specifikacijas/schemas, matmenis ir t.t kas yra reikalinga užrašų gamybai.	UAB Panprojektas Giedrė D.	Iki: 2021.08.02
LAUKO VANDENTIEKIS, VIDAUS VANDENTIEKIS, DRENAŽAS				
Kl. Nr.	Klausta/aptarta	Progresas/Nutarta	Atsakingas	Atlikimo data

ŠILDYMO, VĖDINIMO, VĖSINIMO SISTEMA, ŠILUMOS PUNKTAS, DUJOS

Kl. Nr.	Klausta/aptarta	Progresas/Nutarta	Atsakingas	Atlikimo data
1	Dujų tiekimas pastatui	2021.06.10 pasitarimo metu aptartas klausimas dėl dujų tiekimo atnaujinimo į pastatą. KC direktorė Živilė J. turi kreiptis į dujų tiekėją, dėl dujų tiekimo atnaujinimo. 2021.07.01 pasitarimo metu Tomas D. informavo, kad KC direktorė Živilė J. 2021.06.30 el. paštu pateikė informaciją, kad iškeltas klausimas yra perduotas Kauno rajono komunalinių paslaugų centrui. 2021.07.08 pasitarimo metu dalyvavęs Kauno raj. Sav. atstovas Gediminas P. informavo, kad sekančiam pasitarimui bus pateiktas atsakymas. 2021.07.15 pasitarime KC direktorė Živilė J. pateikė eksploatuojančios įmonės „KPC“ kontaktą dėl dujų tiekimo į pastatą ir visus susijusius klausimus reikėtų spręsti su Andriumi Markevičiumi 868633232. Gautas kontaktas bus perduotas UAB „Sntranga“ darbų vadovui dėl dujų tiekimo į pastatą iškilusių klausimų. 2021.07.22 pasitarime Tomas D. informavo, kad dujų tiekimo klausimas sprendžiasi, „Santranga“ ruošiasi šilumos punkto derinimo darbams.	KC Direktorė Živilė J. KC Direktorė Živilė J. Kauno raj. Sav. Gediminas Pliskauskas Bendra informacija	Iki 2021.06.17 Iki 2021.07.01 Iki 2021.07.15
2	Papildomas kondicionierių įrengimas	2021.07.01 pasitarimo metu Tomas D. informavo, kad KC direktorė Živilė J. 2021.06.30 el. paštu pateikė informaciją, kad gautas raštas iš Karmėlavos gimnazijos dėl kondicionierių papildomo įrengimo šešiose patalpose ir Ia. vestibulyje. Živilė J. prašo pateikti kiek kainuotų papildomų kondicionierių pirkimas. Živilė J. oficialų raštišką pranešimą planuoja pateikti artimiausiu metu. 2021.07.08 pasitarimo metu pakartotinai aptartas klausimas, kaip ir planuota Živilė J. pateikė oficialų raštišką pranešimą, taip pat buvo įvardintos patalpos kuriose bus reikalingi papildomi kondicionieriai. Patalpų Nr. 204, 205, 206, 207, 216, 217 ir 102. Užsakovas prašo pateikti papildomų kondicionierių kainą susiderinimui. 2021.07.15 pasitarimo metu Tomas D. informavo, kad laukiau kainos pasiūlymų dėl papildomų kondicionierių įrengimo. 2021.07.22 pasitarimo metu buvo pateiktas „VRV“ tipo sistemos šaldymo pasiūlymas. Užsakovas informavo, kad tokio tipo šaldymo sistemos finansuoti negali. Prašo pateikti pasiūlymą supaprastinant vėsinimo sistemą montuojant išorinius ir vidinius blokus atskiroms patalpoms. 2021.07.29 pasitarimui buvo pateiktas supaprastintas „multisplit“ tipo vėsinimo sistemos pasiūlymas. Pateiktam kainos pasiūlymui Užsakovas pritarė ir prašė įrenginėti vėsinimo sistemas. Pagal aptartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.	KC Direktorė Živilė J. Baltijos plienas Tomas D. Baltijos plienas Tomas D. Baltijos plienas Tomas D. Baltijos plienas Tomas D.	Iki 2021.07.08 Iki 2021.07.15 Iki 2021.07.29


3	Ištraukiamosios ventiliacijos įrengimas patalpoje Nr. 216.1	2021.07.29 pasitarimo metu Giedrė D. pateikė siūlymą papildomai įrengti ištraukiamąją ventiliaciją 216.1 patalpoje. Kadangi ši patalpa yra vaikų persirengimo ir rūbinės patalpa, papildomas vėdinimas yra būtinas. Pateikta siūlymui Užsakovas ir techninės priežiūros inžinierius pritarė. Užsakovas prašo įrengti papildomą ištraukiamąją ventiliaciją. Pagal aptartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.	Baltijos plienas Tomas D.	
---	---	--	------------------------------	--

ELEKTROTECHNIKA - SILPNOSIOS SROVĖS (GGS, AS, ER)

Kl. Nr.	Klausta/aptarta	Progresas/Nutarta	Atsakingas	Atlikimo data
1	Orinės linijos stulpo atramos iškėlimas	2021.07.01 pasitarimo metu Tomas D. informavo, kad KC direktorė Živilė J. 2021.06.30 el. paštu pateikė informaciją, kad iškeltas klausimas yra perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijai. 2021.07.08 pasitarimo metu Gediminas P. informavo, kad yra gauta informacija iš ESO dėl stulpo atramos iškėlimo. Apytiksliai darbai turėtų būti atlikti per 25 dienas nuo 2021.07.08 dienos.	Kauno raj. Sav. administracija	Iki 2021.07.08
2	Elektros rozečių papildomas įrengimas išmaniosioms lentoms.	2021.07.29 Užsakovas informavo, kad klasėse ateityje bus įrenginėjamos išmaniosios lentos ir klausia ar yra galimybė įrengti papildomas rozetes. Pasitarimo metu buvo apžiūrėtos klasės kuriose reikėtų įrengti papildomas rozetes. Techninė galimybė papildomas rozetes įrengti galimybė yra. Užsakovas prašo jas įrenginėti šiose patalpose: 204, 205, 206, 207, 216. Pagal aptartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.	Baltijos plienas Tomas D.	

SKLYPO SUTVARKYMAS

Kl. Nr.	Klausta/aptarta	Progresas/Nutarta	Atsakingas	Atlikimo data
79.	Papildomų trapų įrengimas ties įėjimais 	2021.07.01 pasitarimo metu aptartas papildomų trapų įrengimo būtinumas, ties įėjimais į pastatą ir rūsio laiptus bei rampą, sklype nuo Parko g. pusės. Numatytų takų link pastato esamas nuolydis yra nemažas, o lyjant lietaus besikaupiantis lietaus vanduo nėra surenkamas ties pastato įėjimais, ką ir parodė 2021.06.24 dieną praėjusi lietaus liūtis. Dėl esamos grėsmės vandens patekimui į pastatą per dideles lietaus liūtis, Rangovas siūlo įrengti papildomus vandens surinkimo trapus. Aptartam siūlymui tech.priežiūros inžinierius Audrius Š. neprieštaravo ir pritarė. Rangovas turi parengia papildomų darbų sąmatą ir ruošti papildomą susitarimą numatomiems darbams ir medžiagoms.	UAB Baltijos plienas Tomas Degutis	
80.	Žaidimų aikštelės, nuolydžiai ir papildomas drenažo įrengimas.	2021.07.08 pasitarimo metu aptartas žaidimo aikštelės paviršiaus nuolydis, kuris pasak Panprojekto Elvyros K. turi būti apie 4 procentai link rekonstruojamo pastato nuo mašinų stovėjimo aikštelės. Taip pat aptarta situacija ir būtinumas dėl nenumatyto drenažo įrengimo. Papildomas drenažas užtikrintų sausus žaidimo aikštelės paviršius lietaus liūčių metu.	UAB Baltijos plienas Tomas Degutis	Iki: 2021.07.21

		Užsakovas prašo įrenginėti papildomą drenažą, bei parengti papildomų darbų sąmata numatytiems darbams ir medžiagoms.	UAB Baltijos plienas Tomas Degutis	
81.	Trinkelio tako vietos keitimas. 	2021.07.08 pasitarimo metu aptartas suprojektuoto trinkelio tako praktiškumas ir patogumas einant į pastatą nuo Parko gatvės pusės. Nutarta suprojektuoto trinkelio tako neįrenginėti numatytoje vietoje, tačiau taką įrenginėti lygiagrečiai pastatui ties ašimi C. Užsakovas prašo įrenginėti taką nutartoje vietoje ir pateikti kiekių pasikeitimo kainą.	UAB Baltijos plienas Tomas Degutis UAB Baltijos plienas Tomas Degutis	Iki: 2021.07.21
82	Išpėjamųjų paviršių įrengimas	2021.07.29 pasitarime aptarta situacija dėl ŽN išpėjamųjų paviršių įrengimo. Tomas D. informavo, kad po patikslinimo ir derinimo su ŽN atstovu yra ženkliai padidėjęs išpėjamųjų paviršių kiekis. Užsakovas informavo, kad išpėjamieji paviršiai turi tenkinti ŽN poreikius ir turi būti įrengti. Užsakovas prašo įrenginėti išpėjamuosius paviršius. Pagal aptartą ir nutartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.	UAB Baltijos plienas Tomas Degutis	

KITA INFORMACIJA:

Susirinkimo vieta - Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r.

Susirinkimų periodiškumas - Ketvirtadieniais 10:00 val.

Dalyvių sąrašas - pridedamas

PASTABA:

Visiems pasitarime dalyvavusiems – per 2 darbo dienas skaičiuojant nuo šio protokolo gavimo elektroniniu paštu dienos, pateikti savo pastabas projekto vadovui Tomui Degučui el. paštu: tomas.degutis@baltijosplienas.lt dėl šio protokolo turinio.

SUSIRINKIMO PROTOKOLO DALYVIŲ SĄRAŠAS

2021 m. 07 d. 29

Objektas Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas
 Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

Eil. Nr.	Atstovai (Imonės pavadinimas)	Vardas pavardė Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyr. specialistas Gediminas Pliskauskas	Parašas
1	Kauno r. savivaldybės administracija		
2	UAB „Gravis projectus“	Audrius Šulga	
3	UAB „Panprojektas“	Elvyra Klimavičienė	
4	UAB „Panprojektas“	Giedrė Dubrovinienė	
5	SK projekto projekto dalies vadovas	Narimantas Girčys	
6	UAB „Baltijos plienas“ Gamybos direktorius	Virginijus Marma	
7	UAB „Baltijos plienas“ Projekto vadovas	Tomas Degutis	
8	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas	Artūras Stepukonis	
9	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas	Žydrūnas Martišius	
10	Ramučių KC direktorė	Živilė Jurgaitienė	
11			
12			
13			
14			
