



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-10-15 Nr. ORC-077

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 25

2021 m. spalio 15 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra papildomų darbų vertė – 2 029,28 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 25 vertė yra 2 029,28 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-10-15 pakeitimo Nr. 25 padidėja 2 029,28 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.891.707,97 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (25 lapai)

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 25

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

1. Atliekant atraminės sienutės tarp namų Telšių g. 19 ir 21 įrengimo darbus, aptiktas projekte ir geodezinėje kontrolinėje nuotraukoje nepažymėtas drenažo vamzdynas, kuriuo, kaip paaiškėjo, surenkamas paviršinis vanduo nuo namo Telšių g. 19 kiemo dangų ir išleidžiamas į buvusio tako konstrukciją. Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktais projektiniais sprendiniais ir papildomų darbų kiekių žiniaraščiais, atsižvelgdama į 2021-08-05 Užsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymą raštu Nr. AS-4245, pritaria, kad, siekiant išvengti paviršinio vandens patekimo į pėsčiųjų taką ir gatvės konstrukciją, būtina drenažo vamzdyną prijungti prie naujai rengiamų lietaus nuotekų tinklų, atliekant papildomus darbus, nurodytus prieduose Nr. 1.

Papildomų darbų vertė 1 107,70 Eur be PVM.

2. Atliekant pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo darbus, ties PK 1+20 PK ir 4+20 (priedai Nr. 1 ir Nr. 2) atkasti esami ryšių šuliniai, kurie neatitinka naujai rengiamų pėsčiųjų ir dviračių takų dangų aukščio, t. y. įrengus takus jie bus iškilę virš pėsčiųjų tako paviršiaus. Mėnesinio pasitarimo Nr. 5 metu apžiūrint objektą, buvo priimtas sprendimas, kad šiuos šulinius būtina pritaikyti prie rengiamo pėsčiųjų ir dviračių tako paviršiaus, pažeminant ne tik šulinių landas, bet ir pačius šulinius, nes išsikišusios šulinių dalys kelia pavojų pėstiesiems ir dviratininkams, neestetiškai atrodo.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktais projektiniais sprendiniais ir papildomų darbų kiekių žiniaraščiais, gavusi Užsakovo pritarimą 2021-09-27 raštu Nr. AS-5202, patvirtina, kad, siekiant suvienodinti šulinių landų ir pėsčiųjų takų aukščius, būtina atlikti papildomus darbus, nurodytus priede Nr. 2.

Papildomų darbų vertė 921,58 Eur be PVM.

Komisija pažymi, kad šių papildomų darbų nebuvo galima numatyti projekto rengimo metu, šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Bendra papildomų darbų vertė – 2 029,28 Eur be PVM.

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata ir darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai;
2. Papildomų darbų sąmata ir darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai;
3. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-254, 4 lapai;
4. Užsakovo raštas Nr. AS-4245, 2 lapai;
5. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-290, 5 lapai;
6. Užsakovo raštas Nr. AS-5202, 2 lapai;
7. Pasitarimo protokolai Nr. 5, 4 lapai.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)


Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis


AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktorius


2021-10-15
.....
(parašas, data)

Artūras Valys

SUDERINTA: _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D. _____

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D. _____



LOKALINĖ SAMATA

Priedas Nr. 1

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**
 Statinys **31 Telšių gatvės rekonstravimas**
 Žiniaraštis **1 Telšių gatvės rekonstravimas I etapas. Papildomi darbai**

			Suma žiniaraščiu		1 340,32 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Telšių gatvės kelio (gatvės) konstrukcija						
1	Sutartis Nr.1.13	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga skaldos k9=1.15	100m3	0,012	279,85	3,36
2	Sutartis Nr.1.18	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	2,00	3,61	7,02
3	Sutartis Nr.3.8	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,023	1 606,96	36,96
4	Sutartis Nr.3.13	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,08	729,01	56,86
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai esami k9=1.15	100m	0,02	1 517,17	30,34
Skyriuje 1						134,54
2 Lietaus nuotekų tinklai						
1	Sutartis Nr. 1.3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	5,20	34,43	179,04
2	N23P-0204	Plastikinių aklių iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 200 mm) k9=1.15	vnt.	1,00	15,34	15,34
3	Sutartis Nr. 1.16	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,052	110,27	5,73
4	Sutartis Nr. 1.20	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,052	216,42	11,25
Skyriuje 2						211,36
3 Žemės darbai						
1	Sutartis Nr. 2.1	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdiniais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	1,17	18,71	21,89
2	Sutartis Nr. 2.2	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	4,31	12,56	54,13
3	Sutartis Nr. 2.5	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,023	171,72	3,95
4	Sutartis Nr. 2.6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,1560	3 844,22	599,70
5	Sutartis Nr. 2.7	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,0156	5 099,52	79,55
6	Sutartis Nr. 2.8	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,0156	165,64	2,58
Skyriuje 3						761,80
Žiniaraštyje 1						1 107,70
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						232,62
Iš viso žiniaraštyje 1						1 340,32

Skaitytoja: Aušra Mikavičienė

Pozi- cija, Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn. spec. žymuo)	Mato vnt.	Kiekis
Lietaus nuotekų tinklai Papildomi darbai				
1.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	TS 2, TS 6, TS 9	m	5,20
2.	D200 mm aklė		vnt	1
3.	Esamo gatvės konstrukcijos ardymas ir atstatymas		kompl	1

 UAB PLENTPROJEKTAS				Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
				Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis	2021-08	0415 – 01 – DP – VN – SKŽ	Lapa	Lapų
36260	PDV	A. Jankovič	2021-08		1	1

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Priedas Nr. 2

Statinių grupė 0244-01 PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO TP

Statinyse 1 INŽINERINIAI TINKLAI

Žinlaraštis 501 TELIA TINKLAI. PAPILDOMI DARBAI

Suma žinlaraščiui 1 115,11 EUR


Sam.		Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Suma žinlaraščiui 1 115,11 EUR	
eil.	kodas		aprašymai	vnt		Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Ryšių šulinys Pk 1+20							
1 Sutaris Nr. 1.10	duobės šuliniui RKŠ-3 viršutinės dalies atkasimas k1=1.30,k9=1.15	100m3		0,057	1491,0	84,99	
2 Sutaris Nr. 1.11	šulinio RKŠ-3 užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3		0,057	800,0	45,6	
3 Sutaris Nr. 1.15	Liukų ARDYMAS šuliniuose k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt		1,0	5,0	5,0	
4 Sutaris Nr. 1.16	Liukų įrengimas šuliniuose k9=1.15	vnt		1,0	22,0	22,0	
Skyriuje 1						157,59	
2 MEDŽIAGOS							
1 Sutaris Nr. 2.5	ŠULINIO LIUKO AUKŠČIO REGULIAVIMO G/B ŽIEDAS	vnt		1,0	9,0	9,0	
2 Sutaris Nr. 2.10	LIUKO TVIRTINIMO VARŽTAS	vnt		2,0	4,0	8,0	
3 Sutaris Nr. 2.12	Sunkūs telefono tinklų liukai MTT-S1	vnt		1,0	210,0	210,0	
4 Sutaris Nr. 2.13	LIUKO UŽRAKTAS	vnt		1,0	8,0	8,0	
Skyriuje 2						235,0	
3 Ryšių šulinys Pk 4+20							
1 Sutaris Nr. 1.10	duobės šuliniui RKŠ-3 viršutinės dalies atkasimas k1=1.30,k9=1.15	100m3		0,057	1491,0	84,99	
2 Sutaris Nr. 1.11	šulinio RKŠ-3 užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3		0,057	800,0	45,6	
3 Sutaris Nr. 1.12	šulinio RKŠ-3 sienos 10cm storio pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m		5,6	1,5	8,4	
4 Sutaris Nr. 1.13	šulinių RKŠ-3 viršutinės dalies įrengimas k9=1.15	vnt		1,0	190,0	190,0	
5 Sutaris Nr. 1.14	ŠULINIO RKŠ-3 VIRŠUTINĖS DALIES IŠMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt		1,0	80,0	80,0	
Skyriuje 3						408,99	
4 MEDŽIAGOS							
1 Sutaris Nr. 2.4	ŠULINIO RKŠ-3 VIRŠUTINĖ DALIS	vnt		1,0	120,0	120,0	
Skyriuje 4						120,0	
Žinlaraštyje 501						921,58	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						193,53	
Iš viso žinlaraštyje 501						1115,11	


Projekto valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

Papildomi darbai


Ryšių šulinys Pk 1+20			
Eik. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Šulinio liuko ardymas	vnt.	1
2	Šulinio liuko aukščio reguliavimo g/b žiedų įrengimas	vnt.	1
3	Sunkaus tipo šulinio liuko įrengimas	vnt.	1

Ryšių šulinys Pk 4+20			
Eik. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Gelžbetoninės šulinio perdangos pjovimas	vnt.	1
2	Gelžbetoninės šulinio perdangos įrengimas betonuojant	vnt.	1

Atestato Nr.	 „PLENTRPROJEKTAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas <i>I ir II etapas</i>		Laida
							0
30410	PV	A. Vilkelis		2021-08	0415 - 01 – DP – TT	Lapas	Lapų
31962	PDV	R. Lučkauskas		2021-08		1	1

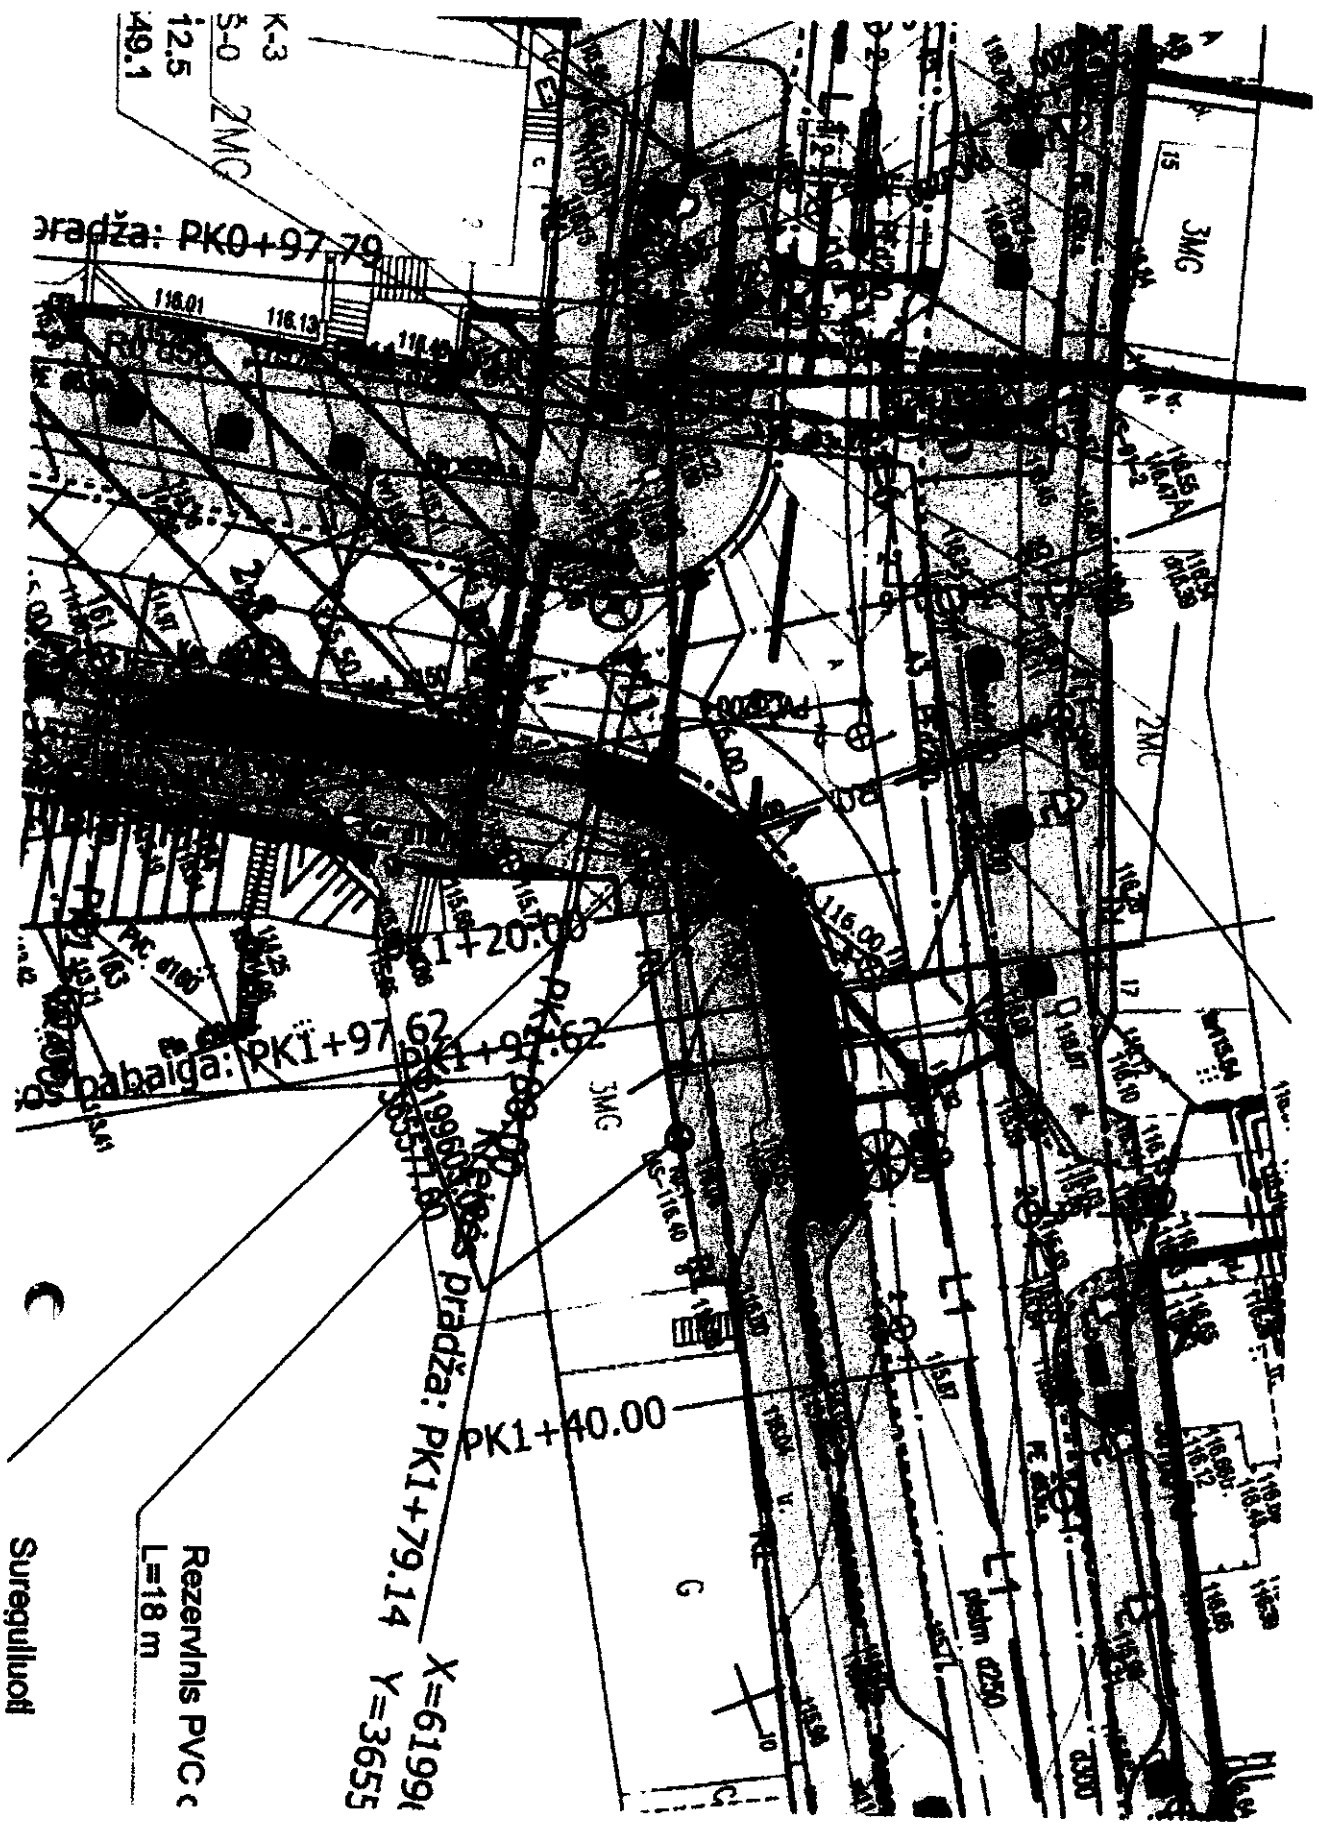

Priedas Nr. 1

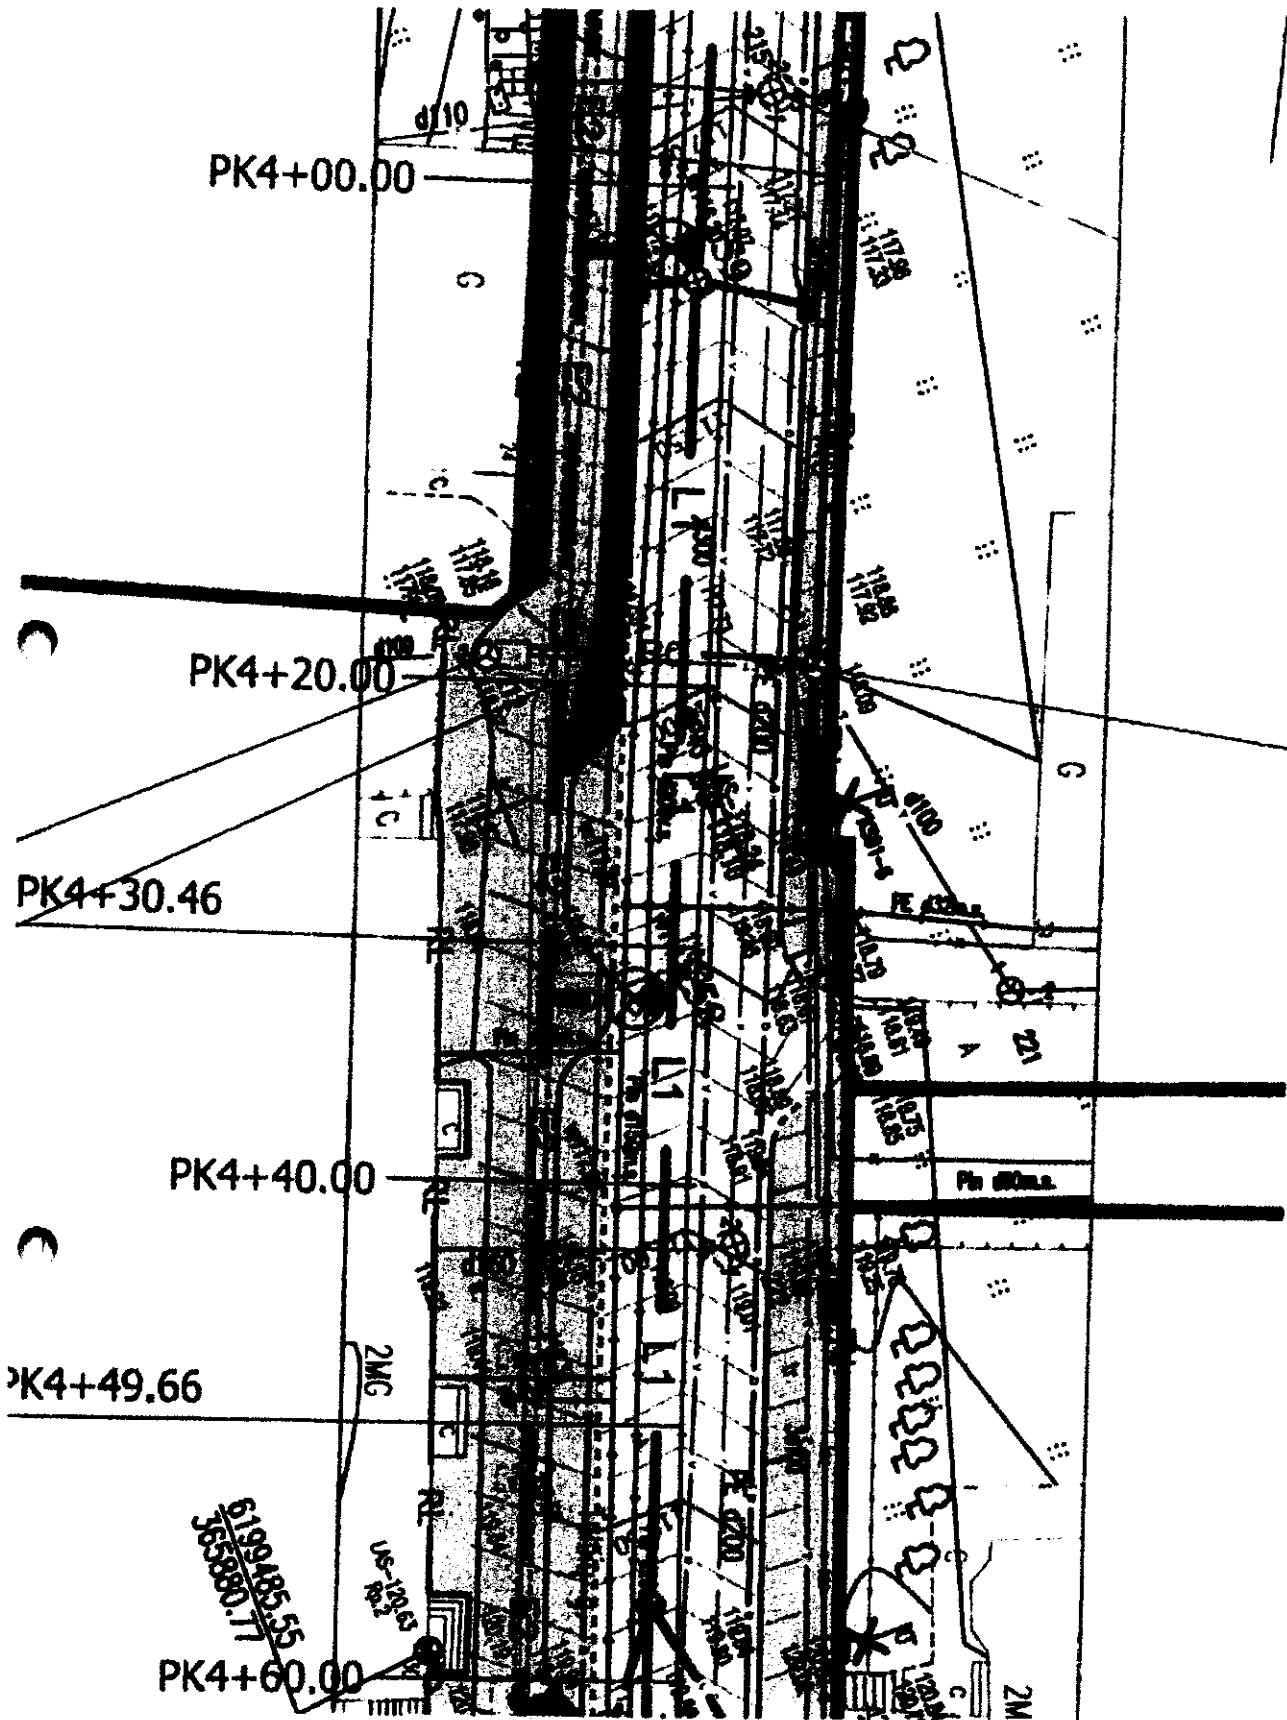



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-08-19, Nr. SDKL-254
Į 2021-08-05 Nr. AS-4245

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

**DĖL DAUGIABUČIO NAMO PRIJUNGIMO PRIE TELŠIŲ G. LIETAUS TINKLŲ
PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATŲ PATEIKIMO**

Rangos sutartis: Nr. BT6-01-174

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

2021-08-05 iš užsakovo gavę prašymą rasti galimybę prijungti daugiabučio namo, esančio Telšių g. 19, drenažą prie Telšių g. lietaus vandens surinkimo tinklų bei projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikus projektinį sprendinį ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, teikiame lokalinę šamatą papildomų darbų atlikimui.

PRIDEDAMA: 1. Projektinis sprendinys ir sąnaudų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;
2. Papildomų darbų šamata, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys


Originalas siunčiamas nebus



Pozi- cija, Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba techn. spec. žymuo)	Mato vnt.	Kiekis
Lietaus nuotekų tinklai				
Papildomi darbai				
1.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	TS 2, TS 6, TS 9	m	5,20
2.	D200 mm aklė		vnt	1
3.	Esamo gatvės konstrukcijos ardymas ir atstatymas		kompl	1

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis	2021-08	0415 – 01 – DP – VN – SKŽ	Lapa	Lapų	
36260	PDV	A. Jankovič	2021-08		1	1	

PROJECT INFORMATION PROJECT NAME: [] PROJECT NUMBER: [] PROJECT LOCATION: [] PROJECT DATE: []	
CLIENT INFORMATION CLIENT NAME: [] CLIENT ADDRESS: [] CLIENT PHONE: [] CLIENT FAX: [] CLIENT E-MAIL: []	
DESIGNER INFORMATION DESIGNER NAME: [] DESIGNER ADDRESS: [] DESIGNER PHONE: [] DESIGNER FAX: [] DESIGNER E-MAIL: []	
CONTRACT INFORMATION CONTRACT NUMBER: [] CONTRACT DATE: [] CONTRACT VALUE: []	
OTHER INFORMATION OTHER PROJECTS: [] OTHER CONTACTS: [] OTHER COMMENTS: []	

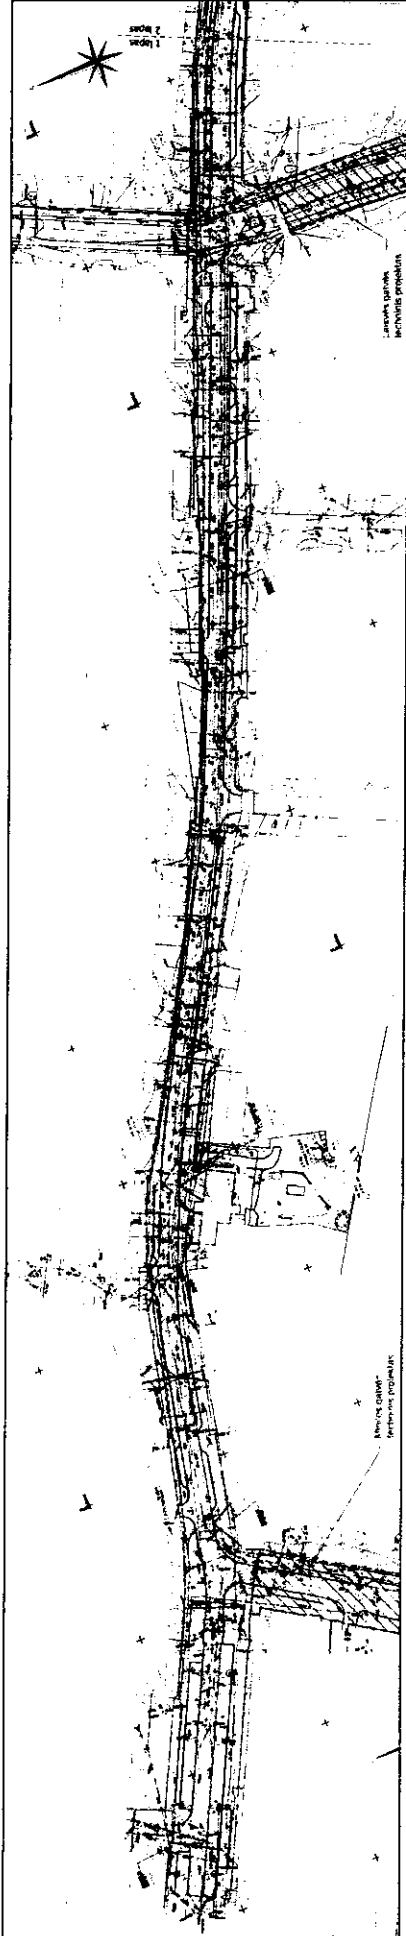

SUDERINTA: _____ EUR. *Finansų direktorius*
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ *Ukmergės raj. sav. tarybos*
 2021 M. MĖN. D. *Mikavičiūtė*

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**
 Statinyse **31 Telšių gatvės rekonstravimas**
 Žinlaraštis **1 Telšių gatvės rekonstravimas I etapas. Papildomi darbai**

Suma žinlaraščiui **1 340,32 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR iš viso
1 Telšių gatvės kelio (gatvės) konstrukcija						
1 Sutaris Nr.1.13		Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga skaldis k9=1.15	100m3	0,012	279,85	3,36
2 Sutaris Nr.1.18		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	2,00	3,51	7,02
3 Sutaris Nr.3.8		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,023	1 606,96	36,96
4 Sutaris Nr.3.13		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,08	729,01	56,86
5 N27P-24-1		Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordūrai esami k9=1.15	100m	0,02	1 517,17	30,34
Skyriuje 1						134,54
2 Lietaus nuotekų tinklai						
1 Sutaris Nr. 1.3		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	5,20	34,43	179,04
2 N23P-0204		Plastikinių aklių iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 200 mm) k9=1.15	vnt.	1,00	15,34	15,34
3 Sutaris Nr. 1.16		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,052	110,27	5,73
4 Sutaris Nr. 1.20		Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,052	216,42	11,25
Skyriuje 2						211,36
3 Žemės darbai						
1 Sutaris Nr. 2.1		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdiniais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	1,17	18,71	21,89
2 Sutaris Nr. 2.2		Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutenkinant gruntą k9=1.15	m3	4,31	12,56	54,13
3 Sutaris Nr. 2.5		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,023	171,72	3,95
4 Sutaris Nr. 2.6		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,1560	3 844,22	599,70
5 Sutaris Nr. 2.7		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,0156	5 099,52	79,55
6 Sutaris Nr. 2.8		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,0156	165,64	2,58
Skyriuje 3						761,80
Žinlaraštyje 1						1 107,70
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						232,62
Iš viso žinlaraštyje 1						1 340,32

Priedas Nr. 4

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“
I. Končiaus g. 3
LT90159 Plungė
El. p. pbustas@pbustas.lt

2021-08-05 Nr. AS-
I Nr. _____

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

AB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL DAUGIABUČIO NAMO PRISIJUNGIMO PRIE TELŠIŲ G. LIETAUS TINKLŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugpjūčio 3 d. gavo Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ raštą D2-620 „Dėl drenazo pajungimo į Telšių g. lietaus tinklus“.

Informuojame, jog Savivaldybės administracija šiam sprendimui pritaria ir prašo projektuotojo bei techninės priežiūros vadovo įvertinus situaciją rasti galimybę prijungti daugiabučio namo, esančio Telšių g. 19, drenazą prie Telšių g. lietaus vandens surinkimo tinklų.

Prašome Rangovo apskaičiuoti, kiek kainuos papildomi darbai ir samatą pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijai bei techninės priežiūros vadovui, kuris įformins darbų pakeitimą.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DAUGIABUČIO NAMO PRISIJUNGIMO PRIE TELŠIŲ G. LIETAUS TINKLŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-06 Nr. AS-4245
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-08-06 Nr. PL21-G-699
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-05 17:41:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-05 17:42:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-06 08:28:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-06 08:28:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, i.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paleškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-06 10:08:44 Dokumentų valdymo sistema Avily

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-09-21, Nr. SDKL-290

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PASIŪLYMO RYŠIŲ ŠULINIŲ PAŽEMINIMUI PATEIKIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų


Atliekant pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo darbus, pastebėta, kad ties PK 1+20 ir 4+20 (priedai Nr. 1 ir Nr. 2) esami ryšių šuliniai neatitinka suprojektuoto gatvės dangų aukščio, t. y. yra iškilę virš tako paviršiaus.

Mėnesinio pasitarimo Nr. 5 metu priimtas sprendimas šiuos šulinius pritaikyti prie rengiamo tako paviršiaus, nes išsikišę šuliniai kelia pavojų pėstiesiems ir dviratininkams, neestetiskai atrodo.

Iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavę sąnaudų kiekių žiniaraščius, teikiame papildomų darbų lokalinę sąmatą ir prašome pritarti papildomų darbų atlikimui.

- PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis ir schemas, 3 lapai;
2. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui




Artūras Valys


Originalas siunčiamas nebus

Papildomi darbai


Ryšių šulinys Pk 1+20			
Eik. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Šulinio liuko ardymas	vnt.	1
2	Šulinio liuko aukščio reguliavimo g/b žiedų įrengimas	vnt.	1
3	Sunkaus tipo šulinio liuko įrengimas	vnt.	1

Ryšių šulinys Pk 4+20			
Eik. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Gelžbetoninės šulinio perdangos pjovimas	vnt.	1
2	Gelžbetoninės šulinio perdangos įrengimas betonuojant	vnt.	1

Atestato Nr.	 „PLENTRPROJEKTAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas <i>I ir II etapas</i>		Laida
							0
30410	PV	A. Vilkelis		2021-08	0415 - 01 – DP – TT	Lapas	Lapų
31962	PDV	R. Lučkauskas		2021-08		1	1

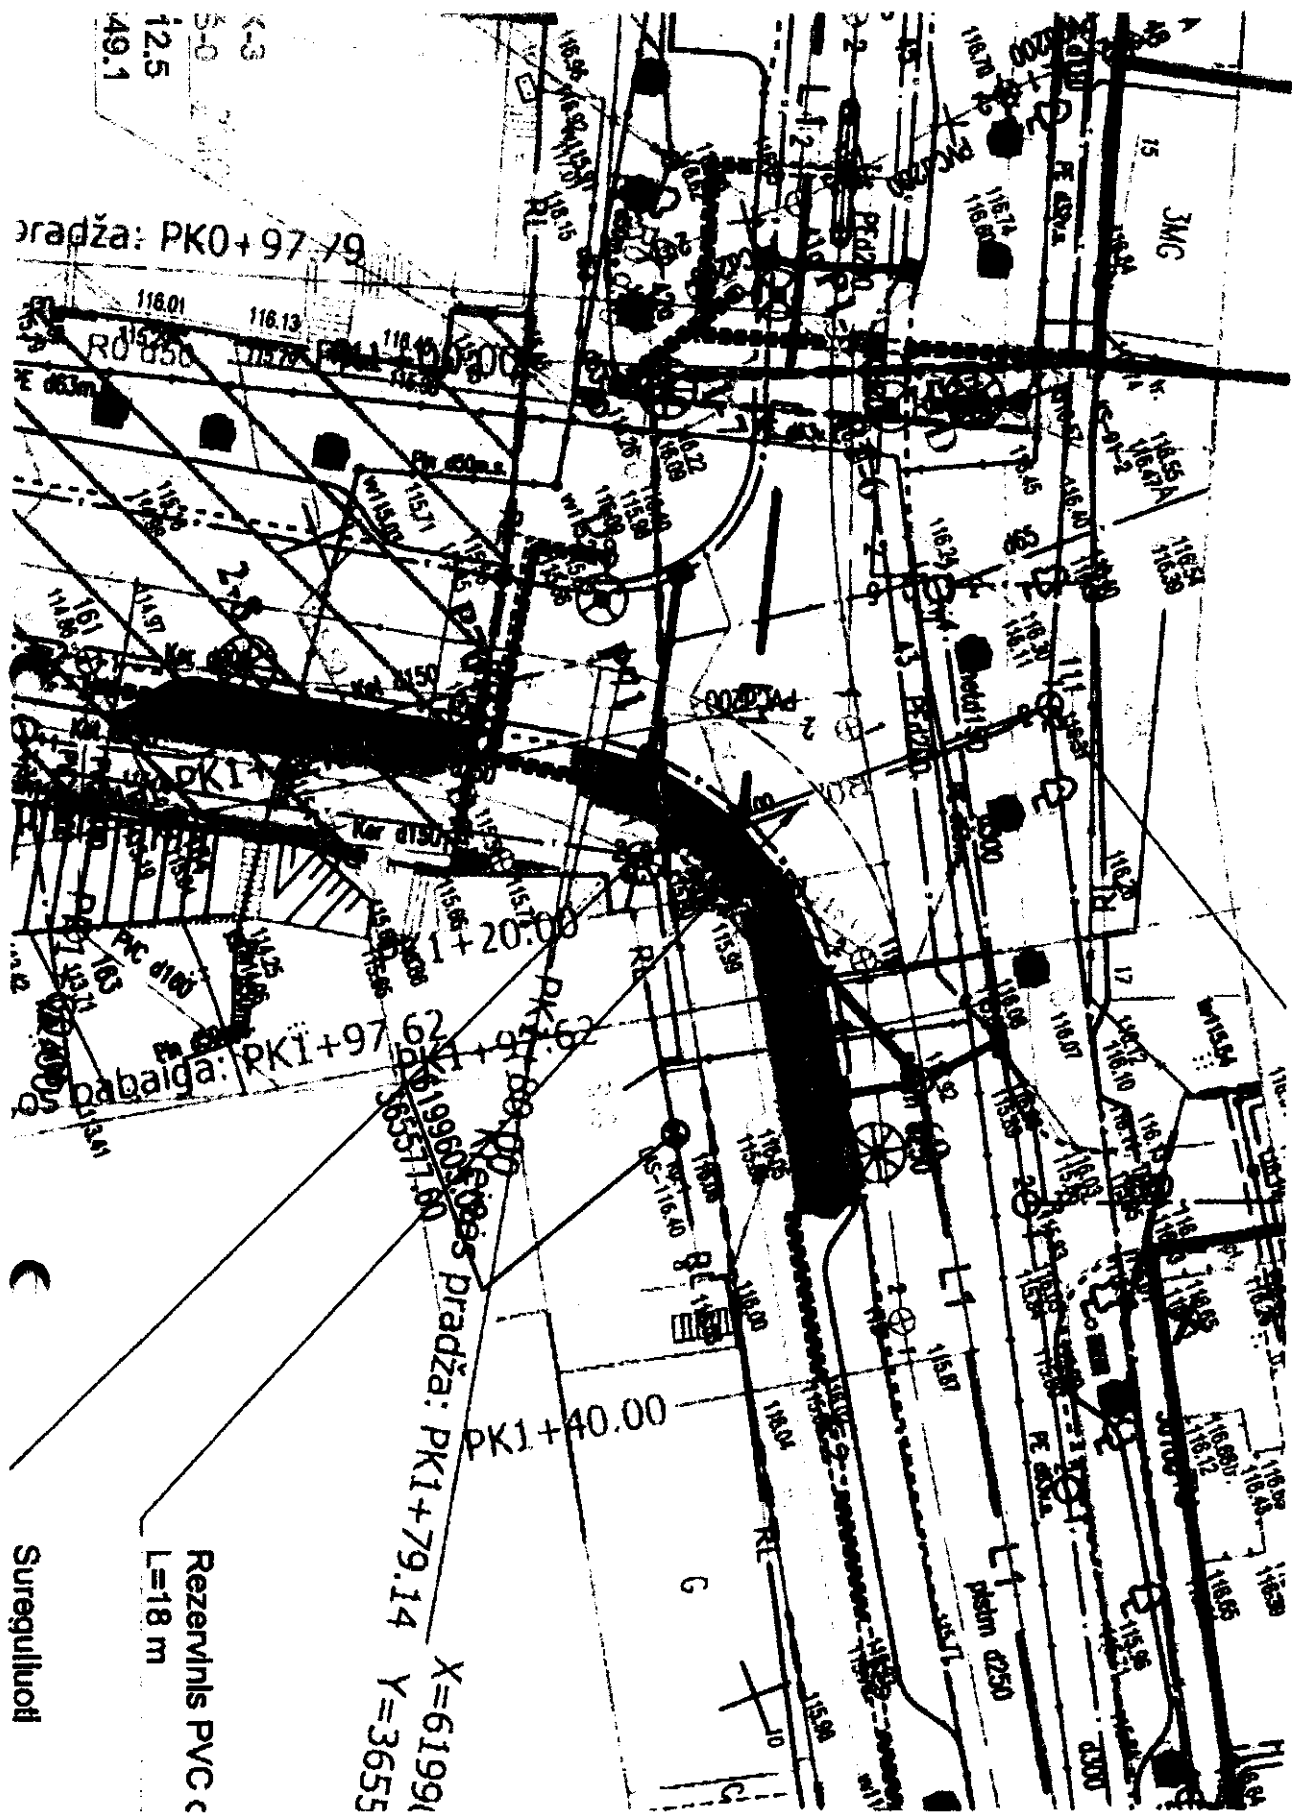

7

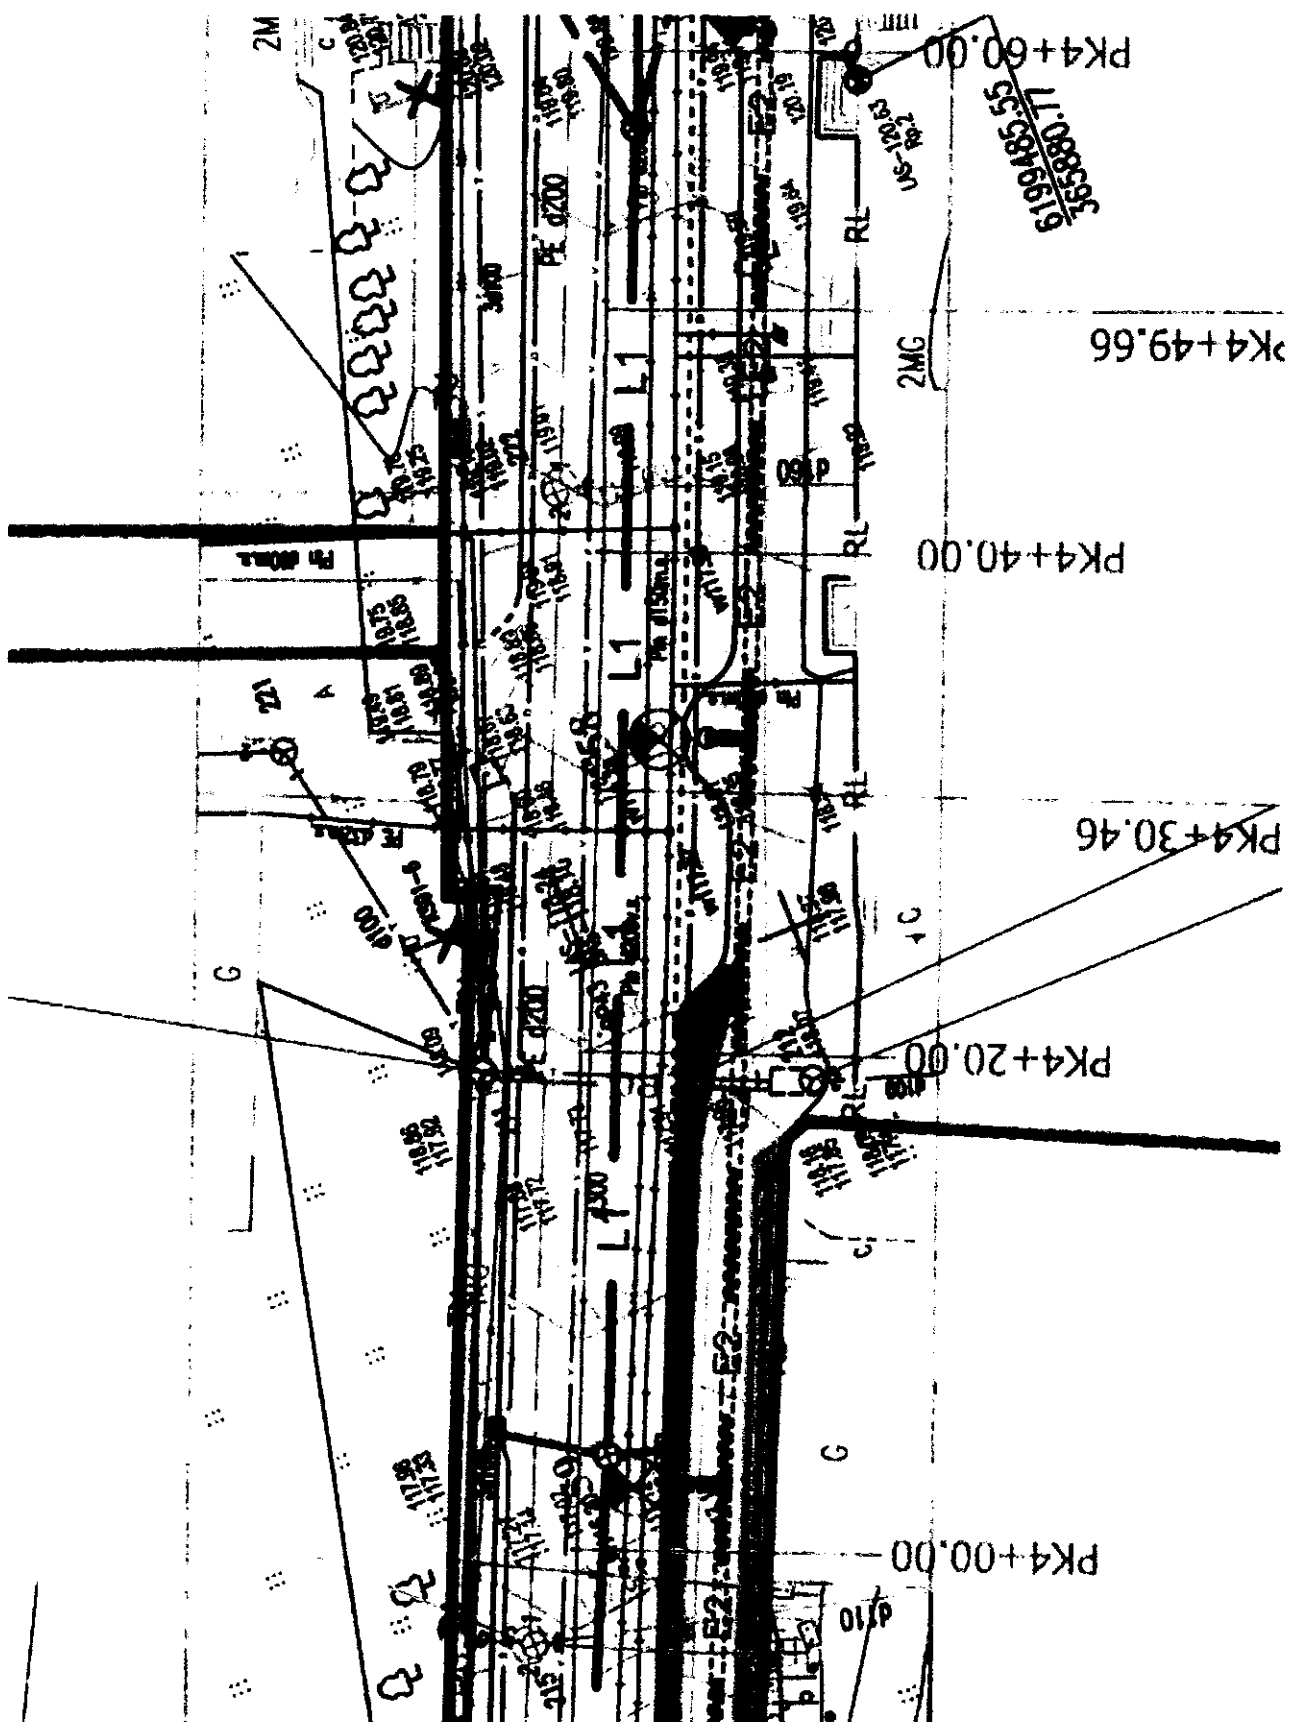

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 0244-01 PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO TP

Statiny's 1 INŽINERINIAI TINKLAI

Žiniaraštis 501 TELIA TINKLAI. PAPILDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 1 115,11 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ryšių šulinys Pk 1+20						
1 Sutaris Nr. 1.10		duobės šuliniui RKŠ-3 viršutinės dalies atkasimas k1=1.30,k9=1.15	100m3	0,057	1491,0	84,99
2 Sutaris Nr. 1.11		šulinio RKŠ-3 užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,057	800,0	45,6
3 Sutaris Nr. 1.15		Liukų ARDYMAS šuliniuose k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1,0	5,0	5,0
4 Sutaris Nr. 1.16		Liukų įrengimas šuliniuose k9=1.15	vnt	1,0	22,0	22,0
Skyriuje 1						157,59
2 MEDŽIAGOS						
1 Sutaris Nr. 2.5		ŠULINIO LIUKO AUKŠČIO REGULIAVIMO G/B ŽIEDAS	vnt	1,0	9,0	9,0
2 Sutaris Nr. 2.10		LIUKO TVIRTINIMO VARŽTAS	vnt	2,0	4,0	8,0
3 Sutaris Nr. 2.12		Sunkūs telefono tinklų liukai MTT-S1	vnt	1,0	210,0	210,0
4 Sutaris Nr. 2.13		LIUKO UŽRAKTAS	vnt	1,0	8,0	8,0
Skyriuje 2						235,0
3 Ryšių šulinys Pk 4+20						
1 Sutaris Nr. 1.10		duobės šuliniui RKŠ-3 viršutinės dalies atkasimas k1=1.30,k9=1.15	100m3	0,057	1491,0	84,99
2 Sutaris Nr. 1.11		šulinio RKŠ-3 užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,057	800,0	45,6
3 Sutaris Nr. 1.12		šulinio RKŠ-3 sienos 10cm storio pjovimas diskiniu pjūkle k8=1.17	m	5,6	1,5	8,4
4 Sutaris Nr. 1.13		šulinių RKŠ-3 viršutinės dalies įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	190,0	190,0
5 Sutaris Nr. 1.14		ŠULINIO RKŠ-3 VIRŠUTINĖS DALIES IŠMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1,0	80,0	80,0
Skyriuje 3						408,99
4 MEDŽIAGOS						
1 Sutaris Nr. 2.4		ŠULINIO RKŠ-3 VIRŠUTINĖ DALIS	vnt	1,0	120,0	120,0
Skyriuje 4						120,0
Žiniaraštyje 501						921,58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						193,53
Iš viso žiniaraštyje 501						1115,11

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė



GAUTA
2021 m. 09 mėn. 27 d.
Nr. PL21-9-862

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2021-09-27 Nr. AS-5202
SDKL-290/AG-
I 2021-09-23 Nr. 3443

AB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į Jūsų 2021 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. SDKL-290/AG-3443, informuoja, kad pritaria ryšių šulinių pakėlimo ir pritaikymo prie naujai įrengtos tako dangos papildomiems darbams bei pateiktai sąmatai.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pasiūlymo ryšių šulinių pažeminimui pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-27 Nr. AS-5202
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-09-27 Nr. PL21-G-862
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 11:56:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-27 11:56:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 14:14:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-27 14:15:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, į.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210921.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-27 16:45:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-27 16:45:17 Dokumentų valdymo sistema Avily

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 5



Parengė: FIDIC inžinierius S. Varkalys

**„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
Telšių gatvės rekonstravimo darbai.**

Data: 2021-07-22

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Telšių g., Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Modestas Budrys, Mindaugas Kaunas, Tomas Jocys, Arvydas Liutika.

Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. FIDIC inžinierius Steponas Varkalys.

Rangovas: (UAB „Plungės lagūna“).

Ernestas Tkačiovas, Edvardas Grubas (UAB „Plungės lagūna“).

Projekto priežiūros vadovas: (UAB „Plentprojektas“)

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
 - 1.1. Oro sąlygos: geros
 - 1.2. Darbų eiga: pagal grafiką.
 - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios: pagal grafiką.
 - 1.4. Rangovo ištekliai: pakankami.
 - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai: nėra atlikta darbų, kuriems reikalingi laboratoriniai tyrimai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga: darbų saugos reikalavimų laikomasi.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata: nelaimingų atsitikimų nėra.
4. Pretenzijos: nėra
5. Pakeitimai/Pranešimai: Ruošiami pakeitimai.
6. Kito mėnesio darbo planas: pagal grafiką.
7. Rangovo dokumentacija: paruošta.
 - 7.1. Darbų programa: suderinta.
 - 7.2. Projektai: paruošti
 - 7.3. Statybos darbų žurnalai: pildomi.
 - 7.4. Pridavimo dokumentacija: darbai nebaigti.
 - 7.5. Darbų eigos ataskaitos: ruošiamos.

**PASITARIMO PROTOKOLAS
Nr. 5**



Parengė: FIDIC Inžinierius S. Varkalys

**„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
Telšių gatvės rekonstravimo darbai.**

8. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai: apsvastyti posėdžio metu.
9. Mokėjimai: pagal grafiką.

SVARSTYTA IR NUTARTA:

1. Darbai vykdomi pagal grafiką ir parengtą projektą.
2. Svarstyti klausimai dėl projektinių sprendinių patikslinimo:
 - 2.1 Ties Pk. 1+20 dešinėje pusėje, atkastas pažeistas ryšių kameros dangtis, kurį reikia pažeminti .
Nutarta: Ryšių kameros dangtį įrengti naują, pažeminant iki projektinio lygio.
Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.
 - 2.2 Telšių Nr. 8 gyvenamo namo rūsio įrengtos ventiliacijos angos užsidengia šaligatvio trinkelėmis, gyventojas prašo palikti neuždengtas angas.
Nutarta : Ties ventiliacijos angomis uždėti groteles, atriboti bortais. Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.
 - 2.2 Reikia išspręsti klausimus nuo pk 0+00 iki 1+10 kairėje ir dešinėje gatvės pusėse dėl gatvės šaligatvių sujungimo su esamomis dangomis, prie kavinės „Beržas“ esamas šaligatvis savininko teritorijoje išklotas plytelėmis 30x30, naujai įrengiamas šaligatvis iš trinkelų, kairėje pusėje dubliuojantis vejų bortas.
Nutarta: Užsakovas sklypų savininkams išsiųs perspėjimo raštus dėl dangų suderinimo, savininkams bendraujant su Rangovu bus priimtas kiekvieno savininko suderintas sprendimas dėl dangų. Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.
 - 2.3 Pk. 1+60 dešinėje nenumatytas servitutinis įvažiavimas į kiemus .
Nutarta : Numatyti įvažiavimą į kiemus Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 5



Parengė: FIDIC Inžinierius S. Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai. Telšių gatvės rekonstravimo darbai.

2.4 Pk. 1+80 parduotuvė „Pitlius“ laiptų papuošimas įrengtas dviračių take, nesaugus dviračių eismas (dviratininkai gali atsitrekti į laiptų papuošimus), reikia išmontuoti įrenginius dviračių tako zonoje.

Nutarta: Užsakovas raštu įpareigos savininkus išmontuoti įrenginius trukdančius dviračių tako įrengimui.

2.5 Pk. 2+10 dešinėje, pastato medinė siena atsiremia į šaligatvį (sklypo riba prie pastato), sklypo savininkas kelia pretenzija, kad jam nuo šaligatvio bėgs vanduo ant namo ir drėkins esamus supuvusius pamatus.

Nutarta: Medinę namo sieną atriboti bortu, šalia sienos įrengti drenažą ir užpilti skalda. Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.6 Pk. 2+70 dešinėje nenumatyta vandens nuvedimas, reikia rengti papildomą vandens surinkimo šulinį.

Nutarta: Įrengti papildomą šulinį vandens nuvedimui. Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.7 Ties pastatais Telšių 27 ir 29 sklypo savininkų paklotos trinkelės aukščiau šaligatvio, reikia numatyti trinkelės suvedimą su rengiamu šaligatviu.

Nutarta: Užsakovas raštu įpareigos savininkus susiderinti su Rangovu sprendinį dėl dangų nuolydžio suvedimo. Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.8 Ties pk. 4+20 dešinėje reikia pažeminti ryšių šulinį, nes neatitinka gatvės dangų aukščio, nenumatyta projekte.

Nutarta: Pažeminti ryšių šulinį iki projektinio lygio. Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.9 Prie namo Telšių g. 38 nenumatyta takas per žalią juostą įėjimui į namą.

Nutarta: Numatyti įrengti taką per žalią juostą su vejais bortais. Projektuotojas paruošia sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 5



Parengė: FIDIC Inžinierius S. Varkalys

**„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
Telšių gatvės rekonstravimo darbai.**

2.10 Prie Rengiamo žiedo neatitinka gatvių suvedimai su žiedu, reikia patikslinti sprendinį.

Nutarta: Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.11 Telšių g. 39 pažeminus šaligatvį, atsidengė pamatas ir elektros, bei dujų įvadų dėžės.

Nutarta: įrengti vejos bortelį, pakeliant dalį šaligatvio, sujungti su gatvės bortu ir esama mūrine sienute. Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.12 Prie SG klinikos neišspręstas užvažiavimas neįgaliesiems iš projektuojamos aikštelės.

Nutarta: Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

2.13 Pk. 0+60 kairėje numatytas medžio sodinimas prieš esantį paminklą, dubliuojasi vejos bortas privačiame sklype, ant paminklo numatytas vejos bortas.

Nutarta: Projektuotojas patikslina sprendinį ir darbų kiekius iki 2021 08 12.

Kitas pasitarimas : 2021. 08. 24. 10 valandą.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

ARVYDAS LIOTIKAS
