

SIRINKIMO PROTOKOLAS NR.2

DĖL VYKDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ

2024 m. sausio 30 Nr. 2

Užsakovas atstovas

Rangovas atstovas

Statinio statybos techninė priežiūra

Projekto vykdymo priežiūros vykdytojas

Parengus darbo projektą, patikslinus techninio projekto sprendinius, suderinus darbo projekto sprendinius su Užsakovu, Projekto vykdymo priežiūros vykdytoju ir Techninės priežiūros vykdytoju keitėsi, neesminiai projekto sprendiniai, ko pasėkoje atsiranda papildomų ir nevykdomų darbų.

Šių darbų nebuvo galima numatyti iki pirkimų pradžios, nes viešuosiuose pirkimuose rangos darbai buvo perkami naudojantis parengtu UAB „Medstatyba“ techniniu projektu.

Svarstyta:

1. Projektuojame pastate yra suprojektuota priėmimo užpylimo bunkerio gelžbetoninė prieduobė. Bunkerio tiekėjas turėjo pagaminti laiptus į prieduobę. Paaiškėjo, kad bunkerio tiekėjas, neįsivertino gelžbetoninės sienelės aukščio ir laiptus pagamino žemesnius nei 300 mm. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą situaciją, buvo nuspręsta, sumažinti įrengtos sienelės aukštį 300 mm, kur bus įrengiami laiptai. Sienelės sumažinimui reikalinga atlikti papildomus darbus.

2. Techniniame projekte (toliau - TP), nėra apspręstas seno pastato lietaus sistemos (3 vnt. įlajų) pajungimas į lauko lietaus tinklus. Seno pastato lietaus sistemos pajungimui reikalinga ardyti seno pastato grindis ir sujungti sistemas, bei jas užbetonuoti. Šitie darbai nebuvo nurodyti TP.

3. TP suprojektuotas lakštinis plienas grindų apsaugai nuo konteinerių ratų (kreipiančiosios KR-1 ir KR-2) TP statinio architektūros dalyje. Rengiant darbo projektą (toliau – DP) architektūros dalį papildomai buvo projektuojamos kreipiančiųjų KR-1 ir KR-2 tvirtinimai ir šonai, pagal esamus konteinerius. Kreipiančiųjų tvirtinimui ir šonų įrengimui reikalinga atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo TP.

4. TP požeminių rezervuarų aptarnavimui suprojektuotas viena liukas. Detalizuojant TP sprendinius DP projektuotojai suprojektavo papildomus 2 vnt. liukus, kurie reikalingi požeminių rezervuarų aptarnavimui. Dviejų papildomų liukų įrengimui reikalinga atlikti papildomus darbus.

5. Projektuotojai pateikė DP elektrotechninės dalies brėžinius, kuriuose patikslino TP elektrotechninės dalies sprendinius. Pagal pateiktus DP brėžinius (22-19) DP-E.BR-01; (22-19) DP-E.BR-04 ir (22-19) DP-E.BR-05 reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti TP. Papildomi darbai: elektros kabelio tiesimas vartams Nr.5 ir Nr.4, elektros kabelio atvedimas nuo šildymo skydo iki šildomo kabelio gnybtų ir šildomo kabelio įrengimas vandenio pajungimui į depakerį.

6. TP nebuvo detalizuotas pajungimas į biofiltrą. Rangovas per gamybinius susirinkimus iškėlė šį klausimą, 2023-11-22 Užsakovas persiuntė projektuotojų paaiškinimą ir sprendimą, kaip pasijungti į biofiltrą. Šių sprendinių įgyvendinimui reikalinga atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo techniniame projekte.

7. Projektuotojai pateikė DP šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo brėžinius, kuriuose patikslino TP sprendinius. Pagal DP brėžinius (22-19) DP-ŠVOK B-01 ir (22-19) DP-ŠVOK B-03, reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti TP. Papildomi darbai: PVC ortakių su sklendėmis įrengimas ir ortakių iš viniplasto įrengimas.

8. Projektuotojai TP vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje ir DP vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje suprojektavo priešgaisrinio vandentiekio pasijungimą prie esamo priešgaisrinio vandentiekio tinklo iš karto - už sienos (pagal senąjį esamo pastato projektą taip ir rodo). Pradėjus montuoti priešgaisrinio vandentiekio tinklus, paaiškėjo, kad esamas priešgaisrinio vandentiekio vamzdis, prie kuriuo suprojektuotas prisijungimas ir kurio diametras yra 76 mm yra žymiai toliau nei suprojektuota TP ir DP. Priešgaisrinio vandentiekio pajungimui reikalinga atlikti papildomus darbus.



9. Projektuotojai TP gaisrinės saugos dalyje suprojektavo 4 evakuacinius kelius, tačiau TP elektrotechnikos dalyje ir DP elektrotechnikos dalyje suprojektavo tik 3 „EXIT“ šviestuvus. 2024-01-09 gamybinio pasitarimo metu rangovas iškėlė klausimą, ar nėra reikalingas dar vienas „EXIT“ šviestuvus. Projektuotojai gamybinio pasitarimo metu patvirtino, kad čia yra jų klaida ir kad reikalinga sumontuoti dar vieną „EXIT“ šviestuvą. Papildomo „EXIT“ sumontavimui reikalinga atlikti papildomus darbus.

10. Įrangos tiekėjams sumontavus technologinę įrangą paaiškėjo, kad jos veikimui reikalingas suspaustas oras. TP nebuvo suprojektuotas suspaustas oras.

11. Patikslinus TP gamybos technologijų dalį, nebereikalinga įrengti kanalų, kurie buvo skirti inžineriniams tinklams įrengti, t. y. šie darbai tampa nevykdomi.

Nutarta: pritarti aukščiau nurodytiems vykdomiems ir nevykdomiems darbams.


PRIDEDAMA, 2024-01-16 UAB „IVRO“ raštas Nr. IVRO24/01-16-01 „, Papildomų darbų, rangos darbų atlikimo pratęsimo ir garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo būdų pagal 2023-05-19 rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS“, 13 lapų.

Užsakovas atstovas

Rangovas atstovas

Statinio statybos techninė priežiūra

Projekto vykdymo priežiūros vykdytojas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“

2024-01-16 Nr. IVRO 24/01-16-01

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ, RANGOS DARBŲ ATLIKIMO PRATĖSIMO IR GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO BŪDŲ PAGAL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTĮ NR. 23-101-AS

1. 2023-05-19 tarp UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Ivro“ (toliau – Rangovas) buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 23-101-AS (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbus (toliau - Darbai).

I. DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 p. nurodyta, kad darbų atlikimo terminas yra 8 mėnesiai nuo Sutarties SD 3.1. punkte nurodytos Darbų atlikimo pradžios, t. y. statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
3. Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Sutartyje numatytas 8 mėnesių terminas rangos darbams, o Užsakovas 2024-01-05 kreipėsi į Rangovą dėl papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų atlikimo yra reikalingas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir rangos darbų atlikimo termino pratęsimo, kadangi dėl papildomų darbų poreikio, rangos darbų atlikti per 8 mėnesius nėra įmanoma. Papildomas darbų poreikis yra nulemtas to, kad darbo projektas (toliau – DP) turėjo būti parengtas dar iki Užsakovui ir Rangovui pasirašant sutartį, tačiau DP, jo dalys yra/buvo rengiamos/tikslinamos per visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį, taip pat iki šio momento, nors rangų darbų atlikimo terminas baigiasi, vis dar nėra parengtas GS dalies DP. Ryšium su tuo, Sutarties įgyvendinti ir atlikti reikalingus rangos darbus suplanuotu laiku, nėra galimybės ne dėl Rangovo kaltės.
4. Remiantis išdėstytu, reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus:
5. **PRIEDAS NR. 1 (sąmata bendrastatybiniai darbai)**
 - 5.1. Pastate, kur yra gelžbetoninė duobė ir yra sumontuotas bunkeris, aplink duobę yra gelžbetoninė sienutė, kurios aukštis apie 300 mm. Bunkerio tiekėjas turėjo į duobę suprojektuoti tinkamus laiptus, bet neįsivertino gelžbetoninės sienutės aukščio ir laiptus pagamino žemesnius nei 300 mm. Užsakovo prašymų, kur yra sumontuoti bunkerio tiekėjo laiptai, buvo sumažinta sienutė 300 mm. To pasakoje atsirado papildomi darbai.
 - 5.2. Nei techniniame projekte (TP), nei darbo projekte (DP) nėra apspręstas seno pastato lietaus sistemos (3vnt. įlajos) pajungimas į lauko lietaus tinklus. Reikalinga ardyti seno pastato grindis ir sujungti sistemas, bei jas užbetonuoti.
 - 5.3. Lakštinis plienas grindų apsaugai nuo konteinerių ratų (kreipiančiosios KR-1 ir KR-2) nebuvo detalizuotas (22-19) TP-SK, buvo tik kiekių žiniaraštyje duotas kiekis 740 kg. 2023-

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

10-12 iš Užsakovo gautas papildomas (22-19) DP-SK A-47 brėžinys, kur detalizuota KR-1 ir KR-2. Pagal gautą brėžinį tonažas yra 2388 kg. Atsirado papildomai 1648 kg.

- 5.4. Požeminių rezervuarų liukų įrengimas 2 vnt. nėra detalizuoti nei TP, nei DP. Yra tik vienas liukas kiekviename žiniaraštyje, Rangovas jį ištraukęs į sąmatą. Viso yra reikalingi 3 liukai, iš jų 2 - yra papildomi darbai.

6. **PRIEDAS NR. 2 (sąmata elektrotechniniai darbai)**


- 6.1. 2023-12-18 iš Užsakovo gauti papildomi brėžiniai (22-19) DP-E.BR-01; (22-19) DP-E.BR-04 ir (22-19) DP-E.BR-05, tapo aišku, kad reikės atlikti papildomus nenumatytus darbus.

7. **PRIEDAS NR. 3 (sąmata AE-1 sistemos pasijungimas į biofiltrą darbai)**

- 7.1. Nei TP, nei DP nebuvo detalizuotas pajungimas į biofiltrą. Rangovas per gamybinius susirinkimus iškėlė šį klausimą kaip pasijungti į biofiltrą. 2023-11-22 Užsakovas persiuntė susirašinėjimus su projektuotojais ir priėmė sprendimą, kad reikia daryti pagal pirmą variantą.

From: [redacted]
Sent: [redacted]
To: [redacted]
Subject: RE: FW: KRA ILC Dumpių biofiltras

Tai galimi du prijungimo būdai, kalbėjau su biofilto tiekėju. Čia būtų galima spręsti kuris variantas yra pigesnis ir patogesnis montavimui, nes [takos veikimui tai netures. 1 variantas (jungtis prie biofilto naikinant "kelnes" ir prijungiant seną pastato dalį prie kairės angos - naują prie dešinės):

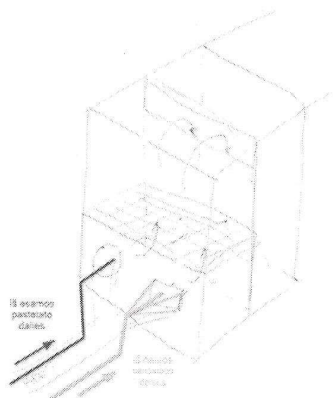


8. **PRIEDAS NR. 4 (sąmata vėdinimo darbai)**

- 8.1. 2023-12-13 iš Užsakovo gauti papildomi brėžiniai (22-19) DP-ŠVOK B-01 ir (22-19) DP-ŠVOK B-03, kuriuose yra pavaizduoti papildomi PVC ortakiai su sklendėmis, atsišakojimai ir aksonometrija, tapo aišku, kad reikės atlikti papildomus nenumatytus darbus.

9. **PRIEDAS NR. 5 (sąmata priešgaisrinio vandentiekio darbai)**

- 9.1. (22-19) TP-VN ir (22-19) DP-VN projektuose priešgaisrinio vandentiekio pasijungimas yra iš karto prie esamo pastato sienos (pagal senąjį esamo pastato projektą taip ir rodo), bet natūroje gaisro vandentiekio vamzdis yra D76 esamame pastate yra žymiai toliau. Pridedama schema. Reikalinga atlikti papildomus darbus.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

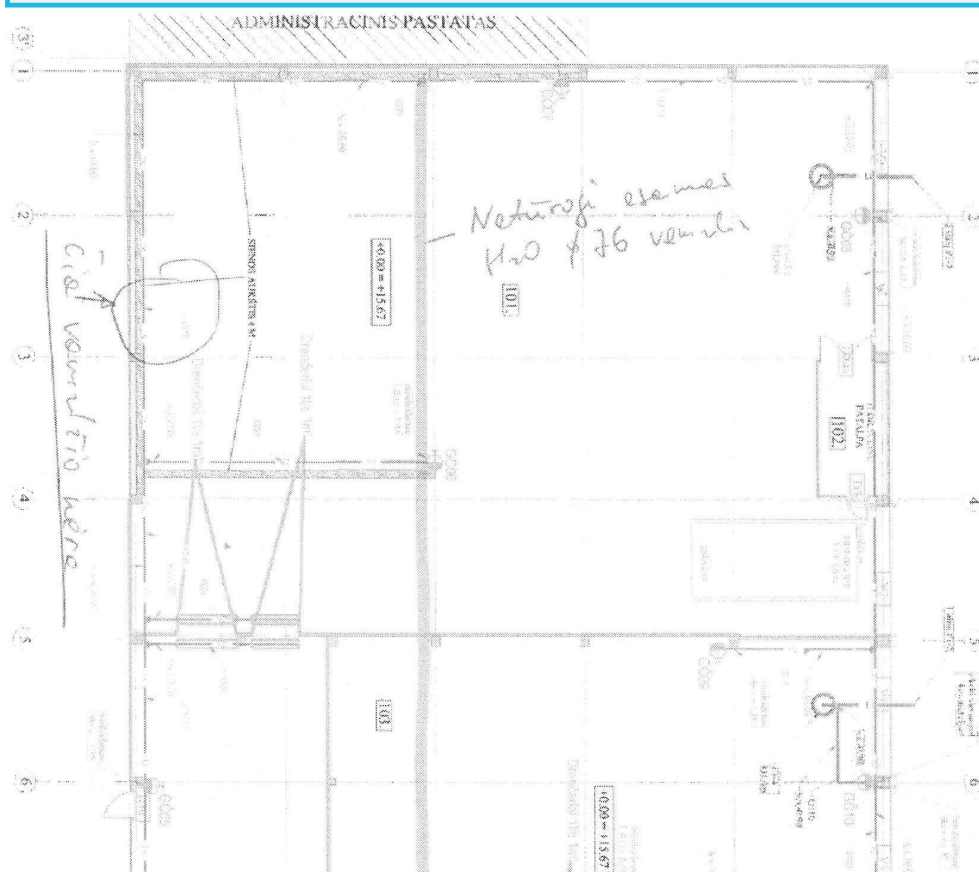

10. PRIEDAS NR. 6 (sąmata elektrotechnikos darbai. EXIT šviestuvo montavimas)

10.1. (22-19) TP-GS plane rodomi 4 evakuaciniai keliai. (22-19) TP-E ir (22-19) DP-E suprojektuoti tik 3 evakuaciniai išėjimo ženklai. 2024-01-09 gamybinio pasitarimo metu rangovas iškėlė klausimą ar nėra reikalingas dar vienas evakuacinis išėjimo ženklas. Projektuotojai patvirtino, kad čia yra jų klaida ir pamiršo suprojektuoti (22-19) TP-E ir (22-19) DP-E. Reikalinga papildomai įrengti dar 1 evakuacinį ženklą.

11. PRIEDAS NR. 7 (sąmata suspausto oro darbai)

11.1. 2024-01-05 užsakovas nurodė įrengti papildomai suspaustą orą. Suspausto oro reikia pastate sumontuotiems technologiniams įrenginiams.

12. Įvertinant prašomų atlikti papildomų darbų apimtį, papildomi rangos darbai turėtų būti atlikti iki 2024-03-15 imtinai. Pridedamas papildomų darbų atlikimo grafikas.

12.1. DARBŲ GRAFIKAS

Visi statybos darbai su skubiai patvirtintais papildomais darbais.	Turi būti baigti 2024-01-31
Baigiamasi aktas ir paskutinis atliktų darbų aktas	Turi būti pasirašyta visų statybos dalyvių 2024-01-31
PAŽYMA DEL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO NENUKRYPSTANT NUO STATINIO PROJEKTO IR JO DOKUMENTŲ, PAGAL KURIUOS ATLIKTI DARBAI, SPRENDINIŲ, STATINIO (JO DALIES) NORMATYVINĖS KOKYBĖS, STATYBOS METU PANAUDOTŲ STATYBOS PRODUKTŲ IR ĮRENGINIŲ KOKYBĖS ATITIKIMO STATINIO PROJEKTO, NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHININIŲ	Turi būti pasirašyta visų statybos dalyvių 2024-01-31

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

DOKUMENTŲ, NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMAMS	
Rangovui perduoti visi reikalingi dokumentai, kurie reikalingi VTPSI	2024-01-31
Tikrinami dokumentai	2024-02-01/02
Teikiame prašymą į VTPSI	2024-02-05
VTPSI užregistruoja prašymą ir tikrina dokumentus	2024-02-06/09
VTPSI ir kt. paskiria komisijos narius	2024-02-12/20
Komisijos darbas	2024-02-21 2024-03-06
Statybos akto išdavimas (jeigu viskas gerai, nėra pastabų iš komisijos narių).	2024-03-08
Įregistravimas Nekilnojamojo turto registre	2024-03-15

II. DĖL GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO


13. Be kita ko, papildome susitarime turi būti detalizuota garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo tvarka, kuri yra būtina sėkmingam ir savalaikiam objekto pridavimui.
14. Sutarties specialųjų sąlygų 6.8 p. nurodyta, kad Darbams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, susijusiems su statybos ranga, taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatose nustatyti garantiniai terminai, tačiau nereglamentuotas garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas, kuris yra būtinas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.
15. Statybos įstatymo 41 str. 2 p. nurodyta, kad Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griauinant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.
16. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas tiek sulaikoma 5 procentų suma nuo statinio statybos kainos iš Užsakovui mokėtinų lėšų, tiek Rangovui pateikiant draudimo bendrovės ar banko išduotą draudimo liudijimą/garantiją reikalaujamai sumai.
17. Įvertinant tai, kad yra siekiama kuo greičiau pilna apimtimi įgyvendinti sutartį, t. y. priduoti statinį, o draudimo bendrovės liudijimas ar banko draudimo garantija yra išduodama ne trumpiau kaip per 10 d. d. po to, kai yra pateikiamas galutinis statybos užbaigimo aktas. Taigi papildomame susitarime yra tikslinga numatyti abu galimus garantinio laikotarpio užtikrinimo būdus - tiek galimybę sulaikyti 5 procentų sumą nuo statinio statybos kainos iš Užsakovui mokėtinų lėšų, tiek Rangovui pateikiant draudimo bendrovės ar banko išduotą draudimo liudijimą/garantiją reikalaujamai sumai. Abu būdai yra priimtini, norint gauti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

Atsižvelgiant išdėstytu yra prašoma pasirašyti papildomą susitarimą dėl:

- papildomų darbų atlikimo;
- rangos darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2024-03-15 imtinai dėl atsiradusios papildomų darbų būtinybės;
- garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo būdų.

Komercijos direktorius



UAB"IVRO"

TVIRTINU:_____TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2024 M. MEN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 4 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai. PRIEDAS Nr.1

2024.01.09		Suma žiniaraščiui		14099,22 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1	N46-35	Betono išmušimas duobės sienutėje, užglaistant kraštus ir išvežant šiukšlės k8=1.17	m3	0,09	4241,0	381,69
2	N46-164	Seno pastato grindų išdaužymas lietaus sistemai pajungti k8=1.17	m3	0,2	1878,4	375,68
3	N6P-0303	Seno pastato grindų užbetonavimas k8=1.03,k9=1.15	m3	0,2	2150,7	430,14
4	N9P-0110	Lakštinis plienas grindų apsaugai nuo konteinerių ratų (kreipiančiųjų montavimas, trūkstamas kiekis)	t	1,648	4610,4	7597,94
5	N23P-0910	Požeminių rezervuarų liukų įrengimas (2vnt)	vnt.	2,0	1433,4	2866,8
Skyriuje 1						11652,25
Žiniaraštyje 4						11652,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2446,97
Iš viso žiniaraštyje 4						14099,22

Sudarė

/Pavardei

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statiny 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 3 Papildomi darbai. Elektrotechniniai darbai. PRIEDAS Nr.2

2024.01.08		Suma žiniaraščiui		1429,28 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N21-19	Kabelio tiesimas esamomis konstrukcijomis, kai kabelio masė iki 1kg/m	100m	1,3	359,2863	467,07
2	N21P-0503	Savireguliuojančio šildymo kabelio montavimas	100m	0,12	330,0825	39,61
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3,0	42,0	126,0
Skyriuje 1						632,68
2 Medžiagos						
1	88004003	El. kabelis su vario gyslomis 3x2,5 mm2 Cca	m	50,0	1,9256	96,28
2	88004004	El. kabelis su vario gyslomis 5x2,5 mm2 Cca	m	80,0	3,0618	244,94
3	346667.1	Savireguliuojantis šildymo kabelis 15w/m, 1mm2	m	12,0	13,3017	159,62
4	88005011	Automatas 3F 10A	vnt	2,0	21,0	42,0
5	88005012	Automatas 1F 10A	vnt	1,0	5,7	5,7
Skyriuje 2						548,54
Žiniaraštyje 3						1181,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						248,06
Iš viso žiniaraštyje 3						1429,28

Sudarė

/Pavaru

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statins 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai. AE-1 sistemos pasijungimas į biofiltrą darbai. PRIEDAS Nr.3

2024.01.08		Suma žiniaraščiui		1527.29 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 AE-1 sistemos pajungimas į biofiltrą						
1	N10-10	Sienų apkalimas juoda skarda ant veltinio*demontavimas k1=0.50,k3=0.000	m2	6,0	4,2	25,2
2	R22-4	Izoliacijos mineralinės vatos dirbiniais ardymas k8=1.17	m2	6,0	10,3	61,8
3	N20-168	Esamo ortakio demontavimas k1=0.50,k3=0.000,k8=1.01	m2	7,0	8,3	58,1
4	N20-168	Esamo ortakio užaklinimas k8=1.01	m2	1,5	22,8	34,2
5	88001021	Aklė d800	vnt	2,0	80,2	160,4
6	N26P-0201	Esamų ortakio izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,05	3184,3	159,22
7	N20-444	Ortakiai iš viniplasto, kurių D iki 500mm, arba perimetras iki 1800mm k8=1.01	m2	3,2	20,9	66,88
8	260181	Ortakiai	m	2,0	214,9	429,8
9	N26P-0201	Esamų ortakio izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,044	3400,5	149,62
10	N10-10	Sienų apkalimas juoda skarda ant veltinio	m2	6,0	19,5	117,0
Skyriuje 1						1262,22
Žiniaraštyje 2						1262,22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						265,07
Iš viso žiniaraštyje 2						1527,29

Sudarė

/Pavardė/

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statins 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai. Vėdinimo darbai. PRIEDAS Nr.4

2024.01.08		Suma žiniaraščiui			5434.23 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vėdinimas						
1	88001023.1	PVC ortakiai d100	m	57,0	56,9	3243,3
2	N20-440	Ortakiai iš viniplasto, kurių D iki 160mm, arba perimetras iki 540mm k8=1.01	m2	17,9	52,0	930,8
3	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2,0	16,5	33,0
4	260188	Atbuliniai vožtuvai d100	vnt	2,0	142,0	284,0
Skyriuje 1						4491,1
Žiniaraštyje 1						4491,1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						943,13
Iš viso žiniaraštyje 1						5434,23

Sudarė: _____
/Pavardė/

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 8 Papildomi darbai. Priešgaisrinio vandentiekio darbai. PRIEDAS Nr.5

2024.01.10		Suma žiniaraščiui		2355.87 EUR		
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 Priešgaisrinis vandentiekis						
1	N16-112-1	Plieniniai vandentiekio vamzdžiai, kompl. su srieginėmis fasoninėmis dalimis. DN65mm	m	30,0	64,9	1947,0
		Skyriuje 8				1947,0
		Žiniaraštyje 8				1947,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				408,87
		Iš viso žiniaraštyje 8				2355,87

Sudarė

/Pavardė

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MEN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statins 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 7 Papildomi darbai. EXIT šviestuvo montavimas. PRIEDAS Nr.6

2024.01.10		Suma žiniaraščiui		229,66 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N21P-0117	PE vamzdžio tvirtinimas ir montavimas	100m	0,1	259,8293	25,98
2	N21-23	Kabelio tiesimas PE vamzdyje, kai kabelio masė iki 1kg/m	100m	0,1	286,9052	28,69
3	N21-229	Vidaus šviestuvų montavimas	100vnt	0,01	3262,8237	32,63
Skyriuje 1						87,3
2 Medžiagos						
1	88004002	El. kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm2 Cca	m	10,0	1,3754	13,75
2	490030.1	Vamzdis PE, d20mm	m	10,0	1,3395	13,4
3	88005008	Šviesinis evakuacinis šviestuvas su 6,6W LED šviesos šaltiniu, keičiamomis piktogramomis, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65	vnt	1,0	75,3482	75,35
Skyriuje 2						102,5
Žiniaraštyje 7						189,8
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						39,86
Iš viso žiniaraštyje 7						229,66

Sudarė _____
/Pavardė/

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 5 Papildomi darbai.Suspausto oro darbai. PRIEDAS Nr.7

2024.01.09		Suma žiniaraščiui		3614.91 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Monatavimo darbai ir medžiagos						
1 N16-114		Suspausto oro vamzdžių tiesimas iš polietileningių m vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)		65,0	26,932	1750,58
2 88001001		Fasoninės dalys	kompl.	1,0	206,9242	206,92
3 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	14,0966	28,19
4 N16P-0201		Suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių m tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo 8 mm) k1=1.35		25,0	16,4014	410,04
5 88001002		Tvirtinimai	kompl.	1,0	193,9915	193,99
6 N16P-1402		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietai užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono sienose ir pertvarose)	vnt.	1,0	67,4628	67,46
7 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1,0	109,0358	109,04
8 N16-118		Suspausto oro vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	0,9	245,9033	221,31
Skyriuje 1						2987,53
Žiniaraštyje 5						2987,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						627,38
Iš viso žiniaraštyje 5						3614,91

Sudarė:

/Pavarde/

UAB"IVRO"

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 8 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Žiniaraštis 6 Nevykdomi darbai. Statinio konstrukcijų darbai

2024.01.09

Suma žiniaraščiui -4835.50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kanalai grindys						
1 N6-14		Grindų armavimas, betonavimas k8=1.03,k9=1.15	m3	7,32	545,94	-3996,28
		Skyriuje 1				-3996,28
		Žiniaraštyje 6				-3996,28
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-839,22
		Iš viso žiniaraštyje 6				-4835,5

Sudarė:

/Pavardė/

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

ĮGALIOJIMAS

2024.01.08 Nr. IVRO 24/01-08-01

Klaipėda

UAB „Ivro“ (toliau – Bendrovė), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti Bendrovė, kurios registruota buveinė Turgaus a. 2, Klaipėda, Lietuvos Respublika, kurios juridinio asmens kodas [redacted] atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal bendrovės įstatus, įgalioja, *komercijos direktorių* [redacted] gimimo data [redacted] gyvenantį [redacted] Klaipėdoje, Lietuvoje (toliau vadinamą – Atstovu), atlikti šiuos veiksmus:

Bendrovės vardu tvirtinti dokumentacijos kopijas, atstovauti, atsiimti korespondenciją, tvarkyti ir tvirtinti dokumentaciją, pasirašyti sutartis bei atlikti kitus būtinus veiksmus, reikalingus aukščiau paminėtų veiksmų atlikimui

Šis įgaliojimas galios iki 2024-12-31. Šis įgaliojimas buvo tinkamai pasirašytas aukščiau įgaliojime nurodytą dieną.

UAB „Ivro“

A.V.

