

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2023-09-

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 1

2023 m. rugsėjo d.
Gargždai

Rangos darbų sutartis 2023-03-17 Nr. AS-577

Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono Gargždų miesto Gedimino g., Palangos g., Saulažolių g., Vytenio g., Gargždupio g., Žibučių g. gatvių kapitalinis remontas

Komisija, sudaryta iš:

Algirdo Ronkaus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresniojo patarėjo;
Editos Zaveckienės – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausios specialistės,
Rytauto Jakulio – MB „LEO.V“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo,
Nerijaus Jakulio – UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ projekto vykdymo priežiūros vadovo,
Tomo Kimbirausko – UAB „VVARFF“ kelių tiesimo padalinio vadovo,
Vyganto Narkaus – UAB „VVARFF“ statinio statybos darbų vadovo,

Įvertinusi 2023 m. birželio 29 d. protokolą Nr. ST3-3, 2023 m. liepos 31 d. protokolą Nr. ST3-6 (protokolai pridedami), rangovo 2023-08-03 raštą Nr. 149-4-45 „Dėl nenumatytų-papildomų darbų Saulažolių g. (sut. Nr. AS-577)“ bei apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus bei pateiktus dokumentus nustatė, kad:

1. Saulažolių g., pagal projektą pradėjus kloti paviršinių nuotekų šalinimo tinklus (DN250-315 mm PVC vamzdžiai), buvo atkasti esami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (toliau – nuotekų tinklai), kurių parametrai tokie: DN400 mm g/b vamzdžiai, kurių ilgis $L = 230$ m, ir 5 vnt. g/b d1000 mm šuliniai hvid = 2,5 m (fotofiksacija pridedama). Senieji nuotekų tinklai projekto dokumentacijoje nebuvo įvertinti, todėl UAB „VVARFF“ neturėjo galimybės įsivertinti jų išardymo, išvežimo ir gyventojų įvadų pajungimo į naują nuotekų tinklą kaštų pirkimo metu (konkurso metu neatliekami požeminių komunikacijų tyrimai, nedaromos topografinės nuotraukos, nėra nustatoma esamų tinklų būklė ir t.t. Visa tai yra techninio darbo projekto apimtyje ir privalo būti nurodyta TS ir darbų kiekių žiniaraščiuose). Esamus nuotekų tinklus būtina išardyti, norint pakloti naujus pagal projektą. Gyventojai paviršinių nuotekų įvadus yra pasijungę į esamus šulinius. Paklojus naująją trasą pagal projektą, žmonių pasijungimai lieka žemiau naujos trasos, taip palikdami gyventojų vamzdžius skęsti vandenyje bei apsemti rūsius. Būtina suprojektuoti naujus įvadus ir juos pajungti į naujai suprojektuotą lietaus tinklų liniją.

2. Gedimino g., Palangos g. Vytenio g., Saulažolių g., Gargždupio g. ir Žibučių gatvių rekonstravimo metu numatyta senuosius šviestuvus (su atramomis) pakeisti naujais, tačiau gatvių apšvietimo modernizavimo Klaipėdos rajone metu, šiose gatvėse dalis šviestuvų jau buvo pakeisti naujais (atramos liko senosios). Rekonstravimo metu būtina įrengti projekte numatytas atramas,

nekeičiant naujų, modernizavimo metu pakeistų šviestuvų. Trūkstami šviestuvai įrengiami pagal projektą. Žemiau pateikta suvestinė, kiek yra senų šviestuvų ir kiek reikės įrengti trūkstamų šviestuvų (lentelė Nr. 1):

		Gatvių apšvietimas (pagal TDP)	Pakeista modernizacijos metu	Perėjų apšvietimas (pagal TDP)	UAB „VVARFF“ pirkti turėtų	Šviestuvų modeliai kurie sumontuoti gatvėse ir tokius pat reikės dėti mums
I	Gedimino g.	12	8	6	4	Thorn IP 36L35-740 NR C2
II	Vytienio g.	24	13	4	11	Thorn IP 36L35-740 NR C2
III	Palangos g.	14	8		6	Thorn IP 12L50-740 ENR C2
I						
V	Saulažolių g.	12	10		2	Thorn IP 24L50-740 WR C2
V	Gargždų g.	14	4	2	10	Thorn IP 24L70-740 SR C2
V						
I	Žibučių g.	7	6		1	Thorn IP 24L50-740 RWT C2

Komisija, išnagrinėjusi surinktą informaciją siūlo:

1. Vadovaujantis sutarties Nr. AS-577 XV skyriaus „Pakeitimai“ nuostatomis bei kitais pateiktais dokumentais, pritarti papildomiems ir nevykdomiems darbams ir jų kiekiams;
2. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti TDP A laidą, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus;
3. Dėl sutarties pakeitimo kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją.

PAPILDOMI (NENUMATYTI) DARBAI (SAULAŽOLIŲ G.):

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Esamų lietaus tinklų demontavimas						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t.m3	0,542	2335,33	1265,75
2	N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t.m3	0,575	565,44	325,13
3	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	575	2,75	1581,25
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunat ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	71,81	16,10	1156,14
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	t	71,81	7,07	507,70
6	N23-22	Gelžbetoninių beslėgių įmovinių vamzdžių * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000, k9=1.15	m	230	14,31	3291,30

8	MN3-115	Kontrolinio šulinio KŠ-10 gyvenvietėje įrengimas *DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000, k9=1.15	vnt.	5	316,60	1583,00
9	MN3-117	Įrengiant kontrolinį šulinį KŠ-10 gyvenvietėje, kai h=2,5 m prie normų MN3-115 pridėti: *DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1k2=0.50, k3=0.000	vnt.	5	42,69	213,45
Skyriuje 1						9923,72
2 PVC vamzdžių montavimas į esamus šulinius						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t.m3	0,014	2335,33	32,69
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas	m3	1	43,61	43,61
3	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	2,04	26,84	54,75
4	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	11,0	2,75	30,25
5	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	10	284,07	2840,70
6	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	2	284,07	568,14
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,17	101,68	17,29
9	N23-150	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių montavimas	100m	0,15	1770,19	265,53
9	N23-151	160 mm skersmens plastikinių vamzdžių montavimas	100m	0,05	3528,53	176,43
Skyriuje 3						4029,39
Viso PAPILDOMI DARBAI Eur be PVM						13953,11

NEVYKDOMI DARBAI:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Gedimino gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-8	150,27	-1202,16

1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Gargždų gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-4	150,27	-601,08
1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Palangos gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-8	150,27	-1202,16
1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Saulažolių gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-10	150,27	-1502,70
1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Žibučių gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-6	150,27	-901,62
1		Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Vytenio gatvė				
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5 W LED šviestuvai	kompl.	-13	150,27	-1953,51
Viso NEVYKDOMI DARBAI Eur be PVM						-7363,23

Nevykdomų darbų vertė iš viso: - 7363,23 Eur (be PVM)

Nevykdomų darbų vertė iš viso: - 8909,51 Eur (su PVM)

Papildomų (nenumatytų) darbų vertė iš viso: 13953,11 Eur (be PVM)

Papildomų (nenumatytų) darbų vertė iš viso: 16883,26 Eur (su PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 6589,88 Eur (be PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 7973,75 Eur (su PVM)

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacijos;
2. 2023-08-03 raštą Nr. 149-4-45 „Dėl nenumatytų-papildomų darbų Saulažolių g. (sut. Nr. AS-577)“;
3. 2023-07-31 pasitarimo protokolas Nr. ST3-6;
4. 2023-06-29 pasitarimo protokolas Nr. ST3-3;
5. Papildomų (nenumatytų) darbų lokalinės sąmatos;
6. Išplėstinė papildomų (nenumatytų) darbų lokalinė sąmata;
7. Nevykdomų darbų sąmatos.







KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASITARIMO PROTOKOLAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, GARGŽDŲ MIESTO, GEDIMINO G. (KL8051), PALANGOS G. (KL8052), SAULAŽOLIŲ G. (KL8053), VYTENIO G. (KL8054), GARGŽDUPIO G. (KL8055) IR ŽIBUČIŲ G. (KL8056) APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO DARBŲ METU)

Pasitarimas vyko 2023-06-09

Pasitarimo pradžia – 9:30 val., pabaiga – 10:00 val.

Pasitarimo pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. patarėjas Algirdas Ronkus.

Pasitarimo sekretorė – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zaveckienė.

Pasitarime dalyvavo: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vicemerė Jolanta Kitra, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Aurelija Vaitkė, UAB „VVARFF“ Statybos direktorius Vygantas Narkus, MB „Leo. V“ statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

1. SVARSTYTA. Projekto „apšvietimo tinklų priderinimas prie modernizavimo metu pakeistų šviestuvų.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad UAB „VVARFF“ vykdo rangos darbus pagal 2023 m. kovo 17 d. sutartį Nr. AS-577 „Klaipėdos rajono Gargždų miesto Gedimino g., Palangos g., Saulažolių g., Vytenio g., Gargždupio g. Žibučių g. kapitalinis remontas“.

A. Ronkus informavo, kad vykdant apšvietimo modernizaciją Klaipėdos rajone, Gedimino g., Palangos g. Vytenio g., Saulažolių g., Gargždupio g. ir Žibučių gatvėje senieji šviestuvai buvo pakeisti naujais. Gatvių rekonstrukcijos metu numatyta keisti tiek atramas, tiek šviestuvus. Tačiau modernizacijos metu įrengtų šviestuvų negalima nuimti. Klausimas rangovui UAB „VVARFF“, ar jie sutinka numatytus projekte šviestuvus pakeisti į tokius pat, kokie jau yra sumontuoti.

V. Narkus atsakė, kad jam prieš susitikimą buvo pateiktos jau sumontuotų šviestuvų deklaracijos ir techninės specifikacijos. Todėl jei sutinka projekto vykdymo priežiūra ir statybos techninės priežiūros vadovas, šviestuvus galime keisti.

Statybos techninė priežiūra atsakė, kad jei projekto vykdymo priežiūra suderins tokius sprendinius, jie taip pat neprieštaraus.

E. Zaveckienė informavo, kad susitikime projekto vykdymo priežiūros vadovas Nerjus Jakulis negalėjo dalyvauti ir pažadėjo perduoti jam informaciją bei suderinti protokolo sprendinius, jei jis sutiks su juo.

A. Ronkus paklausė, ar rangovas galės jau sumontuotus šviestuvus nuimti ir permontuoti ant naujų atramų.

V. Narkus atsakė, kad padarys tai. Tik klausimas dėl Nema jungties. Projekte šviestuvai numatyti su Nema jungtimi. Kokie šviestuvai sumontuoti modernizacijos metu?

A. Vaitkė atsakė, kad modernizacijos metu įrengti šviestuvai be Nema jungties.

A. Ronkus paklausė, kiek šviestuvų dar reikėtų pakeisti.

V. Narkus atsakė, kad iš 83 numatytų pakeisti rekonstravimo projekte, jau pakeisti 52 šviestuvai.

E. Zaveckienė pateikė lentelę:

		Gatvių apšvietimas (pagal TDP)	Pakeista modernizacijos metu
I	Gedimino g.	12	8
II	Vytenio g.	24	13
III	Palangos g.	14	11
IV	Saulažolių g.	12	10
V	Gargždų g.	14	4
VI	Žibučių g.	7	6
Viso		83	52

A. Ronkus pasakė, kad dar neįrengti šviestuvai taip pat turėtų būti be Nema jungties. Liko sumontuoti tik 31 šviestuvą.

A. Vaitkė paklausė, ar užteks galios numatytam gatvių apšvietimui, nes atsiranda daugiau šviestuvų. Ar projekte tai įvertinta? Ar pajungimas nuo esamo taško, ar naujai daromas?

V. Narkus pasakė, kad galios pakaks, nes projekte yra numatyta sumontuoti didesnės galios šviestuvus.

NUSPRESTA:

1. Perduoti projekto priežiūros vadovui reikalingą informaciją apie šviestuvų modernizaciją, kad jis galėtų priimti sprendimą dėl projekto sprendinių keitimo.
2. Protokolo sprendimą derinti su projekto priežiūros vadovu Nerijumi Jakuliu.
3. Suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu, šviestuvai gali būti pakeisti (šviestuvų techninė specifikacija pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Modernizacijos metu sumontuotų šviestuvų techninės specifikacijos.

Posėdžio pirmininkas

Algirdas Ronkus

Posėdžio sekretorė

Edita Zaveckienė

EU-KONFORMITATSERKLÄRUNG ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

DEKLARACIJA UE DE CON FORM ITÉ

Datum, Data, *Data*:

06.10.2021

Wir, mes, *nous*:

Thorn Lighting Limited

Durhamgate Spennymoor Co Durham DL16 6HL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas

déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit

Bezeichnung, Pavadinimas, *Modele*:

ISARO PRO

Bemerkung, Pastaba, *Remarques*:

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Su kuria susijusi ši deklaracija, atitinka šias direktyvas ir standartus:

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux directives et aux normes:

Direktyva 2014/35/ES Žemos įtampos direktyva	En 60598-1:2015 +A11:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2015 En 62493:2015
Direktyva 2014/30/ES Elektromagnetinis suderinamumas	En 55015:2019 +A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
Direktyva 2009/125/EB Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems produktams	Reg. (ES) 2019/2020
Direktyva 2011/65/ES Pavojingų medžiagų (RoHS) apribojimas	

Name, Position und autorisierte Unterschrift

Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas

Nom, position et signature de la personne autorisée



Leo Luppi

Kokybės viceprezidentas

UKCA ATITIKTIES DEKLARACIJA

Data:

2021 10 06

THORN

Mes:

Thorn Lighting Limited
Durhamgate Spennymoor
Co Durham DL16 6HL UK

visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas

Vardas, pavadinimas.


ISARO PRO

Pastaba:

Su kuriais susijusi ši deklaracija, atitinka šiuos reglamentus ir standartus:

JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2016 Nr. 1101 Elektros įrangos (saugos) taisyklės 2016 m.	En 60598-1:2015+A1:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2015 En 62493:2015
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2016 Nr. 1091 Elektromagnetinio suderinamumo taisyklės 2016 m	En 55015:2019+A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2010 Nr. 2617 Su energija susijusių produktų ekologinis ženklas 2010 m.	JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2021 Nr. 1095
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2012 Nr. 3032 Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninės įrangos reglamentuose apribojimas 2012 m.	

Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas


Leo Luppi

Kokybės viceprezidentas

**EU-KONFORMITATSERKLÄRUNG
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA**

THORN

DEKLARACIJA UE DE CONFORMITÉ

Datum, Data, *Data*:

06.10.2021

Wir, mes, *nous*:

Thorn Lighting Limited

Durhamgate Spennymoor Co Durham DL16 6HL UK
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas
déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit

Bezeichnung, Pavadinimas, *Modele*:

THOR S

Bemerkung, Pastaba, *Remarques*:

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Su kuria susijusi ši deklaracija, atitinka šias direktyvas ir standartus:

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux directives et aux normes:

Direktyva 2014/35/ES Žemos įtampos direktyva	EN 60598-1:2015+ A1:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2008 En 62493:2015
Direktyva 2014/30/ES Elektromagnetinis suderinamumas	En 55015:2019+A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
Direktyva 2009/125/EB Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems produktams	Reg. (ES) 2019/2020
Direktyva 2011/65/ES Pavojingų medžiagų (RoHS) apribojimas	

Name, Position und autorisierte Unterschrift

Įgalioto asmens Vardas, Pavardė, pareigos ir parašas *Norn, pareigos et parašas de la personne autorisée*


Leo Luppi

Kokybės viceprezidentas

UKCA ATITIKTIES DEKLARACIJA

Data:

2021 10 06

Mes:

Thorn Lighting Limited
Durhamgate Spennymoor
Co Durham DL16 6HL UK

visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas

Pavadinimas:


THOR S

Pastaba:

Su kuriais susijusi ši deklaracija, atitinka šiuos reglamentus ir standartus:

JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2016 Nr. 1101 Elektros įrangos (saugos) taisyklės 2016 m.	EN 60598-1:2015+ A1:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2008 En 62493:2015
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2016 Nr. 1091 Elektromagnetinio suderinamumo taisyklės 2016 m.	En 55015:2019 +A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2010 Nr. 2617 Su energija susijusių produktų ekologinis ženklas 2010 m.	JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2021 Nr. 1095
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2012 Nr. 3032 Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninės įrangos reglamentuose apribojimas 2012 m.	

Išgalio asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas


Leo Luppi

Kokybės viceprezidentas

EU-KONFORMITATSERKLÄRUNG ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

DEKLARACIJA UE DE CONFORMITÉ

THORN

Datum, Data, *Data*:

06.10.2021

Wir, mes, *nous*:

Thorn Lighting Limited

Durhamgate Spennymoor Co Durham DL16 6HL UK

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas

déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit

Bezeichnung, Pavadinimas, *Modele*:

Volupto

Bemerkung, Pastaba, *Remarques*:

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Su kuria susijusi ši deklaracija, atitinka šias direktyvas ir standartus:

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux directives et aux normes:

Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnis Radijo įrangos direktyva (<i>Efektyvus ir efektyvus radijo spektro naudojimas</i>)	ETSI EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
Direktyvos 2014/53/ES 3.1.a straipsnis Radijo įrangos direktyva (Saugos atitiktis, susijusi su Direktyva 2014/35/ES*) be žemesnės įtampos ribos	En 60598-1:2015 +A1:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2015 En 62493:2015 En 62471:2015
Direktyvos 2014/53/ES 3.1 straipsnis.b Radijo įrangos direktyva (EMC atitiktis, susijusi su Direktyva 2014/30/ES)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) En 55015:2019+A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
Direktyva 2009/125/EB Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems produktams	Reg. (ES) 2019/2020
Direktyva 2011/65/ES Pavojingų medžiagų (RoHS) apribojimas	

Name, Position und autorisierte Unterschrift

Įgalioto asmens Vardas, Pareigos ir parašas *Nom, pareigos ir parašas de la personne autorisée*


Leo Luppi

Kokybės viceprezidentas

UKCA ATITIKTIES DEKLARACIJA

Data:

2021 10 06

TL_CE_Volupto.pdf

CE-4275

THORN

Mes:

Thorn Lighting Limited
Durhamgate Spennymoor
Co. Durham DL16 6HL UK

visiškai atsakingai pripažįstame, kad produktas

Pavadinimas:


Volupto

Pastaba:

Su kuriais susijusi ši deklaracija, atitinka šiuos reglamentus ir standartus:

JK SI 2017 Nr. 1206 6 punktas, 2 punktas Radijo įrangos nuostatai 2017 Efektyvus ir efektyvus radijo spektro naudojimas	ETSI EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
JK SI 2017 Nr. 1206 6, 1 punktas a Radijo įrangos nuostatai 2017 m. (Saugos atitiktis, susijusi su JK SI 2016 Nr. 1101*) "Be žemesnės įtampos ribos	En 60598-1:2015+ A1:2018 En 60598-2-3:2003 +A1:2011 En 62471:2015 En 62493:2015 En 62471:2015
JK SI 2017 Nr. 1206 6, 1 punktas b Radijo įrangos nuostatai 2017 m. (EMC atitiktis, susijusi su JK SI 2016 Nr. 1091)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) En 55015:2019 +A11:2020 En 61000-3-2:2019 +A1:2021 En 61000-3-3:2013 +A1:2019 En 61547:2009
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2010 Nr. 2617 Su energija susijusių produktų ekologinis ženklas 2010 m.	JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2021 Nr. 1095
JUNGTINĖ KARALYSTĖ SI 2012 Nr. 3032 Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninės įrangos reglamentuose apribojimas 2012 m.	

Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas


Leo Luppi
Vice President Quality


Šviestuvų techninės specifikacijos

Gatvės šviestuvai Isaro Pro

Pagrindinis gatvių apšvietimo šviestuvai



1 pav. Šviestuvo nuotrauka

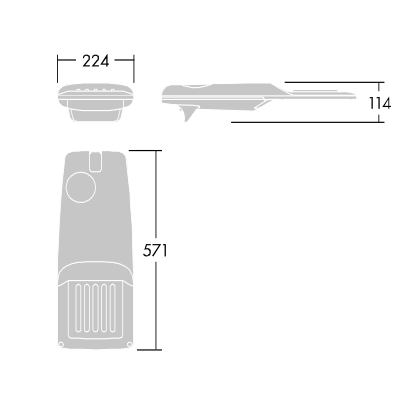


2 pav. Šviestuvo matmenys

Techninės savybės:

- Korpusas iš lieto aliuminio lydinio, milteliniu būdu dažytas šviesiai pilka spalva;
- Korpuso atsparumo korozijai klasė: $\geq C5$ ($C5$ – labai didelė korozija, pagal *ISO 9223* standartą – Metalų ir lydinių korozija);
- Difuzorius iš grūdinto, plokščio stiklo;
- Integruotas maitinimo šaltinis, DALI sąsaja;
- Integruotas, 50 %, 8 val., automatinis galios numetimo mechanizmas, aktyvuojamas 3 valandos prieš ir 5 valandos po apskaičiuoto vidurnakčio;
- Lęšinė optika;
- Tvirtinimo kronšteinas iš aliuminio, šviesiai pilka spalva;
- Nerūdijančio plieno išoriniai varžtai;
- Maitinimo įtampa $\sim 230\text{-}240\text{ V}$;
- Viršįtampių apsauga: ne mažiau 10 kV;
- Šviestuvo galingumas: (nurodyta parametrų lentelėje);
- Šviestuvo efektyvumas: (nurodyta parametrų lentelėje);
- Spalvinė temperatūra: 4 000 K;
- Spalvų atgavos indeksas: $\text{CRI} > 70$;
- Elektrosaugos klasė: II;
- Atsparumo smūgiams klasė: ne mažiau IK08;
- Apsaugos klasė: ne mažiau IP66;
- Šoninis šviestuvo plotas vėjo pasipriešinimui, m^2 : ne daugiau 0,054;
- Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampų diapazone nemažesniu $+10^\circ/-10^\circ$ montuojant ant gembės, arba 90° kampų montuojant tiesiai ant atramos.
- Tarnavimo laikas (B10): ne mažiau 100 000 h L95 prie 25°C ;
- Šviestuvo atidarymas be įrankių, automatinis galios atjungimas;
- ENEC, ENEC+, CE sertifikatas;
- Garantija: 5 metų.

Gatvės šviestuvų Isaro Pro parametrų lentelė						
<i>Eil. Nr</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Galingumas, W</i>	<i>Liumenų paketas, Lm</i>	<i>Šviestuvo efektyvumas lm/W</i>	<i>Spektras, K</i>	<i>Optika</i>
1	IP 12L105-740 NR C2	41	5369	131	4000	NR
2	IP 12L50-740 ENR C2	20	2720	136	4000	EN R
3	IP 12L50-740 NR C2	20	2720	136	4000	NR
4	IP 12L70-740 ENR C2	28	3668	131	4000	EN R
5	IP 12L70-740 RC C2	28	3696	132	4000	RC
6	IP 12L70-740 SC C2	28	3696	132	4000	SC
7	IP 12L70-740 WR C2	28	3696	132	4000	WR
1	<i>IP 24L35-740 NR C2</i>	<i>28</i>	<i>4060</i>	<i>145</i>	4000	NR
2	IP 24L35-740 SR C2	28	3892	139	4000	SR
3	IP 24L35-740 WS C2	28	3892	139	4000	WS
4	IP 24L50-740 ENR C2	38	5434	143	4000	EN R
5	IP 24L50-740 EWC C2	38	5358	141	4000	EW C
6	IP 24L50-740 EWS C2	38	5282	139	4000	EW S
7	IP 24L50-740 MR C2	38	5472	144	4000	MR
8	IP 24L50-740 NR C2	38	5586	147	4000	NR
9	IP 24L50-740 RC C2	38	5510	145	4000	RC
10	IP 24L50-740 RWT C2	38	5586	147	4000	RW T
11	IP 24L50-740 SC C2	38	5472	144	4000	SC
12	IP 24L50-740 SR C2	38	5358	141	4000	SR
13	IP 24L50-740 WR C2	38	5624	148	4000	WR
14	IP 24L50-740 WS C2	38	5358	141	4000	WS
15	IP 24L70-740 ENR C2	53	7314	138	4000	EN R
16	IP 24L70-740 MR C2	53	7314	138	4000	MR

17	IP 24L70-740 RC C2	53	7367	139	4000	RC
18	IP 24L70-740 RWT C2	53	7473	141	4000	RW T
19	IP 24L70-740 SC C2	53	7367	139	4000	SC
20	IP 24L70-740 SR C2	53	7208	136	4000	SR
21	IP 24L70-740 WR C2	53	7526	142	4000	WR
22	IP 24L70-740 WSC C2	53	7208	136	4000	WS C
23	IP 36L35-740 ES C2	40	5760	144	4000	ES
24	IP 36L35-740 EWS C2	40	5720	143	4000	EW S
25	IP 36L35-740 MR C2	40	5960	149	4000	MR
26	IP 36L35-740 NR C2	40	5920	148	4000	NR
27	IP 36L35-740 SR C2	40	5840	146	4000	SR
28	IP 36L35-740 WR C2	40	5960	149	4000	WR
29	IP 36L50-740 EWC C2	55	8195	149	4000	EW C
30	IP 36L50-740 MR C2	55	8140	148	4000	MR
31	IP 36L50-740 NR C2	55	8305	151	4000	NR
32	IP 36L50-740 WR C2	55	8195	149	4000	WR
33	IP 36L70-740 MR C2	78	10920	140	4000	MR
34	IP 36L70-740 SR C2	78	10686	137	4000	SR
35	IP 36L70-740 WR C2	78	10920	140	4000	WR

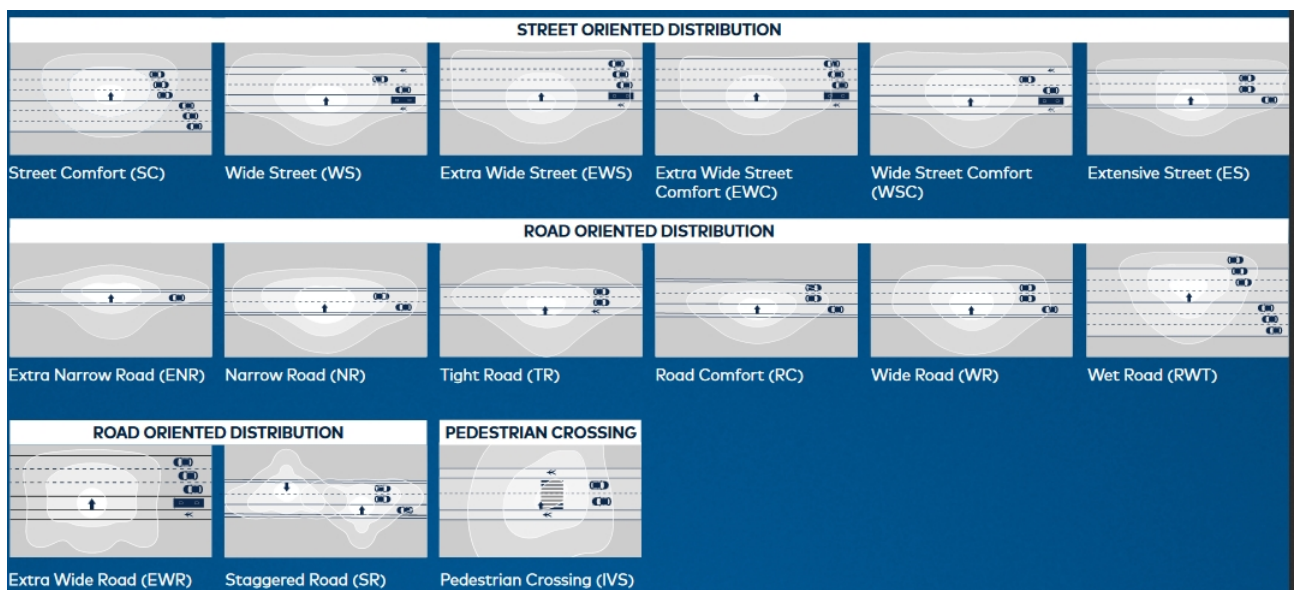

- Gamintojas **Thorn** (Jungtinė karalystė).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų miesto, Gedimino g. (KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (KL8053), Vytenio g. (KL8054), Gargždupio g. (KL8055) ir Žibučių g. (KL8056) apšvietimo tinklų įrengimo (rekonstravimo darbų metu)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-29 Nr. ST3-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-29 10:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-29 15:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	CE Deklaracijos.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Šviestuvų techninė specifikacija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230616.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-29 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASITARIMO PROTOKOLAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, GARGŽDŲ MIESTO, GEDIMINO G. (KL8051), PALANGOS G. (KL8052), SAULAŽOLIŲ G. (KL8053), VYTENIO G. (KL8054), GARGŽDUPIO G. (KL8055) IR ŽIBUČIŲ G. (KL8056) REKONSTRAVIMO DARBŲ EIGOS

Pasitarimas vyko 2023-07-25

Pasitarimo pradžia – 9:30 val., pabaiga – 10:00 val.

Pasitarimo pirmininkė ir sekretorė – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zaveckienė.


Pasitarime dalyvavo: UAB „VVARFF“ Statybos direktorius Vygantas Narkus, UAB „VVARFF“ Kelių tiesimo padalinio vadovas Tomas Kimbirauskas, MB „Leo. V“ statybos darbų techninės priežiūros vadovas Rytautas Jakulis, UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ direktorė Sandra Volosenko, UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Mindaugas Mačikūnas.

1. SVARSTYTA. Projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų miesto, Gedimino g. (KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (KL8053), Vytenio g. (KL8054), Gargždų g. (KL8055) ir Žibučių g. (KL8056) rekonstravimas“ (toliau – Projektas) netikslumai.


KALBĖJO (pagrindinės mintys):

T. Kimbirauskas informavo, kad pateiktame Projekte Palangos g. skersinis pjūvis Nr. 1 (nuo Pk 0+00 iki Pk 3+23 (1 pav.) skiriasi nuo projektuotojo pateikto darbų vykdymo metu (2 pav.). Ar nebus taip, kad bus ir daugiau neatitikimų projekte?

1 pav.

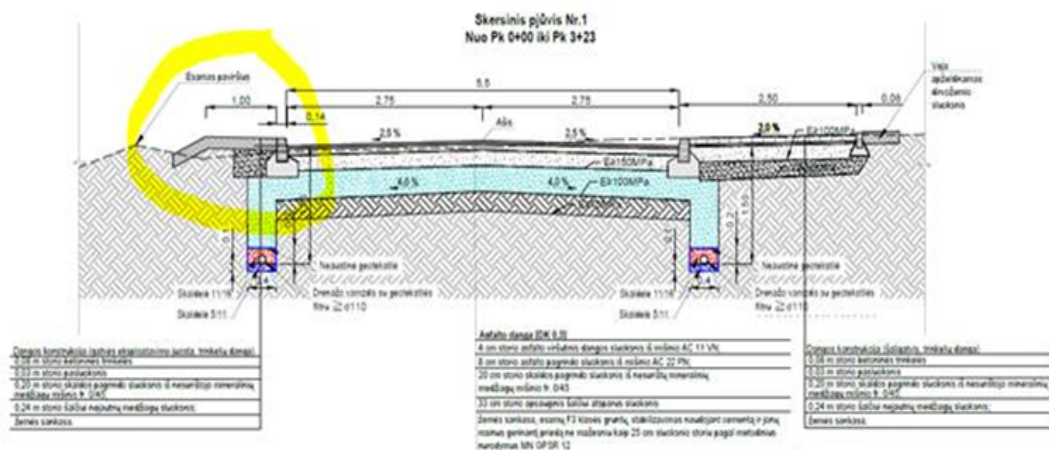

2 pav.

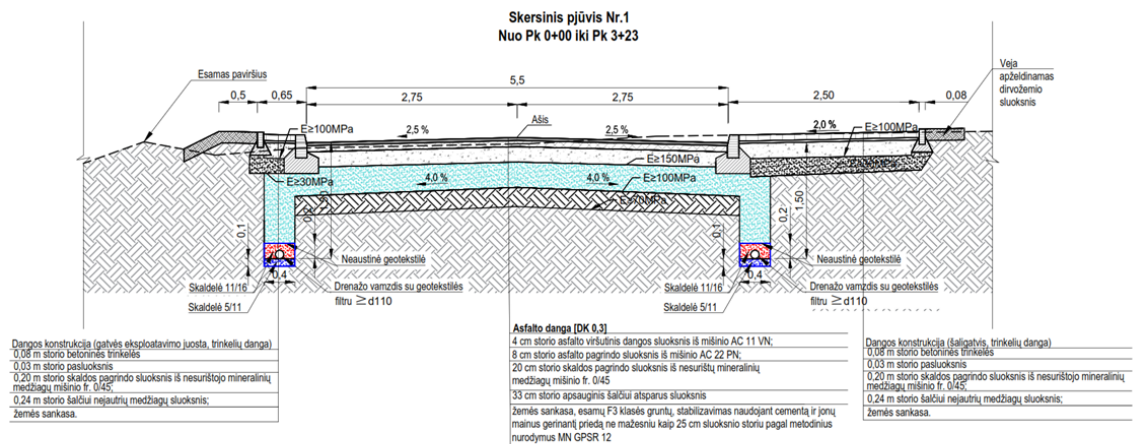

S. Volosenko pasakė, kad jei darbų kiekiai nesikeičia dėl neatitikimo, tai yra techninė klaida.

NUSPREŠTA. Kadangi projekte pateikti darbų kiekiai teisingi, priimama, kad teisingas yra 2 pav. pateiktas skersinis pjūvis (nuo Pk0+00 iki Pk 3+23).

2. SVARSTYTA. Dėl Saulažolių gatvėje klojamos naujos paviršinių nuotekų surinkimo trasos (toliau – lietaus nuotekų tinklai) įrengimo.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

T. Kimbirauskas pasakė, kad kloja lietaus nuotekų trasą Palangos gatvėje viskas buvo gerai. Saulažolių gatvėje numatyta pakloti naują lietaus nuotekų trasą vietoje senosios, tačiau projekte nenumatytas senosios demontavimas. Pakloti naują trasą neįmanoma nedemontavus senosios (vamzdžiai g/b), kuri jau pradėta demontuoti (3 pav.). Vamzdžių demontavimas ir išvežimas būtų papildomi darbai.

3 pav.



E. Zaveckienė pasakė, kad senosios trasos, kol nepriimtas sprendimas ją demontuoti, negalima demontuoti, nes į ją yra pasijungę gatvės gyventojai. Klausimas, kodėl nenumatytas esamos trasos demontavimas.

S. Volosenko pasakė, kad topografijoje mato, kad viena trasa yra šalia, o kita toje pačioje vietoje keičiama ir reikia šitą klausimą su VN projekto dalies vadovu (toliau – PDV) aptarti. Atsakymas bus išsiųstas visiems dalyviams el. paštu.

T. Kimbirauskas pasakė, kad pagal Projektą naujoji trasa eina su nuolydžiu, kaip ir priklauso, o senoji trasa suformuota praktiškai su nuliniu nuolydžiu. Šuliniai, į kuriuos pasijungę gatvės gyventojai, taip pat. Paklojus naująją trasą pagal Projektą, žmonių pasijungimai lieka žemiau naujos trasos. Projekte taip pat nėra įvertintai ir gyventojų pasijungimai į naujus šulinius.

S. Volosenko pasakė, kad dalis gyventojų pasijungimų į šulinius yra nelegalūs, nes topografijoje jų nėra. Viešinimo metu kai kurie gyventojai bandė sakyti, kad nauja trasas sugriauš jų infrastruktūra. Buvo prašoma pateikti dokumentus patvirtinančius legalumą. Klausimas bus aptartas su PDV ir atsakymas išsiųstas el. paštu.

T. Kimbirauskas paklausė, kiek galima stumti lietaus surinkimo groteles į vieną ar kitą pusę ir ar galima būtų keisti groteles, jei reikia (numatytos dviejų tipų grotelės – bordiūrinės ir apvalios).

S. Volosenko pasakė, kad dėl lietaus surinkimo grotelių paklaus PDV, tačiau mano, kad laisvės tikrai bus, nepabėgant labai į šoną. Grotelių tipą rinktis pagal situaciją, kokių reikia, tokias ir dėti.

T. Kimbirauskas priminė, kad reikės Projekto A laidos dėl pakeitimų.

S. Volosenko pasakė, kad A laidą parengs, nes to reikia ir dėl apšvietimo modernizavimo rekonstruojamose gatvėse.

V. Narkus pateikė galutinę informaciją dėl apšvietimo:

		Gatvių apšvietimas (pagal TDP)	Pakeista modernizacijos metu	Perėjų apšvietimas (pagal TDP)	UAB „VVARFF“ pirkti turėtų	Šviestuvų modeliai kurie sumontuoti gatvėse ir tokius pat reikės dėti mums
I	Gedimino g.	12	8	6	4	Thorn IP 36L35-740 NR C2
II	Vytenio g.	24	13	4	11	Thorn IP 36L35-740 NR C2
III	Palangos g.	14	8		6	Thorn IP 12L50-740 ENR C2
I	Saulažolių g.	12	10		2	Thorn IP 24L50-740 WR C2
V	Gargždų g.	14	4	2	10	Thorn IP 24L70-740 SR C2
V	Žibučių g.	7	6		1	Thorn IP 24L50-740 RWT C2

NUSPRESTA.

1. S. Volosenko visiems susitikimo dalyviams išsiųs atsakymus į pateiktus klausimus raštu. Atsakymai pridedami prie protokolo.

2. Dėl papildomų (nenumatytų darbų), kurie atsirado dėl naujos lietaus trasos klojimo senosios trasos vietoje Rangovas turi pateikti motyvuotą pasiūlymą, vadovaudamasis 2023-03-17 sutarties AS-577 XV skyriumi.

PRIDEDAMA:

1. S. Volosenko pateikti ataskymai dėl paviršinių nuotekų surinimko tinklų.

Posėdžio pirmininkė ir sekretorė

Edita Zaveckienė

Nuo: Sandra Volosenko <sandra@tipprojektai.lt>
Išsiųsta: trečiadienis 2023 m. liepa 26 09:00
Kam: Vygantas Narkus; Tomas VVARFF; mbleo.v@gmail.com; Rytautas Jakulis; antanas.proberkas@lakd.lt; Edita Zaveckienė
Kopija: Mindaugas Mačikūnas; Rokas; Nerijus Jakulis
Tema: Saulažolių kvartalas - PVP klausimai

Laba diena,

vakar susirinkimo metu buvo iškelti klausimai dėl Saulažolių g. LVN dalies sprendinių. Siunčiu atsakymus, jei kyla klausimų dėl LVN, tai galite bendrauti tiesiai su PDV – Roku Masevičiumi, prisegu jį prie el. laiško. Bent to prašyčiau, mano atostogų metu, kad klausimai būtų sprendžiami.

1. Dėl suprojektuotos LVN trasos virš esamos trasos.
Kiekių ardymo nėra, bet projektavimo metu ir buvo daryta taip, kad daroma esamo vietoje, kad atsirastų nauja trasa sujungianti pirminį ir galinį šulinius. Jei pradžios ir galo gyliai sueina, nuolydis tampa norminis, galima projektuojamą trasą paglinti ir kilti esamos trasos vietoje. Projektavimo metu, nebuvo esamos trasos altitudžių, todėl gylis esamo ir projektuojamo nesutampa.
Ar galėtumėte pamatuoti esamų šulinių gylius, kad Rokas įvertintų pagilinimą projektuojamos į esamos vietą? Tokiu atveju, ir gyventojų sklypų pasijungimai likti galėtų.
2. Esant poreikiui, dėl esamų inžinerinių tinklų faktinės vietos ir neatitikimo su topografinė nuotrauka, šulinius stumdyti galima. Pastumdymas neturėtų labai stipriai nusistumti nuo žemiausių vietų.
3. Jei pastūmus šulinius keičiasi grotelės iš bordiūrinių į apvalias, arba atvirkščiai, keitimas galimas pagal situaciją, kurioje vietoje atsiduria pastumtas šulinys.

Pagarbiai

Sandra Volosenko

Direktorė



UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Savanorių pr. 187, III a.
LT-50177 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 643 49378
El. p. sandra@tipprojektai.lt

Šį elektroninį dokumentą gavote iš UAB „Transporto infrastruktūros projektai“. Šiame elektroniniame dokumente ir jo prieduose esanti informacija yra skirta tik siuntėjo numatytam gavėjui. Visa ši Jūsų gauta informacija siuntėjo gali būti laikoma konfidencialia ar sudarančia komercinę ar gamybinę paslaptį. Jei Jūs šį elektroninį dokumentą gavote atsitiktinai, malonėkite jį pašalinti iš bet kokių Jūsų žinioje esančių skaitmeninės informacijos laikmenų ir apie tai informuoti siuntėją. Šiuo taip pat Jus informuojame, kad bet koks kitoks šios Jūsų gautos informacijos platinimas ar naudojimas gali būti neteisėtas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų miesto, Gedimino g. (KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (KL8053), Vytenio g. (KL8054), Gargždžio g. (KL8055) ir Žibučių g. (KL8056) rekonstravimo darbų eigos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-31 Nr. ST3-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-31 17:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PVP komentaras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-07 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2346 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas**Statinsys 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždų, Žibučių gatvių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Saulažolių gatvė (KL8052). Papildomi/nenumatyti darbai Nr.1**

2023.09.08

Suma žiniaraščiui 10192.31 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Esamų lietaus tinklų demontavimas						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,542	2335,33	1265,75
2	N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0,575	565,44	325,13
3	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	575,00	2,75	1581,25
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	71,81	16,10	1156,14
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	t	71,81	7,07	507,70
Skyriuje 1						4835,97
2 PVC vamzdžių montavimas į esamus šulinius						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,014	2335,33	32,69
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas	m3	1,00	43,61	43,61
3	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	2,04	26,84	54,75
4	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	11,00	2,75	30,25
5	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt	10,00	284,07	2840,70
6	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt	2,00	284,07	568,14
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,17	101,68	17,29
Skyriuje 2						3587,43
Žiniaraštyje 1						8423,40
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1768,91
Iš viso žiniaraštyje 1						10192,31

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2346 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas**Statinsys 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždų, Žibučių gatvių rekonstravimas****Žiniaraštis 7 Saulažolių gatvė (KL8052). Papildomi/nenumatyti darbai Nr.1.1**

2023.09.08

Suma žiniaraščiui 6690.95 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi/nenumatyti darbai Nr.1.1

1 N23-22		Gelžbetoninių beslėgių įmovinių vamzdžių paklojimas * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m	230,00	14,31	3291,30
2 MN3-115		Kontrolinio šulinio KŠ-10 gyvenvietėje įrengimas * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt	5,00	316,60	1583,00
3 MN3-117		Įrengiant kontrolinį šulinį KŠ-10 gyvenvietėje, kai h=2.5 m prie normų MN3-115 pridėti: * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt	5,00	42,69	213,45
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,15	1770,19	265,53
5 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,05	3528,53	176,43
Skyriuje 1						5529,71
Žiniaraštyje 7						5529,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1161,24
Iš viso žiniaraštyje 7						6690,95

Sudarė : *Sąmatininkas Mindaugas Švažas*

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2346 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas**Statinsys 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas****Žiniaraštis 7 Saulažolių gatvė (KL8052). Papildomi/nenumatyti darbai Nr.1.1**

2023.09.08

Suma žiniaraščiui

6690.95 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Papildomi/nenumatyti darbai Nr.1.1					
1 N23-22		m		230,0		
	Gelžbetoninių beslėgių įmovinių vamzdžių paklojimas * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	1,18	135,7	10,43	1415,35
260245	Gelžbetonio įmoviniai vamzdžiai	m	0,995			
534010	Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.)	m3	0,0038			
570885	Vanduo	m3	0,302			
600026	Sandūrų užtaisymo skiedinys	m3	0,0004			
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg	0,343			
489022	Kranas-vamzdžių klotuvas traktoriaus bazėje	maš.val	0,08	9,2	64,5	593,4
489034	Kranas	maš.val	0,029918	3,44057	39,0	134,18
N23-22	Darbo užm. 1415.35 Medžiagos		Mechanizmai 727.58		Iš viso 2142.93	
2 MN3-115		vnt		5,0		
	Kontrolinio šulinio KŠ-10 gyvenvietėje įrengimas * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	29,67	74,175	10,43	773,65
2093006	Plienas armatūrinis, karštai valcuotas, lygus, klasė A-I, d16mm	t	0,004		1285,58	
2571022	Ruberoidas	m2	1,45		0,83	
2571670	Liukas ketinis sunkus stebėjimo šuliniams	vnt	1,0		182,32	
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	0,13			
2900041	Cementinis skiedinys	m3	0,06		103,75	
2900047	Karjerinis žvyras	m3	0,25		14,23	
2900103	Lentų atraižos	m3	0,04		81,16	
G-15009	Žiedas KS10.6	vnt	1,0		212,75	
G-15010	Žiedas KS10.9	vnt	1,0		319,13	
G-9084	PLOKŠTĖS-PERDENG.ŠULIN KCP1-10-1	vnt	1,0		132,97	
G-9107	PLOKŠTĖS-DUGNAI/ŠULIN KCD-10	vnt	1,0		239,34	
2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	3,0	7,5	16,46	123,45
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0,95	2,375	27,49	65,29
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0,38	0,95	27,0	25,65
MN3-115	Darbo užm. 773.65 Medžiagos		Mechanizmai 214.39		Iš viso 988.04	
3 MN3-117		vnt		5,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Įrengiant kontrolinį šulinį KŠ-10 gyvenvietėje, kai h=2.5 m prie normų MN3-115 pridėti: * DEMONTAVIMAS (įkainis pritaikytas) k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.13	žm.val.	2,82	7,05	11,09	78,18
2093026	Plienas armatūrinis, periodinio profilio, klasė A-2, d 20mm	t	0,002		1285,58	
G-15006	Žiedas KS7.3	vnt	1,0		66,48	
G-15010	Žiedas KS10.9	vnt	1,0		319,13	
2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0,14	0,35	21,03	7,36
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0,75	1,875	27,49	51,54
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0,12	0,3	27,0	8,1
MN3-117	Darbo užm. 78.18 Medžiagos			Mechanizmai 67.00	Iš viso 145.18	
4 N23-150		100m		0,15		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9,8	1,47	10,3	15,14
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m	101,0	15,15		
1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	101,0	15,15	13,41	203,16
N23-150	Darbo užm. 15.14 Medžiagos 203.16			Mechanizmai	Iš viso 218.30	
5 N23-151		100m		0,05		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,2	0,56	10,3	5,77
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m	101,0	5,05		
1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	101,0	5,05	27,97	141,25
N23-151	Darbo užm. 5.77 Medžiagos 141.25			Mechanizmai	Iš viso 147.02	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 2288.09 Medžiagos 344.41			Mechanizmai 1008.97	Iš viso 3641.47	
Viso žiniaraštyje	7 Darbo užm. 2288.09 Medžiagos 344.41			Mechanizmai 1008.97	Iš viso 3641.47	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			10,33		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				30,27	
	Sezoniniai darbai 15.00% (2288.09)		343,21			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2288.09+343.21)		210,50			
	Viso:		2841,80	354,74	1039,24	4235,78
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2288.09+343.21+210.50)		50,87			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2892,67	354,74	1039,24	4286,65
	Statyb vietės išlaidos 9.00%					385,80
	Iš viso tiesioginės išlaidos					4672,45
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(2288.09+343.21+210.50)					593,94
	Pelnas 5.00%(4672.45+593.94)					263,32
	Iš viso netiesioginės išlaidos					857,26
					Bendra vertė be PVM	5529,71
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1161,24
					Bendra vertė su PVM	6690,95

Sudarė : Sqmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statiny's 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 23 Apšvietimas. Gedimino gatvė (KL8051). Nevykdomi darbai

2023.09.01				Suma žiniaraščiui		-1454.61 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai							
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvai	kompl.	-8,00	150,27	-1202,16	
		Skyriuje 1				-1202,16	
		Žiniaraštyje 23				-1202,16	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-252,45	
		Iš viso žiniaraštyje 23				-1454,61	

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statinsys 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 24 Apšvietimas. Palangos gatvė (KL8052). Nevykdomi darbai

2023.09.01				Suma žiniaraščiui		-1454.61 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai							
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvas	kompl.	-8,00	150,27	-1202,16	
		Skyriuje 1				-1202,16	
		Žiniaraštyje 24				-1202,16	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-252,45	
		Iš viso žiniaraštyje 24				-1454,61	

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statiny 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 25 Apšvietimas. Saulažolių gatvė (KL8052). Nevykdomi darbai

2023.09.01

Suma žiniaraščiui -1818.27 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai						
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvai	kompl.	- 10,00	150,27	- 1502,70
		Skyriuje 1				-1502,70
		Žiniaraštyje 25				-1502,70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-315,57
		Iš viso žiniaraštyje 25				-1818,27

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statinys 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 26 Apšvietimas. Vytenio gatvė (KL8054). Nevykdomi darbai

2023.09.01

Suma žiniaraščiui -2363.75 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai

1 890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvas	kompl.	-13,00	150,27	-1953,51
	Skyriuje 1				-1953,51
	Žiniaraštyje 26				-1953,51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-410,24
	Iš viso žiniaraštyje 26				-2363,75

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

2023 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statiny 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždų, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 27 Apšvietimas. Gargždų gatvė (KL8055). Nevykdomi darbai

2023.09.01

Suma žiniaraščiui -727.31 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai						
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvas	kompl.	-4,00	150,27	-601,08
		Skyriuje 1				-601,08
		Žiniaraštyje 27				-601,08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-126,23
		Iš viso žiniaraštyje 27				-727,31

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2300 Klaipėdos rajonas Gargždų miestas (6 gatvės)

Statiny's 1 Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio, Žibučių gatvių rekonstravimas

Žiniaraštis 28 Apšvietimas. Žibučių gatvė (KL8056). Nevykdomi darbai

2023.09.01				Suma žiniaraščiui		-1090.96 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos). Nevykdomi darbai							
1	890116	Pilnai sukomplektuotas 33,5W LED šviestuvas	kompl.	-6,00	150,27	-901,62	
		Skyriuje 1				-901,62	
		Žiniaraštyje 28				-901,62	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-189,34	
		Iš viso žiniaraštyje 28				-1090,96	

Sudarė : Sąmatininkas Mindaugas Švažas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vygantas Narkus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 1 prie Sut. Nr. AS-577 2023-03-17
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-26 Nr. A32-2605
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vygantas Narkus Statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-13 15:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-27 12:58 - 2026-08-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Kimbirauskas Kelių tiesimo padalinio vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-13 18:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-13 18:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-17 11:21 - 2025-04-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Jakulis PVP
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-21 16:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-21 16:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-06 13:51 - 2023-12-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rytautas Jakulis STPV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-25 10:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-05 17:50 - 2027-01-04 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 11:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 16:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 16:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Fotofiksacijos-Saulažolių g. Lietaus tinklų ardymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-06-29 pasitarimo protokolas Nr. ST3-3.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-07-31 pasitarimo protokolas Nr. ST3-6.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 Sąmata, papildomi Nr.1 (su konkursiniais įkainiais).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 Sąmata, papildomi Nr.1.1 (su naujais įkainiais) (su priskaitymais).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2.1 Sąmata, papildomi Nr.1.1 (su naujais įkainiais) išplėstinė.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nevykdomų darbų sąmatos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr. 149-4-45 raštas savivaldybei, dėl nenumatytų papildomų darbų Saulažolių g..adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-04 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriui
savivaldybe@klaipedos-r.lt
edita.zaveckiene@klaipedos-r.lt

2023-08-03 Nr. 149-4-45

MB „Leo. V“
Statybos darbų techninės priežiūros vadovui
mbleo.v@gmail.com

Dėl nenumatytų-papildomų darbų Saulažolių g. (sut. Nr. AS-577)

UAB „VVARFF“ (toliau – rangovas) išanalizavo techninę dokumentaciją ir vykdant darbus atsirado nenumatytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti konkursinėje projektinėje dokumentacijoje:

1. Saulažolių g. pradedant įrenginėti magistralinę lietaus tinklų liniją, DN250-315 mm PVC vamzdžius, šalia šios įrenginėjamos trasos buvo atkasta esama lietaus tinklų magistralinė linija DN400 mm g/b vamzdžiai, kurių ilgis $L = 230$ m, ir 5 vnt. g/b d1000 mm šuliniai $h_{\text{vid}} = 2,5$ m, gyventojų įvadai DN110-160 mm iš PVC – 12 vnt. Rangovas apie tai informavo statybos dalyvius ir aptarė apie susidariusią problemą susirinkimo metu (Pasitarimo protokolas reg. nr. Nr. **ST3-6** 2023-07-31). Protokole rangovas išdėstė šias problemas:

 - Nėra galimybių įrengti naują trasą šalia esamos trasos, kadangi naujoji trasa klojasi toje pačioje vietoje kaip ir senoji, todėl neišmanoma pakloti vamzdžius pagal projektą nedemontavus esamo senos linijos.
 - Pagal projektą naujoji trasa eina su nuolydžiu, kaip ir priklauso, o senoji trasa suformuota praktiškai su nuliniu nuolydžiu. Šuliniai, į kuriuos pasijungę gatvės gyventojai, taip pat. Paklojus naująją trasą pagal projektą, žmonių pasijungimai lieka žemiau naujos trasos, taip palikdami gyventojų vamzdžius skęsti vandenyje bei apsemti rūsius.
 - Projekte nėra įvertinti ir gyventojų pasijungimai į naujus šulinius.

Visapusiškam ir sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingi papildomai nenumatyti darbai. Rangovas neturėjo galimybės įsivertinti senų tinklų demontavimo ir įvadų pajungimo darbus esančius po žeme. Rangovas neturi galimybės konkurso metu atlikti įvairius požeminių komunikacijų tyrimus, užsakinėti topografines nuotraukas, nustatinėti esamų tinklų būklę, daryti videodagnostiką, matuoti gylius, ieškoti įvadų ir t.t. Visa tai yra techninio darbo projekto apimtyje ir privalo būti nurodyta TS ir darbų kiekų žiniaraščiuose. Remiantis sutarties Nr. **AS-577** (2023-03-17) punktu 15.5.12, prašome įvertinti papildomus darbus ir skirti papildomų lėšų.

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

Raštą parengė:

Vygantas Narkus
UAB „VVARFF“
Kelių tiesimo padalinys
Statybos direktorius
+370 603 28 932
vygantas@varf.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilmantas Bučius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl nenumatytų-papildomų darbų Saulažolių g. (sut. Nr. AS-577)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-03 Nr. 149-4-45
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 11:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-29 13:07 - 2024-08-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "creation/date" (įskaitant visus pasikartojimus) turi būti pasirašytas Metaduomuo "registrations/registration/date" (įskaitant visus pasikartojimus) turi būti pasirašytas Metaduomuo "registrations/registration/number" (įskaitant visus pasikartojimus) turi būti pasirašytas Ryšių aprašo (relations.xml) klaida: rinkmena "metadata/signableMetadata1.xml" turi būti pasirašyta
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-04 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
