

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje 01.2.1-LVPA-V-830-03-0007

Sutartis Nr. S-1095, 2020-10-14

Objektas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Žiniaraštis Nr. 2 – Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Data: 2021-07-27

PAKEITIMO AKTAS Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktorius pavaduotojo

M. Rikterio

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialisto

G. P. Vasilavičiaus

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos skyriaus vyr. inžinieriaus

E. Tarvydo

MB „DPKTP“ Fidic inžinieriaus

Techninės priežiūros vadovo

D. Pasvensko

UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“

Projekto vykdymo priežiūros vadovo

V. Vyšniausko

UAB „Kauno keliai“ Rangovo atstovo

statinio statybos vadovo

O. Steponavičiaus

Išnagrinėjusi objekto „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ projektinę dokumentaciją, bei vietoje apžiūrėjusi objektą,

nustatė, kad:

1. Techniniame projekte nurodyta, kad naujai klojama vandentiekio trasa turi būti sujungiama su esamu trišakiu ALK.2, tačiau vykdant darbus paaiškėjo, kad esamo trišakio vieta jau yra užimta ir pasijungti į ją nėra galimybės. UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ kreipėsi į Kauno rajono savivaldybę su prašymu, kad vandentiekio posūkyje P7 būtų pakeistas sprendinys, įrengiant trišakį. Įrengus trišakį išliks galimybė pajungti naujai projektuojamos Jėgainės gatvės vandentiekio tinklus, tai padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti tinklai, bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje.

2021 metų balandžio mėnesio 13 dieną UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštu Nr. SR-21/04-02 (priedas Nr. 2) kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administraciją prašydami pakeisti vandentiekio P7 posūkį į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti naujai projektuojamos Jėdainės g. vandentiekio tinklus.

2021 metų balandžio mėnesio 19 dieną Kauno rajono savivaldybės administracija raštu Nr. SD-1587 (priedas Nr. 3) kreipėsi į statybos dalyvius, kad būtų pakoreguotas vandentiekio tinklų projektas.

2021 metų balandžio mėnesio 29 dieną Fidic inžinierius raštu Nr. 29 (priedas Nr. 4) kreipėsi į projekto autorių UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“, kad išanalizuotų galimybę pakeisti vandentiekio sprendinius ties posūkiu P7 ir pasijungimu ALK2, bei esant galimybei pateikti šių sprendinių detalizavimą.

2021 metų gegužės mėnesio 13 dieną UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ raštu Nr. VV0512 (priedas Nr. 5) pateikė Fidic inžinieriui sprendinius, bei papildomų-nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį.

2021 metų gegužės mėnesio 25 dieną Fidic inžinierius raštu Nr. 30 (priedas Nr. 6) kreipėsi į UAB „Kauno keliai“, kad pagal projekto autoriaus sprendinius bei papildomų-nevykdomų darbų žiniaraštį pateiktų sąmatas.

2021 metų gegužės mėnesio 26 dieną UAB „Kauno keliai“ raštu Nr. 100-04 (priedas Nr. 7) pateikė Fidic inžinieriui sąmatas.

2021 metų gegužės mėnesio 27 dieną Fidic inžinierius raštu Nr. 31 (priedas Nr. 8) kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administraciją, kad remiantis Sutarties konkrečių sąlygų 13.1. punktu Užsakovas pritartų siūlomiesiems pakeitimams.

2021 metų birželio mėnesio 3 dieną Kauno rajono savivaldybės administracija raštu Nr. SD-2472 (priedas Nr. 9) pritarė siūlomiesiems pakeitimams.

2021 metų birželio mėnesio 10 dieną Fidic inžinierius raštu Nr. 32 (priedas Nr. 10) nurodė UAB „Kauno keliai“ darbus vykdyti pagal UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ raštu Nr. VV0512 pateiktus sprendinius ir paruošti reikalingus dokumentus darbų pakeitimui.

Vadovaudamasi 2020-10-14 pirkimo sutarties Nr. S-1095 konkrečių sąlygų 13.1. punktu „Papildomas darbas reiškia darbą, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį pirkimą ir į Sutartį, tačiau tapo būtinas Darbams užbaigti ir yra tiesiogiai su Darbais susijęs. Darbo atšaukimas reiškia darbą, kuris buvo įtrauktas į Sutartyje, tačiau vykdant Darbus paaiškėjo, kad toks darbas tapo nebereikalingas ir nebus įsigijamas. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.“

Komisija nutarė:

siekiant laiku bei kokybiškai atlikti darbus ir pasiekti projekto rezultatus:

Neatlikti šių darbų:

- Elektromovinė alkūnė DN200x90° – 2 vnt.;

Papildomai atlikti šiuos darbus:

- Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.) – 33 m3;
- Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15 – 1 m3;
- Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija – 1 vnt.;
- Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje) – 2 vnt.;
- Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai – 2 vnt.;
- Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose – 4 vnt.;
- Pylimų įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu – 20 m3;
- Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu – 5 m2;
- Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200 – 4 vnt.;
- Flanšinis trišakis DN200x200 – 2 vnt.;

- Flanšinė trumpa sklendė DN200 – 4 vnt.;
- Atrama iš betono C12/15 – 0,25 m³;
- G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, lataku sudarymui ir hidroizoliacija – 1 vnt.;

Pagal visą pakeitimą:

Papildomai atliekamų darbų vertė 3967,14 eurų (be PVM).

Neatliekamų darbų vertė -400,00 eurų (be PVM).






Iš viso po pakeitimo 3567,14 eurų (be PVM).

Iš viso po pakeitimo 4316,24 eurų (su PVM).

PRIDEDAMA:

1. Pakeitimo sąmata Nr. 2 (2 lapai);
2. UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštas 2021-04-13 Nr. SR-21/04-02 į Kauno rajono savivaldybės administraciją (1 lapas);
3. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas 2021-04-19 Nr. SD-1587 statybos dalyviams (1 lapas);
4. MB „DPKTP“ raštas 2021-04-29 Nr. 29 į UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ (3 lapai);
5. UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ raštas 2021-05-12 Nr. VV0512 į MB „DPKTP“ (1 lapas);
6. MB „DPKTP“ raštas 2021-05-25 Nr. 30 į UAB „Kauno keliai“ (6 lapai);
7. UAB „Kauno keliai“ raštas 2021-05-26 Nr. 100-04 į MB „DPKTP“ (3 lapai);
8. MB „DPKTP“ raštas 2021-05-27 Nr. 31 į Kauno rajono savivaldybės administraciją (19 lapų);
9. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas 2021-06-03 Nr. SD-2472 į MB „DPKTP“ (1 lapas);
10. MB „DPKTP“ raštas 2021-06-10 Nr. 32 į UAB „Kauno keliai“ (7 lapai);

Komisija:

	M. Rikteris (V. Pavardė)
	G. P. Vasilavičius (V. Pavardė)
	E. Tarvydas (V. Pavardė)
	D. Pasvenskas (V. Pavardė)
	V. Vyšniauskas (V. Pavardė)
	O. Steponavičius (V. Pavardė)

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, ne PVM mokėtojas

Rangovas: UAB „Kauno keliai“ (įmonės kodas 135640993)

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje 01.2.1-LVPA-V-830-03-0007

Statybos pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Rangos sutartis: Nr. S-1095 sudaryta 2020-10-14

Pakeitimo sąmata Nr. 2

Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
	Pagal 1 pakeitimo punktą. Vandentiekio P7 posūkio, trišakio įrengimas				
	PAPILDOMI DARBAI				
Susisiekimas 2.2.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	27	4,73	127,71
Paviršinių nuotekų tinklai 13	Smėlio pasluoksnių įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	1	10,00	10,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 6	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	vnt.	1	830,00	830,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	1	45,00	45,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt.	2	10,00	20,00
Susisiekimas 2.3.	Pylių įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu	m³	20	14,07	281,40
Susisiekimas 2.5.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu	m²	5	0,23	1,15
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	2	140,00	280,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	1	160,00	160,00
38	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	3	285,00	855,00
32	Atrama iš betono C12/15	m3	0,25	58,00	14,50

Viso papildomi darbai:					2.726,76
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektromovinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2					
PAPILDOMI DARBAI					
Susisieikimas 2.2.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	6	4,73	28,38
16	G/b surenkamas šulinys dT000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	1	320,00	320,00
9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt.	2	10,00	20,00
19	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	1	285,00	285,00
8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	1	45,00	45,00
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	2	140,00	280,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	1	160,00	160,00
Viso papildomi darbai:					1.240,38
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektromovinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal visą pakeitimą:					
Nevykdomi darbai					-400,00
Papildomi darbai					3.967,14
Iš viso Pakeitimui be PVM					3.567,14
PVM					749,1
Iš viso Pakeitimui su PVM					4.316,24

Sudarė:

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Tikrino:

Fidic inžinierius:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikteris
(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)


(data)

UAB "Kauno keliai"
Statybos vadovas
Ovidijus Steponavičius
Atestato Nr. 32018

2021-07-27

2021-07-27

2021-07-27



Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Lietuva

2021 m. balandžio 13 d.
Nr. SR-21/04-02
Kauno rajonas

Siunčiama: el. paštu, originalas paštu siunčiamas nebus

PRAŠYMAS

Šiuo metu yra rengiamas Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Jėgainės g., Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos projektas, kuriame numatomas vandentiekio įrengimas padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje bei aplinkinėse gyvenvietėse. Šiame projekte yra numatomas vandentiekio tinklų prijungimas prie PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOSPROJEKTO (I ETAPAS) vandentiekio tinklų ties p7 posūkiu. Siekiant išvengti naujai įrengtų tinklų ardymo prašome pakeisti p7 posūkį į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti kitus tinklus.

Pagarbiai

Kęstutis Banionis

Direktorius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KĘSTUTIS BANIONIS
Data: 2021-04-14 10:31:49



+370 694 48301

+370 373 99299

kestutis@ftz.lt

www.ftz.lt

Terminalo g. 3, Kauno LEZ I

504469, Kauno rajonas

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt

2021-04-19 Nr. SD-1587

kopija
UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
kestas@insip.lt

DPKTP, MB
Dariui Pasvenskui
mbdptp@gmail.com

DĖL PAPILDOMO ŠULINIO PROJEKTAVIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) 2020-10-12 sudarė statybos rangos sutartį Nr. S-1095, kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno rajono savivaldybė statybos darbai (I etapas)“ statybos darbus.

Pranešame, kad Užsakovas gavo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštą Nr. SR-21/04-02 (2021-04-13) kuriame prašoma pakeisti vandentiekio linijos posūkį p7 į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti naujai projektuojamus Jėgainės gatvės vandentiekio tinklus. Tai padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje. Šis klausimas buvo svarstomas 2021-03-25 nuotolinio pasitarimo metu (pasitarimo protokolas Nr. 3). Prašome atlikti darbo projekto pakeitimus su reikalingais derinimais ir paruošti papildomų darbų sąmatą.

PRIDEDAMA: UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ rašto Nr. SR-21/04-02 kopija, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Budžetinė įstaiga
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386



Tikime laisve
1918-04-25

MB "DPKTP"

Priedas Nr. 4

Įmonės kodas 305562793

Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r. tel. +37062090505

A.s. Nr. LT72723000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"
Misko g. 30-71, LT-44313 Kaunas
El. p. valdas@icp.lt

2021-04-29 Nr. 29

Kopija:
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriui
Savanorių per. 371, Kaunas
El. p. info@krs.lt

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
El. p. info@kaunokeliai.lt

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

MB "DPKTP" veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP“ dėl objekto „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas)) techninės priežiūros bei FIDIC Inžinieriaus paslaugų.

Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija 2021-04-19 raštu Nr. SD-1587 kreipėsi dėl vandentiekio linijos posūkio p7. Užsakovas prašo suprojektuoto posūkio p7 vietoje įrengti šulinį su trišakiu perspektyviniam vandentiekio linijos prisijungimui. Prašom išanalizuoti galimybes atlikti prašomus darbus. Esant galimybei prašomų darbų įgyvendinimui prašau pateikti sprendinį ir darbų kiekių žiniaraštį.

Rangovas negali prijungti naujai paklotos vandentiekio trasos taške ALK.2 kaip numatyta projekte nes minėtame prisijungimo taške yra prijungta kita vandentiekio trasa įgyvendinta kitu projektu. Prašau pateikti sprendinį vandentiekio trasos prijungimui taške ALK.2 kartu pateikiant ir darbų kiekių žiniaraštį.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Užsakovo 2021-04-19 raštas Nr. SD-1587

Pagarbiai

FIDIC Inžinierius

Originalas siunčiamas nebus

Darius Pasvenskas





ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt

2021-04- Nr. SD-

kopija
UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
kestas@insip.lt

DPKTP, MB
Dariui Pasvenskui
mbdpktp@gmail.com

DĖL PAPILDOMO ŠULINIO PROJEKTAVIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) 2020-10-12 sudarė statybos rangos sutartį Nr. S-1095, kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno rajono savivaldybė statybos darbai (I etapas)“ statybos darbus.

Pranešame, kad Užsakovas gavo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštą Nr. SR-21/04-02 (2021-04-13) kuriame prašoma pakeisti vandentiekio linijos posūkį p7 į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti naujai projektuojamus Jėgainės gatvės vandentiekio tinklus. Tai padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje. Šis klausimas buvo svarstomas 2021-03-25 nuotolinio pasitarimo metu (pasitarimo protokolais Nr. 3). Prašome atlikti darbo projekto pakeitimus su reikalingais derinimais ir paruošti papildomų darbų sąmatą.

PRIDEDAMA: UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ rašto Nr. SR-21/04-02 kopija, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Būdžėnė Istaiga
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386



Tikime laisvę
Laisvė tikime



KAUNO LEZ
infrastruktūra

Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Lietuva

2021 m. balandžio 13 d.
Nr. SR-21/04-02
Kauno rajonas

Siunčiama: el. paštu, originalas paštu siunčiamas nebus

PRAŠYMAS

Šiuo metu yra rengiamas Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų lėgainės g., Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos projektas, kuriame numatomas vandentiekio įrengimas padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje bei aplinkinėse gyvenvietėse. Šiame projekte yra numatomas vandentiekio tinklų prijungimas prie PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOSPROJEKTO (I ETAPAS) vandentiekio tinklų ties p7 posūkiu. Siekiant išvengti naujai įrengtų tinklų ardymo prašome pakeisti p7 posūkį į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti kitus tinklus.

Pagarbiai

Kęstutis Banionis

Direktorius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KĘSTUTIS BANIONIS
Data: 2021-04-14 10:31:49



+370 694 48301
+370 373 99290

kestutis@ftz.lt
www.ftz.lt

Terminalo g. 3, Kauno LEZ I
504469, Kauno rajonas

MB „DPKTP“
Dariui Pasvenskui
Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r.
El.p. mbdpktp@gmail.com

2021-05-12 Nr.VV0512
į 2021-04-29 Nr.29

Kopija:
UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponaviciu@kaunokeliai.lt

Siunčiama: el.paštu, originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

Kauno LEZ infrastruktūra UAB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2019-106, pagal kurią įsipareigojo atlikti „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Pk 0+74 iki Pk 10+25 Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ Projekto vykdymo priežiūrą

Atsakydami į FIDIC inžinieriaus gautą raštą Nr. 2021-04-29 Nr.29, išnagrinėjome galimybę pajungti perspektyvinį vandentiekio tinklą, įrengiant papildomą šulinį vandentiekio linijos posūkio Nr.P7 vietoje. Pateikiame darbo projekto A laidos brėžinį su papildomo šulinio Nr. V12 įrengimo sprendiniu (Priedas Nr.1).

Projektuojant vandentiekio tinklus buvo numatyta taške ALK.2 pajungti naujai projektuojamą vandentiekio trasą į esamą vandentiekio trasą, Rangovui atsikasus paaiškėjo, kad pajungti vandentiekio trasos prie esamų tinklų numatytame taške ALK.2 nėra galimybės, kadangi šiame taške jau yra pajungti kiti tinklai. Norint tinkamai išpildyti projektą reikalinga įrengti papildomą šulinį Nr.V13 su uždromąja armatūra. Už šulinio vandentiekio linija turi būti prijungiama prie esamos linijos, šalia kitu projektu įrengto trišakio (plane žym. - Triš.2). Pateikiame A laidos papildomo šulinio V13 sprendinį (Priedas Nr.2).

Pateikiamas vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.3).

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Papildomo šulinio Nr. V12 detalizacija.
2. Priedas Nr.2. Papildomo šulinio Nr. V13 detalizacija.
3. Priedas Nr.3. Vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis.

Direktorius



Valdas Vyšniauskas

Ramunė Gubenko, 867241060, el.p. ramune@rusneta.lt

MB „DPKTP“

Priedas Nr. 6

Įmonės kodas 305562793

Statybinių g. 2A, Vilnius, LT-53262 Kauno r. tel. +37062090505

A.s. Nr. L1727230000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 53340, Kaunas
El. p. info@kaungk.lt

2021-05-25 Nr. 30

Kopija:
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriui
Savanorių per. 371, Kaunas
El. p. info@kka.lt

UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
Miško g. 30-71, LT-44313 Kaunas
El. p. valdas@insep.lt

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

MB „DPKTP“ veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP“ dėl objekto „**Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas))** techninės priežiūros bei FIDIC Inžinieriaus paslaugų.

Fidie inžinierius 2021-04-29 raštu Nr. 29 kreipėsi į Projektuotoją dėl vandentiekio linijos posūkio p7 ir prisijungimo taško ALK.2.

Projektuotojas raštu Nr. VV0512 pateikė sprendinius ir darbų kiekių žiniaraštį.

Prašau pateikti samatas pagal Projektuotojo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ 2021-05-12 raštas Nr. VV0512.

Pagarbiai

FIDIC Inžinierius

Darius Pasvenskas



Originalas siunčiamas nebus

MB „DPKTP“
Dariusi Pastoriai Ltd
Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r.
El. paštas: info@dpktp.lt

2021-05-12 Nr. VV0512
į 2021-04-29 Nr. 29.

Kopija:
UAB „Kauno ūkiai“
Gydliai 1, Ieja namų ruošos
Gydliai 2, Ieja namų ruošos

Siunčiamas elektroniniu būdu, originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

Kauno EEZ infrastruktūra UAB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2019-106, pagal kurią įsipareigojo atlikti „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Pk 0+74 iki Pk 10+25 Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ Projekto vykdymo priežiūrą.

Atsakydami į FIDIC inžinieriaus gautą raštą Nr. 2021-04-29 Nr. 29, išnagrinėjome galimybę pajungti perspektyvinį vandentiekio tinklą, įrengiant papildomą šulinį vandentiekio linijos posūkio Nr. P7 vietoje. Pateikiame darbo projekto A laidos brėžinį su papildomo šulinio Nr. V12 įrengimo sprendiniu (Priedas Nr. 1).

Projektuojant vandentiekio tinklus buvo numatyta taške ALK.2 pajungti naujai projektuojamą vandentiekio trasą į esamą vandentiekio trasą. Rangovui atsikakus paaiškėjo, kad pajungti vandentiekio trasos prie esamų tinklų numatytame taške ALK.2 nėra galimybės, kadangi šiame taške jau yra pajungti kiti tinklai. Norint tinkamai išpildyti projektą reikalinga įrengti papildomą šulinį Nr. V13 su uždromąja armatūra. Už šulinio vandentiekio linija turi būti prijungiama prie esamos linijos, šalia kitu projektu įrengto trišakio (plane žym. - Triš.2). Pateikiame A laidos papildomo šulinio V13 sprendinį (Priedas Nr. 2).

Pateikiamas vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr. 3).


PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Papildomo šulinio Nr. V12 detalizacija.
2. Priedas Nr. 2. Papildomo šulinio Nr. V13 detalizacija.
3. Priedas Nr. 3. Vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis.

Direktorius



Valdas Vyšniauskas



VAMZDŽIO LATAKO DUGNO ALITUDĖ	
PROJEKTIUJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYNIJIMAS IZOLIJACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
INULIYDIS %	ILGIS (m)
ATSTUMAS (m)	
SULINKO TAŠKO KAMPU PIL POSOKIU NUMERIAI	

71.26	71.26	71.26	71.27	71.27	71.28	71.28
73.43	73.43	73.43	73.39	73.39	73.34	73.34
73.43	73.43	73.43	73.39	73.39	73.34	73.34
PE100 PN10 d200						
Smēlīto pasluksnis 15 cm						
		0.05%	0.05%			
		20.10	20.10			13.60
		20.10	20.10			13.6
3.10	3.10					
Tr.2 V13						P9
						P8

[illegible]

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------	--	-------	--------------	--------	----------

Vandentiekio tinklų medžiagos

Pagal I pakeitimo punktą: Vandentiekio papildomo šulinio įrengimas P7 posūkio vietoje.

Vykdomi darbai

1.	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	TS 4.2.	m ³	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 4
2.	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	TS 4.2.3; 5.4.3.1	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 6
3.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	TS 5.2.5	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 8
4.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	TS 5.2.	vnt.	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 9
5.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	TS 5.2.4	vnt.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 10
6.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 24
8.	Atrama iš betono C12/15	TS 5.4.3.1	m ³	0.25	Vandentiekio tinklų medžiagos 32
9.	Flanšinė trumpa sklendė DN200	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	3	Vandentiekio tinklų medžiagos 38
10.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m ³	27	Susisiekimas 2.2.
11.	Pylių įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu		m ³	20	Susisiekimas 2.3.
12.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu		m ²	5	Susisiekimas 2.5.

Nevykdomi darbai

Atestato Nr.					PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0-74 IKI PK 10-25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (I ETAPAS)				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	VYKDOMŲ NEVYKDOMŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
20680	PV	K. Jucevičius		2021 04				1	
23829	PDV	R. Gubenko		2021 04					
DP	STATYBOS KAUNO R. RANGŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA UŽSAKOVAS DARBŲ "KAUNO KETIAT"				2020-150-DP-VN-SŽ			Lapas	Lapu
								1	2

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Lil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	--	-------	--------------	--------	----------

1.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	-1	VN 26
----	--------------------------------	--------------------------	-----	----	-------

Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2

Vykdomi darbai

1.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m ³	6	Susisiekimas 2.2.
2.	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3.0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija		vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 16
3.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose		vnt.	2	9
4.	Flanšinė trumpa sklendė DN200		vnt	1	19
5.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12.5t (žalioje zonoje)		kompl.	1	8
6.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai		vnt.	1	10
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200		vnt	2	24
8.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
9.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	-1	VN 26

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	1



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2021-05-26 Nr. 100-04

MB „DPKTP“ FIDIC inžinieriui Dariui Pasvenskui
mbdpktp@gmail.com

DĖL 2021-05-25 RAŠTO NR. 30

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2020 metų spalio mėnesio 14 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-1095. Sutartyje Rangovas pagal Užsakovo pateiktą „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ techninį projektą (toliau – Projektas) įsipareigoja atlikti darbus. Sutarties vertė 2630330,30 Eur su PVM.

Rangovas UAB „Kauno keliai“ 2021 metų gegužės mėnesio 25 dieną gavo raštą Nr. 30 iš Fidic inžinieriaus, rašte prašoma Rangovo pagal rašte pateiktus priedus, pateikti papildomiems nevykdomiems darbams darbų kiekių žiniaraštį.

Teikiame preliminarų papildomų nevykdomų darbų žiniaraštį.

Pridedama:

- Preliminarus papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 2 lapai.

Rangovo atstovas

Statinio statybos vadovas

Ovidijus Steponavičius



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, ne PVM mokėtojas

Rangovas: UAB „Kauno keliai“ (įmonės kodas 135640993)

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje 01.2.1-LVPA-V-830-03-0007

Statybos pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Rangos sutartis: Nr. S-1095 sudaryta 2020-10-14

Preliminarus papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis

Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
	Pagal 1 pakeitimo punktą. Vandentiekio P7 posūkio, trišakio įrengimas				
	PAPILDOMI DARBAI				
Susisiekimas 2.2.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	27	4,73	127,71
Paviršinių nuotekų tinklai 13	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	1	10,00	10,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 6	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	vnt.	1	830,00	830,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	1	45,00	45,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt.	1	10,00	10,00
Susisiekimas 2.3.	Pylimų įrengimas gruntu atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu	m³	20	14,07	281,40
Susisiekimas 2.5.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu	m²	5	0,23	1,15
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	2	140,00	280,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	1	160,00	160,00
38	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	3	285,00	855,00

32	Atrama iš betono C12/15	m3	0,25	58,00	14,50
Viso papildomi darbai:					2.716,76
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektromovinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2					
PAPILDOMI DARBAI					
Susisiekimas 2.2.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	6	4,73	28,38
16	G/b surenkamas šulinys d1000mm H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	1	320,00	320,00
9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt.	2	10,00	20,00
19	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	1	285,00	285,00
8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	1	45,00	45,00
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	2	140,00	280,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	1	160,00	160,00
Viso papildomi darbai:					1.240,38
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektromovinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal visą pakeitimą:					
Nevykdomi darbai					-400,00
Papildomi darbai					3.957,14
Iš viso Pakeitimui be PVM					3.557,14
PVM					747
Iš viso Pakeitimui su PVM					4.304,14

Sudarė:

Rangovas:

UAB "Kauno keliai"
Projektų vadovas
Ovidijus Steponavičius
Atestato Nr. 32018
(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

2021 05 26

MB "DPKTP"**Priedas Nr. 8**

Įmonės kodas 305562793

Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r. tel. +37062090505

A.s. Nr. LT727230000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriui
Savanorių per. 371, Kaunas
El. p. info@kaunokeliai.lt

2021-05-27 Nr. 31

Kopija:
UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
El. p. info@kaunokeliai.lt

UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"
Miško g. 30-71, LT-44313 Kaunas
El. p. valdas@insip.lt

DĖL VANDENTIEKIO TINKLO

MB "DPKTP" veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP“ dėl objekto „**Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ**“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas)) techninės priežiūros bei FIDIC Inžinieriaus paslaugų.

Užsakovas 2021-04-19 raštu Nr. SD-1587 kreipėsi į rangovą dėl vandentiekio linijos posūkį p7.

Fidic inžinierius 2021-04-29 raštu Nr. 29 kreipėsi į Projektuotoją dėl vandentiekio linijos posūkio p7 ir vandentiekio linijos prisijungimo taško ALK.2 prašydamas pateikti sprendinius ir darbų kiekių žiniaraščius. Projektuotojai raštu Nr. VV0512 pateikė sprendinius ir darbų kiekių žiniaraščius. Inžinierius raštu Nr. 30 kreipėsi į Rangovą prašydamas pateikti samatą pagal Projektuotojų pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Rangovas 2021-05-26 raštu Nr. 100-04 pateikė samatas.

Remiantis konkrečių sąlygų 13.1 punktu prašau Užsakovo pritarti siūlomiems pakeitimams.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Užsakovo raštas SD-1587, 1 lapas.
2. Priedas Nr. 2. Inžinieriaus raštas Nr. 29, 3 lapai.
3. Priedas Nr. 3 Projektuotojo UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas" raštas Nr. VV0512, 5 lapai.
4. Priedas Nr. 4 Inžinieriaus raštas Nr. 30, 6 lapai.
5. Priedas Nr. 5 Rangovo UAB „Kauno keliai“ raštas Nr. 100-04, 3 lapai

Pagarbiai

FIDIC Inžinierius
Originalas siunčiamas nebus

Darius Pasvenskas



Priedas Nr. 1

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt

2021-04- Nr. SD-

kopija
UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
kestas@insip.lt

DPKTP, MB
Dariui Pasvenskui
mbdpktp@gmail.com

DĖL PAPILDOMO ŠULINIO PROJEKTAVIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) 2020-10-12 sudarė statybos rangos sutartį Nr. S-1095, kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno rajono savivaldybės statybos darbai (I etapas)“ statybos darbus.

Pranešame, kad Užsakovas gavo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštą Nr. SR-21/04-02 (2021-04-13) kuriame prašoma pakeisti vandentiekio linijos posūkį p7 į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti naujai projektuojamus Jėgainės gatvės vandentiekio tinklus. Tai padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje. Šis klausimas buvo svarstomas 2021-03-25 nuotolinio pasitarimo metu (pasitarimo protokolas Nr. 3). Prašome atlikti darbo projekto pakeitimus su reikalingais derinimais ir paruošti papildomų darbų sąmatą.

PRIDEDAMA: UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ rašto Nr. SR-21/04-02 kopija, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Sarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Budžetinė įstaiga
Savimoniai pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 395 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administracijas@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre
Kodas 188756386



Tikime laisvę
2021-04-13

MB "DPKTP"

Įmonės kodas 305562793

Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r. tel. +37062090505

A.s. Nr. LT727230000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Priedas Nr. 2

UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"

2021-04-29 Nr. 29

Mėslų g. 8071, LT-14313 Kaunas

El. p. info@statyba.lt

Kopija:

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Kelių ir transporto skyriui

Savanorių per. 371, Kaunas

El. p. info@kcs.lt

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas

El. p. info@kaunokeliai.lt

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

MB "DPKTP" veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP“ dėl objekto „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas)) techninės priežiūros bei FIDIC inžineriaus paslaugų.

Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija 2021-04-19 raštu Nr. SD-1587 kreipėsi dėl vandentiekio linijos posūkio p7. Užsakovas prašo suprojektuoti posūkio p7 vietoje įrengti šulinių su trisakiu perspektyviniam vandentiekio linijos prisijungimui. Prašom išanalizuoti galimybes atlikti prašomus darbus. Esant galimybei prašomų darbų įgyvendinimui prašau pateikti sprendinį ir darbų kiekių žiniaraštį.

Rangovas negali prijungti naujai paklotos vandentiekio trasos taške ALK.2 kaip numatyta projekte nes minėtame prisijungimo taške yra prijungta kita vandentiekio trasa įgyvendinta kitu projektu. Prašau pateikti sprendinį vandentiekio trasos prijungimui taške ALK.2 kartu pateikiant ir darbų kiekių žiniaraštį.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Užsakovo 2021-04-19 raštas Nr. SD-1587

Pagarbiai

FIDIC inžinierius

Darius Pasvenskas

Originalas siunčiamas nebus



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt

2021-04- Nr. SD-

kopija
UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
kestas@insip.lt

DPKIP, MB
Darius Pasvenskui
mbdpkip@gmail.com

DĖL PAPILDOMO ŠULINIO PROJEKTAVIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) 2020-10-12 sudarė statybos rangos sutartį Nr. S-1095, kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno rajono savivaldybės statybos darbai (I etapas)“ statybos darbus.

Pranešame, kad Užsakovas gavo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ raštą Nr. SR-21/04-02 (2021-04-13) kuriame prašoma pakeisti vandentiekio linijos posūkį p7 į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti naujai projektuojamus Jėgainės gatvės vandentiekio tinklus. Tai padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje. Šis klausimas buvo svarstomas 2021-03-25 nuotolinio pasitarimo metu (pasitarimo protokolais Nr. 3). Prašome atlikti darbo projekto pakeitimus su reikalingais derinimais ir paruošti papildomų darbų sąmatą.

PRIDEDAMA: UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ rašto Nr. SR-21/04-02 kopija, 1 lapas.

Administracijos direktorius


Šarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Budžetinė įstaiga
Savanorių pr. 37
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386





KAUNO LEZ
infrastruktūra

Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Lietuva

2021 m. balandžio 13 d.
Nr. SR-21/04-02
Kauno rajonas

Siunčiama: el. paštu, originalus paštu siunčiamas nebus

PRAŠYMAS

Šiuo metu yra rengiamas Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įėgainės g., Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos projektas, kuriame numatomas vandentiekio įrengimas padidins teritorijos plotą kuriame išvystyti šie tinklai bei padidins vandentiekio tinklų patikimumą Kauno LEZ teritorijoje bei aplinkinėse gyvenvietėse. Šiame projekte yra numatomas vandentiekio tinklų prijungimas prie PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOSPROJEKTO (I ETAPAS) vandentiekio tinklų ties p7 posūkiu. Siekiant išvengti naujai įrengtų tinklų ardymo prašome pakeisti p7 posūkį į šulinį su trišakiu, taip paliekant galimybę prijungti kitus tinklus.

Pagarbiai

Kęstutis Banionis

Direktorius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KESTUTIS BANIONIS
Data: 2021-04-14 10:31:49



+370 691 48301

+370 673 95299

kestutis@ltz.lt

www.ltz.lt

Terminalo g. 3, Kauno LEZ

504469, Kauno rajonas

MB „DPKTP“
Dariui Pasvenskui
Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r.
El p. mb@dpktp.lt

2021-05-12 Nr. VV0512
į 2021-04-29 Nr. 29

Kopija:
UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponaviciu@kaunokeliai.lt

Siunčiama: el. paštu, originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

Kauno LEZ infrastruktūra UAB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2019-106, pagal kurią įsipareigojo atlikti „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Pk 0+74 iki Pk 10+25 Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ Projekto vykdymo priežiūrą.

Atsakydami į FIDIC inžinieriaus gautą raštą Nr. 2021-04-29 Nr. 29, išnagrinėjome galimybę pajungti perspektyvinį vandentiekio tinklą, įrengiant papildomą šulinį vandentiekio linijos posūkio Nr. P7 vietoje. Pateikiame darbo projekto A laidos brėžinį su papildomo šulinio Nr. V12 įrengimo sprendiniu (Priedas Nr. 1).

Projektuojant vandentiekio tinklus buvo numatyta taške ALK.2 pajungti naujai projektuojamą vandentiekio trasą į esamą vandentiekio trasą. Rangovui atsikąsus paaiškėjo, kad pajungti vandentiekio trasos prie esamų tinklų numatyta taške ALK.2 nėra galimybės, kadangi šiame taške jau yra pajungti kiti tinklai. Norint tinkamai įsipildyti projektą reikalinga įrengti papildomą šulinį Nr. V13 su uždromąja armatūra. Už šulinio vandentiekio linija turi būti prijungiama prie esamos linijos, šalia kitu projektu įrengto trišakio (plane žym. - Triš.2). Pateikiame A laidos papildomo šulinio V13 sprendinį (Priedas Nr. 2).

Pateikiamas vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr. 3).

PRIDEDAMA:



1. Priedas Nr. 1. Papildomo šulinio Nr. V12 detalizacija.
2. Priedas Nr. 2. Papildomo šulinio Nr. V13 detalizacija.
3. Priedas Nr. 3. Vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis.

Direktorius



Valdas Vyšniauskas

Ramunė Gubenko 867241060, el.p. ramune@rusne.lt

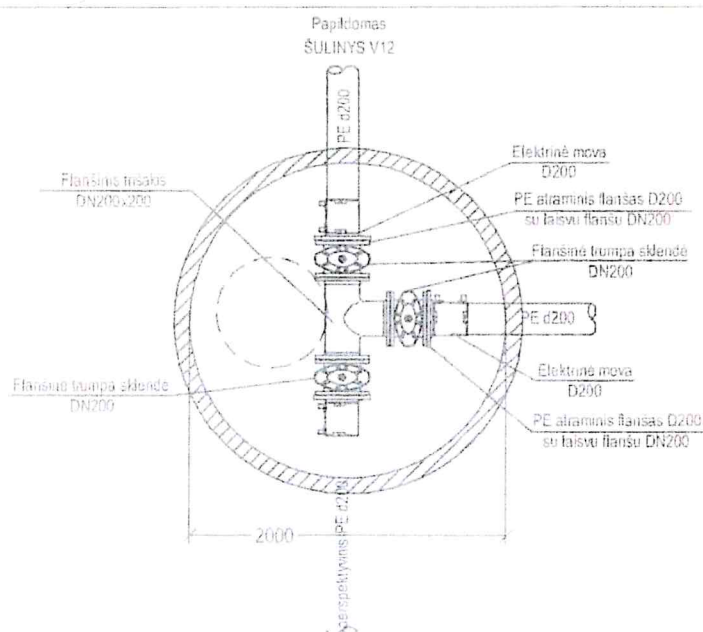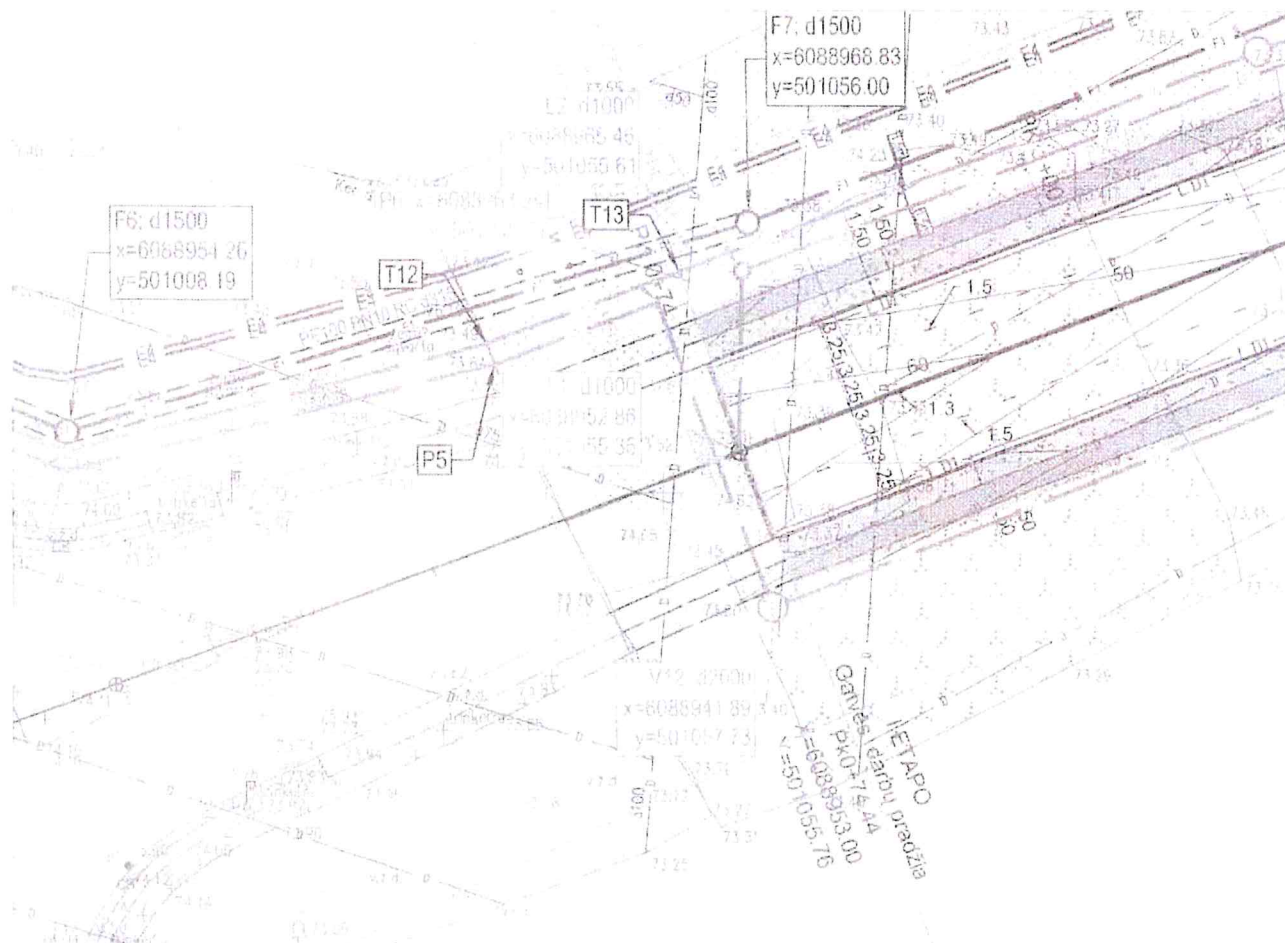

A	2021-02-08	Perspektyvinio vandentiekio tinklo pajungimu numatytas papildomas šulinys Nr. V12, posūkio P7 vietoje.	R. Gubenko	
Laida	Data	Kelimo pavadinimas (priežastis)	Vardas, pavardė	Parasas
Sertifikato Nr		INSIP INŽINERINIS SĄJŪDAS IR PROJEKAVIMAS	OBJEKTAS PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (I ETAPAS)	
1450	PV	K. Jucevičius	2021-02	BRĖŽINYS
23829	PDV	R. Gubenko	2021-02	PAPILDOMO VANDENTIEKIO ŠULINIO V12 DETALIZACIJA
				Laida
				A

MEDŽIAGU IR DARBU ŽINIARAŠTIS

Pozicija Išil Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
----------------------	--	-------	--------------	--------	----------

Vandentiekio tinklų medžiagos

Pagal 1 pakeitimo punktą: Vandentiekio papildomo šulinio įrengimas P7 posūkio vietoje.

Vykdomi darbai

1.	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	TS 4.2.	m ³	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 4
2.	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	TS 4.2.3; 5.4.3.1	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 6
3.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	TS 5.2.5	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 8
4.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	TS 5.2.	vnt.	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 9
5.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	TS 5.2.4	vnt.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 10
6.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 24
8.	Atrama iš betono C12/15	TS 5.4.3.1	m ³	0,25	Vandentiekio tinklų medžiagos 32
9.	Flanšinė trumpa sklendė DN200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	3	Vandentiekio tinklų medžiagos 38
10.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m ³	27	Susisiekimas 2.2.
11.	Pylimų įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu		m ³	20	Susisiekimas 2.3.
12.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu		m ²	5	Susisiekimas 2.5.

Nevykdomi darbai

Atestato Nr.	 INSIP UAB "INSIP" REGISTRUOTA ĮMONĖ, ĮSTATYTOJAS: UAB "KAUNO KELIAI"				PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0-74 IK1 PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (I ETAPAS)				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	VYKDOMŲ NEVYKDOMŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
20680	PV	K. Jucevičius		2021-04				4	
23829	PDV	R. Gubenko		2021-04					
DP	STATYBOS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA UŽSAKOVAS: UAB "KAUNO KELIAI"				2020-150-DP-VN-SŽ			Lapas	Lapu
								1	2

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Fil Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
------------------------------	--	-------	--------------	--------	----------

1.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	-1	VN 26
----	--------------------------------	--------------------------	-----	----	-------

Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2

Vykdomi darbai

1.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m³	6	Susisiekimas 2.2.
2.	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija		vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 16
3.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose		vnt.	2	9
4.	Flanšinė trumpa sklendė DN200		vnt	1	19
5.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)		kompl.	1	8
6.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai		vnt.	1	10
7.	Tempinui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200		vnt	2	24
8.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
9.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	-1	VN 26

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Uaida
2	2	1

Priedas Nr. 4

MB "DPKTP"

Įmonės kodas 305562793

UAB "DPKTP" įstatymai, t. I-53262 Kauno r. tel. +37062090505

As. Nr. 1-17272-0000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

UAB "Kauno LEZ"

R. Kauno m. g. 30-71, t. I-44313 Kaunas

ĮĮ p. 1-17272-0000000603321

2021-05-25 Nr. 30

K. 1-17272

Kauno r. miesto savivaldybės administracijos

Techninės specifikacijos

Savivaldybės taryba, Kaunas

ĮĮ p. 1-17272-0000000603321

UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"

Miško g. 30-71, t. I-44313 Kaunas

ĮĮ p. 1-17272-0000000603321

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

MB "DPKTP" veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB "DPKTP" dėl objekto **„Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas))** techninės priežiūros bei FIDIC Inžineriaus paslaugų.

Idie inžinerius 2021-04-29 raštu Nr. 29 kreipėsi į Projektuotoją dėl vandentiekio linijos postūpio p7 ir prisijungimo taško ALK.2.

Projektuotojas raštu Nr. VV0512 pateikė sprendinius ir darbų kiekių žiniaraštį.

Prašau pateikti sumatus pagal Projektuotojo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas" 2021-05-12 raštas Nr. VV0512.
Pagurbiai

FIDIC Inžinerius

Darius Pasvenskas

Originalas siunčiamas nebus

2021-05-12 Nr.VV0512
i 2021-04-29 Nr.29.

...tā, kas vāsta sludlamas nebus

DEL VANDERBEEKIO TRASOS

Klaipėdos „UAB „Sielva“ UAB (Johau – Užsakovas) ir UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ sudaro projektavimo darbų sutartį Nr. 2019-106, pagal kurią įsipareigojo atlikti „Privažiavimo gaisrės nuo žiedinės sankryžos Pk 0+74 iki Pk 10+25 Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai (1 etapas)“ Projekto vykdymo priežiūrą

Atsakydami į FIDIC Inžinieriaus gautą raštą Nr. 2021-04-29 Nr.29, išnagrinėjome
deltą, kurioje nurodoma, kad, vadovaujantis tinkla, įrengiant papildomą šulinį vandentiekio
linijos ruožinio Nr.ET-1000-01. Pareikiame darbo projekto A laidos brėžinį su papildomo
šulino Nr. V12 įrengimo sprendiniu (Priedas Nr.1).

Projekto planuojama prijungti tinklą buvo numatyta laške ALK.2 pajungti naujai įrengiamą šulinį prie esančios stamų vandentiekio trasa. Rangovui atsikakus paaiškėjo, kad pajungti vandentiekio trasos prie esančių tinklų numatytiame laške ALK.2 nėra galimybės. Kadangi šiuo laške jau yra pajungti kiti tinklai. Norint tinkamai įspildyti projektą reikalinga įrengti papildomą šulinį Nr.V13 su uždaromąja armatūra. Už šulinio vandentiekio linija turi būti prijungiama prie esančios linijos. Šalia kitu projektu įrengto trišakio (plane žym. - Triš.2). Pateikiame A laidos papildomame šulinio V13 sprendinį (Priedas Nr.2)

Pateiktumas – įvydomų – neįvydomų darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.3).

PRIDE: VMA

1. Priedas Nr.1. Papildomo šulinio Nr. V12 detalizacija



2. Priedas Nr.2. Papildomo šulinio Nr. V13 detalizacija.

3. Priedas Nr. 3. Vykidimų – neįvykdomų darbų kiekių žiniosraštis.

Directorius

Valdas Vyšniauskas

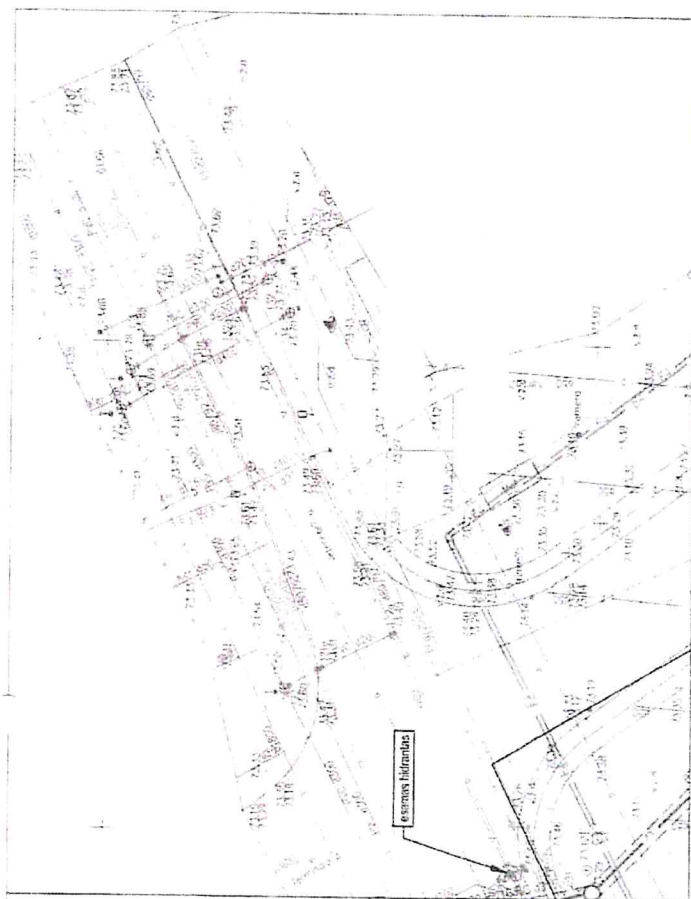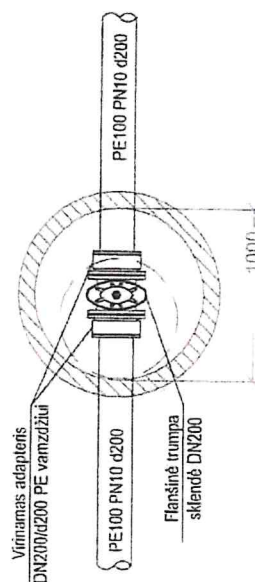

[illegible]

A	2021.03.30	Ypatumai: skubiosios studijos, atnaujinti patalpinimo baldai, pakeičiamas vandenintiesiems (patalpa 6 kambarių, 133,0) pastatų, kad būtų atitiktas įstatyme nustatytas reikalavimas. Toliau planuojama patalpinimo grąžinti su išdėstytu bendradarbiavimu.	R. Čiulienė	<i>[Signature]</i>
A	2021.02.21	Atnaujinti patalpinimo baldai, pakeičiamas vandenintiesiems (patalpa 6 kambarių, 133,0) pastatų, kad būtų atitiktas įstatyme nustatytas reikalavimas. Toliau planuojama patalpinimo grąžinti su išdėstytu bendradarbiavimu.	R. Čiulienė	<i>[Signature]</i>
Laisvės	Data	Kitą dieną pasirašiusius (patalpinimus)	Varėdos, pavarėla	Parškus

Sąskaitos Nr.	OBJEKTAS:		Laiškas
	PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINIS SANKRYŽYS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (ETAPAS)		
1450	PV	K. Jurevičius	2021.03
23429	PDV	R. Gubenko	2021.03
Įrašas	Užsakytojas:	UAB "KAUNO KETAI"	
DP	Įrašas:	2020-150-DP-VN-05	

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Posi- cija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
Vandentiekio tinklų medžiagos					
Pagal 1 pakeitimo punktą: Vandentiekio papildomo šulinio įrengimas P7 posūkio vietoje.					
<i>Vykdomi darbai</i>					
1.	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	TS 4.2.	m ³	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 4
2.	Surenkamo g b vandentiekio šulinio įrengimas. d2000mm su hidroizoliacija	TS 4.2.3; 5.4.3.1	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 6
3.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žaliąjoje zonoje)	TS 5.2.5	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 8
4.	Protarpinių d200 įrengimas g b šuliniuose	TS 5.2.	vnt.	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 9
5.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	TS 5.2.4	vnt.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 10
6.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5:4: 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	TS 5.2.3; 5:4: 6.3	vnt	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 24
8.	Atrama iš betono C12-15	TS 5.4.3.1	m ³	0,25	Vandentiekio tinklų medžiagos 32
9.	Flanšinė trumpa sklendė DN200	TS 5.2.3; 5:4: 6.3	vnt	3	Vandentiekio tinklų medžiagos 38
10.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m ³	27	Susisieikimas 2.2.
11.	Pylių įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu		m ³	20	Susisieikimas 2.3.
12.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu		m ²	5	Susisieikimas 2.5.

Nevykdomi darbai

Atestato Nr.	 INSIP INSTRUMENTINIS SAVIVALDYBĖS INŽINERINIS PASAULIS				PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0-74 IKI PK 10-25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (1 ETAPAS)				
	Parcigos	V. Pavardė	Parašas	Data	VYKDOMŲ NEVYKDOMŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
20680	PV	K. Jucevičius		2021-04				1	
23829	PDV	R. Gubenko		2021-04					
DP	NEATYTOJAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA UŽSAKOVAS LAB "KAUNO KIEPIS"				2020-150-DP-A N-SŽ			Lapas 1	Lapas 2

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINLARAŠTIS

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	-1	VN 26
Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2					
<u>Vykdomi darbai</u>					
1.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m³	6	Susisiekimas 2.2.
2.	G/b surenkamas šulinys d1000mm H=3.0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija		vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 16
3.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose		vnt.	2	9
4.	Flanšinė trumpa sklendė DN200		vnt	1	19
5.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12.5t (žalioje zonoje)		kompl.	1	8
6.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai		vnt.	1	10
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200		vnt	2	24
8.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
9.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5.4; 6.3	vnt	-1	VN 26



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52390 Kaunas, Lietuva, tel. (8 - 37) 452389, faksas (8 - 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Registracijos bylos Nr. AB-2000-251, Registracijos centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
Aidas, Aidas, 15111, 44062001951125 AB, SEB, Aidas, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2021-05-26 Nr. 100-04

VR „DPKTP“ LIDIC“ inžinierius Darius Pasvenskui
pildyti dp@dpktp.lt

DĖL 2021-05-25 RAŠTO NR. 30

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188113300, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2020 metų spalio mėnesio 14 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-1095. Sutarties Rangoje pagal Užsakovo pateiktą „**Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Bireliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)**“ techninį projektą (toliau – Projektas) įsipareigoja atlikti darbus. Sutarties vertė 2630330,30 Eur su PVM.

Rangovas UAB „Kauno keliai“ 2021 metų gegužės mėnesio 25 dieną gavo raštą Nr. 30 iš LR inžinieriaus, rašte prašoma Rangovo pagal rašte pateiktus priedus, pateikti papildomiems nevykdomiems darbamų darbų kiekių žiniaraštį.

Užsakovas prašo inžinieriaus pateikti papildomų nevykdomų darbų žiniaraštį.

Priedama:

- Preliminarus papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 2 lapai.

Rangovo atstovas

Statymo statybos vadovas

Osvaldas Staponaitis

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, ne PVM mokėtojas

Rangovas: UAB „Kauno keliai“ (įmonės kodas 135640993)

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje 01.2.1-LVPA-V-830-03-0007

Statybos pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Rangos sutartis: Nr. 8-1095 sudaryta 2020-10-14

Preliminarus papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis

Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
	Pagal 1 pakeitimo punktą, Vandentiekio P7 posūkio, trišakio įrengimas				
	PAPILDOMI DARBAI				
Susisiekimas 2.2	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosuvirėlius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m ³	27	4,73	127,71
Paviršinių nuotekų tinklai 13	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais h=15	m ³	1	10,00	10,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 6	Surenkamo g h vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	vnt.	1	830,00	830,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12.5t (žaliąjoje zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	1	45,00	45,00
Vandentiekio tinklų medžiagos 9	Protarpinių d200 įrengimas grb šuliniuose	vnt.	2	10,00	20,00
Susisiekimas 2.3.	Pylių įrengimas gruntu atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu	m ³	20	14,07	281,40
Susisiekimas 2.5	Sunkiosios viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizmais h=30 cm gyliu	m ²	5	0,23	1,15
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt.	2	140,00	280,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt.	1	160,00	160,00
38	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt.	3	285,00	855,00

32	Atrama iš betono C12/15	m3	0,25	58,00	14,50
Viso papildomi darbai:					2.726,76
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektrinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo AI.K.2					
PAPILDOMI DARBAI					
Susisiekimas 2.2	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumi (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	6	4,73	28,38
16	G/b surenkamas šulinys d1000m H=3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	1	320,00	320,00
9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt	2	10,00	20,00
19	Planšinė trumpa sklendė DN200	vnt	1	285,00	285,00
8	Ketinis šulimo dangtis lengvo tipo 12,5t (žaliąjo zonoje)	kompl.	1	102,00	102,00
10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt	1	45,00	45,00
24	Tempimui atsparus planšinis adapteris DN200xd200	vnt	2	140,00	280,00
15	Planšinis mišakis DN200x200	vnt	1	160,00	160,00
Viso papildomi darbai:					1.240,38
NEVYKDOMI DARBAI					
26	Elektrinė alkūnė DN200x90o	vnt	-1	200,00	-200,00
Viso nevykdomi darbai:					-200,00
Pagal visą pakeitimą:					
Nevykdomi darbai					-400,00
Papildomi darbai					3.967,14
Iš viso Pakeitimui be PVM					3.567,14
PVM					749,1
Iš viso Pakeitimui su PVM					4.316,24

Sudarė:

Rangovas:

UAB „Kaimo ūkis“
 Šturka Marius Juozas
 (vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

2021-05-26

(data)



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB „DPKTP“ FIDIC inžinieriui
Dariui Pasvenskui
El. p.: mbdpkt@gmail.com

2021-06-03 Nr. SD-2472
Į 2021-05-27 raštą Nr. 31

Kopija:
UAB „Kauno keliai“ Statinio statybos vadovui
Ovidijui Steponavičiui
El. p. info@kaunokeliai.lt

DĖL VANDENTIEKIO TINKLO

Kauno rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi FIDIC inžinieriaus 2021-05-27 pateiktą raštą Nr. 31 dėl vandentiekio linijos objekte „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų I etapas), pritaria rašte pateiktiems projektiniams pakeitimams.

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Biudžetinė įstaiga
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386



Tikime laisve

1990 KOVO 11

MB „DPKTP”

Priedas Nr. 10

Įmonės kodas 305562793

Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r. tel.+37062090505

A.s. Nr. LT72723000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
El. p. info@kaunokeliai.lt

2021-06-10 Nr. 32

Kopija:
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriui
Savanorių per. 371, Kaunas
El. p. info@krs.lt

UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“
Miško g. 30-71, LT-44313 Kaunas
El. p. valdas@insip.lt

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

MB „DPKTP” veikia pagal 2020 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį Nr. CPO155932/S-1316 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP” dėl objekto **„Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų (I etapas))** techninės priežiūros bei FIDIC Inžinieriaus paslaugų.

Fidic inžinierius 2021-05-27 Nr. 31 kreipėsi į Užsakovą dėl vandentiekio linijos posūkio p7 ir prisijungimo taško ALK.2. sprendinių pritarimo. Užsakovas raštu 2021-06-03 Nr. SD-2472 pritarė siūlomiesiems sprendiniams.

Prašau darbus vykdyti pagal Projektuotojo raštu Nr. VV0512 pateiktus sprendinius.

Prašau ruošti darbų pakeitimui reikalingus dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ 2021-05-12 raštas Nr. VV0512.
2. Priedas Nr. 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. SD-2472

Pagarbiai

FIDIC Inžinierius

Darius Pasvenskas

Originalas siunčiamas nebus

MB „DPKTP“
Dariui Pasvenskui
Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r.
El.p. mbdpktp@gmail.com

2021-05-12 Nr.VV0512
į 2021-04-29 Nr.29

Kopija:
UAB „Kauno keliai“
Ovidijui Steponavičiui
ovidijus.steponaviciu@kaunokeliai.lt

Siunčiama: el.paštu, originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL VANDENTIEKIO TRASOS

Kauno LEZ infrastruktūra UAB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2019-106, pagal kurią įsipareigojo atlikti „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Pk 0+74 iki Pk 10+25 Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ Projekto vykdymo priežiūrą

Atsakydami į FIDIC inžinieriaus gautą raštą Nr. 2021-04-29 Nr.29, išnagrinėjome galimybę pajungti perspektyvinį vandentiekio tinklą, įrengiant papildomą šulinį vandentiekio linijos posūkio Nr.P7 vietoje. Pateikiame darbo projekto A laidos brėžinį su papildomo šulinio Nr. V12 įrengimo sprendiniu (Priedas Nr.1).

Projektuojant vandentiekio tinklus buvo numatyta taške ALK.2 pajungti naujai projektuojamą vandentiekio trasą į esamą vandentiekio trasą. Rangovui atsikąsus paaiškėjo, kad pajungti vandentiekio trasos prie esamų tinklų numatytame taške ALK.2 nėra galimybės, kadangi šiame taške jau yra pajungti kiti tinklai. Norint tinkamai išpildyti projektą reikalinga įrengti papildomą šulinį Nr.V13 su uždaromąja armatūra. Už šulinio vandentiekio linija turi būti prijungiama prie esamos linijos, šalia kitu projektu įrengto trišakio (plane žym. - Triš.2). Pateikiame A laidos papildomo šulinio V13 sprendinį (Priedas Nr.2).

Pateikiamas vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.3).

PRIDEDAMA:



1. Priedas Nr.1. Papildomo šulinio Nr. V12 detalizacija.
2. Priedas Nr.2. Papildomo šulinio Nr. V13 detalizacija.
3. Priedas Nr.3. Vykdomų – nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis.

Direktorius




Valdas Vyšniauskas


Ramunė Gubenko, 867241060, el.p. ramune@russtat.lt

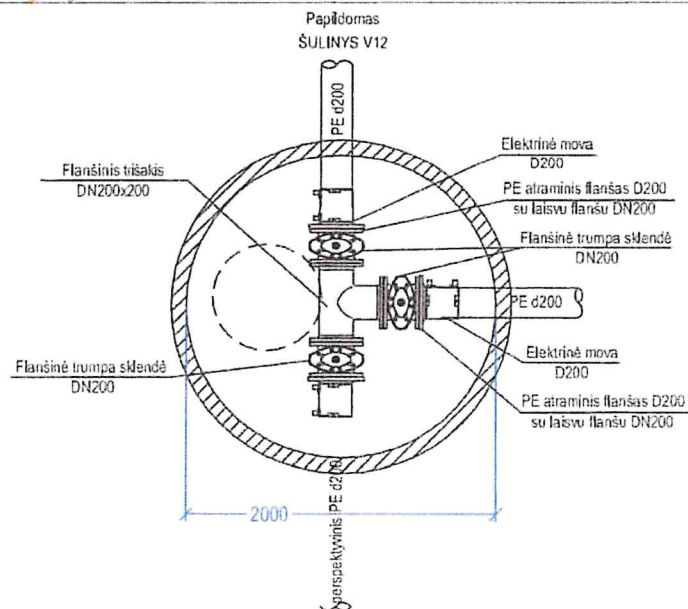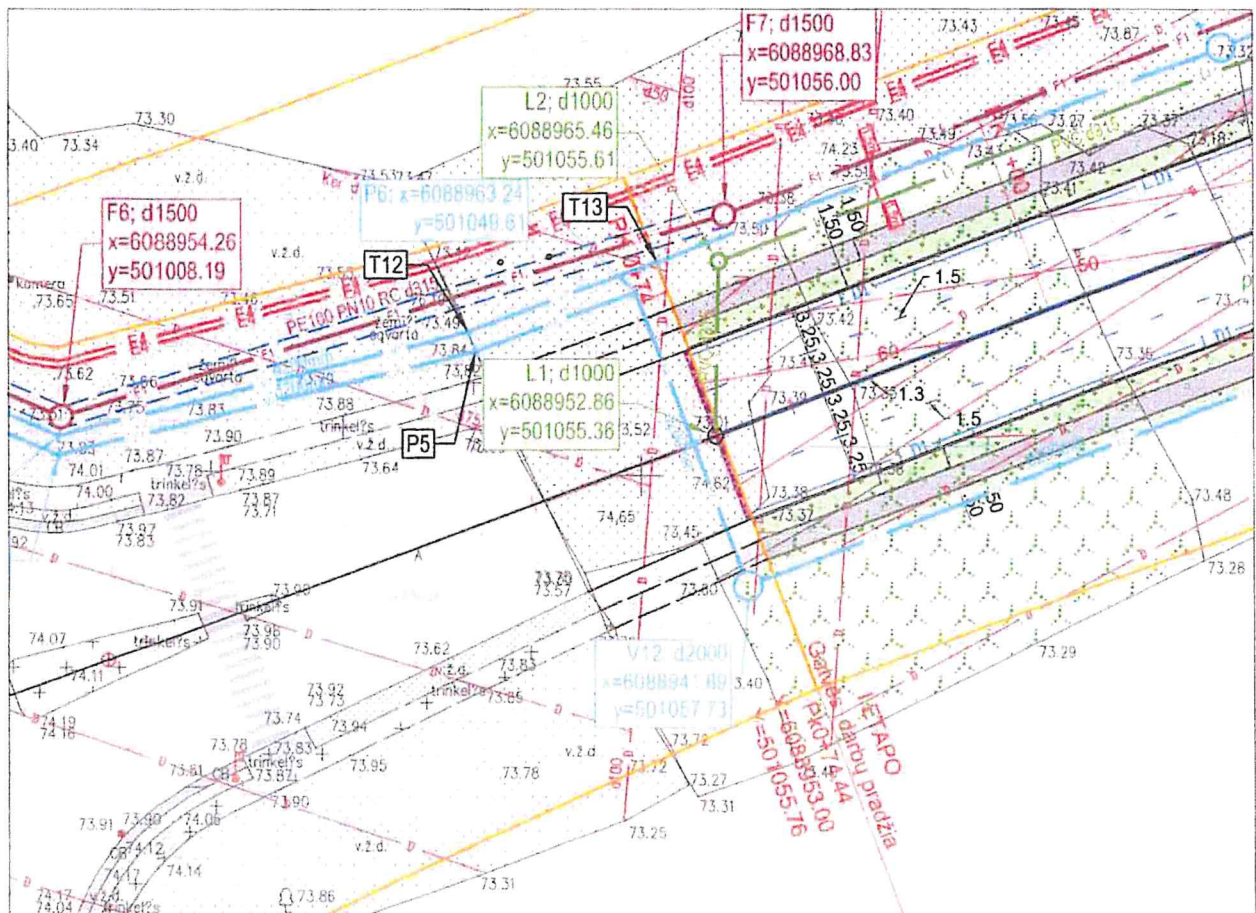

A	2021 02 08	Perspektyvinio vandentiekio tinklo pajungimui numatytas papildomas šulinys Nr. V12, posūkio P7 vietoje.				R. Gubenko				
Laida	Data	Kėlimų pavadinimas (priešaištis)				Vardas, pavardė	Parašas			
Sertifikato Nr.	 INŽINERINĖ STATYBA IR PROJEKTAVIMAS					OBJEKTAS: PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (I ETAPAS)				
1450	PV	K. Jucevičius		2021 02	BRĖŽINYS:				Laida	
23829	PDV	R. Gubenko		2021 02	PAPILDOMO VANDENTIEKIO ŠULINIO V12 DETALIZACIJA				A	
Etapas	UŽSAKOVAS:				ŽYMUO:				LAPAS	LAPŲ
DP	UAB "KAUNO KELIAI"				2020-150-DP-VN-05				1	1

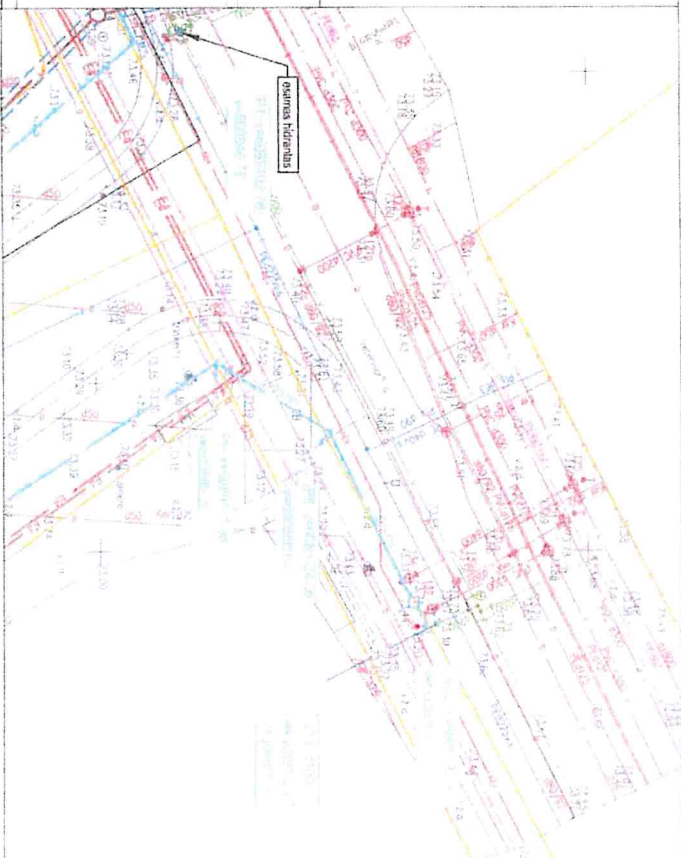

The drawing shows a cross-section of a PE 100 PN10 d200 pipe. A flange is attached to the pipe, with a dimension line indicating a length of 1000 mm. The flange is labeled 'Flansinė tuopa skerslė DN200'. The pipe is labeled 'PE 100 PN10 d200'.

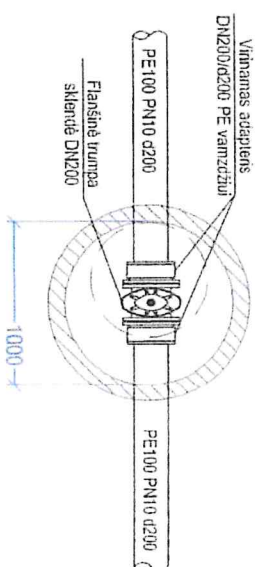[illegible]

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------	--	-------	--------------	--------	----------

Vandentiekio tinklų medžiagos

Pagal 1 pakeitimo punktą: Vandentiekio papildomo šulinio įrengimas P7 posūkio vietoje.

Vykdomi darbai

1.	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	TS 4.2.	m ³	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 4
2.	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	TS 4.2.3; 5.4.3.1	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 6
3.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	TS 5.2.5	kompl.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 8
4.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	TS 5.2.	vnt.	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 9
5.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	TS 5.2.4	vnt.	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 10
6.	Flanšinis trišakis DN200x200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 15
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	2	Vandentiekio tinklų medžiagos 24
8.	Atrama iš betono C12/15	TS 5.4.3.1	m ³	0,25	Vandentiekio tinklų medžiagos 32
9.	Flanšinė trumpa sklendė DN200	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	3	Vandentiekio tinklų medžiagos 38
10.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m ³	27	Susisiekimas 2.2.
11.	Pylimų įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu		m ³	20	Susisiekimas 2.3.
12.	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu		m ²	5	Susisiekimas 2.5.

Nevykdomi darbai

Atestato Nr.	INSIP INŽINERINĖ STATYBA IR PROJEKTAVIMAS				PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS PK 0+74 IKI PK 10+25 BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS (I ETAPAS)				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	VYKDOMŲ NEVYKDOMŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
20680	PV	K. Jucevičius		2021 04				/	
23829	PDV	R. Gubenko		2021 04					
DP	STATYTOJAS: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA UŽSAKOVAS: UAB "KAUNO KELIAI"				2020-150-DP-VN-SŽ			Lapas /	Lapu 2

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	--	-------	--------------	--------	----------

1.	Elektromovinė alkūnė DN200x90°	TS 5.2.3; 5;4; 6.3	vnt	-1	VN 26
----	--------------------------------	--------------------------	-----	----	-------

Pagal 2 pakeitimo punktą: Papildomo šulinio pastatymas dėl vandentiekio pajungimo ALK.2

Vykdomi darbai

1.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)		m³	6	Susisiekimas 2.2.
2.	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija		vnt	1	Vandentiekio tinklų medžiagos 16
3.	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose		vnt.	2	9
4.	Flanšinė trumpa sklendė DN200		vnt	1	19
5.	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)		kompl.	1	8
6.	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai		vnt.	1	10
7.	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200		vnt	2	24

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	1



Priedas Nr. 2

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB „DPKTP“ FIDIC inžinieriui
Dariui Pasvenskui
El. p.: mbdpktp@gmail.com

2021-06- Nr. SD-
į 2021-05-27 raštą Nr. 31

Kopija:
UAB „Kauno keliai“ Statinio statybos vadovui
Ovidijui Steponavičiui
El. p. info@kaunokeliai.lt

DĖL VANDENTIEKIO TINKLO

Kauno rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi FIDIC inžinieriaus 2021-05-27 pateiktą raštą Nr. 31 dėl vandentiekio linijos objekte „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ (Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbų I etapas), pritaria rašte pateiktiems projektiniams pakeitimams.

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Evaldas Tarvydas, 8620 93930, el. p. evaldas.tarvydas@krs.lt.

Biudžetinė įstaiga
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 502
Faks. (8 37) 313 797
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386

