

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-07-16 Nr. ORC- 073

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 14

2020 m. liepos 16 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Papildomų darbų vertė – 1795,08 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 156,87 Eur be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 14 vertė yra 1638,21 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-07-16 pakeitimo Nr.14 padidėja 1638,21,21 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.796.220,03 Eur be PVM.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (24 lapai).


Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius



.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas


UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius



.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui



.....
(parašas, data)

Artūras Valys

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 14

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;

Rangovo atstovo AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

1. Pagal Rietavo gatvės rekonstravimo projektą, prie Rietavo g. gyvenamųjų namų Nr. 14, 22, 25, 31 kiemų numatyta įrengti žaliąją zoną, tačiau, atlikus statybos darbus, nuo tako ribos iki minėtų sklypų ribų žalios zonos įrengimui liko tik siauras ruožas 15 - 30 cm ruožas, kuriame žalios zonos įrengimas netenka prasmės. Užsakovas, įvertinęs šią situaciją, 2020-05-14 raštu Nr. AS-2068 paprašė projekto autorių pateikti projektinį sprendinį, panaikinant žaliąją zoną, jos vietoje suprojektuojant trinkelį dangą.

Komisija, išnagrinėjusi pirkimo ir projektinę dokumentaciją, apžiūrėjusi faktinę situaciją statybvietyje, gavusi Užsakovo prašymą 2020-05-14 raštu Nr. AS-2068, projekto autoriaus sprendinį 2020-05-20 raštu Nr. 020/318 (Priedai Nr. 2 ir Nr. 3), patvirtina, kad siauro žalios zonos ruožo tarp tako ir sklypų ribų įrengimas netikslingas ir pritaria jo panaikinimui, įrengiant trinkelį dangą, bei patvirtina, kad būtina atlikti šiuos papildomus darbus:

Papildomi darbai

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
<i>2 Žemės sankasa</i>				
5		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,014
6		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m k9=1.15	100m3	0,015
7		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 15.00 km)	t. m3	0,015
8		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,015
10		Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,037
<i>3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija</i>				
9		Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,06
14		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,37
15		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,37

		k9=1.15		
16		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,34
17		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,03

Papildomų darbų vertė – 1 354,08 Eur be PVM.

ir nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
2 Baigiamieji darbai				
1		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	0,37
2		Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,37

Nevykdomų darbų vertė – 156,87 Eur.

2. Laisvės g. rekonstravimo projekte, brėžinyje Nr. 0244-02-TP-SD-BR2, numatyta ties PK12+04 augančią liepą pašalinti, kadangi ji patenka į naujai rengiamo šaligatvio konstrukciją.

2020-05-28 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija priėmė sprendimą (2020-05-28 posėdžio protokolas Nr. LK-142), kuriuo leido pašalinti liepą, sumokant atkuriamąją vertę 396,00 eurų.

2020-06-11 raštu Nr. SDKL-133 rangovas informavo, kad sprendimas leisti kirsti medžius, tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę, įsigaliojo 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 pakeitus 2008 m. sausio 31 d. LR AM įsakymą Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. po to, kai rangovas pateikė pasiūlymą darbų atlikimui (2019-04-03), ir pasirašė rangos sutartį (2019-05-14), todėl šių aplinkybių numatyti ir šių darbų įsivertinti negalėjo.

Vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, medžius kirsti draudžiama intensyviausiu paukščių veisimosi laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Statybietę Užsakovas Rangovui perdavė 2020-05-05, todėl, norėdamas nukirsti medį, Rangovas privalėjo kreiptis į ekspertą-ornitologą, kuris pateikė vertinimo išvadą, kad Laisvės g. (PK12+04) numatytame šalinti medyje „*lizdų, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos*“.

Komisija, įvertinusi situaciją objekte, susipažinusi su pirkimo ir projektine dokumentacija, norminių dokumentų reikalavimais, atsižvelgdama į Užsakovo pritarimą 2020-06-16 raštu Nr. AS-2656, patvirtina, kad, būtina rangovui apmokėti už papildomus darbus, kurių pirkimo metu numatyti ir įsivertinti negalėjo:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
2 Kiti darbai				
1		Ornitologiniai želdynų vertinimas	vnt.	1,000
2		Medžių atkuriamoji vertė	vnt.	1,000

Papildomų darbų vertė – 441,00 Eur be PVM

Bendra papildomų darbų vertė – 1 795,08 Eur be PVM.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 156,87 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. 2020-05-14 Užsakovo raštas Nr. AS-2068, 1 lapas;
2. UAB „Plentprojektas“ raštas Nr. 020/318, 2 lapai;
3. Ištraukos iš techninio ir darbo projekto brėžinių, 6 lapai
4. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-133, 3 lapai;
5. Leidimas saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. LŽ-142, 1 lapas;
6. 2020-06-16 Užsakovo raštas Nr. AS-2656, 1 lapas;
7. 2020-06-22 ornitologinio vertinimo išvada, 2 lapai;
8. Leidimas saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. LŽ-16, 1 lapas;
9. Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 4 lapai.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktorius


.....
(parašas, data) 2020-07-16

Artūras Valys

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-05-14 Nr. 15-2068
I Nr. _____

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai, nuvykę į objektą, pastebėjo, kad prie gyvenamųjų namų kiemų (Rietavo g. 31, 25, 22 ir 14) pagal projektą turi būti žalioji zona, tačiau, atlikus darbus, nuo tako ribos iki sklypo ribos lieka tik nuo 15 cm iki 30 cm pločio. Prašome projektuotojo pateikti projektinį sprendinį ir darbų kiekius, panaikinant žaliąją zoną, ir jos vietoje suprojektuoti trinkelį dangą, kad būtų sklandžiai suvedami aukščiau tarp gyventojų kiemų ir naujai įrengiamo tako, kad ir ateityje būtų išvengta gyventojų nusiskundimų ir žaliųjų zonų priežiūros.

Taip pat prašome projektuotojo pateikti projektinį sprendinį ir kiekius, praplatinant nuovažą iki 1 metro PK 2+20, sujungiant nuovažą su asfalto danga, nes, atlikus darbus, esama asfalto danga sklandžiai nesusijungia su naujai projektuojama nuovaža.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



Plungės rajono savivaldybės administracija

2020-05-20 Nr. 020/318

UAB „Plungės lagūna“

Į 2020-05-14

Originalas siunčiamas nebus

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui

AB „Eurovia Lietuva“

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) informavo, kad prie gyvenamųjų namų kiemų (Rietavo g. 31, 25, 22 ir 14) pagal projektą turi būti žalioji zona, tačiau, atlikus darbus, nuo tako ribos iki sklypo ribos lieka tik nuo 15 cm iki 30 cm pločio. Taip pat prašoma projektuotojo pateikti projekcinį sprendinį ir kiekius, praplatinant nuovažą iki 1 metro PK 2+20, sujungiant nuovažą su asfalto danga, nes, atlikus darbus, esama asfalto danga sklandžiai nesusijungia su naujai projektuojama nuovaža.

Užsakovo prašymu teikiame brėžinį ir papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį.

Pridedama:

1. Dangų ir eismo organizavimo planas – 1 lapas;
2. Papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas


Aivaras Vilkelis


PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Iškasos, gruntas išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (10% darbų atliekami rankomis)	m ³	15
2.	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, $k \geq 1,5 \times 10 \text{ m/s}^{-5}$	m ³	6
3.	Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15	m ²	37
4.	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m	m ²	37
5.	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x60) įrengimas	m ²	34
6.	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x80) įrengimas	m ²	3


NEVYKDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Dirvožemio užpylimas ir užsėjimas veja h=0,10 m	m ²	37


Atestato Nr.	 „PLENTRPROJEKTAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas <i>I ir II etapas</i>		Laida
							A
30410	PV	A.Vilkelis		2020-06	0368 – DP – S	Lapas	Lapų
25887	PDV	A.Vilkelis		2020-06			
						1	1

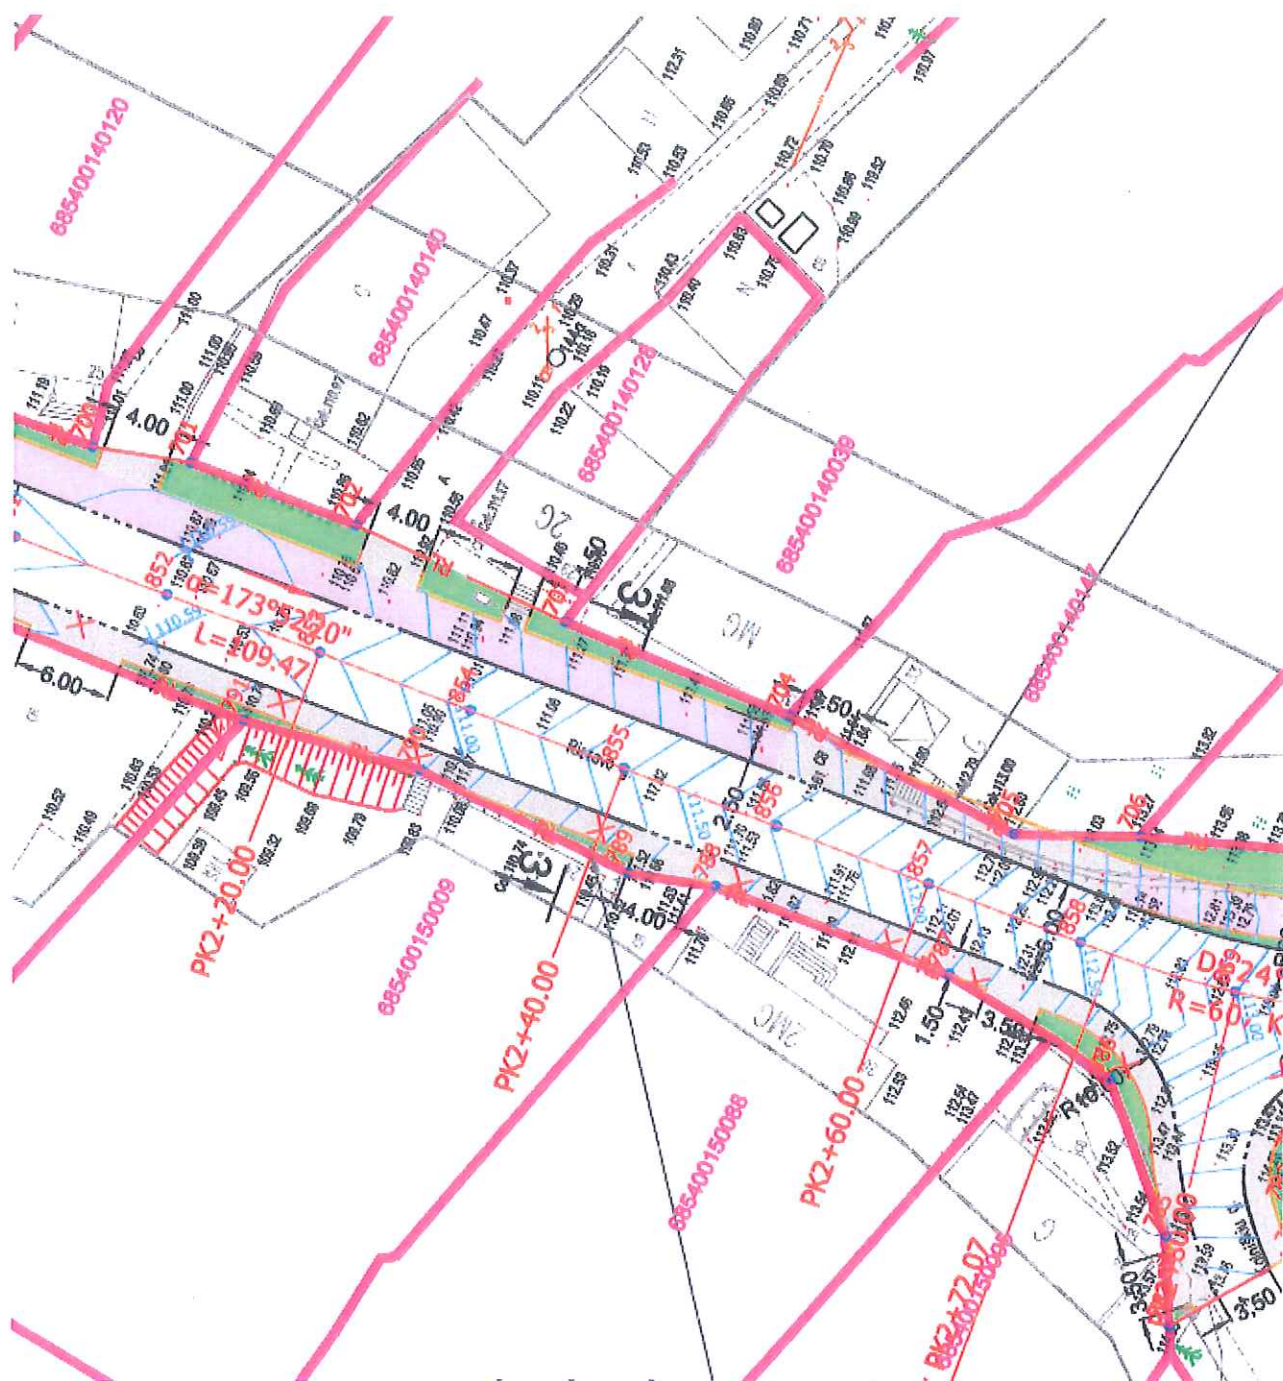


Iš brėž. 0244-03-TP-SD-BR3

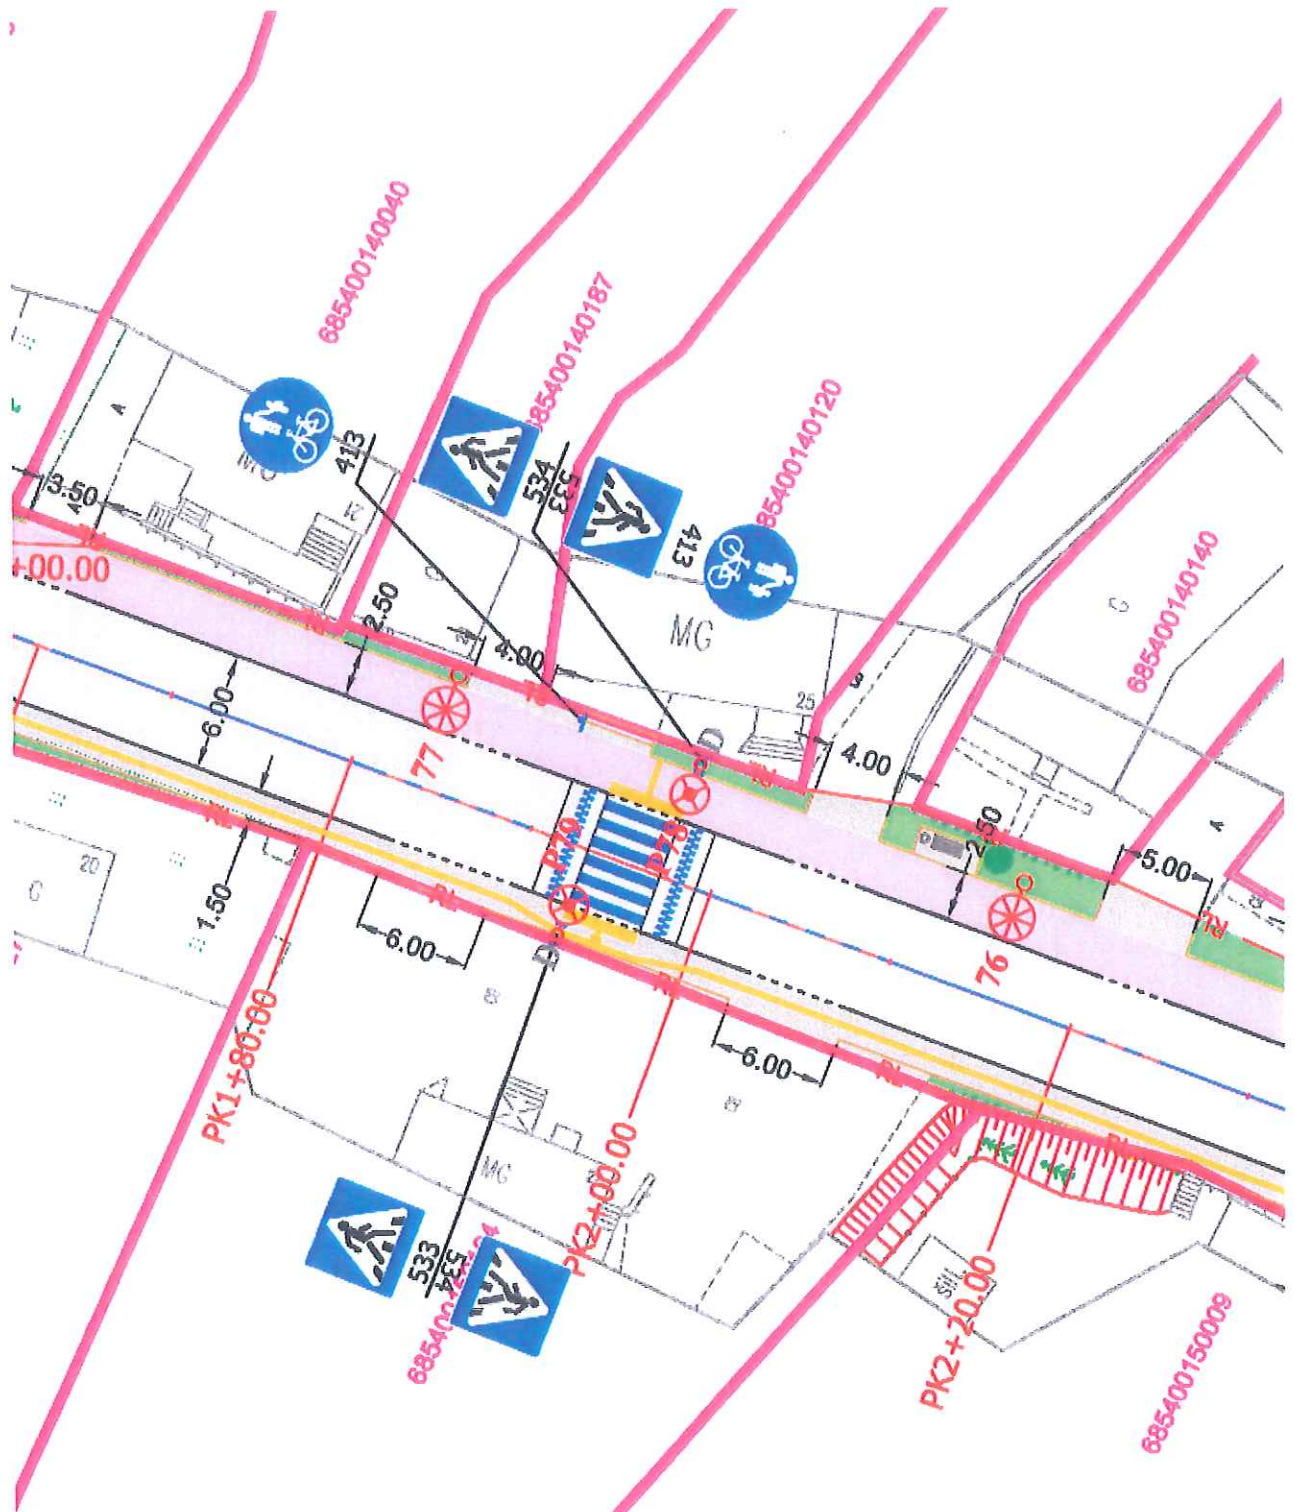

Iš brėžinio 0370-03-DP-SD-BR4 Laida A

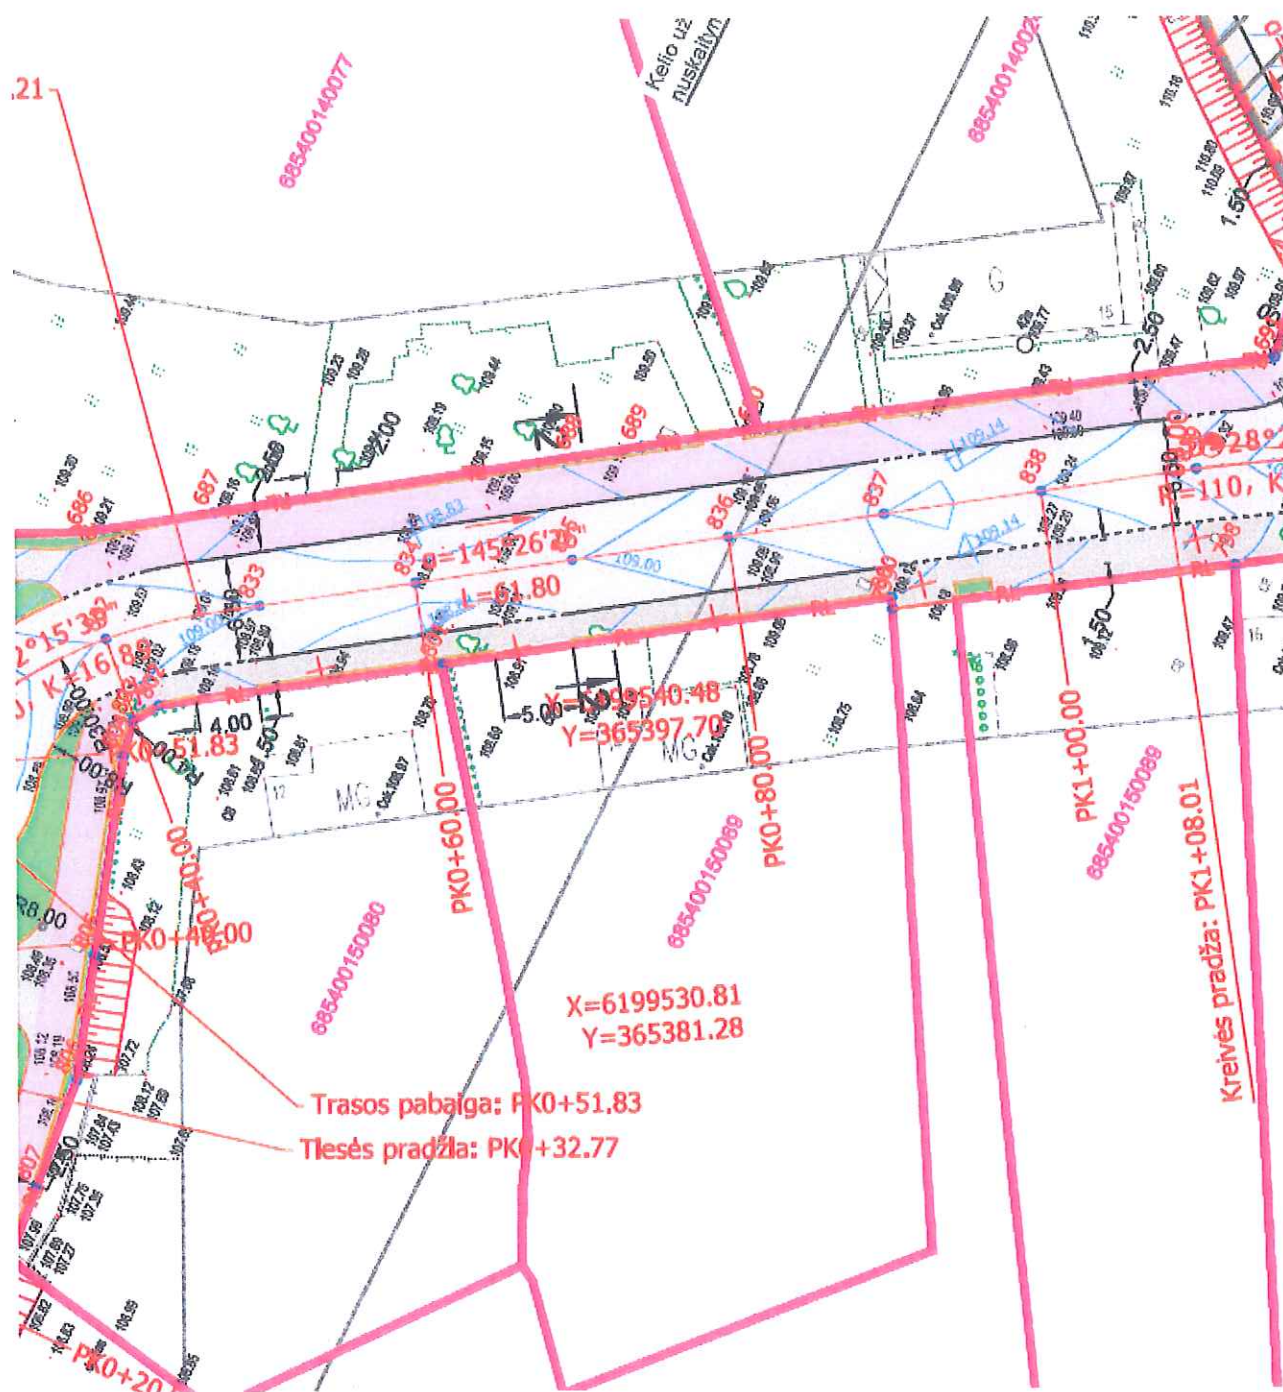

Iš brėž. 0244-03-TP-SD-BR3

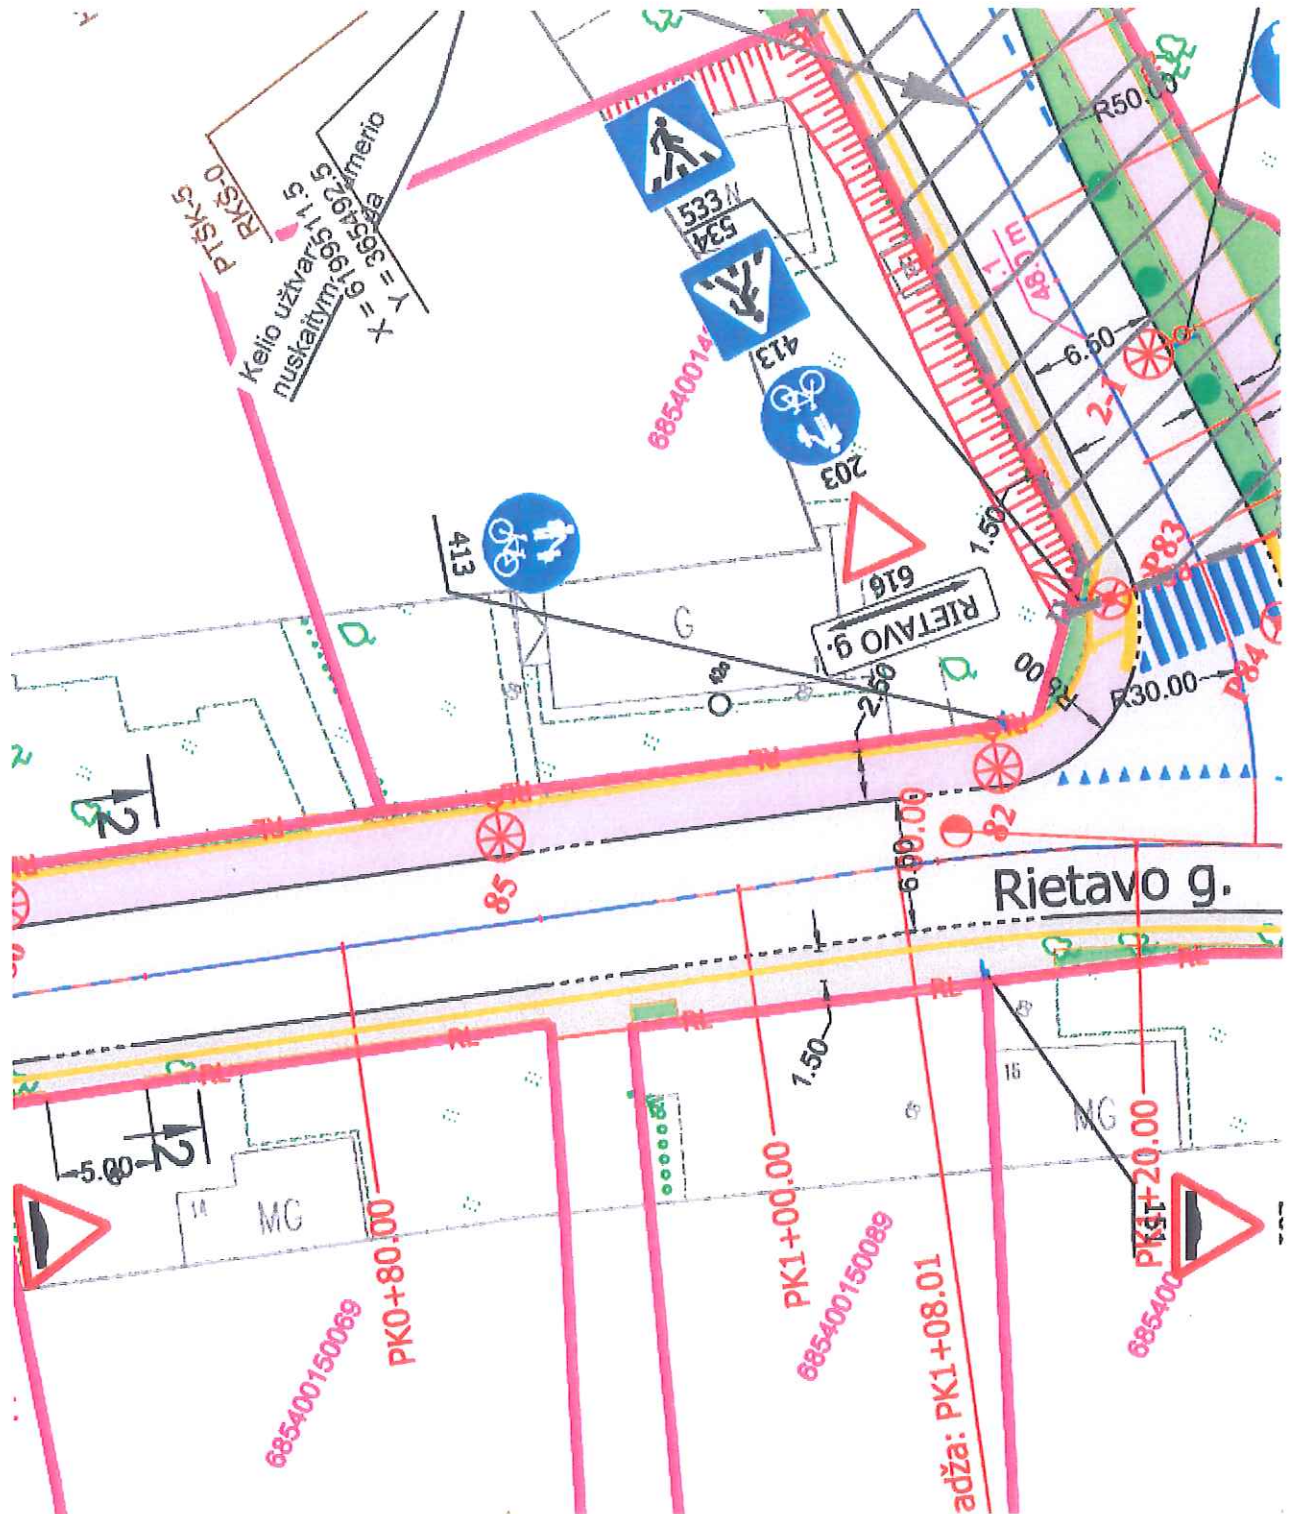



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-06-11 Nr. SDKL-133

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL MEDŽIO LAISVĖS G. ŠALINIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

Rangovas šiuo metu vykdo Laisvės g. rekonstravimo darbus. Projekte numatyta pašalinti į darbų zoną patenkanti medį (liepą), dėl kurio kirtimo buvo kreiptasi į Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją.

2020-05-28 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija surašė posėdžio protokolą Nr. LK-142, kuriuo leido pašalinti liepą, sumokant atkuriamąją vertę.

Atsižvelgdami į tai, kad rangovas pasiūlymą darbų atlikimui teikė 2019-04-03, rangos sutartis pasirašyta 2019-05-14, o sprendimas leisti kirsti medžius, tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę, įsigaliojo 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 pakeitus 2008 m. sausio 31 d. LR AM įsakymą Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prašome Užsakovą apmokėti už liepos šalinimą 396,00 eurų sumą, kadangi pasiūlymo teikimo metu šių aplinkybių numatyti negalėjome.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Telšių gatvės rekonstravimo projekte numatyta šalinti 38 medžius, kurių šalinimo kaštų rangovas pasiūlymo teikimo metu taip pat negalėjo įsivertinti.

Papildomai informuojame, kad 2020-06-09 raštu Nr. (7.2E)2E-5704 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateikė LR Aplinkos ministerijos išaiškinimą, kada savivaldybės tarnautojas ar prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros komisija neturėtų skaičiuoti numatomų kirsti (šalinti) saugotinių medžių ir krūmų atkuriamosios vertės.

Atsižvelgdami į tai, kad projektas dalinai finansuojamas Kelių direkcijos lėšomis bei vienas iš projekto tikslų yra eismo saugumo priemonių didinimas, siūlome pasitikslinti, ar šiam projektui neturėtų būti taikomos šios sąlygos, t. y. medžiai kertami neatlygintinai, tuo labiau, kad projekto apimtyse numatyta pasodinti daugiau medžių, nei šalinti.

PRIDEDAMA: 2020-06-09 raštas Nr. (7.2E)2E-5704, 2 lapai.

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas

Žilvinas Babarskis





GAUTA
2020 m. 06 mėn. 10 d.
Nr. 2020-06-08

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Adresatams pagal sąrašą

2020-06-08 Nr. (7.2E) 2E- 5704
I _____ Nr. _____

DĖL GAUTO IŠAIŠKINIMO

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) 2020 m. birželio 5 d. gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštą Nr. (65)-D8(E)-3037, kuriuo išaiškinama, kada savivaldybės tarnautojas ar prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros komisija neturėtų skaičiuoti numatomų kirsti (šalinti) saugotinių medžių ir krūmų atkuriamosios vertės.

Prašome vadovautis gautu išaiškinimu įgyvendinant projektus rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų sutarčių su Kelių direkcija pagrindu.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-06-05 raštas Nr. (65)-D8(E)-3037 dėl teisės aktų taikymo, 2 lapai.

Administravimo departamento direktorius,
atliekantis Transporto infrastruktūros statybos
ir priežiūros departamento direktoriaus
funkcijas

Remigijus Lipkevičius

I. Dikčienė, tel. (8 5) 232 9631, el. p. inga.dikciene@lakd.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos

2020- - Nr.
I 2020-05-19 Nr. 2E-4712

Kopija
Lietuvos savivaldybių asociacijai

DĖL TEISĖS AKTŲ TAIKymo

Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020 m. gegužės-19 d. raštą Nr. 2E-4712, mano, kad, vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 5.10 papunkčiu, *saugotini medžiai ir krūmai, augantys valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinkantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše*, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, *nurodytus kriterijus, gali būti kertami (šalinami) neatlyginamai, o savivaldybės tarnautojas ar prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vadovaudamasi Aprašo 12 punktu, neturėtų skaičiuoti tokių numatomų kirsti (šalinti) saugotinių medžių ir krūmų atkuriamosios vertės.*

Aplinkos viceministras

Marius Narmontas

M. Žolynas, 8 5 278 6569, el. p. mindaugas.zolynas@am.lt



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PLUNGĖS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2020 m. gegužės 28 d. Nr. LK-142

Plungė

DARBOTVARKĖ. Želdinių tvarkymo Plungės miesto seniūnijoje svarstymas.

1. **SVARSTYTA.** 2020-05-25 gautas įmonės UAB „Plungės Lagūna“ darbų vykdytojo Ernesto Tkačiovo prašymas dėl leidimo šalinti liepą ir krūmus augančius įgyvendinamo projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ teritorijoje, Laisvės gatvėje. Želdinius reikalinga pašalinti, nes trukdo vykdyti projekto darbus. Komisija apžiūrėjo nurodytas vietas ir vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA.

1. Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (2020-01-08 redakcija) „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –Tvarka) liepa (33 cm skersmens) neatitinka tvarkos 5 punkte nurodytiems atvejams, kai saugotinus medžius galima kirsti neatlygintinai. Leisti pašalinti liepą augančią Laisvės g. (PK12+04), tik prieš tai sumokėjus želdinių atkuriamąją vertę 396,00 eurų. Želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintais įkainiais (2016-02-02 redakcija). Medžių atkuriamoji vertė, pateikus prašymą, gali būti patikslinta medį nukirtus dėl aptikto kamieno puvinio.

2. Vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., kitu atveju turi būti pateikiama eksperto-ornitologo pažyma, kad kertamame medyje nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

3. Vadovaujantis LR vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miško paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ krūmai (tujos), augantys valstybinėje žemėje, šalia Laisvės g. 27, 29, 31, 33 namų, neatitinka nustatytų kriterijų, todėl leidimas pašalinti nereikalingas.

4. Leidimas šalinti saugotinus medžius bus išduotas tik, kai bus pravestos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą LT454010043000010043, esančią Luminor Bank, AB ir pateiktas mokėjimo išrašas.

Komisijos pirmininkė

Roberta Jakumienė

Komisijos sekretorius

Sonata Serapinienė

Komisijos narys

Kristina Petrulevičienė

Kopija sukurta
Specialiste Sonata Serapinienė

2020 m. gegužės 29 d.

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-06-16

Nr.

A5-2656
SDKL-133/AG-

| 2019-06-11

Nr. 3900

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL MEDŽIO LAISVĖS GATVĖJE ŠALINIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. birželio 11 d. raštą Nr. SDKL-133/AG-3900 ir informuoja, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės administracija apmokės kertamo medžio atkuriamąją vertę. Administracija įpareigoja techninės priežiūros vadovą dėl kertamo medžio įforminti darbų pakeitimą. Be to, tęsiant „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ projekto darbus, Administracija įpareigoja techninės priežiūros vadovą visų likusių kertamų medžių atkuriamąją vertę įforminti darbų pakeitimu.

Į Jūsų persiūtą LR aplinkos ministerijos 2020-05-06 raštą Nr. (65)-D8(E)-3037 „Dėl teisės aktų taikymo“ teikiame pastabą, kad Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (2020-01-08 redakcija) „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 5.10 punktu, neskaičiuoja medžių atkuriamosios vertės valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje. Rekonstruojamos Laisvės ir Telšių gatvės yra priskiriamos miestų gatvėms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams“ priedo 10 punktu, miestų, miestelių gatvėse didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai, matuojant 1,3 m aukštyje, priskiriami saugotiniams. Pažymime, kad Komisija saugotinių medžių atkuriamosios vertės gali neskaičiuoti tik Tvarkos 5 punkte numatytais atvejais.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Roberta Jakumienė, tel. (8 448) 73 004, el. paštas Roberta.jakumiene@plunge.lt
Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“

ORNITOLOGINIO VERTINIMO IŠVADA PAGAL UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ UŽSAKYMĄ
SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO,
GENĖJIMO DARBAMS LAISVĖS G. 3, PLUNGĖJE

2020-06-22

Plungė

Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija), 3 skyriaus 21 punktu, prieš atliekant želdynų tvarkymo darbus numatytas būtinas saugotinių medžių ornitologinis vertinimas ir ornitologo išvada.

Numatyto želdynų tvarkymo objekto ornitologinį vertinimą atliko UAB „Ornitostogos“ kvalifikuoti ornitologai pagal UAB „Plungės lagūna“ užsakymą saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Ornitologinis medžių ir krūmų vertinimas Laisvės g. 3, Plungėje, buvo atliktas 2020 m. birželio 19 d., apsilankymo metu buvo įvertinta 1 liepa. **Patikrinimo metu lizdų, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos.**

Rekomenduojame paukščių perėjimo metu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. visus želdynų tvarkymo darbus, jei tai įmanoma, vykdyti nemotorinėmis priemonėmis, siekiant kuo labiau sumažinti galimą trikdymą gretimuose medžiuose perintiems paukščiams.

UAB „Ornitostogos“ direktorius

Marius Karlonas





SĄSKAITA-FAKTŪRA (INVOICE)

Serija (Invoice No.) ORN 021/76
Data (Invoice Date) 2020-06-22

Apmokėjimo terminas (Payment terms): 10 dienų (10 days)

Customer	UAB "Plungės lagūna"	Seller	UAB „Ornitostogos“
Legal entity's code	169901489	Legal entity's code	305010841
VAT code	LT699014811	VAT code	-
Address	Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas	Address	Paramėlis 6, LT-65273, Varėna district, Lithuania
Phone		Bank account number (IBAN)	LT784010051004696314
E-mail	tomas@plungeslaguna.lt	Bank	AB Luminor bank
		Bank address	Konstitucijos pr. 21 A, 03601, Vilnius
		Bank Code	40100
		SWIFT (BIC) Code	AGBLT2X

Paslaugų pavadinimas (Description of services)	Mato vnt. (Unit of measure)	Kiekis (Quantity)	Vieneto kaina (Unit price), Eur	Suma (Price), Eur
Ornitologinis želdynų vertinimas Plungėje	vnt. (unit)	1	45,00	45,00
Viso suma (Subtotal sum), Eur				45,00
PVM (VAT) 0 (%)				
BENDRA SUMA (TOTAL), EUR				45,00

Suma žodžiais (Amount in words): keturiasdešimt penki Eur, 00 ct

Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo
1 priedas

Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnija
(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

2020-07-01 Nr. LŽ-16

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Leidžiama pagal pateiktą prašymą UAB „Plungės Lagūna“ I. k. 169901489
Plungės g. 28, Rietavas

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

adresas, telefono numeris)

žemės sklype (PK12+04) Laisvės g., Plungėje

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

Pašalinti liepa, vadovaujantis Tvarkos 9 punktu. Darbus atlikti savo jėgomis ir prisiimant atsakomybę už galimas pasekmes.

kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., kitu atveju turi būti pateikta eksperto-ornitologo pažyma, kad kertamame medyje nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

(terminai, ribojantys darbus)

liepa

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys*)

33;

(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

1 vnt.

(medžių ir krūmų kiekis)

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė trys šimtai devyniasdešimt šeši (žodžiais) 396 Eur;

Leidimas saugotinius medžius ir krūmus kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, galioja neturimi nuotai; leidimas saugotiniams medžiams ir krūmams genėti galioja vienam genėjimui atlikti.



(Leidimą išduodantis tarnautojo pareigų pavadinimas)

SUDERINTA

(saugomos teritorijos direkcijos atstovo pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė, parašas)

(parašas)

Dangirutė Jurkuvienė

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

Priedas Nr. 9

TVIRTINU: _____

Vykdomeis direktorius
Povilas Batavičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 1 638,44 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Žemės sankasa						
5		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,014	1 385,67	18,71
6		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1 m k9=1.15	100m3	0,015	1 509,52	22,64
7		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 15.00 km)	t. m3	0,015	6 653,13	99,80
8		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,015	165,64	2,48
10		Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,037	637,14	23,57
Skyriuje 2						167,20
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
9		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,06	1 606,96	96,42
14		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,37	729,01	269,73
15		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,37	272,79	100,93
16		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,34	1 923,49	653,99
17		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,03	2 193,76	65,81
Skyriuje 3						1 186,88
Žiniaraštyje 1						1 354,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						284,36
Iš viso žiniaraštyje 1						1 638,44

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.


 Vykdomasis direktorius
 Povilas Batavičius
LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"**Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje****Statiny 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24****Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Papildomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui		
				Kiekis	533,61 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		2 Kiti darbai				
1		Ornitologiniai želdynų vertinimas	vnt	1,000	45,00	45,00
2		Medžių atkuriamoji vertė	vnt	1,000	396,00	396,00
		Skyriuje 2				441,00
		Žiniaraštyje				441,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				92,61
		Iš viso žiniaraštyje				533,61


 Projekto valdymo vadovė
 Rimta Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinys **64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17**Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Nevykdomi darbai**Suma žiniaraščiui **189,81 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 Baigiamieji darbai						
1		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	0,37	406,09	150,25
2		Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,37	17,90	6,62
Skyriuje 3						156,87
žiniaraštyje 1						156,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						32,94
Iš viso žiniaraštyje 1						189,81

Projektų valdymo vadovė
 Vilma Šimkūnaitė
