

Projekto pavadinimas:

Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Girėnų kaimo Ryto g. Nr. Gir-12 kapitalinio remonto darbai

Rangos sutartis: 2022-06-17, Nr. VPS-114

Objektas:

Šakių r. sav. Šakių sen. Girėnų k. Ryto g. Nr. Gir-12 kapitalinio remonto darbai

Data: 2024 m. birželio mėn 06 d

Darbų pakeitimo aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo- Šakių r. savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo

Martyno Remeikio,

Techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros,

Projekto vadovo Andriaus Gegužio,

Rangovo atstovo – UAB „Hidrokesta“ direktoriaus Valdo Savukaičio;

1. Remiantis susirinkimo, įvykusio 2024-06-03 d protokolu Nr. 1, dėl:

1.1. Dėl papildomų darbų atlikimo įrengiant pralaidas nuvažose ties Pk 0 +63 kairėje pusėje, Pk 0+ 75 dešinėje pusėje, Pk 0+ 87 kairėje pusėje, Pk 1+ 30 kairėje pusėje, Pk1+ 70 dešinėje pusėje, Pk 2+ 55 kairėje pusėje, taip pat esamos nuvažos prailginimo ties Pk 2+ 40 dešinėje pusėje. Papildomos nuvažos į laukus su pralaida įrengimo tie Pk. 3+60 kairėje pusėje .

Komisija siūlo:

1. Įrengti vandens pralaidas nuvažose ties Pk 0+ 63 kairėje pusėje, Pk 0+ 75 dešinėje pusėje, Pk 0+ 87 kairėje pusėje, Pk 1+ 30 kairėje pusėje, Pk 1+ 70 dešinėje pusėje, Pk 2 +55 kairėje pusėje, taip pat prailginti esamą nuvažą į kiemą ties Pk 2+ 40 dešinėje pusėje. Pk 3+ 60 kairėje pusėje įrengti papildomą nuvažą su pralaida įvažiavimui į laukus.

Priedai:

1. Protokolas Nr.1, 2024-06-03
2. Kainos skaičiavimas lok. sąm. Nr. 15-1
3. Situacijos schema

Papildomų darbų vertė be PVM: -9122,06 Eur

Nevykdomų darbų vertė be PVM: - 0,00 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė be PVM: - 9122,06Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė pagal kainos skaičiavimus :

Bendra papildomų darbų vertė, su PVM: -11037,69 Eur

Bendra nevykdomų darbų vertė su PVM: - 0,00 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė su PVM: - 11037,69 Eur

Komisija:

Užsakovo atstovas

Techninės priežiūros vadovas

Projekto vadovas

Rangovo atstovas

SUDERINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus
Vedėjas

Martynas Remeikis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 11.03.2024 TUKS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 15-1 Susisiekimo komunikacijų paskirties Ryto g. (Gir-12) Girėnų k., Šakių sen. Šakių r. sav. kapitalinis remontas

Statiny 1 PAPILDOMI DARBAI (I kainiai konkursiniai)

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

2024.06.03

Suma žiniaraščiui 11037.69 EUR

Sąm. el.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Nuovažų įrengimas						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	42,68	16,65	710,62
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,47	797,51	1172,34
3	H16K-141	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg.,iš A/B miš.0/16-VN	100 m2	1,18	1615,29	1906,04
4	N57P-3307	Kelkraščio dangos įrengimas iš dolomitinės skaldos (85%) ir augalinio grunto (15% su žolių sėklomis) mišinio 0/22, h-5cm	100m2	0,13	767,92	99,83
5	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	5,42	38,41	208,18
6	N23P-0104	PP 300mm skersmens pralaidos įrengimas iki 1,0m gylyje	m	55,0	34,63	1904,65
7	N23-234	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant	m3	23,18	17,69	410,05
8	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt	10,0	129,45	1294,5
9	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	100m2	9,82	144,18	1415,85
		Skyriuje 2				9122,06
		Žiniaraštyje 1				9122,06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1915,63
		Iš viso žiniaraštyje 1				11037,69

Sudarė :

/Pavardė/

Projekto pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Girėnų k. Ryto g. Nr. Gir-12 kapitalinio remonto darbai

Rangos sutartis: 2022-06-17 Nr. VPS-114

PROTOKOLAS Nr. 1

2024 m. birželio mėn. 03 d.
Šakių rajonas

Dėl papildomų darbų atlikimo, vykdanč sutartį „Šakių r. sav. Šakių sen. Girėnų k. Ryto g. Nr. Gir-12 kapitalinio remonto darbai

DALYVIAI:

1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis,
2. Techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra,
3. Projekto vadovas Andrius Gegužis
4. UAB „Hidrokesta“ atstovas Valdas Savukaitis.

DARBOTVARKĖ:

Dėl papildomų darbų Užsakovo pageidavimu.

1. SVARSTYTA.

1. UAB „Hidrokesta“ atstovas informavo, kad Užsakovo pageidavimu reikalinga įrengti vandens pralaidas nuvažose ties Pk 0+63 kairėje pusėje, Pk 0+75 dešinėje pusėje, Pk 0+87 kairėje pusėje, Pk 1+30 kairėje pusėje, Pk 1+70 dešinėje pusėje, Pk. 2+55 kairėje pusėje, taip pat prailginti esamą nuvažą į kiemą ties Pk 2+40 dešinėje pusėje. Pk 3+60 kairėje pusėje įrengti papildomai nuvažą su pralaida į laukus. Minėti darbai parengtame projekte nebuvo numatyti.


NUTARTA.

1. Pritarti vandens pralaidų įrengimui nuvažose ties Pk 0+63 kairėje pusėje, Pk. 0+75 dešinėje pusėje, Pk +87 kairėje pusėje, Pk 1+30 kairėje pusėje, Pk 1+70 dešinėje pusėje, Pk 2+55 kairėje pusėje, taip pat prailginti esamą nuvažą į kiemą ties Pk 2+40 dešinėje pusėje, kad galėtų į ten įvažiuoti sunkiasvorė technika. Pk 3+60 kairėje pusėje įrengti papildomai nuvažą su pralaida, įvažiavimui į laukus.

2. Paveisti UAB „Hidrokesta“ pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijai darbų sammatinius skaičiavimus. Projekto vadovui A. Gegužiui išleisti projekto A laidą.

Dalyviai:	Parašas	Data
Martynas Remeikis		
Andrejus Ūdra		
Andrius Gegužis		
Valdas Savukaitis		



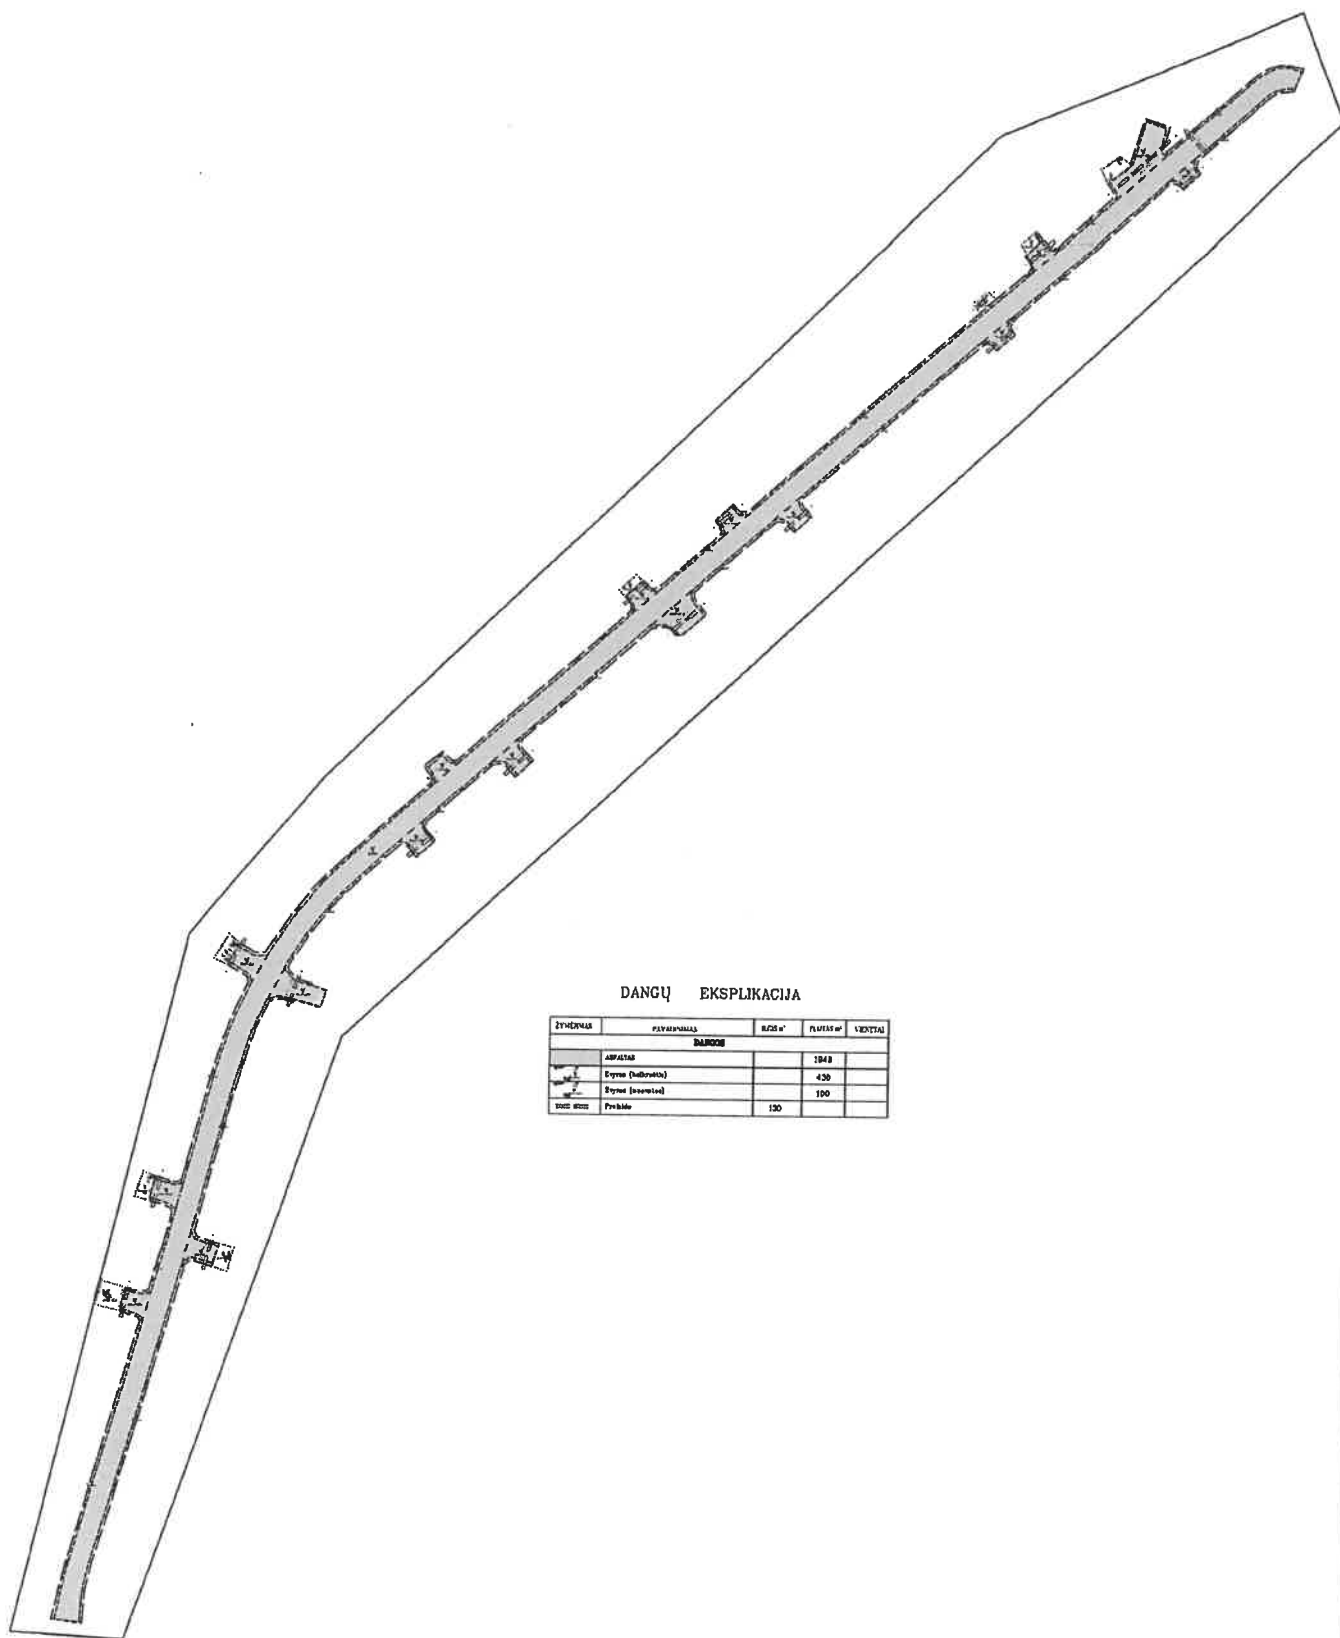

DANGŲ EKSPLIKACIJA

ŽYDINIMAS	PAVIRŠIAUS	RUŠIS	PLAUTAS	VENTILAS
DANGŲ				
1	asfaltas		1048	
2	lygis (asfaltas)		430	
3	lygis (asfaltas)		100	
4	lygis	100		

