



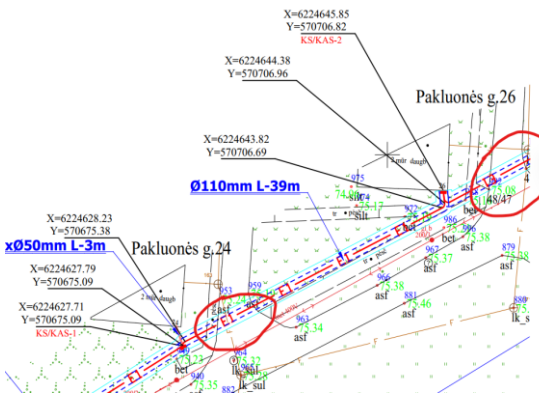
DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO


Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-ESO-1335) 0,4 kV OL L-200 iš Pp-310 rekonstravimo (Panevėžio reg., Biržų raj.), darbų pirkime.

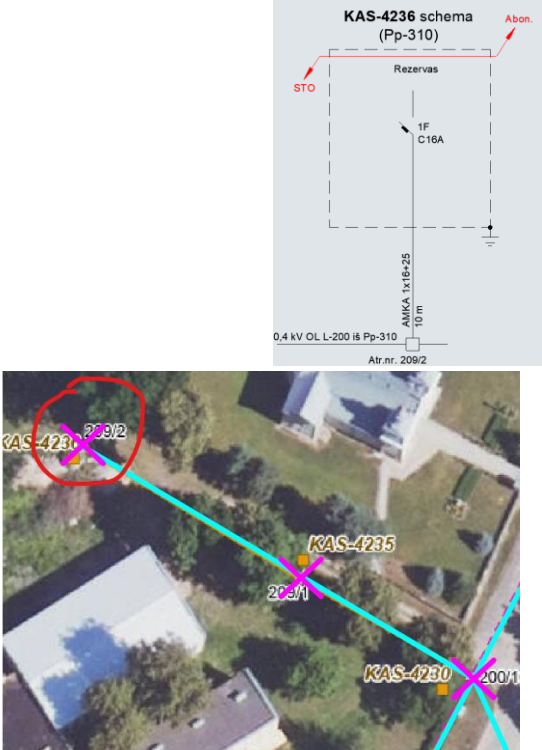

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai
1.	Kita	2. Aiškinamasis raštas. Projekto pritarimų lentelė	Ar projektas suderintas su Via Lietuva ir yra pasirašytas priedas?	Projektas suderintas su Via Lietuva ir yra pasirašytas priedas.
2.	Kita	4.1 Principinė schema. 3 lapas 4.2 Trasų planas 3 lapas	Trasų plano 3 lape numatoma suprojektuoti KAS-24, tačiau principinėje schemoje šios spintos nėra. 	Pridedame papildytą principinę schemą su KAS-24.
3.	Kita	4.1 Principinė schema. 3 lapas 5. Žiniaraštis	KAS-23 turėtų būti tranzitinė (KS/KAS-23), kuri užmaitintų praleistą KAS-24 nuo KSB. Tikslinti kabelių skerspjūvius KAS-23 bei KAS-24 pajungimui ir movų kiekius.	Pridedame papildytą principinę schemą, žiniaraštį, SDKŽ ir Sutarties SD (pakoreguotas Teikiamų medžiagų sąrašas).

			<p>Projektuojama KAS-23 (Pp-309)</p> <p>$P_1=14$ kVA $U_1=10$ kV $U_2=0.4$ kV $I_n=20$ A</p>	
4.	Kita	5. Žiniaraštis	<p>Įtraukti medžiagas, reikalingas KAS-24 pajungimui nuo KAS-23, į kabelių montavimo lentelę, medžiagų bei darbų žiniaraščius. Tikslinti projektuojamų spintų kiekį.</p>	<p>Pridedame pakoreguotą medžiagų žiniaraštį. Pridedame papildytą principinę schemą, žiniaraštį, SDKŽ ir Sutarties SD (pakoreguotas Teikiamų medžiagų sąrašas).</p>
5.	Kita	<p>4.1 Principinė schema 1 Lapas</p> <p>5. Žiniaraštis</p>	<p>KS/KAS-2 numatyta 8 apskaitų. Pagal tipines schemas ir AB ESO 2.4 techninius reikalavimus bei ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, elektros apskaitos prietaisų spintoje gali būti 6, nebent atskiru projektu sprendimu gali būti gaminamos su daugiau kaip 6 apskaitom. Prašome patvirtinti, kad ESO priims į eksploataciją tokią spintą arba pakoreguoti projekto sprendinius.</p> <p>Projektuojama KS/KAS-2 (Pp-310)</p> <p>$P_1=129$ kVA $U_1=10$ kV $U_2=0.4$ kV $I_n=20$ A</p>	<p>Patvirtiname, kad ESO priims į eksploataciją tokią spintą su 8 apskaitom.</p>
6.	Kita	<p>5. Žiniaraštis 2 Lapas</p> <p>4.1 Principinė schema 1 Lapas</p>	<p>Principinėje schemoje į KS/KAS-2 perjungiamo 7 vartotojus, bet KML nurodyti 8 vartotojai. Vartotojų sąrašė taip pat randame 7 vartotojus. Prašome pakoreguoti kabelių montavimo lentelę, medžiagų bei darbų žiniaraščius.</p>	<p>Pridedame papildytą principinę schemą, žiniaraštį su KL montavimo lentele, SDKŽ ir Sutarties SD (pakoreguotas Teikiamų medžiagų sąrašas).</p>
7.	Kita	<p>4.1 Principinė schema 1 Lapas</p> <p>5. Žiniaraštis</p>	<p>KS/KAS-6 numatyta 11 apskaitų. Pagal tipines schemas ir AB ESO 2.4 techninius reikalavimus bei ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, elektros apskaitos prietaisų</p>	<p>Patvirtiname, kad ESO priims į eksploataciją tokią spintą su 11 apskaitų.</p>

			<p>spintoje gali būti 6, nebent atskiru projektiniu sprendimu gali būti gaminamos su daugiau kaip 6 apskaitom. Prašome patvirtinti, kad ESO priims į eksploataciją tokią spintą arba pakoreguoti projekto sprendinius.</p> 	
8.	Kita	<p>4.2 Trasų planas 7 lapas</p> <p>5. Žiniaraštis</p>	<p>Ar nereikėtų numatyti uždary pradūrimų po asfaltuotais keliais tarp KS/KAS-1 - KS/KAS-2 bei KS/KAS-2 - KS/KAS-3? Jeigu taip, tai reikėtų įtraukti uždarus pradūrimus į kabelių montavimo lentelę, medžiagas bei darbus.</p> 	<p>Čia įvažiavimas į negyvenamus daugiabučius, kelio danga prastos būklės, nėra ko pažeisti, todėl uždaru būdu kabeliai neklojami. Sprendiniai suderinti su kelininku.</p>

9.	Kita	<p>4.1 Principinė schema 2 Lapas</p> <p>4.2 Trasų planas 4 Lapas</p> <p>5. Žiniaraštis</p>	<p>KS/KAS-12 numatyta perjungti 19 ir 17 namus, bet 17 namas apleistas, nesimato jokio atvesto įvado bei nėra vartotojų sąrašo. Ar reikalingas jam įvadas? Jeigu ne, tai reikėtų koreguoti KML, el. schemą, medžiagų bei darbų žiniaraščius.</p> 	<p>KS/KAS-12 palikta rezervinė vieta, jeigu sklypo savininkas norės jungtis prie tinklo.</p>
10.	Kita	<p>4.1 Principinė schema 4 Lapas</p> <p>4.2 Trasų planas 4 Lapas</p> <p>4.3 Demontavimo schema</p> <p>5. Žiniaraštis</p>	<p>209/2 atramoje yra sumontuota spinta KAS-4236 su rezervine vieta apskaitai. Demontavimo scheme numatytas šios atramos demontavimas, bet nenumatytas apskaitos spintos pajungimas. Ar nereikėtų numatyti spintos KAS-4236 pajungimo nuo proj. KAS-15? Jeigu taip – tikslinti tranzitinių ir galinių spintų kiekius, kabelių skerspjūvius ir movų kiekius.</p>	<p>KAS-4236 yra tuščias ir pakabintas ant atramos, KAS-15 pakoregavome į dviejų apskaitų ir palikome rezervinę vietą, jeigu kažkada norės jungtis prie tinklo.</p> <p>Pridedame koreguotą principinę schemą, žiniaraštį, SDKŽ ir Sutarties SD (pakoreguotas Teikiamų medžiagų sąrašas).</p>

				
11.	Kita	<p>5. Žiniaraštis</p> <p>2. Aiškinamasis raštas</p>	Projekto bendrųjų rodiklių kiekiai nesutampa su kabelių montavimo lentelės kiekiais.	Pridedame koreguotą Bendrųjų rodiklių lentelę ir koreguotą žiniaraštį.
12.	Kita	<p>5. Žiniaraštis</p> <p>4.3 Demontavimo schema</p> <p>2. Aiškinamasis raštas 9 Lapas</p>	<p>Demontavimo schemoje parodyta, kad reikia demontuoti visas L-200 atramas, tačiau aiškinamojo rašto 9 lapo Biržų raj. savivaldybės priede numatyta, kad beveik visos atramos su atšakomis bus perimtos į savivaldybės balansą. Kuriuo dokumentu remiantis bus vykdomi demontavimo darbai?</p> <p>Tikslinti demontuojamų atramų kiekį darbų žinairaštyje ir demontavimo schemoje.</p>	Pridedame pakoreguotą demontavimo schemą. Rangovui darbų metu reikia papildomai susiekti su savivaldybės apšvietimo skyriumi, t.y. susisiekti su atsakingu asmeniu iš Biržų rajono savivaldybės administracijos ir demontuojamas atramas dar kart patikslinti su jais. Pastaba pridėta demontavimo schemoje.
13.	Kita	4.3 Demontavimo schema	Atramose Nr. 200/8, 205/1 yra gandrallzdžiai. Ar jie bus iškeliami ar paliekamos atramos?	<p>Paliekamos abi atramos su gandrallzdžiais Nr. 200/8 ir 205/1.</p> 

14.	Kita	5. Žiniaraštis	Jeigu koreguosis apskaitos spintų kiekis pagal anksčiau pateiktas pastabas, tada reikia tikslinti įžeminimo kontūro įrengimo darbų bei medžiagų kiekius.	Pridedame pakoreguotą principinę schemą, žiniaraštį, SDKŽ ir Sutarties SD (pakoreguotas Teikiamų medžiagų sąrašas).
15.	Kita	4.2 Trasų planas 5. Žiniaraštis	Kurioje genplano vietoje numatomi asfalto ardymo/ atstatymo darbai? Prie darbų numatyta 50 m², bet nėra nei išnašų, nei dangų atstatymo brėžinių.	Koreguotame trasų plane pridėti dangų atstatymo brėžiniai. Asfalto ardymo yra Pakluonės g., taip pat vietomis asfalto ardymas/atstatymas numatytas tiesiant abonentinius kabelius Vytauto g.
16.	Kita	4.2 Trasų planas 5. Žiniaraštis	Kurioje genplano vietoje numatomi trinkelų ardymo/ atstatymo darbai? Prie darbų numatyta 20 m², bet nėra nei išnašų, nei dangų atstatymo brėžinių.	Pridėti dangų atstatymų brėžiniai. Numatyta atsiradus poreikiui ardyti trinkelės tiesiant abonentinius kabelius.

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA:

- 2.3. Priedas Nr. 3 Sutarties projektas (Specialioji dalis) AKTUALI.
- 2.4.1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) AKTUALI.
- 4.1. Principinės schemos koreguotos AKTUALI.
- 4.2. Trasų planai koreguoti AKTUALI.
5. Žiniaraštis koreguotas AKTUALI.
- Bendrųjų rodiklių lentelė koreguota AKTUALI.
- 4.3. Demontavimo schema koreguota AKTUALI.
