

s: UAB „Kretingos vandenys“

Nr. 8-144

UAB „Plungės lagūna“, Plungės g. 28 Rietavas

Sutarties pavadinimas: „Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 2

Data: 2025-03-12

2025-03-05 dieną nuotoliniu būdu įvykusio pasitarimo Nr. 3 savivaldybės I a. salėje metu nutarta:

1. Visi nustatyti projektinės ir faktinės situacijos neatitikimai ir netikslumai užfiksuojami objekto apžiūros aktais, kuriuose priimami atitinkami sprendimai, kaip tuos neatitikimus šalinti. Šiuos protokolus pasirašo visi apžiūros dalyviai.

2. Iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios išleisti naują projekto laidą, į kurią bus įtraukti visi projekto pakeitimai ir parengtas darbų pakeitimo aktas.

Rangovui pagal projektą „Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinio remonto darbai“ (toliau Projektas) atliekant lietaus nuotekų tinklo L1 įrengimo darbus iškilo šie klausimai:


1. Dėl vandentiekio trasos padėties neatitikimo projektui negalima į projektinę padėtį pastatyti šulinio LŠ2. Norint išsaugoti esamą vandentiekio trasą, šulinį reikia patraukti 50 cm į šoną.



Apie šią situaciją statybos darbų vadovas 2025-03-12 dieną elektroniniu laišku informavo statybos proceso dalyvius: donatas.sirutis@kretingosvandenys.lt; info@inzinerijospro.lt; daiva@tvvari.in:

Galimas šios problemos sprendimas patraukti lietaus kanalizacijos šulinį LŠ2 50 cm į šoną, kad išsaugoti projekte parodytos vietos neatitinkančią vandentiekio liniją.

2. Laukų gatvėje netoli šulinio LŠ2 naudojant TV diagnostiką rasti du seni įvadai į senąją lietaus trasą (pažymėta raudona linija). Jų pajungimas į naują lietaus kanalizacijos trasą nesuprojektuotas.

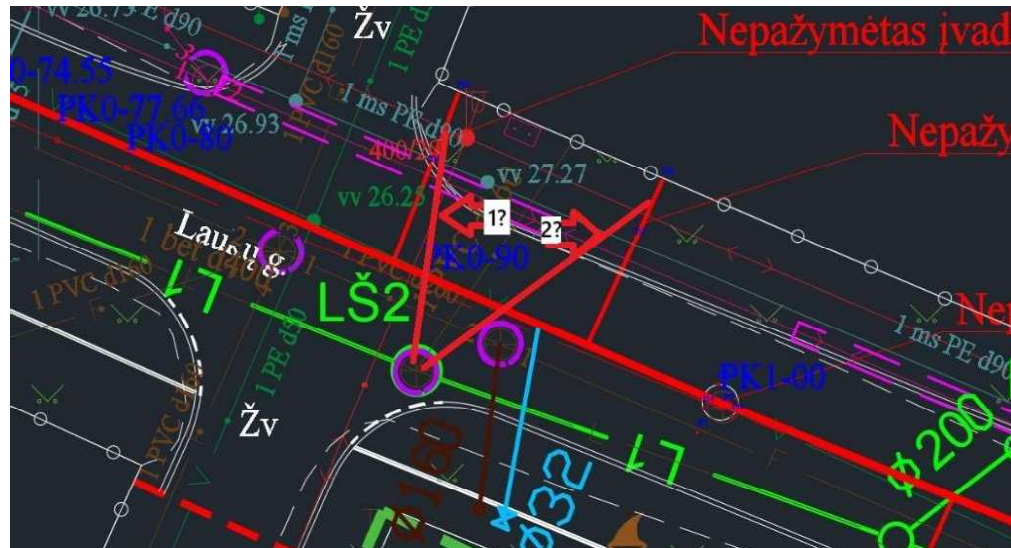

Galimas šios problemos sprendimas būtų pajungti projekte nepažymėtus lietaus kanalizacijos įvadus į lietaus kanalizacijos šulinį LŠ2, panaudojant iki 45 laipsnių posūkio kampus.

NUTARTA:

1. Patraukti LŠ1 šulinį ir L1 trasą reikiamu atstumu, kad būtų išsaugota esama vandentiekio trasa. Projekto sprendinius pakoreguoti užbaigus statybos darbus, išleidžiant naują projekto laidą, už tai yra atsakingas Statytojas. Šiam sprendinio tikslinimui nebus reikalingi papildomi darbai.

2. Pajungti nepažymėtus lietaus kanalizacijos įvadus į lietaus kanalizacijos šulinį LŠ2.

Rangovas parengia ir prie šio apžiūros akto prideda papildomų darbų sąmatą (priedas Nr. 1) ir pajungimo schemą (priedas Nr. 2). Papildomi darbai vykdomi nedelsiant, vėliau (kai bus rengiamas) juos įtraukiant į papildomą susitarimą. Projekto sprendinius pakoreguoti užbaigus statybos darbus, išleidžiant naują projekto laidą. Už tai yra atsakingas Statytojas.

PRIDEDAMA: 1. Priedas Nr. 1. Preliminari papildomų darbų sąmata.

2. Priedas Nr. 2. Prijungimo schema.

UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Donatas Sirutis

Techninė priežiūra: UAB „Inžinerijospro“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Rytautas Jakulis

Projektuotojas: UAB „Tvari inžinerija“ projekto vykdymo priežiūros vadovė Daiva Dambrauskienė

Rangovo atstovas: UAB „Plungės lagūna“ statybos darbų vadovas Valdas Bulzgis

ĮKAINOTAS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Laisvės gatve iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinis remontas

LIETAUS NUOTEKŲ DALIS (apžiūros aktas Nr.2)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Pastaba
PAPILDOMI DARBAI						
	Lietaus tinklai					
1.	PVC savitakiniai vamzdžiai Ø 160 mm, su sujungimo detalėmis, įskaitant visus reikalingus žemės darbus, gruntinio vandens šalinimą, montavimo darbus, sistemos išbandymą, praplovimą, televizinę diagnostiką	m	7,5			Sutartinis kainas
2.	PVC savitakiniai vamzdžiai Ø 200 mm, su sujungimo detalėmis, įskaitant visus reikalingus žemės darbus, gruntinio vandens šalinimą, montavimo darbus, sistemos išbandymą, praplovimą, televizinę diagnostiką	m				Sutartinis kainas
Viso papildomų darbų suma						

