

2019-01-21 Nr. 61-364

Uždaroji akcinė bendrovė „NODAMA”

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r., Tel. (8-459) 56294, (8-698) 11971, El. paštas info@uabnodama.lt
Kodas – 164819885 PVM mokėtojo kodas LT648198811
A/s Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100
Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

2019-01-21 Nr. 11

DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ RAČIUPĖNŲ GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE, STATYBOS DARBŲ

UAB „Nodama“, vadovaudamasi 2018 m. birželio 5 d. statybos rangos sutartimi Nr. B5-184 (toliau – Sutartis), vykdo Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste, statybos darbus. Darbų vykdymo metu iš statybos proceso dalyvių sudaryta komisija teikė pasiūlymus dėl kai kurių projekto sprendinių koregavimo, kurie yra išdėstyti darbų pakeitimo akte.

Teikiame Jums darbų pakeitimo aktą su priedais pasirašymui.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais, 27 lapai,
2. UAB „Kupiškio vandenys“ 2018 m. gruodžio 31 d. rašto Nr. S(1.11)-117 „Dėl Kupiškio miesto Račiupėnų gatvės inžinerinių tinklų statybos“ kopija, 1 lapas.

Statybos direktorius



Rolandas Velutis

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1

2019 01 18

Projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste, statybos darbai“

Sutarties Nr.: B5-184 (2017 10 12)
Data: 2018 m. birželio mėn. 5 d.

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojo	Mažvydas Šalkausko
Rangovo atstovo	UAB „Nodama“ statybos direktoriaus	Rolandas Velučio
Projektuotojo atstovo	UAB „Egna“ projektų vadovo	Ernestas Gegecko
Techninės priežiūros atstovo	UAB „Panevėžio miestprojektas“ techninės priežiūros vadovo	Saulius Garbauskas

Komisija, apžiūrėjusi projekte „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste, statybos darbai“ vykdomus darbus, susipažinusi su techniniu ir darbo projektais bei darbų kiekių žiniaraščiais, nustatė, kad:

1. Konkursui pateiktame techniniame projekte 1714-TP-VN *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis*, numatyta vieną vandentiekio trasos dalį pajungti nuo esamo vandentiekio d-400 mm Kupiškio miesto Jaunimo gatvėje. Rangovui, atlikus nužymėjimo darbus objekte, nustatyta, kad Račiupėnų gatvės dalyje nuo Jaunimo g. iki sankryžos su Slėnio g. egzistuoja veikianti vandentiekio linija. Pažymėtina tai, kad išduodama projektavimo sąlygas, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė, UAB „Kupiškio vandenys“ nurodė reikalavimą: „5. <...> Kitai daliai Račiupėnų gatvės naujai įrengiamų vandentiekio tinklų prijungimą numatyti į Račiupėnų-Slėnio gatvės D400 vandentiekio tinklus. Prisijungimo vieta šulinys Nr. 144 arba numatyti naują šulinį, įsipjaunant į vamzdyną trišakio pagalbe ir įrengiant uždaromąją armatūrą.“, tačiau projekte pasirinkti kiti sprendiniai, kurie buvo suderinami su UAB „Kupiškio vandenys“. Vis tik, atsižvelgiant į tai, kad Račiupėnų gatvės dalyje nuo Jaunimo g. iki sankryžos su Slėnio g. esantys vandentiekio tinklai (114 m ilgio atkarpa) yra veikiantys ir geros būklės, reikalinga atsisakyti šios atkarpos vandentiekio trasos įrengimo. Taip pat atsisakyti dviejų vandentiekio įvadų (gyvenamieji namai Nr. 1 ir Nr. 3), nes vandentiekis į šiuos namus yra atvestas nuo esamos vandentiekio linijos.
2. Konkursui pateiktame techniniame projekte 1714-TP-VN *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis*, suprojektuota naujai įrengiamą buitinių nuotekų trasą tiesti atviruoju būdu per Kupiškio

m. Panevėžio gatvę ir pajungti į esamą buitinių nuotekų liniją, įrengiant naują d400 šulinį. Atsižvelgiant į tai, kad Kupiškio m. Panevėžio gatvė yra rajoninio kelio Nr. 2411 Kupiškis-Kuosėnai-Naiviai-Misiukiškis dalis, kuri priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD), visi su Panevėžio g. susiję sprendiniai turi būti derinami su LAKD. Kadangi konkursui pateikto techninio projekto sprendiniai nebuvo derinti su LAKD, Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2018 m. lapkričio 29 d. pasirašė su LAKD Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškelimo sutartį Nr. S-953, kurioje nustatyti konkretūs tinklų tiesimo sprendiniai ir kurios pagrindu 2018 m. gruodžio 6 d. išduotas leidimas riboti eismą. Remiantis, minėtos sutarties sąlygomis, vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų vamzdžius po Panevėžio g. numatyta kloti uždaru būdu (dėkle), atsisakant techninio projekto sprendinio vamzdyną kloti atviruoju būdu.

3. Konkursui pateiktame techniniame projekte 1714-TP-VN *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis*, ties Račiupėnų g. 14 namu suprojektuotas tik buitinių nuotekų įvadas, o vandentiekio įvadas nenumatytas. Nors sprendiniai buvo suderinti su UAB „Kupiškio vandenys“, nustatyta, kad norint užtikrinti tinkamą vartotojų aprūpinimą geriau vandeniu, reikalinga nuo naujai įrengiamos vandentiekio trasos numatyti ir įvesti vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą Nr. 14.
4. Konkursui pateiktame techniniame projekte 1714-TP-VN *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis*, numatyta vieną vandentiekio trasos dalį, tarp Aukštaičių ir Panevėžio g., pajungti naujai įrengiamame d1000 g/b šulinyje Nr. V1-1. Atsižvelgiant į UAB „Kupiškio vandenys“ rekomendacijas, tikslinga atsisakyti naujo šulinio įrengimo ir vandentiekį pajungti į netoliese esantį g/b šulinį Nr. V101. Šiuo tikslu reikėtų įrengti d63 ketinį keturšakį, atsisakant naujo šulinio bei trišakio įrengimo.

Komisija siūlo:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Račiupėnų gatvės dalyje nuo nuo Jaunimo g. iki sankryžos su Slėnio g. esantys vandentiekio tinklai yra veikiantys ir geros būklės, atsisakyti šios atkarpos naujos vandentiekio trasos įrengimo. Naujai įrengiamą vandentiekio liniją pajungti nuo esamo vandentiekio šulinio Nr. 147A.
2. Vadovaujantis 2018 m. lapkričio 29 d. sutarties su LAKD Nr. S-953 sąlygomis, vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų vamzdžius po Panevėžio g. kloti uždaru būdu (dėkle). Buitinių nuotekų tinklus pajungti į esamą buitinių nuotekų šulinį Nr. KF 221 (neįrengiant naujo d400 šulinio), vandentiekio trasą pajungti į esamą vandentiekio liniją, įrengiant požeminę sklendę.
3. Siūloma nuo naujai įrengiamos vandentiekio trasos numatyti ir įvesti vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą Nr. 14.
4. Vandentiekio trasos dalį tarp Aukštaičių ir Panevėžio gatvių pajungti nuo esamo vandentiekio šulinio Nr. V101.

Neatliekamų darbų vertė -	-11.807,52	€ su PVM
Papildomų darbų vertė -	10.810,36	€ su PVM
Bendra darbų pakeitimo Nr. 1 vertė -	-997,16	€ su PVM



Priedai:

- | | |
|--------------|---|
| Priedas Nr.1 | Nevykdomų darbų sąmata (1 lapas); |
| Priedas Nr.2 | Papildomų darbų sąmata (2 lapai); |
| Priedas Nr.3 | Sutarties lokalinės sąmatos ir DP esančių sprendinių suvestinio darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščio palyginimas (4 lapai); |
| Priedas Nr.4 | Suvestinis medžiagų sąnaudų žiniaraštis (3 lapai) |
| Priedas Nr.5 | Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis Nr. S-953 (9 lapai); |
| Priedas Nr.6 | Leidimas kloti eismą Nr. LR-1455 (2 lapai); |
| Priedas Nr.7 | Planas su projektuojamais vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklais (1812-DP-VN-BR02) (5 lapai). |

Komisiija:


Mažvydas Šalkauskas


Rolandas Velutis


Ernestas Gegeckas


Saulius Garbauskas

Nepri štarauju

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018M. MĖN. D.

2018M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

187A INŽINERINIAI TINKLAI

Statiny

4 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI RAČIUPĖNŲ GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE

Žiniaraštis

4 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbai. Nevykdomi darbai

2019.01.30

Suma žiniaraščiui 11807.52 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekio tinklai						
1 N1P-0106		Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	1.590	99.83	158.73
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2.880	26.77	77.10
3 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	m	25.970	2.65	68.82
4 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	120.430	6.56	790.02
5 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	26.440	15.86	419.34
6 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.207	118.68	24.57
7 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	100m	1.2043	146.68	176.65
8 N22-212		Vamzdynų D 32-63mm praplovimas su dezinfekcija	km	0.02067	533.33	11.02
9 N22-214		Vamzdynų D 110mm praplovimas su dezinfekcija	km	0.12043	651.27	78.43
10 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65m3	100m3	2.350	64.56	151.72
11 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	2.350	83.35	195.87
12 N22P-0802		Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (V1-1, Aukštaičių g.)	m3	0.930	762.67	709.28
13 N22P-0802		Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (V1-2, Panevėžio g.)	m3	1.540	729.99	1124.18
14 N22-314		Ketinių trišakių D 100x65 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt	1.000	384.13	384.13
15 N22-270		Vandentiekio ketinių sklendžių D 100mm pastatymas	vnt	1.000	408.25	408.25
16 N22-539		Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus adapterių montavimas	vnt.	1.000	139.61	139.61
17 N22P-0205		Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais	vnt.	1.000	127.43	127.43

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		tarpikliais montavimas, kai skersmuo 110 mm				
18 N16-41		Požeminių sklendžių, kurių D iki 32mm, prijungimas	vnt	1.000	47.45	47.45
19 N22-265		Aklių d-32 mm pastatymas	10 vnt.	0.100	60.75	6.08
20 N25P-0907		Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas	vnt.	1.000	18.41	18.41
21 N22P-0905		Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas	vnt.	1.000	19.32	19.32
22 N22P-0407		Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną 32 mm balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 110 mm	vnt.	2.000	43.71	87.42
23 H16K-1		Kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	42.300	8.53	360.82
24 N57P-3103		Viršutinio išlyginamojo kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	100m3	0.400	3583.13	1433.25
Skyriuje 1						7017.90
2		Buitinių nuotekų tinklai				
25 N1P-0106		Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0.990	99.83	98.83
26 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.780	653.28	509.56
27 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.420	864.94	363.27
28 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	6.190	15.86	98.17
29 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	1.200	105.40	126.48
30 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65m3	100m3	1.240	84.73	105.07
31 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100m3	1.240	129.44	160.51
32 N23-208		Iki 200 mm skersmens vamzdynų praplovimas	100m	1.200	51.88	62.26
33 H16K-1		Kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	14.840	8.53	126.59
34 N57P-3103		Viršutinio išlyginamojo kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	100m3	0.070	3583.13	250.82
35 N27P-20-2		Dangos atstatymas, paskleidžiant rankiniu būdu, tankinant vibroplokšte	100m2	0.400	2097.05	838.82
Skyriuje 2						2740.38
Žiniaraštyje 4						9758.28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2049.24
Iš viso žiniaraštyje 4						11807.52

SUDARĖ:



Projekto vadovas
Aimantas Sabaliauskas

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018M. MĖN. D.

2018M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **187A INŽINERINIAI TINKLAI**

Statiny **4 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI RAČIUPĖNŲ GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE**

Žiniaraštis **3 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbai. Papildomi darbai**

2019.01.07

Suma žiniaraščiui **10810.36 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR		
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Vandentiekio tinklai									
1	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm	m	5.29	5.73	9.7		15.43	
2	N22P-0407	Išipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt.	1.0	8.68	15.02	6.79	30.49	
3	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	11.0	47.61	270.04		317.65	
4	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	23.0	62.22	116.0		178.22	
5	N22-313	Keturių keturšakių D 65 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt	1.0	26.27	145.18		171.45	
6	N22-368	Vamzdžių D 100mm virš 20m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	26.0	801.35	2.43	1484.56	2288.34	
Skyriuje 1					951.86	558.37	1491.35	3001.58	
2 Buitinių nuotekų tinklai									
7	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	11.0	47.61	270.04		317.65	
8	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	30.0	81.15	151.3		232.45	
9	N22-372	Vamzdžių D 300mm virš 20m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	29.0	893.81	1187.23	1821.96	3903.0	
Skyriuje 2					1022.57	1608.57	1821.96	4453.10	
Viso žiniaraštyje 3					1974.43	2166.94	3313.31	7454.68	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1974.43)					157.95				
Viso:					2132.38	2166.94	3313.31	7612.63	
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1974.43+157.95)					661.04				
Statinio statybos išlaidos					2793.42	2166.94	3313.31	8273.67	
Statybvietės išlaidos 2.00%								165.47	
Iš viso tiesioginės išlaidos								8439.14	
Pridėtinės išlaidos 15.00%(1974.43+157.95)								319.86	
Pelnas 2.00%(8439.14+319.86)								175.18	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Iš viso netiesioginės išlaidos						495.04
							Bendra vertė be PVM	8934.18
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1876.18
							Bendra vertė su PVM	10810.36

SUDARÈ:

RE: 

Projekto vadovas
Aimantas Sabaliauskas

Statinių grupė 187A INŽINERINIAI TINKLAI

Statinsys 4 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI RAČIUPĖNŲ GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE

Žiniaraštis 1 Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbai

Sutarties lokalinė sąmata					DP*
Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kiekis

Darbai	
Atliekami (+)	Neatliekami (-)

1 Vandentiekio tinklai

1	N27P-58-1	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100m	5,5	5,5
2	R27P-1-1	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio	100m3	1,3	1,3
3	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	260,0	260,0
4	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	1,25	1,25
5	N1P-0106	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m3	11,7	10,11
6	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,8	
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	40,0	37,12
8	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	m	224,5	198,53
9	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm	m	340,2	345,55
10	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	434,8	314,40
11	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	125,0	98,56
12	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	5,647	5,440
13	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	100m	4,348	3,1437
14	N22-212	Vamzdynų D 32-63mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,5647	0,54403
15	N22-214	Vamzdynų D 110mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,4348	0,31437
16	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,65m3	100m3	17,55	15,20
17	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	17,55	15,20

	-1,59
	-2,88
	-25,97
5,35	
	-120,40
	-26,44
	-0,207
	-1,2043
	-0,02067
	-0,12043
	-2,35
	-2,35

18	N22P-0802	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (V1-1, Aukštaičių g.)	m3	0,93	0,00
19	N22P-0802	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (V1-2, Panevėžio g.)	m3	1,54	0,00
20	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	2,0	13,0
21	N22-265	Aklių d-100 mm pastatymas	10 vnt.	0,1	0,1
22	N22-313	Ketinių trišakių D 65x65 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt	1,0	1,0
23	N22-314	Ketinių trišakių D 100x65 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt	2,0	1,0
24	N22-269	Vandentiekio ketinių sklendžių D 65 mm pastatymas	vnt	2,0	2,0
25	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių D 100mm pastatymas	vnt	2,0	1,0
26	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus adapterių montavimas	vnt.	2,0	1,0
27	N22P-0205	Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais tarpikliais montavimas, kai skersmuo 65 mm	vnt.	2,0	2,0
28	N22P-0205	Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais tarpikliais montavimas, kai skersmuo 110 mm	vnt.	2,0	1,0
29	N16-41	Požeminių sklendžių, kurių D iki 32mm, prijungimas	vnt	36,0	35,0
30	N22-265	Aklių d-32 mm pastatymas	10 vnt.	3,6	3,5
31	N25P-0907	Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas	vnt.	36,0	35,0
32	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas	vnt.	36,0	35,0
33	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių D 100mm pastatymas	vnt	1,0	1,0
34	N25P-0907	Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas	vnt.	1,0	1,0
35	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas	vnt.	1,0	1,0
36	N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną 32mm balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm	vnt.	18,0	19,0
37	N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną 32 mm balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 110 mm	vnt.	18,0	16,0
38	H16K-1	Kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	398,0	355,7
39	N57P-3103	Viršutinio išlyginamojo kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	100m3	2,20	1,80
-	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	0,00	23,00
-	N23-313	Ketinių keturšakių D 65 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus	vnt.	0,00	1,00
-	N22-368	Vamzdžių D 100mm virš 20 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	0,00	26,00

2 Buitinių nuotekų tinklai

40	N27P-58-1	Siūlių pjaustymas diskinė freza asfaltbetonio dangoje	100m	5,8	5,8
41	R27P-1-1	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio	100m3	1,35	1,35

	-0,93
	-1,54
11,0	
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-1,0
	-0,1
	-1,0
	-1,0
1,0	
	-2,0
	-42,3
	-0,40
23,00	
1,00	
26,00	

65	N27P-20-2	Dangos atstatymas, paskleidžiant rankiniu būdu, tankinant vibroplokšte	100m2	0,4	
66	R16-115	Vejos mažų plotų atstatymas	100m2	1,6	1,6
-	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	0,00	30,00
-	N22-372	Vamzdžių D 300 mm virš 20 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	0,00	29,00

	-0,4
30,00	
29,00	

* - Sąnaudų žiniaraštis pagal darbo projekte (žymuo 1812-DP-LVN) numatytus sprendinius

Sudarė:

 Projektų vadovas
Aimantas Sabaliauskas

MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
Trasa V1				
1.	Vamzdžio PE100 PN10 d32mm gylyje iki 2.10 m montavimas (be sandūrų sujungimo) tranšėjoje, komplekte su fasoninėmis dalimis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas / 30,0cm storio smėlio virš vamzdžio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu	TS 1.1	m	198,53 ✓
2.	Vamzdžio PE100 PN10 d63mm gylyje iki 2.30 m montavimas (be sandūrų sujungimo) tranšėjoje, komplekte su fasoninėmis dalimis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu	TS 1.1	m	345,55 ✓
3.	Vamzdžio PE100 PN10 d110mm gylyje iki 2.30 m montavimas (be sandūrų sujungimo) tranšėjoje, komplekte su fasoninėmis dalimis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu	TS 1.1	m	314,40 ✓
4.	Kalaus ketaus flanšinis trišakis d65x65mm PN10/16	TS 1.2	vnt	1 ✓
5.	Kalaus ketaus flanšinis trišakis d100x65mm PN10/16	TS 1.2	vnt	1 ✓
6.	Atsparus tempimui flanšinis adapteris d65x63mm PN16	TS 1.2	vnt	2
7.	Universali mova d65mm PN16	TS 1.2	vnt	2
8.	Universali mova d110mm PN16	TS 1.2	vnt	1 ✓
9.	Ketinis keturšakis D65 mm	TS 1.2	vnt	1
10.	Požeminė uždarymo sklendė DN32 su prailginimo velenu ir kapa, aklė d32mm	TS 1.2	kompl	35 ✓
11.	Požeminė uždarymo sklendė DN100 su prailginimo velenu ir kapa	TS 1.2	kompl	1
12.	Pajungimas d32mm su balnu su kaitinamąja spirale prie d63mm vamzdžio	TS 1.2	kompl	19 ✓
13.	Automatinė nuorinimo kolonėlė	TS 1.10	kompl	1
14.	Pajungimas d32mm su balnu su kaitinamąja spirale prie d110mm vamzdžio	TS 1.2	kompl	16 ✓
15.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	-	m ³	1060,00
16.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kaušo talpa 0,65 m ³	-	m ³	1533,00

Atestato Nr.	 Verkių g. 5, Vilnius Tel. +370 65521320 projektavimas@egna.eu Įmonės kodas 302590816		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
20319	S PV	E. Gegeckas	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų	
27720	S PDV	T. Drungilas	Račiupėnų gatvėje, esančios Kupiškio mieste statybos projektas	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			Medžiagų sąnaudų žiniaraštis	
			Laida	
			O	
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
	Kupiškio rajono savivaldybė		1812-DP-LVN-MSŽ	
			Lapas	Lapų
			1	3

17.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	-	m ³	1533,00
18.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	-	m ³	100,00
19.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas 10 cm	-	m ²	38,00
20.	Kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	-	m ³	358,00
21.	Viršutinio išlyginamojo kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	-	m ³	182,00
22.	Vamzdynų hidraulinis bandymas	TS 1.6	kompl	1
23.	Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas	TS 1.5	kompl	1
24.	Komunikacijų žymėjimo metaliniai stovai	TS 1.8	vnt	13
25.	Komunikacijų žymėjimo lentelės	TS 1.8	vnt	23
26.	Vamzdžių D110 virš 20m ilgio pristūmimas, nekasant grunto	-	m	26,00
27.	Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas užsakovui	TS 2.8	kompl	1

Trasa F1

1.	Vamzdžio PVC d160, „N“ klasės klojimas iki 2,00m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru / smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas / smėlio virš vamzdžio įrengimas/ pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu	TS 2.1	m	211,90 ✓
2.	Vamzdžio PVC d200, „N“ klasės klojimas iki 3,65m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru / smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas / smėlio virš vamzdžio įrengimas/ pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu	TS 2.1	m	758,00
3.	Apsauginis dėklas PVC d315 vamzdžiui d200	TS 2.1	m	29,18
4.	Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai D315 komplekte su kinetėmis, sandarinimo medžiagomis, d160mm In Situ jungtimis, hermetišku dangčiu.	TS 2.6/2.7	kompl	37
5.	Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai D425 h=1,40 - 2,00m komplekte su kinetėmis, sandarinimo medžiagomis, d160-200mm In Situ jungtimis, hermetišku dangčiu.	TS 2.6/2.7	kompl	10
6.	Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai D425 h=2,01 - 3,00m komplekte su kinetėmis, sandarinimo medžiagomis, d160-200mm In Situ jungtimis, hermetišku dangčiu.	TS 2.6/2.7	kompl	11
7.	Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai D425 h=3,01 - 3,50m komplekte su kinetėmis, sandarinimo medžiagomis, d160-200mm In Situ jungtimis, hermetišku dangčiu.	TS 2.6/2.7	kompl	3
8.	G/B buitinių nuotekų šulinys su lipynėmis d1,0m H=1,60-2,00m (iki įtekėjimo vamzdžio/latako apačios) su hermetišku kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu)	TS 2.5/2.7	kompl	3

DOKUMENTO ŽYMUO:

1812-DP-LVN-MSŽ

Lapas

2

Lapų

3

Laida

O

9.	G/B buitinių nuotekų šulinys su lipynėmis d1,50m H=2,01-3,00m (iki įtekėjimo vamzdžio/latako apačios) su hermetišku kaliaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu lataku, protarpinėmis PVC vamzdžiams (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu)	TS 2.5/2.7	kompl	3
10.	G/B buitinių nuotekų šulinys su lipynėmis d1,0m H=3,01-3,65m (iki įtekėjimo vamzdžio/latako apačios) su hermetišku kaliaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu lataku, protarpinėmis PVC vamzdžiams (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu)	TS 2.5/2.7	kompl	3
11.	Pasijungimas prie esamų tinklų	-	kompl	2
12.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	-	m ³	1520,00
13.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kaušo talpa 0,65 m ³	-	m ³	2550,00
14.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	-	m ³	2550,00
15.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	-	m ³	135,00
16.	Smėlis vamzdžių pasluoksniui 10 cm	TS2.2/2.3	m ³	40,00 ✓
17.	Kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	-	m ³	393,00
18.	Viršutinio išlyginamojo kelio pagrindo sluoksnio įrengimas	-	m ³	239,00
19.	Komunikacijų žymėjimo metaliniai stovai	TS 2.6	vnt	20 ✓
20.	Komunikacijų žymėjimo lentelės	TS 2.6	vnt	30
21.	Vamzdžių D315 virš 20 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	-	m	29,18
22.	Vamzdyno hidraulinis bandymas	TS 2.4	vnt.	1
23.	Paslėpto vamzdžio TV diagnostika	TS 2.8	vnt.	1
24.	Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui	TS 2.8	vnt.	1

Pastaba:

1. Medžiagų sąnaudų žiniaraštį tikslinti statybos metu.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
1812-DP-LVN-MSŽ	3	3	O

Automobilių kelių juostos naudojimo
inžineriniams tinklams kloti bendrųjų
taisyklių BT ITK 09
2 priedas (privalomasis)

INŽINERINIŲ TINKLŲ KLOJIMO, PRIEŽIŪROS, REKONSTRUKCIJOS IR IŠKĖLIMO SUTARTIS

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 5 - 953
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama Kelio valdytoju), atstovaujama EDUPRDO GRINYAVECKO, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Tinklo valdytoju), atstovaujama administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. TS-91 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, (toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

Sutartyje naudojamos sąvokos:

- | | | |
|----------|---|---|
| Objektas | – | valstybinės reikšmės kelių juosta ir/ar kelias (jų ruožai), nurodyti Sutarties priede Nr. 1. |
| Tinklas | – | inžinerinis tinklas, dėl kurio klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ar iškėlimo kelio juostoje yra sudaryta ši Sutartis. |
| Darbai | – | Tinklo klojimo, priežiūros, iškėlimo iš Objekto, taip pat Tinklo gedimų bei avarijų šalinimo darbai – tiek visi bendrai, tiek bet kurie iš jų atskirai. |

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Kelio valdytojas suteikia teisę Tinklo valdytojui savo lėšomis, prisiimant riziką bei atsakomybę šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimų atlikti Darbus Objekte.
2. Atsižvelgiant į tai, jog pagal šią Sutartį Tinklo valdytojo Darbai atliekami Kelio valdytojo valdomame Objekte, Tinklo valdytojas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad Tinklo valdytojo atliekami Darbai, šių Darbų rezultatas, Tinklo naudojimo sąlygos bei jo apsaugos zonos (juostos ar kiti apribojimai) negali pabloginti, kliudyti ar kitaip neigiamai paveikti Objekto priežiūros ir naudojimo sąlygų bei plėtros perspektyvų.
3. Tinklo valdytojas įsipareigoja besąlygiškai vykdyti teisėtus Kelio valdytojo nurodymus, įskaitant (bet jais neapsiribojant) nurodymus dėl Tinklo iškėlimo iš Objekto bei Objekto pradinės techninės būklės atstatymo, kai tai būtina Kelio valdytojui įgyvendinant Objekto plėtrą, priežiūros ir rekonstrukcijos darbus.

4. Tinklo valdytojas Objektu turi teisę naudotis tik pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir jokių kitų teisių į Objektą (jo dalį) neįgyja.
5. Tinklo valdytojui perleidus tinklą tretiesiems asmenims ar kitu būdu pasikeitus Tinklo valdytojui, visos teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties, pereina naujam Tinklo valdytojui.
6. Tinklo valdytojas privalo savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę gauti asmenų, kurie VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto duomenų registre yra nurodyti kaip Objekte esančių žemės sklypų savininkai, leidimą tuose žemės sklypuose atlikti Darbus. Tinklo valdytojas, gavęs minėtų asmenų prašymą (reikalavimą) iškelti Tinklą iš Objekte esančio žemės sklypo, privalo tai padaryti savo lėšomis ir atstatyti Objekto pirminę techninę būklę šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

II. LEIDIMŲ DARBAMS IŠDAVIMAS

7. Tinklo valdytojas gali naudotis Objektu tik tiek, kiek reikia šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Bet kokius Darbus Objekte Tinklo valdytojas gali pradėti ir atlikti tik raštu iš anksto suderinęs juos su Kelio valdytoju bei turėdamas Kelio valdytojo šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduotą leidimą atlikti Darbus, išskyrus Tinklų ar Objekto avarijos atvejus. Įvykus Tinklo ar Objekto avarijai, jos pasekmių šalinimo darbai atliekami šios sutarties 22–26 punktuose nustatyta tvarka.
8. Tinklo valdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo savo lėšomis parengti ir suderinti su visomis atsakingomis institucijomis techninį projektą (jeigu toks projektas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka). Projektas privalo būti parengtas prieš kreipiantis į Kelio valdytoją dėl leidimo atlikti Darbus Objekte išdavimo. Darbų techninis projektas turi būti parengtas taip, kad jame numatytos Tinklo apsaugos zonos bei kitos Tinklo naudojimo sąlygos nepažeistų Kelio valdytojo teisėtų interesų ir nekliudytų Objekto naudoti pagal paskirtį, atlikti Objekto priežiūros, rekonstrukcijos ir plėtros darbų.
9. Tinklo valdytojas, prieš pradėdamas Darbus, Kelių priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155, nustatyta tvarka privalo raštu kreiptis į Kelio valdytoją dėl leidimo atlikti Darbus išdavimo bei pateikti Kelio valdytojui eismo ribojimo suderinimo ir apmokėjimo už eismo ribojimą dokumentus. Transporto priemonių eismas ribojamas ar uždraudžiamas vadovaujantis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3-488.
10. Tinklo valdytojas taip pat privalo nurodyti Darbų pradžios ir pabaigos terminus. Jeigu nustatytu terminu darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priedo nuostatomis apskaičiuojant papildomus mokesčio už eismo ribojimą Tinklo valdytojui dydžius.
11. Kelio valdytojas, vadovaudamasis Taisyklėmis bei įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkos apraše nurodyti dokumentai, leidžiantys atlikti darbus Objekte, ir laikydamasis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše nustatytos tvarkos, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, tik Tinklo valdytojui sumokėjus šį mokestį bei pateikus tai patvirtinantį dokumentą, šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduoda Tinklo valdytojui raštišką leidimą atlikti Darbus Objekte. Kelio valdytojo sprendimas dėl leidimo atlikti Darbus išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tinklo valdytojo mokesčio už eismo ribojimą sumokėjimo dienos. Esant motyvuotam atsisakymui išduoti leidimą, mokestis grąžinamas.
12. Tinklo valdytojas bet kokius Darbus Objekte gali pradėti tik turėdamas visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šioje Sutartyje numatytus dokumentus ir leidimus, suteikiančius teisę atlikti Darbus Objekte.



13. Kelio valdytojui pareikalavus, prieš pradėdamas Darbus Objekte, Tinklo valdytojas privalo pateikti Kelio valdytojui šios Sutarties priede Nr. 2 numatytą tinkamo Tinklo valdytojo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimo garantiją.

III. TINKLO VALDYTOJO PAREIGOS

14. Jeigu dėl Tinklo Valdytojo atliekamų Darbų Objekte yra ar turi būti uždaromas ar ribojamas eismas, Tinklo valdytojas, laikydamasis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87, ir suderinęs su Kelio valdytoju ir su Lietuvos kelių policijos tarnyba, privalo savo lėšomis aptverti Darbų atlikimo vietą. Tinklo valdytojas atsako už saugų eismą ir darbų saugą Objekte.
15. Kelio valdytojas turi teisę paskirti savo atstovą, kuris prižiūri ir kontroliuoja šioje Sutartyje numatytą Darbų atlikimą. Tinklo valdytojas privalo vykdyti visus teisėtus Kelio valdytojo nurodymus.
16. Tinklo valdytojas privalo užtikrinti, kad jo sudaromos sutartys su trečiaisiais asmenimis dėl Darbų atlikimo Objekte būtų sudarytos atsižvelgiant į šią Sutartį. Tinklo valdytojo ir trečiųjų asmenų sudarytų sutarčių sąlygos, prieštaraujančios šiai Sutarčiai, nesukuria Kelio valdytojui jokių prievolių ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. Tinklo valdytojas visais atvejais atsako už trečiųjų asmenų veiksmus (neveikimą) atliekant Darbus Objekte.
17. Tinklo valdytojas, užbaigęs Darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę privalo atlikti visus Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos Tinklo valdytojo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą. Šie darbai privalo būti suderinti su Kelio valdytoju ir atlikti per įmanomai trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą terminą.
18. Tinklo valdytojui neatlikus Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų, atlikus juos netinkamai ar pažeidžiant šioje Sutartyje nustatytas sąlygas bei terminus, Kelio valdytojas pateikia rašytinę pretenziją dėl netinkamo Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų atlikimo bei nustato papildomą protingą terminą šiems darbams atlikti ar trūkumams pašalinti. Jeigu per Kelio valdytojo nustatytą papildomą terminą Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas įgyja teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Tinklo valdytojas įsipareigoja atlyginti visas Kelio valdytojo su Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų atlikimu susijusias patirtas išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.
19. Visi Darbai, atliekami šios Sutarties pagrindu, įskaitant ir Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įforminami Objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktu arba pradinės techninės būklės atstatymo aktu, kurį pasirašo Kelio valdytojo ir Tinklo valdytojo paskirti atsakingi asmenys. Kilus nesutarimų dėl Darbų ar Objekto pradinės techninės būklės atstatymo kokybės, juos sprendžia ekspertas(-ai), už kurio(-ių) darbą apmoka šalis, kurios nenaudai yra priimta eksperto(-ų) išvada.
20. Tinklo valdytojas neturi teisės atlikti jokių šioje Sutartyje nenumatytų darbų Objekte, o tokius darbus atlikęs, įsipareigoja Kelio valdytojo reikalavimu savo sąskaita nedelsdamas nugriauti/išardyti pastatytus statinius ar kitą nenumatytą Darbų rezultatą bei atlyginti visas Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų dėl to patirtas išlaidas ir nuostolius. Jeigu Tinklo valdytojas per Kelio valdytojo nurodytą terminą nepradeda ar neužbaigia griauti/ardyti pažeidžiant šią Sutartį pastatytų statinių ar kito Darbų rezultato, Kelio valdytojas turi teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti pasitelkti trečiuosius asmenis, o Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su tokių darbų atlikimu susijusias išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.



21. Jeigu Tinklo valdytojas nesilaiko Kelio valdytojo raštiškame leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi Kelio valdytojo leidimo atlikti Darbus Objekte, Kelio valdytojas turi teisę pareikalauti nedelsiant sustabdyti Darbus tol, kol Tinklo valdytojo padaryti pažeidimai bus ištaisyti, o Tinklo valdytojas įsipareigoja be jokių sąlygų paklusti tokiam Kelio valdytojo reikalavimui ir nedelsiant sustabdyti Darbus.

IV. AVARIJŲ ŠALINIMAS

22. Įvykus Tinklo avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Objekte, Tinklo valdytojas privalo imtis neatidėliotinų veiksmų siekdamas išvengti didesnės žalos Objektui ir/ar Tinklui. Apie Tinklo avariją, pradėtus neatidėliotinus avarijos ir jos pasekmių šalinimo darbus Objekte Tinklo valdytojas nedelsdamas žodžiu (telefonu) bei raštu (faksu ar elektroniniu paštu) privalo pranešti Kelio valdytojui ir kreiptis dėl Kelio valdytojo leidimo atlikti Darbus išdavimo bei atlikti avarijos pasekmių šalinimo darbus laikantis šios Sutarties ir Taisyklių reikalavimų.
23. Kelio valdytojas, gavęs pagal šios Sutarties sąlygas tinkamai parengtą Tinklo valdytojo raštišką prašymą išduoti leidimą dėl Darbų, reikalingų Objekte esančio Tinklo avarijų pasekmėms šalinti, tokį leidimą išduoda ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tinklo valdytojo rašytinio prašymo gavimo.
24. Užbaigęs Tinklo avarijos pasekmių šalinimo darbus, Tinklo valdytojas privalo atlikti Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
25. Įvykus avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Objekte, Kelio valdytojas, prieš pradėdamas avarijos pasekmių šalinimo darbus, kurie yra susiję su Objekte esančiu Tinklu arba gali turėti jam įtakos, privalo žodžiu (telefonu) bei raštu (faksu ar elektroniniu paštu) nedelsdamas pranešti apie tai Tinklo valdytojui.
26. Įvykus avarijai Objekte ir Kelio valdytojui pareikalavus, Tinklo valdytojas privalo užtikrinti, kad jo atstovas nedelsdamas neatlygintinai atvyktų į Objektą bei tiksliai nurodytą Tinklo trasos vietą Objekte. Tinklo valdytojui nevykdant šio įsipareigojimo, Kelio valdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Tinklo trasos vietai nustatyti ir/ar nedelsdamas pradėti avarijos šalinimo darbus. Tinklo valdytojui neatsiuntus savo atstovo į Objektą ar šiam nenurodžius tikslios Tinklo trasos vietos, ar ją nurodžius netiksliai, Kelio valdytojas neatsako už avarijos pasekmių šalinimo darbų metu Tinklo valdytojui padarytą žalą. Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo dėl Tinklo trasos vietos nustatymo patirtas išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

V. TINKLO VALDYTOJO PAREIGOS KELIO VALDYTOJUI ATLIEKANT OBJEKTO REMONTO DARBUS

27. Kelio valdytojas raštu (registruotu paštu ar elektroniniu paštu) iš anksto prieš protingą terminą, bet ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių, privalo informuoti Tinklo valdytoją apie planuojamus Objekto rekonstrukcijos ar plėtros darbus, kurių atlikimas gali turėti įtakos Objektui esančiam Tinklui.
28. Tinklo valdytojas, gavęs nurodytą Kelio valdytojo pranešimą, privalo užtikrinti, kad jo atstovas Kelio valdytojo nurodytu laiku neatlygintinai atvyktų į Objektą ir tiksliai nurodytą Tinklo trasos vietą Objekte, taip pat vykdyti kitus Kelio valdytojo pranešime nurodytus teisėtus reikalavimus.
29. Tinklo valdytojo atstovui nustatytu laiku neatvykus į Objektą, nenurodžius Tinklo trasos vietos ar nurodžius ją netiksliai, Kelio valdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Tinklo trasos vietai nustatyti. Šiems asmenims nurodžius Tinklo trasos vietą Objekte arba dėl objektyvių priežasčių negalint to padaryti, Kelio valdytojas turi teisę pradėti darbus Objekte. Tokiu atveju Kelio valdytojas neatsako už Objekte esančio Tinklo sugadinimą ar sunaikinimą, o visų galimų nuostolių atsiradimo ir kompensavimo rizika tenka Tinklo valdytojui. Tinklo valdytojas taip pat privalo atlyginti visas Kelio valdytojo dėl Tinklo trasos vietos nustatymo patirtas išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

30. Tinklo valdytojas, gavęs Kelio valdytojo rašytinį pranešimą apie planuojamus vykdyti Objekto priežiūros, rekonstrukcijos ar plėtros darbus bei Kelio valdytojo nurodymą iškelti Tinklą iš Objekto ruožų, kuriuose jis trukdytų atlikti numatytus darbus, privalo savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę iškelti Tinklą iš visų Kelio valdytojo nurodytų Objekto ruožų.
31. Tinklo iškėlimo darbai privalo būti atlikti per Kelio valdytojo nurodytą protingą terminą, kuris yra būtinas tokiems iškėlimo darbams atlikti. Tinklo valdytojui Kelio valdytojo nurodytu terminu nepradėjus ar neužbaigus Tinklo iškėlimo darbų, Kelio valdytojas turi teisę Tinklo iškėlimo darbus atlikti pats arba šiems darbams atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimo darbais susijusias išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.
32. Kelio valdytojo nuostoliais be kitos žalos visais atvejais laikomi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priede numatyti mokesčiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Tinklo valdytojas būtų privalėjęs sumokėti, jeigu būtų iškėlęs Tinklą iš Objekto savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę.
33. Kelio valdytojo reikalavimu atliekant Tinklų iškėlimo iš Objekto darbus, Tinklo valdytojas privalo laikytis visų šioje Sutartyje Darbams atlikti taikomų taisyklių ir tvarkos.
34. Kelio valdytojas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti Tinklo valdytojo iškelti Tinklą iš Objekto arba atlikti Tinklo remonto ar rekonstrukcijos darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu yra pakankamai pagrindo manyti, kad tolesnis Tinklo buvimas Objekte gali turėti neigiamos įtakos Objekto priežiūros ir naudojimo sąlygoms bei plėtros perspektyvoms, sąlygoti žalos Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai atsiradimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

35. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
36. Tinklo valdytojas atsako už tai, kad jo bei Darbams atlikti pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos taisyklių reikalavimų. Tinklo valdytojas taip pat atsako už saugų eismą Objekte ar jo dalyje, kurioje vyksta Darbai.
37. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
38. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui.

VII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

39. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
40. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
41. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

42. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

43. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu iš Objekto iškeliamas dalis Tinklo, ši Sutartis lieka galioti Objekte likusios Tinklo dalies atžvilgiu.
44. Ši Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Tinklo iškėlimo iš Objekto arba pabaigus Tinklo eksploataciją. Tokiu atveju Šalys pasirašo Sutarties nutraukimo aktą, kuriame turi būti aptartos Sutarties nutraukimo pasekmės: Tinklo iškėlimo iš Objekto tvarka ir terminai, su Sutarties nutraukimu susijusios Šalių teisės ir pareigos bei kiti aktualūs klausimai. Jeigu nutraukiant Sutartį Šalys susitaria, jog Tinklas iš Objekto nebus iškeliamas, Sutarties nutraukimo akte turi būti numatyta kompensacija Kelio valdytojui už vėlesnį Tinklo iškėlimą ir utilizavimą.
45. Kelio valdytojui pareikalavus iškelti Tinklą iš Objekto dėl Tinklo valdytojo įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo, Tinklo valdytojas privalo iškelti Tinklą iš Objekto per Kelio valdytojo nurodytą protingą terminą, kuris yra būtinas tokiems iškėlimo darbams atlikti. Tinklo valdytojui Kelio valdytojo nurodytu terminu nepradėjus ar neužbaigus Tinklo iškėlimo darbų, Kelio valdytojas turi teisę Tinklo iškėlimo darbus atlikti pats arba šiems darbams atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis ir iškėlus Tinklą vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Tinklo valdytojo kaltės. Tokiu atveju Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimo darbais susijusias išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.
46. Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis įsipareigoja pareikšti kitai Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi imtis priemonių pašalinti Sutarties pažeidimą.
47. Kelio valdytojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, pranešdamas apie tai Tinklo valdytojui raštu. Sutartis laikoma nutraukta pranešime nurodytą dieną, o jei tokia diena nebus nurodyta – nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma tai, kad Tinklo valdytojas, nepaisydamas Kelio valdytojo pretenzijos, pažeidžia Taisyklėse nustatytus reikalavimus Darbams atlikti, Kelio valdytojui pareikalavus atsisako iškelti Tinklą iš Objekto, nepagrįstai ilgai delsia atlikti bet kuriuos Darbus Objekte, be pateisinamos priežasties nebendrauja su Kelio valdytoju Sutarties vykdymo klausimais arba kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį.
48. Tinklo valdytojui nevykdant Šalių pasirašyto Sutarties nutraukimo akto arba Tinklo valdytojui per Kelio valdytojo nustatytą terminą neiškėlus Tinklo iš Objekto, Kelio valdytojas įgyja teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti pasitelkti trečiuosius asmenis, o Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimu ir utilizavimu susijusias išlaidas bei visus dėl to patirtus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų nuostolius.

VIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

49. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis gera Šalių valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Kelio valdytojo registruotos buveinės vietą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Šioje Sutartyje vartojamos, tačiau konkrečiai neapibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos atsižvelgiant į Taisyklėse naudojamą atitinkamų sąvokų apibrėžimą.

51. Šalys įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų pranešti viena kitai apie savo rekvizitų ar įgaliotų asmenų pasikeitimus.
52. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
53. Ši Sutartis įsigalioja tik suderinus Sutarties priedą Nr.1 su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Šalims pasirašius kiekviename Sutarties lape. Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
54. Šalys vykdo šią Sutartį pasitikėdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia.
55. Tinklo valdytojo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. 8 (459) 35507, mob. 8 (686) 72986, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.
56. Kelio valdytojo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys: Lietuvos automobilių kelių direkcijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus l. e. vedėjo pareigas Miroslav Javorovič, tel. (8 5) 232 9732, el. p. miroslav.javorovic@lakd.lt.

Sutarties priedai:


Priedas Nr.1. Valstybinės reikšmės kelių juostų, kuriose bus atliekami Darbai (klojamas, prižiūrimas ir/ar iškeliamas Tinklas), sąrašo forma.

Priedas Nr.2. Tinklo valdytojo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimo garantijos forma (jeigu taikoma), 2 variantai.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kelio valdytojas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas: 188710638
Telefonas: 8 (5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303

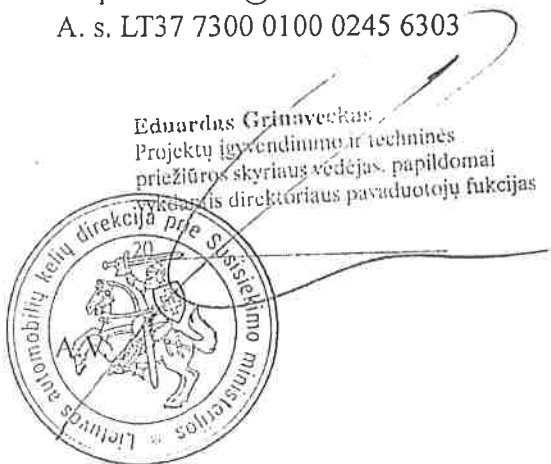

Tinklo valdytojas:

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Įmonės kodas: 188774975
Telefonas: 8 (459) 35500
El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt
A.s. LT38 4010 0434 0016 3115

Administracijos direktorius



SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė (teisininkė)
Raminta Morkūnaitė
2018-11-11

2018 m. lapkričio mėn. 29 d.
Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros,
rekonstravimo ir iškelimo sutarties
Nr.: S – 953
priedas Nr. 1

Projekto pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, esančioje Kupiškio mieste statybos projektas

Projekto numeris: 1812-DP-VN-BR02

Projekto rengėjas: UAB "Egna"

Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas Tinklas, sąrašas

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio (km)		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			nuo	iki			
1.	Rajoninis kelias Nr. 2411 Kupiškis – Kuosėnai – Naiviai – Misiukiškis (Panevėžio gatvė)	Kerta kelią Vandentiekis (V1 D63 dėkle D110)	0.665	0.665	-	0,022	Pradžios: X=6188787.37 Y= 561809.26 H=1,90 m; Pabaigos: X= 6188779.20 Y= 561827.36 H=1,90 m; Tinklas klojamas uždaru būdu
2.	Rajoninis kelias Nr. 2411 Kupiškis – Kuosėnai – Naiviai – Misiukiškis (Panevėžio gatvė)	Kerta kelią Nuotekos (F1 D200 dėkle D315)	0.665	0.665	-	0,027	Pradžios: X= 6188788.65 Y= 561810.15 H=1,90 m; Pabaigos: X= 6188780.61 Y= 561828.06 H=1,90 m; Tinklas klojamas uždaru būdu

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kelio valdytojas:
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Įmonės kodas: 188710638
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Tel. (8 5) 232 9600
El. p. lakd@lakd.lt

Tinklo valdytojas:
Kupiškio rajono savivaldybės
administracija
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Įmonės kodas: 188774975
Telefonas: 8 (459) 35500
El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt
A.s. LT38 4010 0434 0016 3115


(pareigos, vardas pavardė, parašas)

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

SUDERINTA:

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
laikinas atstovas Valstybinės teisėmės kelių
ir kelių priežiūros skyriaus vedėjo pareigas
Atstovė J. Javorkaitė
2018-11-28

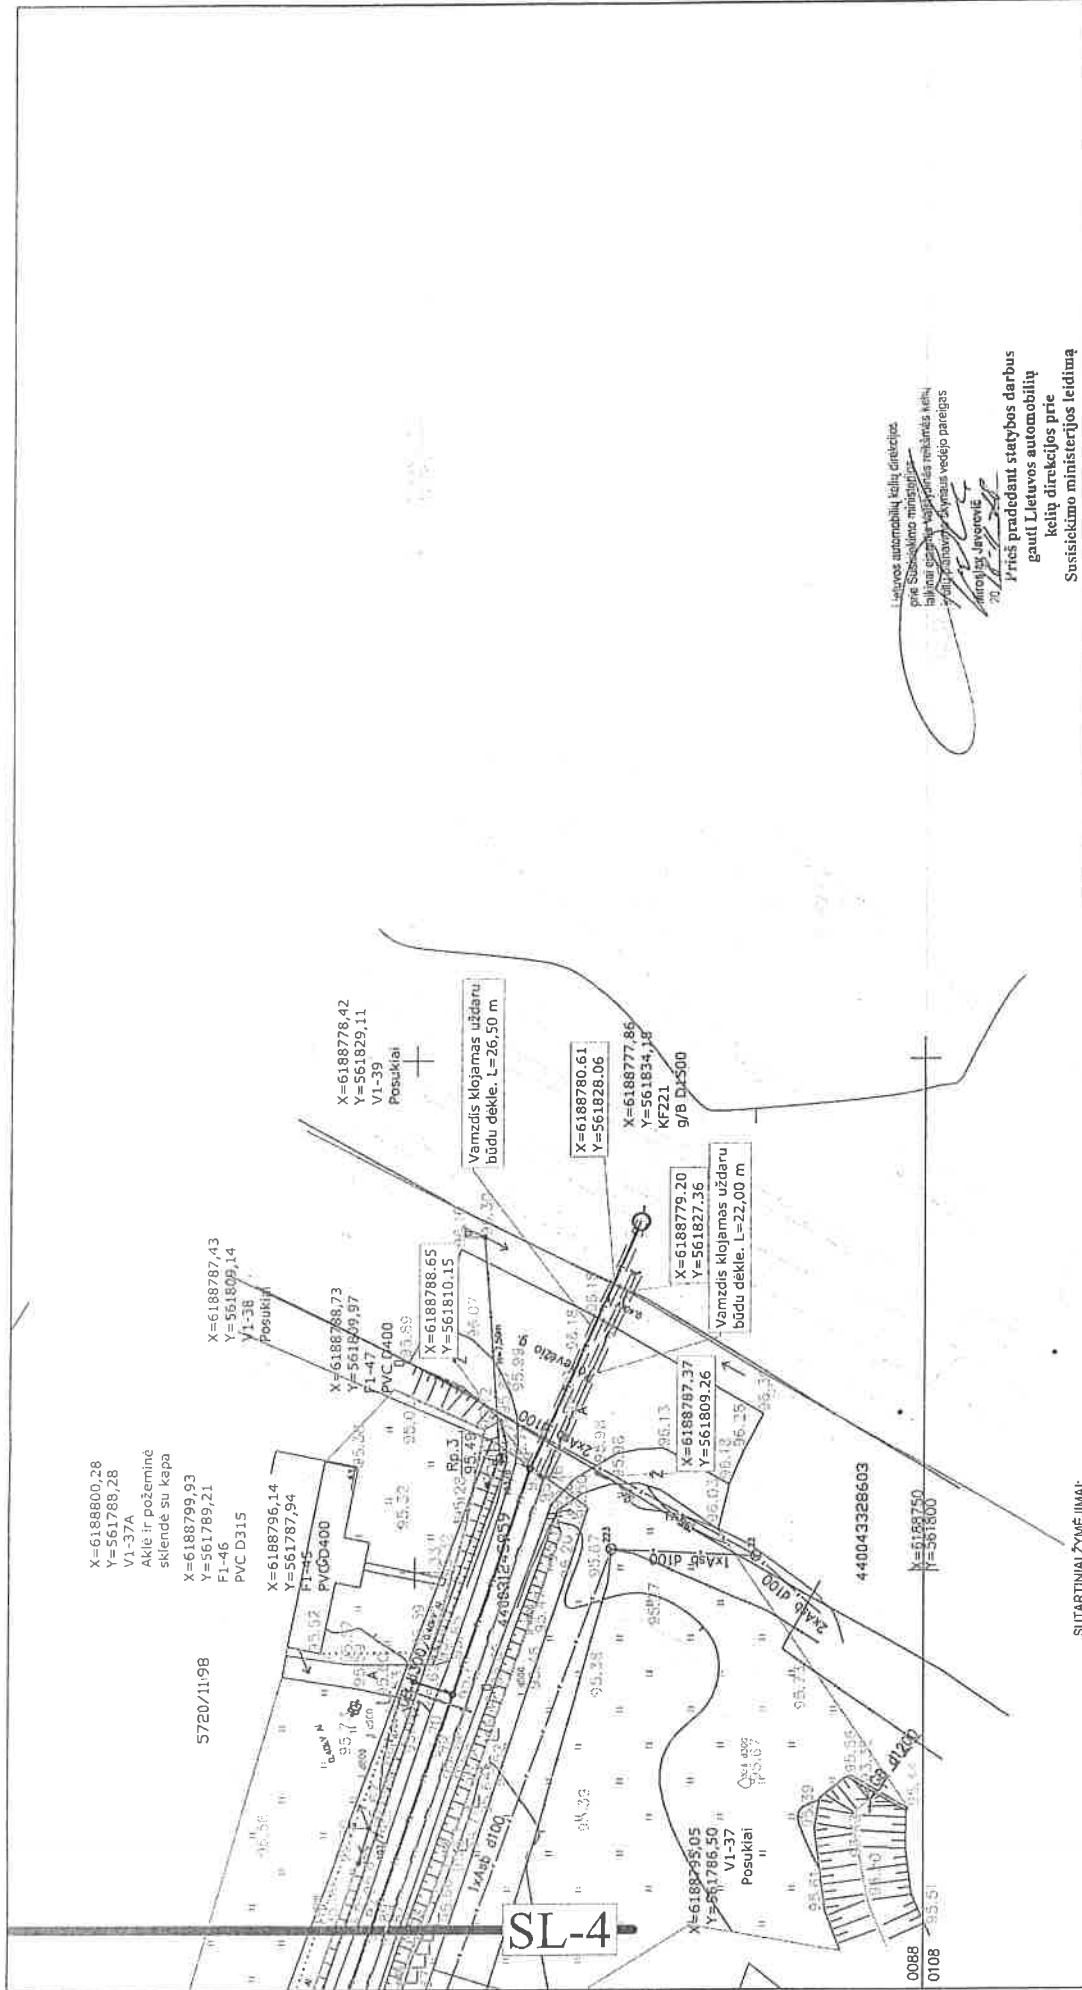

0	2017-12-13	Statybos leidimui	
Laida	Išduotimo data	Laidos statusas	Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.		EGNA	Viešųjų ir privačiųjų reikšmės kelių statybos projektas
20319	SPV	Ernestas Gejeckas	STATISTINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
27720	SHDV	Tomas Drungilas	Vandentiekio ir būtinųjų nuotekų šalinimo tinklų Raciūnėlių gatvės, esančių Kupiškio mieste statybos projektas
Atliko		Tomas Drungilas	Planuojamų projektuojamųjų vandentiekio ir būtinųjų nuotekų šalinimo tinklų
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAROVA	STATISTINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO
L.F.	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	STATISTINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	0
		Planuojamų projektuojamųjų vandentiekio ir būtinųjų nuotekų šalinimo tinklų	MI-500
		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
		MI-500	8

PRISTABAI:

1. PASTABOS TAIKOMA: PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
2. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
3. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
4. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
5. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
6. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
7. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
8. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
9. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
10. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
11. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
12. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
13. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
14. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
15. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
16. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
17. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
18. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
19. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS
20. PASTABŲ TINKLŲ TIKSLINIS NUBRAZDINIMAS, PASTABŲ IR AKTŲ DOKUMENTACIJOS

SUTARTINAI ŽYMNĖJIMAI:

— V1 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

— F1 — PROJEKTUOJAMOS BŪTINĖS NUOTEKOS

VANDENTIEKIO TINKLŲ SANITARINĖ APSAUGOS ZONA

BŪTINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SANITARINĖ APSAUGOS ZONA

KELIO RIBOS

DEKLAS VAMZDŽIŲ

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio
direktoriaus
2005 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. AV-297

LEIDIMAS RIBOTI EISMĄ NR. LR-1455

Duomenys apie darbų ar renginio vietą:

Panevėžio apskr., Kupiškio r. savivaldybė, kelią prižiūrinti valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ Šiaurės rytų regionas
rajoninis kelias Nr. 2411
(magistralinio, krašto, rajoninio)
Kupiškis–Kuosėnai–Naiviai–Misiukiškis , ruožas 0.665 km

(kelio pavadinimas, kilometras, kuriame leidžiama atlikti darbus)

Statinio ar renginio projektas dėl darbų kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje patvirtintas ir suderintas:

LAKD (inžinerinių tinklų iškėlimo sutartis Nr. S-953, 2018-11-29), Kupiškio rajono savivaldybės administracija,
UAB „Kupiškio vandenys“

(nurodomos institucijos, derinimo sąlygos, derinimo data)

Mokestis už eismo ribojimą sumokėtas 37Eur, mokėjimo pavedimo Nr.3457 2018 gruodžio 5 d.

Statybos ar renginio darbų pobūdis ir technologija: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų įrengimas
vamzdžių traukimui uždaru būdu skersai kelio Nr. 2411 kelio juostoje 0.665km.(Panevėžio g.)

(trumpas aprašymas)

Apylankos schema suderinta su: apylanka nereikalinga, eismas nebus ribojamas

(kada ir kas suderino su policija, kelio savininku, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ar valstybinės reikšmės automobilių kelių prižiūrėčia valstybės įmone (arba Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos))

Statybos ar renginio darbų vykdytojas: UAB „Nodama“, Parko g. 2, Noriūnai. LT-40395, Kupiškio r.
Donatas Šilaiškis, darbų vadovas, tel.8-614-13561

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

Savivaldybės leidimas statyti, remontuoti objektą arba rengti renginį: Nr. LSNS-53-180831-00025, 2018-08-31,
Kupiškio rajono savivaldybės administracija, vyr. specialistas Andrius Jurėnas, tel. 8-614-51662

(leidimo Nr., data, kas pasirašė, pareigos, telefonas)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Panevėžio miestprojektas“, techninis prižiūrėtojas
Saulius Garbauskas, kv. atestato Nr. 20923

(juridinis ar fizinis asmuo, pareigos, vardas, pavardė, atestato Nr., telefonas)

Darbų ar renginių pradžia: 2018 m. gruodžio 10 d.
Darbų ar renginių pabaiga: 2018 m. gruodžio 12 d.

Atliekamų darbų garantinis laikas 5 metai , paslėptiems -10 metų

Leidžiama pagal pateiktą prašymą roboti eismą:

1. atliekant darbus vadovautis T DVAER 12. Laikini kelio ženklai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus;
2. Nevykdyti darbų pasibaigus leidimo galiojimo laikui ar sustabdžius jo galiojimą;
3. Apie pradėtus ir pabaigtus darbus **PRIVALO** pranešti:
VĮ „Kelių priežiūra“ Šiaurės rytų regiono Kupiškio KT viršininkui Ovidijui Zibavičiui (tel. 8 686 83792), El. paštas: ovidijus.zibavicius@keluprieziura.lt
4. Baigus darbus pažeisti kelio elementai (išvažinėti kelio sankasos šlaitai, grioviai ar kt.) turi būti atstatyti
5. Leidimo gavėjas pilnai atsako už aplinkosaugą, užtikrina saugų pėsčiųjų ir transporto eismą bei kelio ženklų apsaugą darbų metu, darbų vykdymo vietoje iki pilno darbų užbaigimo.
6. Leidimo roboti eismą originalas arba patvirtinta jo kopija visada turi būti darbo vietoje.
7. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu: centras@eismoinfo.lt

Leidimas galioja iki 2018 m. gruodžio 12 d.

LR-1455

Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

2018 m. gruodžio 6 d

Tomas Žagūnis



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



UAB „KUPIŠKIO VANDENYS“

Ugnlagesių g. 5, 40112 Kupiškis. Tel. (8 459) 35 145, [el. p. info@kupiskiovandenys.lt](mailto:el.p.info@kupiskiovandenys.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 164702145

UAB „Nodama“

2018-12-31 Nr. S(1.11)- 117

DĖL KUPIŠKIO MIESTO RAČIUPĖNŲ GATVĖS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS

Informuojame, kad Kupiškio m. Račiupėnų g. vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų statybos darbų metu, rangovui UAB „Nodama“ atkasus dalį Račiupėnų g. ir Jaunimo g. iki sankryžos su Slėnio g., esančių esamų vandentiekio tinklų, matyti, kad esami tinklai yra geros būklės, nepažeisti ir tinkami eksploatavimui. Atsižvelgdami į tai, rekomenduojame laikytis UAB „Kupiškio vandenys“ 2017 m. kovo 21 d. raštu Nr. S(1.11)-32 išduotose techninėse sąlygose Nr.17-06 nustatytų reikalavimų: „5,<...> *Kitai daliai Račiupėnų gatvės naujai įrengiamų vandentiekio tinklų prijungimą numatyti į Račiupėnų-Slėnio gatvės DN 100 vandentiekio tinklus. Prisijungimo vieta – šulinys Nr. 144 arba numatyti naują šulinį, įsipaunant į vamzdyną trišakio pagalba ir įrengiant uždaramąją armatūrą*“.

Taip pat, rekomenduojame atsisakyti techniniame projekte numatyto sprendimo pajungti trasos dalį tarp Aukštaičių ir Panevėžio g. nuo naujai įrengiamo d1000 g/b šulinio (projekte pažymėta Nr. V1-1) ir numatyti kitą sprendinį: trasą pajungti į esamą g/b šulinį Nr.V101. Šiuo tikslu esamame šulinyje Nr. V101 reikėtų įrengti d63 ketinį keturšakį, atsisakant naujo šulinio bei trišakio įrengimo.

Direktorius

Vidas Zulonas

Saulius Simanavičius, tel. (459) 35370, el. p. saulius.simanavičius@kupiskiovandenys.lt
