

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr.1

2021-04-23

**„Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) remonto darbai“,
Sutartis Nr. SR-756, 2020-10-07**

Komisija sudaryta iš:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiojo specialisto

R. Radvilavičius

UAB „Rusnė“ projekto vadavo

A. Mačionis

AB „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovo

A. Kudirka

Komisija, apžiūrėjusi: Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) atliekamus remonto darbus (toliau – **Darbai**), konstatuoja:

1. Po augalinio dirvožemio sluoksniu aptiktas asfaltbetonis. Nuo PK 3+75 iki PK 4+35 ir nuo PK 5+00 iki PK 6+45. Viso bendras plotas 295 m²., storis 10 cm. Viso 70,8 t. (dešinė pusė) (Priedas Nr.1).
2. Esamos vandentiekio kapos yra sulūžusios. PK 0+75 1 vnt. ir PK 0+45 1 vnt. Viso: 2 vnt. (Priedas Nr.2).
3. Esamas 400 mm skersmens fekalinės kanalizacijos šulinėlio teleskopas sulūžęs, nesandarus. PK 0+90 kiekis 1 vnt. (Priedas Nr.3).

Komisija siūlo:

1. Nuo PK 3+75 iki PK 4+35 ir nuo PK 5+00 iki PK 6+45 (dešinė pusė), po augalinio dirvožemio sluoksniu aptiktą asfaltbetonį išardyti, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą.
2. PK 0+75 1 vnt., PK 0+45 1 vnt., esamas sulūžusias vandentiekio kapas pakeisti naujomis.

3. PK 0+90 1 vnt., esamą 400 mm skersmens fekalinės kanalizacijos šulinėlio sulūžusį, nesandarų teleskopą pakeisti nauju.

Priedai:

Priedas Nr.1 Foto fiksacija (4 lapai);


Priedas Nr.2 Foto fiksacija (3 lapai);

Priedas Nr.3 Foto fiksacija (1 lapas).

Komisija:



Rokas Radvilavičius



Algimantas Mačionis




Alvydas Kudirka

KTR-4 darbų vadovas
Gediminas Bakšaitis

l. e. p.

Nuo PK 3+75 iki PK 4+35 ir nuo PK 5+00 iki PK 6+45



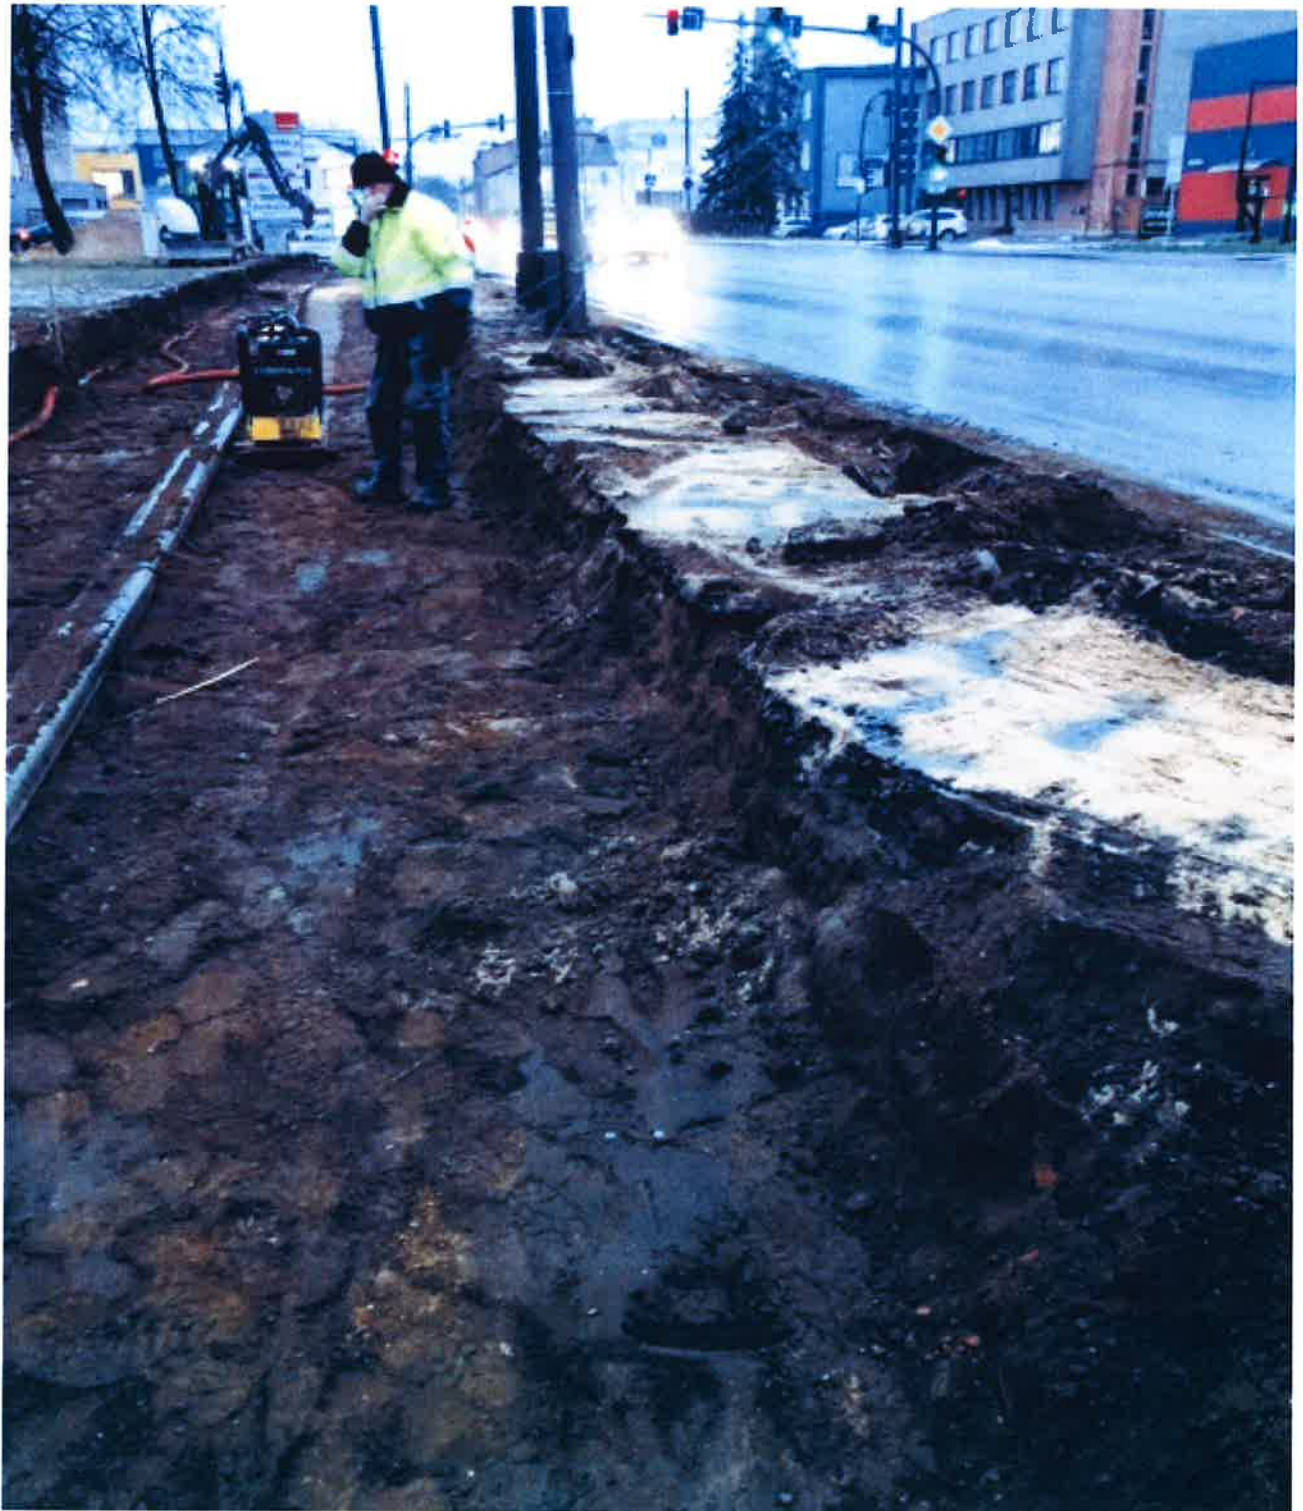





PK 0+45







PK 0+90

