

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai  
Laisvės a. 20, Panevėžys  
El. p. [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)

**2022-06-23**  
**Nr. 22/06/23-01BR**

## RAŠTAS

Dėl medžiagų suderinimo:

AB „Panevėžio statybos trestas“, vadovaujantis 2020 metų liepos mėnesio 24-os dienos Rangos sutartimi Nr. 22-1628, vykdo viešųjų erdvių prie Bendruomenės rūmų sutvarkymo rangos darbus.

Šiuo raštu pakartotinai teikiame:

1. Žemės darbų papildomus darbų sąmatą – 1 lapas;
2. Plytelių įrengimo papildomų darbų sąmatą – 1 lapas;
3. Elektroninių ryšių šulinio pažeminimo papildomus darbų sąmatą – 1 lapas;
4. Granitinių kelio bortų suderinimo aktą Nr. 11 – 2 lapai;
5. Mažosios architektūros elementų suderinimo aktą Nr. 12 – 5 lapai;
6. Želdinių suderinimo aktą Nr. 13 – 2 lapai;
7. Betoninių pakopų suderinimo aktą Nr. 14 – 2 lapai;

Prašome kuo skubiau patvirtinti prie rašto pridėtas sąmatas ir suderinti medžiagų suderinimo akte nurodytus gaminius.

AB „Panevėžio statybos trestas“ Statybos direktorius



## LOKALINĖ SĄMATA

**Objektas:** Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

**Statinys:** 1 Kranto gatvės (nuo Vasario 16-osios g. iki Anykščių g.) rekonstravimo darbai

**Žiniaraštis:** 2 Žemės darbai. Papildomi darbai. (pagal sutarties Nr. 22-1628, 3.4.1 a punktą).

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
		<b>Žemės darbai</b>				
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1,15	100m3	0,4097	182,63	74,82
2	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,4097	248,10	101,65
3	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9 000	100m3	0,4097	294,18	120,53
4	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k9=1,15	t. m3	0,04097	143,16	5,87
5	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1,15	100m3	0,4097	1 754,03	718,63
<b>Viso Eur:</b>						<b>1 021,50</b>
<b>PVM 21%:</b>						<b>214,52</b>
<b>Viso Eur su PVM:</b>						<b>1 236,02</b>

Kiekiai suderinti

## LOKALINĖ SĄMATA

**Objektas:** Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

**Statinys:** 2 Teritorijos prie Panevėžio bendruomenių rūmų (Kranto g. 28) sutvarkymo darbai

**Žinlaraštis:** Plytelių įrengimas. Papildomi darbai pagal sutarties Nr. 22-1628, 3.4.1 a punktą

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		<b>1 Bendruomenių rūmų teritorijos paruošimo darbai</b>				
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	1,2575	109,70	137,95
2	R27P-25-1	Šulinio landos paauskštėjimas ( gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0000	152,41	304,82
3	R19-73	Šulinių dangčių pakeitimas dangčiais su aikštelės danga	vnt	2,0000	602,10	1 204,20
		<b>Skyriuje 1</b>				<b>1 646,97</b>
		<b>2 Dangų įrengimas Bendruomenių rūmų teritorijoje</b>				
4	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamą volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,3770	67,56	25,47
5	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,3770	13,59	5,12
6	N27P-8-1	Pagrindo paruošimojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h~10 cm k9=1.15	100m3	0,12575	1 754,03	220,57
7	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,2575	282,60	355,37
8	N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenų atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm k9=1.15	100m2	1,2575	2 631,95	3 309,68
		<b>Skyriuje 1</b>				<b>3 916,21</b>
		<b>Viso Eur:</b>				<b>5 563,18</b>
		<b>PVM 21%:</b>				<b>1 168,27</b>
		<b>Viso Eur su PVM:</b>				<b>6 731,45</b>

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2021 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

**Statinių grupė 2019-27 Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas****Statinyss 3 Lauko apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas****Žiniaraštis 4 Elektronikos dalis. Kranto g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g. Elektroninių ryšių papildomi darbai (pagal sutarties Nr. 22-1628, 3.4.1 b punktą)**

2022.06.15

Suma žiniaraščiu

**1827,43****Eur.**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

**1 Darbai**

1 R27p-25-3	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt	1,0	34,31	34,31
2 R27P-24-1	Šulinio landos remontas, keičiant gelžbetonio žiedus k8=1.05, k9=1.15	vnt	1,0	599,54	599,54
3 N21-348-1	Kabelio tvirtinimas	vnt.	2,0	34,64	69,28
4 N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 (esamų komunikacijų)	km	0,009	6774,02	60,97
5 N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,009	2733,96	24,61
6 N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių m k9=1.15 (apsauginio futliaro)	m	9,0	5,92	53,28
7 N24-359	Futlių galų užtaisymas k9=1.15	vnt	3,0	19,46	58,38
8 N21-24	Esamų tinklų įgilinimas. Pritaikyta	100m	0,09	1243,0	111,87

**Skyriuje 1****1012,24****2 Medžiagos**

1 260365	Šulinių betono ir gelžbetonio detalės	m3	0,203	670,36	136,08
2 260885	Gelžbetonio žiedai	vnt	1,0	67,04	67,04
3 3860-40	Tvirtinimo kronšteinų komplektas	vnt	2,0	52,22	104,44
4 1022-309	Vamzdžiai iš PE 80, PEHD, DN 110 (futliaras)	m	9,0	9,63	86,67
5 260822	HDPE vamzdžių sandarinimo priemonės	kompl.	3,0	34,6	103,8

**Skyriuje 2****498,03****Žiniaraštyje 1****1510,27**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**317,16****Iš viso žiniaraštyje 1****1827,43**


Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“

Kiekiai suderinti





## Medžiagų suderinimo aktas Nr. 14

2020 m. liepos mėn. 24 d. rangos sutartis Nr. 22-1628

Objektas: „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“


Statybos vieta: Kranto gatvė (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g.), teritorija prie bendruomenių rūmų (Kranto g. 28, Panevėžyje), pėsčiųjų tiltas ir pėsčiųjų takas (nuo Kranto g. iki Jakšto g.)

Statybos rūšis: inžinerinių statinių rekonstravimas, tilto kapitalinis remontas ir lietaus nuotekų tinklų statyba.


Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, gatvės, kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Pateikiame suderinimui objekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ medžiagų sąrašą:

Nr.	Medžiaga, pavadinimas, naudojimo vieta	Aprašymas, nuotrauka
1	Gelžbetoninės pakopos 2500x300x100mm. Gaminiai bus naudojami naujų laiptų bendruomenių rūmų aikštėje įrengimui.	





Suderinta tolesniam vykdymui:

Rangovas: K

Techninis prižiūrėtojas: J

Užsakovas:


Projekto vykdymo priežiūros vadovas: J

Pastaba : pakopos nederinamos, nes prieštarauja TS sąlygoms





Panevėžio miesto savivaldybės administracija  
Laisvės a. 20, Panevėžys  
El. p. [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)



2022-04-08

## Medžiagų suderinimo aktas Nr. 13

2020 m. liepos mėn. 24 d. rangos sutartis Nr. 22-1628

Objektas: „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“

Statybos vieta: Kranto gatvė (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g.), teritorija prie bendruomenių rūmų (Kranto g. 28, Panevėžyje), pėsčiųjų tiltas ir pėsčiųjų takas (nuo Kranto g. iki Jakšto g.)

Statybos rūšis: inžinerinių statinių rekonstravimas, tilto kapitalinis remontas ir lietaus nuotekų tinklų statyba.

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, gatvės, kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Pateikiame suderinimui objekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ medžiagų sąrašą:

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Apimtis	Dydis kont.
1.	Korėjinis lendrūnas	vnt	30		C3
2.	Kraujažolės	vnt	5		C3
3.	Gojinis šlavijias Caradonna	vnt	30		C3
4.	Paupinė usnis	vnt	30		C3
5.	Didžioji astrancija Rubra	vnt	30		C3
6.	Mažalapė liepa Rancho, SG ne mažesnis kaip 40 cm.	vnt	6	10-12	SG


AB „Panevėžio statybos trestas“  
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys  
Įmonės kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503  
Faks. +370 45 505 520  
El. paštas: [pst@pst.lt](mailto:pst@pst.lt)  
[www.pst.lt](http://www.pst.lt)

AB Luminor Bank  
A/s LT694010041200090221  
AB SWEDBANK  
A/s LT947300010000074994



# PST



Suderinta tolesniam vykdymui:

Užsakovas:

Techninis prižiūrėtojas: I

Projekto vykdymo priežiūros vadovas: T

Rangovas: .


✓

AB „Panevėžio statybos trestas“  
P. Puzino g. 1. LT-35173 Panevėžys  
Įmonės kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503  
Faks. +370 45 505 520  
El. paštas: pst@pst.lt  
www.pst.lt

AB Luminor Bank  
A/s LT694010041200090221  
AB SWEDBANK  
A/s LT947300010000074994





## Medžiagų suderinimo aktas Nr. 11

2020 m. liepos mėn. 24 d. rangos sutartis Nr. 22-1628

Objektas: „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“



Statybos vieta: Kranto gatvė (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g.), teritorija prie bendruomenių rūmų (Kranto g. 28, Panevėžyje), pėsčiųjų tiltas ir pėsčiųjų takas (nuo Kranto g. iki Jakšto g.)

Statybos rūšis: inžinerinių statinių rekonstravimas, tilto kapitalinis remontas ir lietaus nuotekų tinklų statyba.


Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, gatvės, kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Pateikiame suderinimui objekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ medžiagų sąrašą:

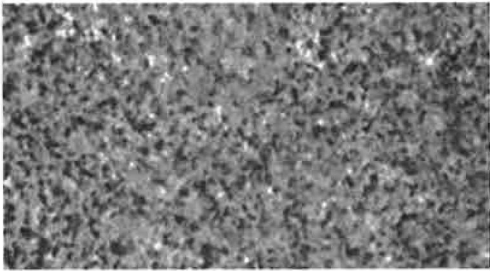Nr.	Medžiaga, pavadinimas, naudojimo vieta	Aprašymas, nuotrauka
1	Granitiniai kelio bortai 	 Matmenys 150x220. Ilgis 0,8m – 1,2m. Spalva G654 NEW. Užapvalintas, nenuapjautas, R=2cm. Pastaba: Skirtingų ilgių bortus montuoti eilėmis pagal ilgį.





Suderinta tolesniam vykdymui:

Užsakovas:

Techninis prižiūrėtojas:

Projekto vykdymo priežiūra:


Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“  
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys  
Įmonės kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503  
Faks. +370 45 505 520  
El. paštas: pst@pst.lt  
www.pst.lt

AB Luminor Bank  
A/s LT694010041200090221  
AB SWEDBANK  
A/s LT947300010000074994





## Medžiagų suderinimo aktas Nr. 12

2020 m. liepos mėn. 24 d. rangos sutartis Nr. 22-1628

Objektas: „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“


Statybos vieta: Kranto gatvė (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g.), teritorija prie bendruomenių rūmų (Kranto g. 28, Panevėžyje), pėsčiųjų tiltas ir pėsčiųjų takas (nuo Kranto g. iki Jakšto g.)

Statybos rūšis: inžinerinių statinių rekonstravimas, tilto kapitalinis remontas ir lietaus nuotekų tinklų statyba.


Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos, gatvės, kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai.



Statinio kategorija: ypatingas statinys

Pateikiame suderinimui objekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ medžiagų sąrašą:

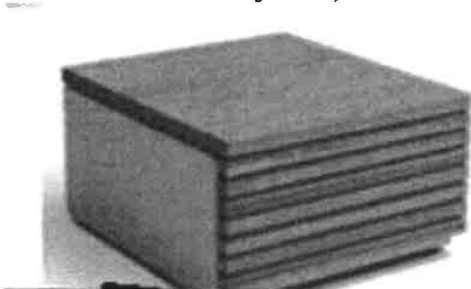Nr.	Medžiaga, pavadinimas	Aprašymas, nuotrauka
1.	<b>Suoliukas</b>  Betoninis su granito skaldelės apdaila 50x50x40cm	Betonas su medžio apdaila (kietmedis-bukmedis). Apdaila iš dviejų pusių (priekinė fasadinė pusė ir sėdimoji dalis).  






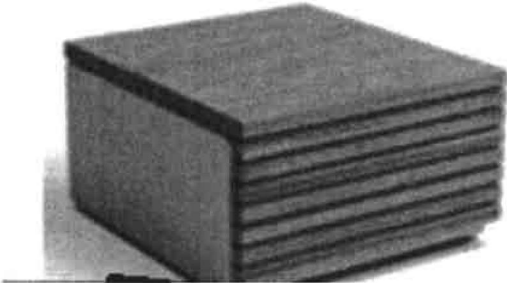2.	<p><b>Suoliukas</b></p> <p>Betoninis su granito skaldelės apdaila 200x200x40cm</p>	<p>Betonas su medžio apdaila (kietmedis-bukmedis). Apdaila iš dviejų pusių (priekinė fasadinė pusė ir sėdimoji dalis).</p> 
3.	<p><b>Betoninė šiukšlių dėžė</b></p> <p>Betoninė šiukšlių dėžė su natūralaus granito skaldelės apdaila.</p> <p>Išmatavimai: Ilgis/plotis - 45x45 cm Šiukšliadėžės aukštis - 60 cm Aukštis su stogeliu - 80 cm Svoris - 140 kg. Cinkuoto plieno 45L talpos įdėklas.</p> <p>Pastaba šiukšlių dėžes montuoti lygiagrečiai įrengiamai dangai, išlaikant simetrinius atstumus plytelės kraštinėms.</p>	<p>Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Tai užtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skaldelę nuo byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio poveikio. Cinkuoto plieno stogelis su pelenine.</p> 









4.	<b>Dviračių stovas</b>  Pagamintas iš 48 mm skersmens plieno. Išmatavimai: Aukštis - 80 cm Plotis - 80 cm	Tinka dviems dviračiams statyti. Pritaikytas tvirtinti betonuojant. Dviratis rakinamas per rėmą, todėl stovas yra saugesnis eksploatuojant.  





5.	<b>Taktiliniai indikatoriai</b>	<p>Nerūdijantis plienas 304 markės. Skersmuo 25mm. aukštis 4-5mm.</p> <p>Nerūdijantis plienas 304 markės. Skersmuo 25mm. ilgis 280mm., aukštis 4-5mm.</p>





Suderinta tolesniam vykdymui:

Užsakovas:

Techninis prižiūrėtojas: I

Projekto vykdymo priežiūros vadovas: I

Rangovas: Andrius Jėčius

AB „Panevėžio statybos trestas“  
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys  
Įmonės kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503  
Faks. +370 45 505 520  
El. paštas: pst@pst.lt  
www.pst.lt

AB Luminor Bank  
A/s LT694010041200090221  
AB SWEDBANK  
A/s LT947300010000074994

