

Užsakovas	Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas	UAB „Parama“
Sutarties Nr. ir data,	2021-03-31, Nr. VPS-53
Objekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai - Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruožuose nuo 0,00 iki 0,20km, nuo 0,00 iki 0,23 km ir nuo 0,23 iki 0,81 km rekonstravimas, įrengiant takus ir apšvietimą .

MOTYVUOTAS SIŪLYMAS DARBŲ PAKEITIMUI

2021-12-09 buvo organizuojama objekto apžiūra (Priedas Nr.2 Apžiūros aktas Nr.1). Objekto apžiūros metu komisija nusprendė, jog reikalingi žemės sankasos stiprinimo sprendiniai.

2022-05-11 raštu Nr. 73 Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu pateikė sprendinius. (Priedas Nr.3 Raštas Nr.73)

2022-05-19 raštu Nr. 9-2022-345 Statybos techninės priežiūros vadovas pritarė sprendiniams. (Priedas Nr.4 Raštas Nr. 9-2022-345)

Pagal pateiktą papildomų darbų kiekių žiniaraštį Rangovas parengė papildomų darbų sąmatą. (Priedas Nr.1 Sąmata)

Rangovas prašo Užsakovo pritarti motyvuotam siūlymui.

Rangovo įvertinimas pinigine išraiška:

Papildomi darbai: 22857,36 Eur (be PVM).

Neatliekami darbai: -0,00 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 22857,36 Eur (be PVM).

Papildomas laikas darbams atlikti nereikalingas.

Rangovas negalėjo numatyti papildomų darbų kiekių, nes šie darbai priskiriami paslėptų darbų kategorijai ir nėra galimybės iš anksto jų numatyti.

Pridedama:

- 1) Priedas Nr. 1. Sąmata
- 2) Priedas Nr.2 Apžiūros aktas Nr.1
- 3) Priedas Nr.3 Raštas Nr.73
- 4) Priedas Nr.4 Raštas Nr. 9-2022-345

Statybos vadovas

Arvydas Iešmantavičius





Elektroninio
archyvo
informacinė
sistema

[Pagrindinis](#)[Paslaugos](#)[ADOC dokumentai](#)**[] ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Motyvuotas siūlymas

Rinkmena: Motyvuotas siūlymas.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS
ATSTOVAS
Gen. direktorius Raimondas Juodsukis

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė (19-14-1) Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai-Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, rekonstravimo projektas.

Statiny 1 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai-Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, rekonstravimo projektas.

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		Pastabos
				Vieneto kaina	Iš viso	
	GRIŠKABŪDŽIO G. PĖŠČIŲJŲ TAKO IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS					
1	II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,54	1534,49	828,62	
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	5,4	131,62	710,75	
3	Geotinklo paklojimas	m2	1800,0	2,26	4068,00	kalk. Nr.1
4	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15*žvyro 0/32 fr. Užpylimas 30 cm	100m3	5,4	1544,35	8339,49	
	Skyriuje 1				13946,86	
	STRIŪPŲ G. PĖŠČIŲJŲ TAKO IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS					
1	II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,345	1534,49	529,40	
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,45	131,62	454,09	
3	Geotinklo paklojimas	m2	1150,0	2,26	2599,00	kalk. Nr.1
4	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15*žvyro 0/32 fr. Užpylimas 30 cm	100m3	3,45	1544,35	5328,01	
	Skyriuje 2				8910,50	
	žiniaraštyje 1				22857,36	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4800,05	
	Iš viso žiniaraštyje 1				27657,41	

Sudarė:

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Gen.direktorius Raimondas Juodsnukis

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 2022-311 Šakių rajono savivaldybės administracija

Statinyss 4 Striūpų g. ir Griškabūdžio g. Šakių mieste rekonstravimo darbai. Papildomai vykdomi darbai

Žiniaraštis 1 Striūpų g. ir Griškabūdžio g. Šakių mieste rekonstravimo darbai. Papildomai vykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr.1					
1	N27P-66-1	100m2		0,01		
	Geotinklo paklojimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2,5	0,025	8,15	0,2
624-206	Lankstus geotinklas Enkagrid MAX 30 grunto armavimui (30/30 kN/m)	m2	110,0	1,1	1,48	1,63
N27P-66-1	Darbo užm. 0.20	Medžiagos	1.63	Mechanizmai	Iš viso 1.83	
Skyriuje	1	Darbo užm. 0.20	Medžiagos	1.63	Mechanizmai	Iš viso 1.83
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0,05		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.20)			0,03		
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.20+0.03)			0,02		
		Viso:	0,25	1,68		1,93
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.20+0.03+0.02)					
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	0,25	1,68		1,93
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0,17
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2,1
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.20+0.03+0.02)					0,05
	Pelnas 5.00%(2.10+0.05)					0,11
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,16
				Bendra vertė be PVM		2,26
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,47
				Bendra vertė su PVM		2,73

Sudarė :

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės
administracija
Rangovas UAB „Parama“
Sutarties Nr. VPS-53 (2021-03-31)
Objekto pavadinimas „Valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai - Bridžiai,
kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir
Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruožuose
nuo 0,00 iki 0,20km, nuo 0,00 iki 0,23 km ir
nuo 0,23 iki 0,81 km rekonstravimas, įrengiant
takus ir apšvietimą.“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2021 m. gruodžio 9 d.

I. Komisijos sudėtis

Šakių rajono savivaldybės administracijos ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Mauza;
AB „Viamatika“ Statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Vytenis Venclova;
UAB „Medstatyba“ Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vytautas Matulevičius;
UAB „Parama“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius.

II. Faktinės aplinkybės

Atliekant darbus UAB „Parama“ (toliau Rangovas) užsakė UAB „Laboratorinių bandymų centras“ laboratoriją atlikti statinio apkrovimo plokštė savikontrolės bandymus žemės sankasos sluoksniui (Priedas Nr.1 Bandymų protokolas Nr. 12246-S). Bandymas PK 3+84 D 5,20 m nuo ašies atliktas tik nukastame ir netankintame žemės sankasos sluoksnyje (E_{v2} 32,2 MPa), o PK 5+14 D 5,90 m nuo ašies volu sutankintame žemės sankasos sluoksnyje (E_{v2} dėl didelių deformacijų nustatyti nepavyko). Iš rezultatų matyti, jog tankinant žemės sankasos sluoksnį dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir silpnų (netinkamų) gruntų žemės sankasos būklė tik blogėja. Tokia pati situacija ir visame likusiame ruože. Rangovas negali įvykdyti savo įsipareigojimo pasiekti reikalaujamą deformacijos modulio E_{v2} vertę $\geq 45,0$ MPa.

III. Problema

Iš rezultatų matyti, jog tankinant žemės sankasos sluoksnį dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir silpnų (netinkamų) gruntų žemės sankasos būklė tik blogėja. Tokia pati situacija ir visame likusiame ruože. Rangovas negali įvykdyti savo įsipareigojimo pasiekti reikalaujamą deformacijos modulio E_{v2} vertę $\geq 45,0$ MPa.

IV. Siūlymas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas pateiks techninius sprendinius žemės sankasos sluoksniu sustiprinimui.

V. Parašai



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Objekto apžiūros aktas Nr.1

Rinkmena: Objekto apžiūros aktas Nr.1 (1)(1).adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai	Parašo informacija
VYTAUTAS MAUZA,  vyriausiasis specialistas (2022... Vytenis Ver techninis prižiūrėtoja (2022... vytautas matulevičius (2022-02-1 13:00:57) ARVYDAS IEŠMANTAV Filialo direk (20...	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “MEDSTATYBA”

UAB "Medstatyba", Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius, tel. (370 5) 2613796, fax.(370 5) 2613768,
el. paštas: vytautas.matulevicius@medstatyba.lt, Įmonės kodas 122603589, PVM mokėtojo kodas 226035811.
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

UAB „Viamatika“

2022 05 11 Nr. 73
į 2021 11 23 Nr. 9-0458


UAB “Medstatyba” papildė projektinius sprendinius dėl sankasos stabilizavimo ir juos pateikė Rangovui. Taip pat vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentelė, projektuotojas neprieštarautų, kad žemės sanakso deformacijos modulis būtų pakeistas iš 45 MPa į 30 MPa.

Priedai:




1. Skersinių pjūvių brėžiniai A laida;
2. Medžiagų kiekių žiniaraštis A laida.

Projekto vadovas


Vytautas Matulevičius




PROJEKTUOJAMO PĖSČIŲŲ TAKO
DANGOS KONSTRUKCIOS SKERSINIS PJŪVIS 'I-I'.

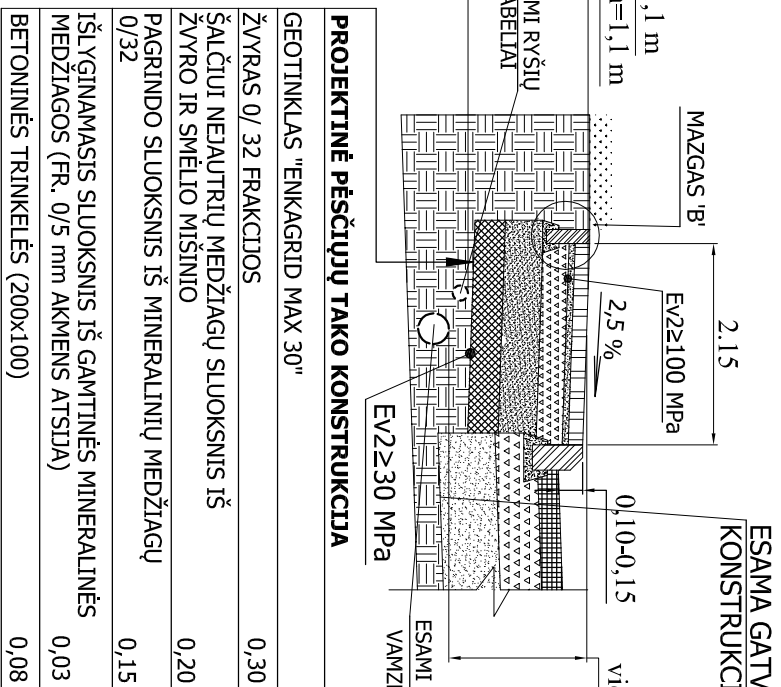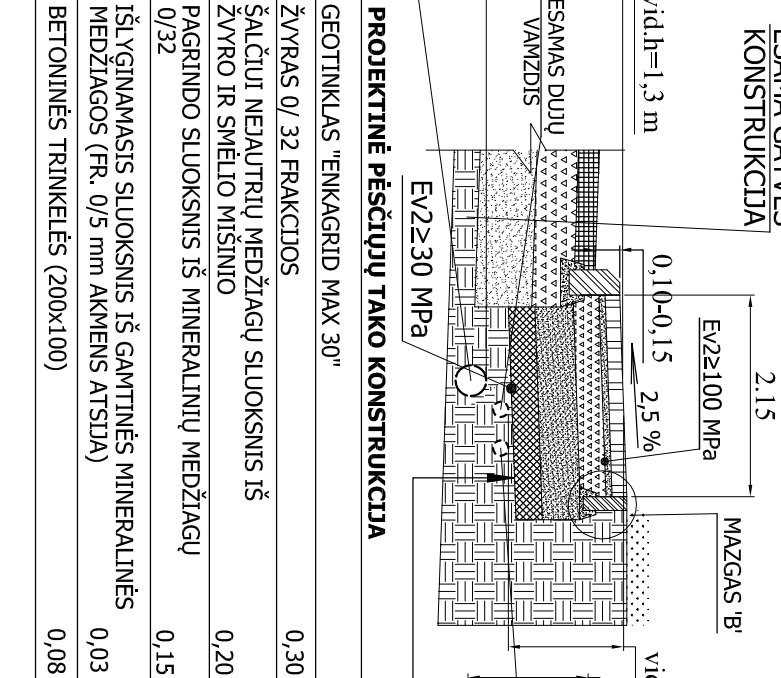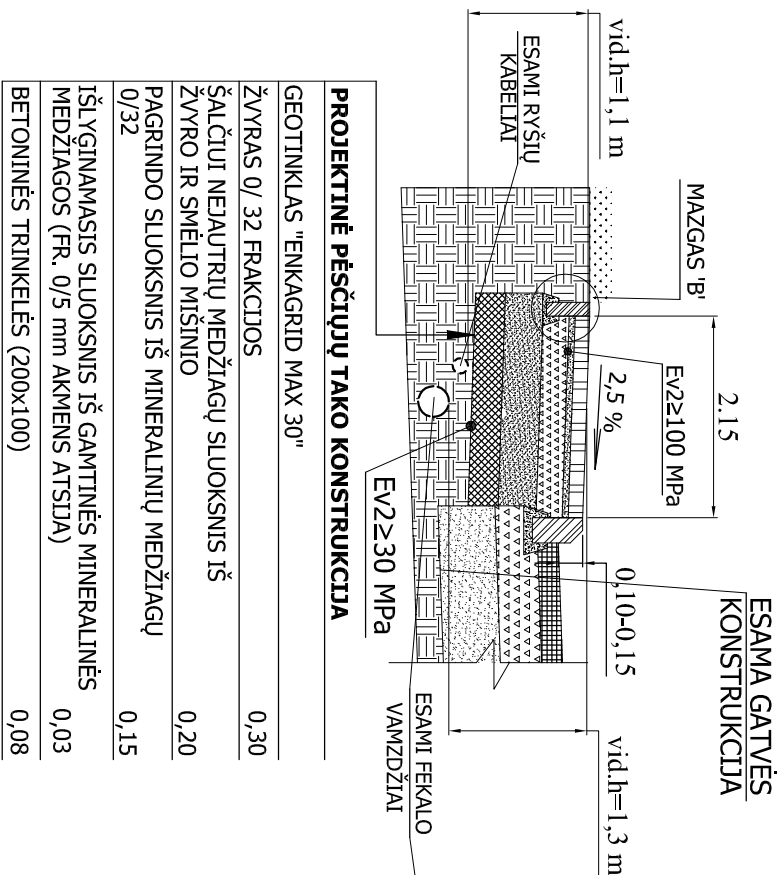


PROJEKTUOJAMO PĖSČIŲŲ TAKO
DANGOS KONSTRUKCIOS SKERSINIS PJŪVIS 'K-K'.

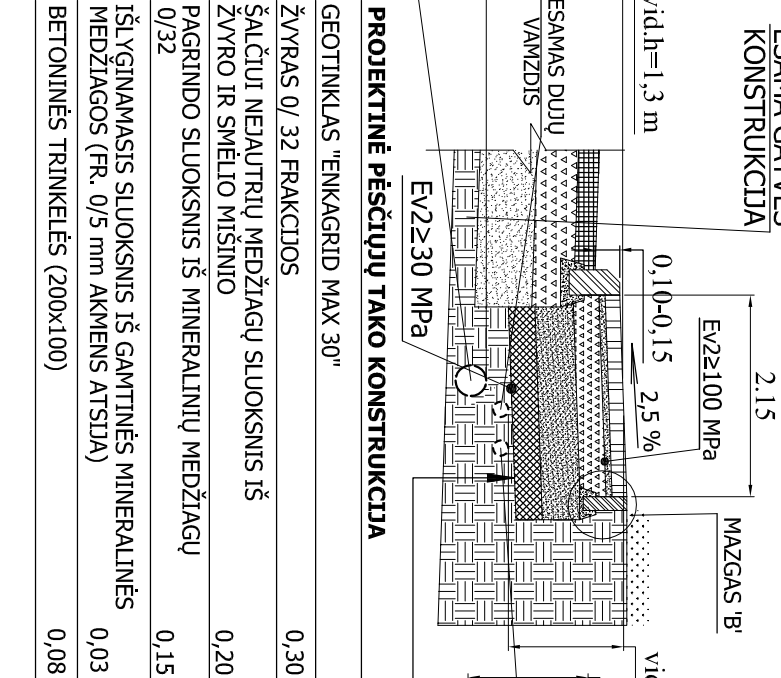


PROJEKTUOJAMO PĖSČIŲŲ TAKO
DANGOS KONSTRUKCIOS SKERSINIS PJŪVIS 'L-L'.

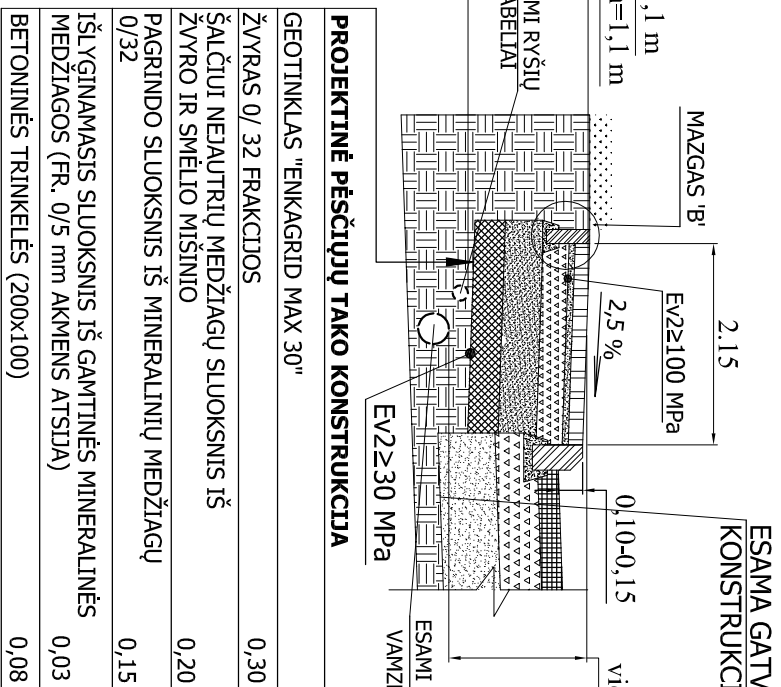


ESAMOS DANGOS PRIVEDIMO PRIE
GATVĖS BORTO PJŪVIS
"1-1"

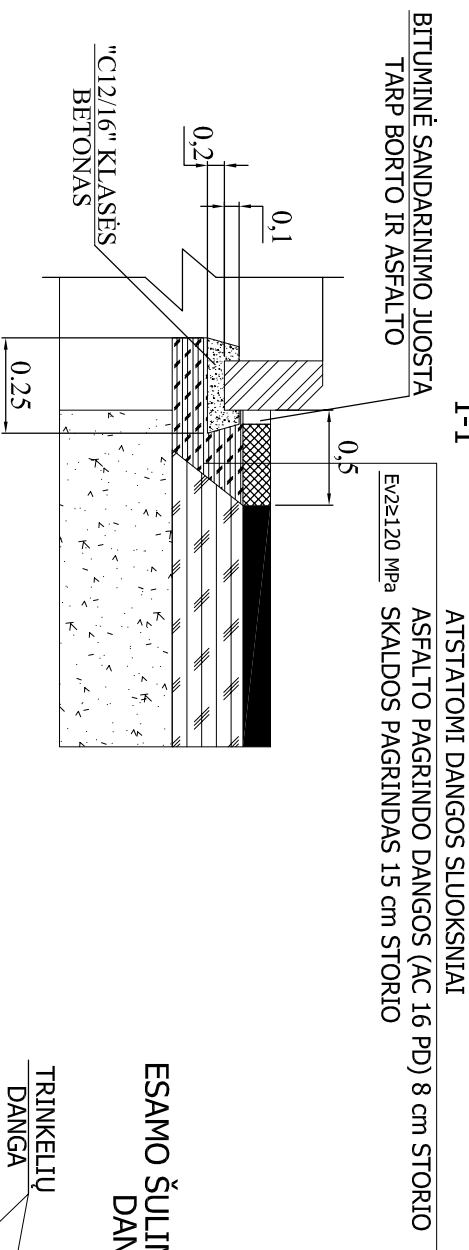




PROJEKTUOJAMO TAKO SUJUNGIMO
SU ESAMU TAKU PJŪVIS "2-2"

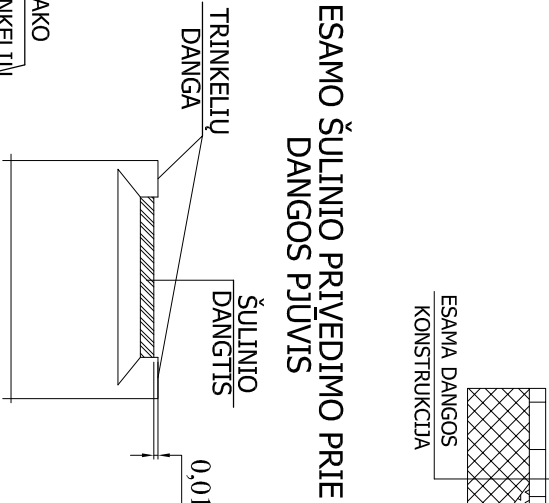

ESAMO ŠULINIO PRIVEDIMO PRIE
DANGOS PJŪVIS

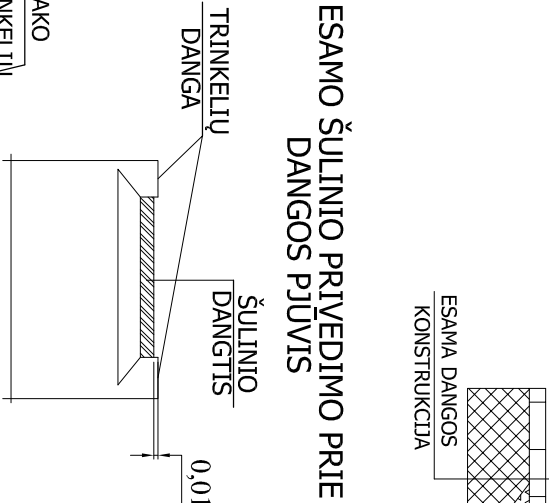


NUOVAŽOS ĮRENGIMO SCHEMA

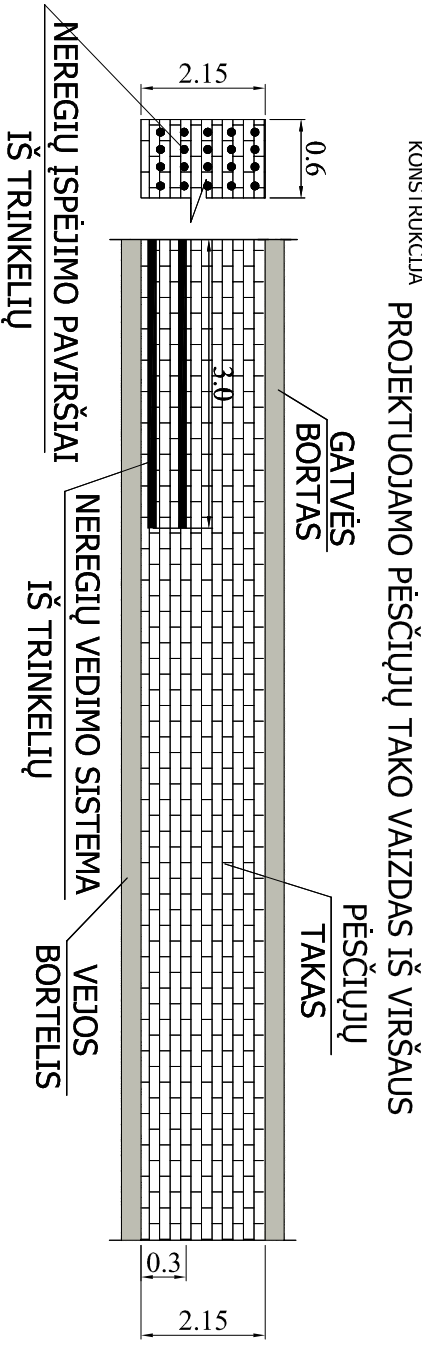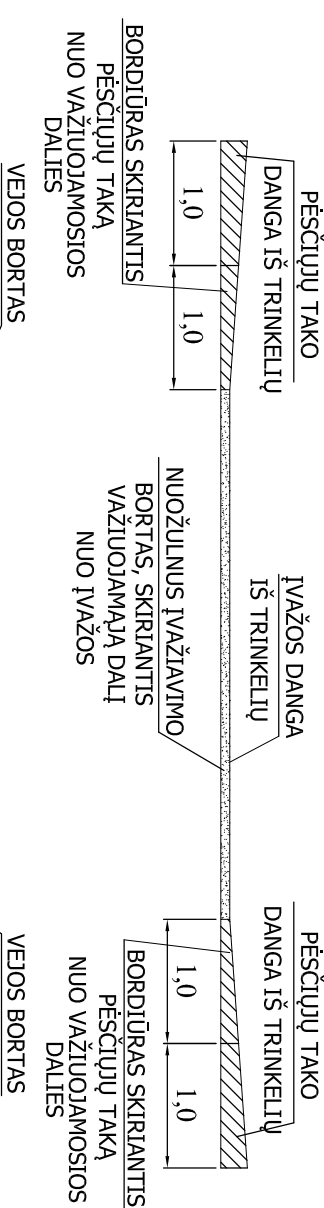

A	2022 - 01	Pirminė projekto laida statybos leidimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato Nr.	UAB "MEDSTATYBA" Ateities g. 10 LT08303 VILNIUS TEL.: 2613796	"VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3837 ŠAKIAI-BRIDŽIAI KURIAM ŠAKIŲ MIESTE SUTEIKTI STRUTŲ IR GRISKABIDŽIO GATVIŲ PAVADINIMAI, RUOŽIUSI Nuo 0,00 iki 0,20 km, Nuo 0,00 iki 0,23 km ir Nuo 0,23 iki 0,81 km, REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT TAKUS IR APSVIETIMĄ".
32198	PV	V.MATULEVIČIUS
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS
LT	UŽSAKOVAS: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	ELEMENTŲ CHARAKTERINGI PJŪVIAI IR MAZGAI
		TAKŲ
		Lapas
		Lapų

RENGIAMO PĖSČIŲJŲ TAKO POILSIO AIKŠTELĖS SKERSINIS PJŪVIS.

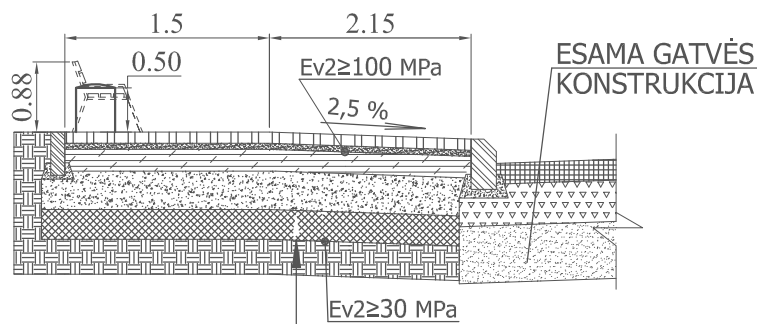


POILSIO AIKŠTELĖS DANGOS KONSTRUKCIJA

GEOTINKLAS "ENKAGRID MAX 30"	
ŽVYRAS 0/ 32 FRAKCIJOS	0,30
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS IŠ ŽVYRO IR SMĖLIO MIŠINIO	0,20
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ 0/32	0,15
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GAMTINĖS MINERALINĖS MEDŽIAGOS (FR. 0/5 mm AKMENS ATSIJA)	0,03
BETONINĖS TRINKELĖS (200x100)	0,08

POILSIO AIKŠTELĖS NEĮGALIESIEMS SITUACIJOS SCHEMA

NEREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
IŠ TRINKELIŲ SU APSKRITIMO
FORMOS IŠKILIMAIŠ

NEREGIŲ VEDIMO PAVIRŠIAI
IŠ TRINKELIŲ SU IŠKILIOMIS
LYGIAGREČIOMIS JUOSTELĖMIS

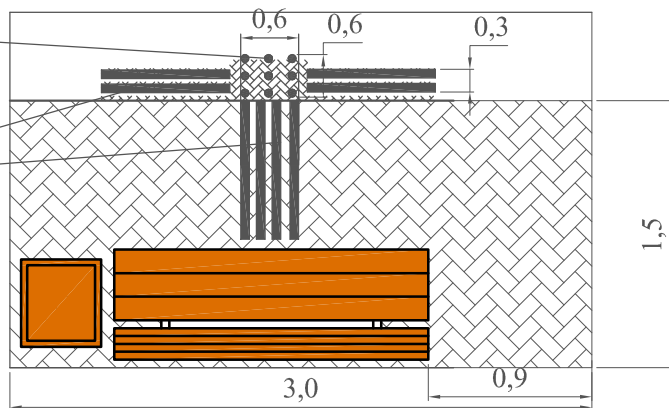

A	2022 - 01		Pirminė projekto laida statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Atestato Nr.	UAB "MEDSTATYBA" Ateities g.10 LT08303 VILNIUS TEL: 2613796		"VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3837 ŠAKIAI-BRIDŽIAI, KURIAM ŠAKIŲ MIESTE SUTEIKTI STRIŪPŲ IR GRIŠKABŪDŽIO GATVIŲ PAVADINIMAI, RUOŽUOSE NUO 0,00 IKI 0,20 KM, NUO 0,00 IKI 0,23 KM IR NUO 0,23 IKI 0,81 KM, REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT TAKUS IR APŠVIETIMĄ".			
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	TAKŲ ELEMENTŲ CHARAKTERINGI PJŪVIAI IR MAZGAI		Laida	
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS			A	
LT	UŽSAKOVAS: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		[19-14/1]-TDP-S-3		Lapas	Lapų
					2	2

Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis teritorijos sutvarkymui

Poz. Nr.	Techninė spec.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas
1.	Griškabūdžio g. pėsčiųjų tako iš trinkelio įrengimas					
1.1.	TS-02	Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	m ² /m ³	1800/720	1800/1260	0/540
1.2.	TS-01	Esamos 0,5 m pločio juostos asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną	m	950	-	-
1.3.	TS-01	Esamos pėsčiųjų tako asfalto dangos (0,06 m) storio ardymas ir išvežimas į sąvartyną.	m ² /m ³	390/23	-	-
1.4.	TS-01	Esamos pėsčiųjų tako plytelių dangos (0,07 m) storio ardymas ir išvežimas į sąvartyną.	m ² /m ³	265/19	-	-
1.5.	TS-01	Esamų gatvės bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną	m/m ³	700/32	-	-
1.5.1		Geotinklo „Enkagrid Max 30“ paklojimas	m ²	0	1800	1800
1.5.2		Žvyro 0/32 frakcijos užpylimas 30 cm	m ²	0	1800	1800
1.6.	TS-02	Grunto (lovio dugno) tankinamas 0,5 m gylyje	m ²	1800	-	-
1.7.	TS-03	Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas	m ³	420	-	-
1.8.	TS-04	Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas	m ²	1800	-	-
1.9.	TS-05	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas	m ²	1800	-	-
1.10.	TS-07	Betoninių trinkelio (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis	m ²	1650	-	-
1.11.	TS-07	Neregijų vedimo sistemos iš betoninių trinkelio (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas	m ²	150	-	-
1.12.	TS-07	Betoninių vejos bortų (1000x200x80	m	950	-	-

A	2022-01	Priminė projekto laida			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „MEDSTATYBA“ ATEITIES g. 10 08303 VILNIUS TEL. 261 37 96		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai-Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruožuose nuo 0,00 iki 0,20 km, nuo 0,00 iki 0,23 km ir nuo 0,23 iki 0,81 km, rekonstravimas, įrengiant takus ir apšvietimą“		
32198	PV	V.Matulevičius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Medžiagų kiekių žiniaraštis.		LAIDA
25889	PDV	V.Matulevičius			A
LT	UŽSAKOVAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO (19–14/1)–TDP–S-KŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 3

		mm) ant betono pagrindo įrengimas				
1.13.	TS-07	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas	m	950	-	-
1.14.		Sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas	m	950	-	-
1.15.	TS-06	Asfalto dangos 0,5 m pločio ir 8 cm storio atstatymas iš AC 16 PD	m	950	-	-
1.16.	TS-04	Mineralinių medžiagų 0/32 mišinio pagrindo 0,5 m pločio ir 15 cm storio atstatymas	m	950	-	-
1.17.		Vejos užsėjimas šalia pėsčiųjų tako	m ²	1400	-	-
1.18.	TS-08	Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas	vnt	3	-	-
1.19.		Esamų šulinių privedimas iki projektinės dangos	vnt	22	-	-
2. Striūpų g. pėsčiųjų tako iš trinkelio įrengimas						
2.1.	TS-02	Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	m ² /m ³	1150/460	1150/805	0/345
2.2.	TS-01	Esamos 0,5 m pločio juostos asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną	m	600	-	-
2.3.	TS-01	Esamos pėsčiųjų tako asfalto dangos (0,06 m) storio ardymas ir išvežimas į sąvartyną.	m ² /m ³	400/24	-	-
2.4.	TS-01	Esamų gatvės bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną	m/m ³	400/18	-	-
2.4.1		Geotinklo „Enkagrid Max 30“ paklojimas	m ²	-	1150	1150
2.4.2		Žvyro 0/32 frakcijos užpylimas 30 cm	m ²	-	1150	1150
2.5.	TS-02	Grunto (lovio dugno) tankinamas 0,5 m gylyje	m ²	1150	-	-
2.6.	TS-03	Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas	m ³	330	-	-
2.7.	TS-04	Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas	m ²	1150	-	-
2.8.	TS-05	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas	m ²	1150	-	-
2.9.	TS-07	Betoninių trinkelio (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis	m ²	1000	-	-
2.10.	TS-07	Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelio (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas	m ²	150	-	-
2.11.	TS-07	Betoninių vejų bortų (1000x200x80 mm) ant betono pagrindo įrengimas	m	600	-	-
2.12.	TS-07	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono	m	600	-	-

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(19–14/1)–TDP–S–KŽ	2	3	A

		pagrindo įrengimas				
2.13.		Sandarinio juostos tarp borto ir asfalto įrengimas	m	600	-	-
2.14.	TS-06	Asfalto dangos 0,5 m pločio ir 8 cm storio atstatymas iš AC 16 PD	m	600	-	-
2.15.	TS-04	Mineralinių medžiagų 0/32 mišinio pagrindo 0,5 m pločio ir 15 cm storio atstatymas	m	600	-	-
2.16.		Vejos užsėjimas šalia pėsčiųjų tako	m ²	1200	-	-
2.17.	TS-08	Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas	vnt	2	-	-
2.18.		Esamų šulinių privedimas iki projektinės dangos	vnt	17	-	-

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(19-14/1)-TDP-S-KŽ	3	3	A


UAB „Parama“ statybos vadovui Arvydui
Iešmantavičiui
Kopija:
Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-05-19	Nr.	9-2022-345
I _____	Nr.	_____

DĖL ŽEMĖS SANKASOS SUSTIPRINIMO SPRENDINIŲ ĮVERTINIMO (SUTARTIS NR. S-1335)

Išnagrinėję Jūsų 2022-05-18 dienos raštą Nr.05-279 dėl objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3837 Šakiai – Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruože nuo 0,00 iki 0,20, nuo 0,00 iki 0,23 ir nuo 0,23 iki 0,81 km rekonstravimas, įrengiant takus ir apšvietimą“, kuriuo pateikėte Projektuotojo UAB „Medstatyba“ patikslintus projektinius sprendinius bei patikslintus medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščius, kuriuos Projektuotojas pasiūlė dėl negaunamų reikalaujamų žemės sankasos stiprumo parametrų.

Išnagrinėję Projektuotojo pateiktą medžiagą, informuojame, kad pritariame Projektuotojo patikslintiems projektiniams sprendiniams ir pagal Projektuotojo pateiktus patikslintus medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščius prašome pateikti savo pasiūlymą darbų atlikimui.



Techninis prižiūrėtojas

Vytenis Venclova

ORIGINALAS NEBUS IŠSIŪSTAS
