

Užsakovas: UAB „Kretingos vandenys“

Sutartis: Nr. 8-144

Rangovas: UAB „Plungės lagūna“, Plungės g. 28 Rietavas

Sutarties pavadinimas: „Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinio remonto darbai“

Dokumentą elektroniniu parašu

pasirašė RYTAUTAS, JAKULIS

Data: 2025-04-08 15:27:40


OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 3

Data: 2025-03-14

2025-03-05 dieną nuotoliniu būdu įvykusio pasitarimo Nr. 3 savivaldybės I a. salėje metu nutarta, kad visi nustatyti projektinės ir faktinės situacijos neatitikimai ir netikslumai turi būti fiksuojami objekto apžiūros aktais, kuriuose priimami atitinkami sprendimai, kaip tuos neatitikimus šalinti. Šiuos aktus pasirašo visi apžiūros dalyviai. Taip pat nutarta, kad iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios bus išleista nauja projekto laida, į kurią bus įtraukti visi projekto pakeitimai ir parengtas darbų pakeitimo aktas.


Rangovui pagal projektą „*Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinio remonto darbai*“ (toliau Projektas) atliekant lietaus nuotekų tinklo L1 įrengimo darbus iškilo šie klausimai:

1. Dėl vandentiekio trasos padėties neatitikimo projektui negalima į projektinę padėtį pastatyti šulinio LŠ3. Norint išsaugoti esamą vandentiekio trasą, šulinį reikia patraukti 100 cm į šoną. Šulinio centras atsiduria tiesiai po kelio bortų linija.

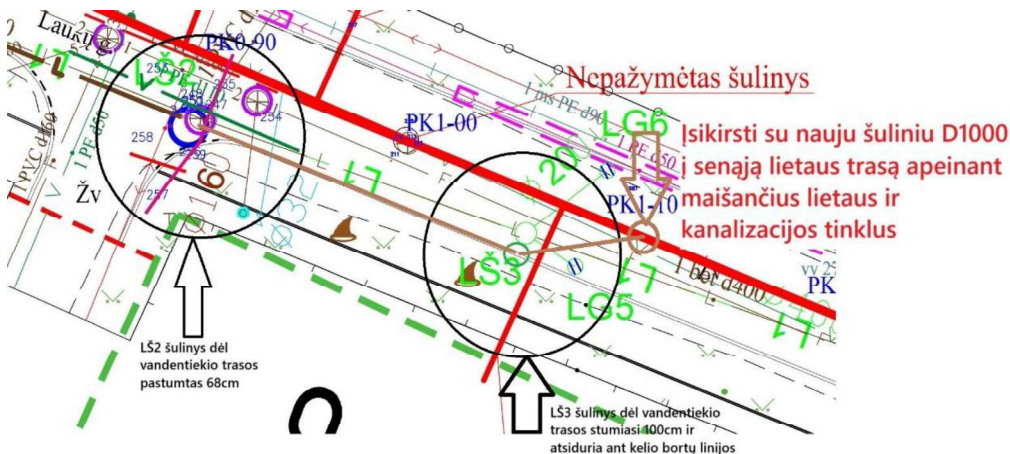

Galimas problemos sprendimas būtų į LŠ3 šulinį sumontuoti bordiūrinio tipo lietaus surinkimo groteles (yra numatyti projekte 6 vnt.) ir neberengti lietaus surinkimo šulinėlio LG5, kuris tampa nebereikšmingu.

2. Tarp šulinio LŠ3 ir LŠ4 lietaus kanalizacijos trasa smailiu kampu kerta vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklus, todėl praktiškai neįmanoma po jais praeiti.

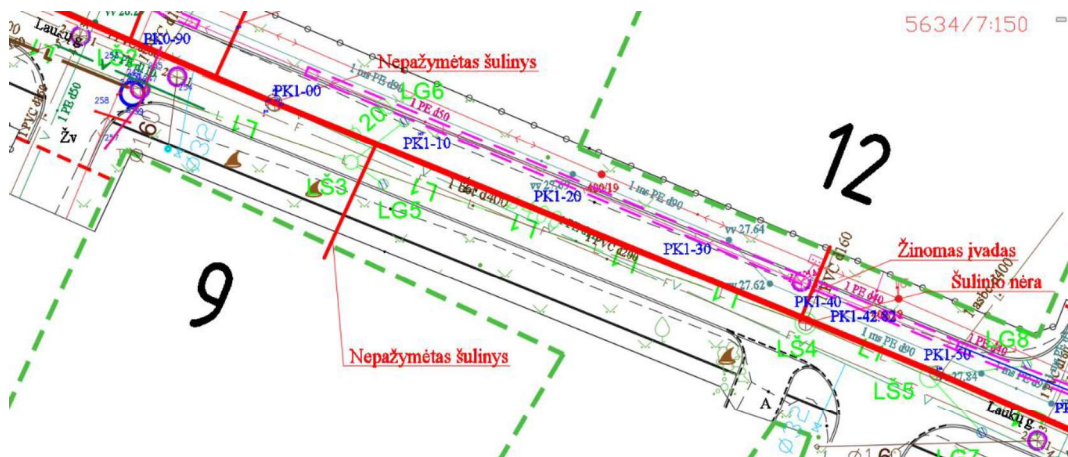

Galimas problemos sprendimas nuo LŠ3 šulinio lietaus kanalizacijos trasą L1 į kitą gatvės pusę perkelti kertant neprojektinėje padėtyje esančius vandentiekio ir kanalizacijos tinklus iki 45 laipsnių kampu, kas leistų išvengti šių tinklų sugadinimo. Senoje lietaus trasoje pastatyti papildomą d1000 šulinį ir toliau naują lietaus kanalizacijos trasą kloti demontuojant senos trasos vamzdžius.

NUTARTA:

1. Pk 1+00 demontuoti projekte nepažymėtą D1000, 3,5 m gylio šulinį Nr.2;
2. Pk 1+07 ant šulinio vietoje uždaro plaukiojančio tipo šulinio liuko uždėti D700 bordiūrines groteles 1 vnt.;
3. Pk 1+10 pastatyti papildomą D1000, 3,3 m aukščio šulinį PLŠ2 (pilnas komplektas);
4. Pk1+12 nerengti LG5 lietaus surinkimo šulinio.
5. Pk 1+03 pajungti į LŠ3 šulinį nepažymėtą d160 įvadą iš sklypo Nr. 9.

Rangovas parengia ir prie šio apžiūros akto prideda papildomų darbų sąmatą (priedas Nr. 1) ir pajungimo schemą (priedas Nr. 2). Papildomi darbai vykdomi nedelsiant, vėliau (kai bus rengiamas) juos įtraukiant į papildomą susitarimą. Projekto sprendinius atkoreguoti užbaigus statybos darbus, išleidžiant naują projekto laidą, už tai yra atsakingas Statytojas.

PRIDEDAMA: 1. Priedas Nr. 1. Preliminari papildomų ir nevykdomų darbų sąmata;

2. Priedas Nr. 2. Prijungimo schema.

UAB „Kretingos vandenys“

Donatas Sirutis

UAB „Inžinerijospro“

statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Rytautas Jakulis

UAB „Tvari inžinerija“

projekto vykdymo priežiūros vadovė

Daiva Dambrauskienė

UAB „Plungės lagūna“ statybos darbų vadovas


Valdas Bulzgis

ĮKAINOTAS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Laukų gatvės KT8009, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Laisvės gatve iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinis remontas

LIETAUS NUOTEKŲ DALIS (apžiūros aktas Nr.3)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Pastaba
PAPILDOMI DARBAI						
	Lietaus tinklai					
1.	PVC savitakiniai vamzdžiai Ø 160 mm, su sujungimo detalėmis, įskaitant visus reikalingus žemės darbus, gruntinio vandens šalinimą, montavimo darbus, sistemos išbandymą, praplovimą, televizinę diagnostiką	m	3			Sutartinis kainis
2.	Lietaus surinkimo šulinys d700 mm ir jo įrengimas, Hvid=1.90m (įskaitant 0,30 cm nusodinimo dalį), su visa reikiama hidroizoliacija (su protarpinėmis, su bordiūrinėmis grotelėmis), su montavimu	kompl.				Sutartinis kainis
3.	Apvalus surenkamas gelžbetoninis DN 1000 mm kanalizacijos šulinys ir jo įrengimas, Hvid=2,50 m ,su visa reikiama hidroizoliacija (su protarpinėmis, ketiniu dangčiu, šulinių žymėjimo ženklais, su kritimo stovais), su montavimu	kompl.				Sutartinis kainis
4.	Demontuojami esami gb d1000 šuliniai (išardomi)	kompl.				Sutartinis kainis
Viso papildomi darbai						
NEVYKDOMI DARBAI						
	Lietaus tinklai					
6.	Lietaus surinkimo šulinys d700 mm ir jo įrengimas, Hvid=1.90m (įskaitant 0,30 cm nusodinimo dalį), su visa reikiama hidroizoliacija (su protarpinėmis, ketiniu grotelių dangčiu), su montavimu	kompl.				
Viso nevykdomi darbai						

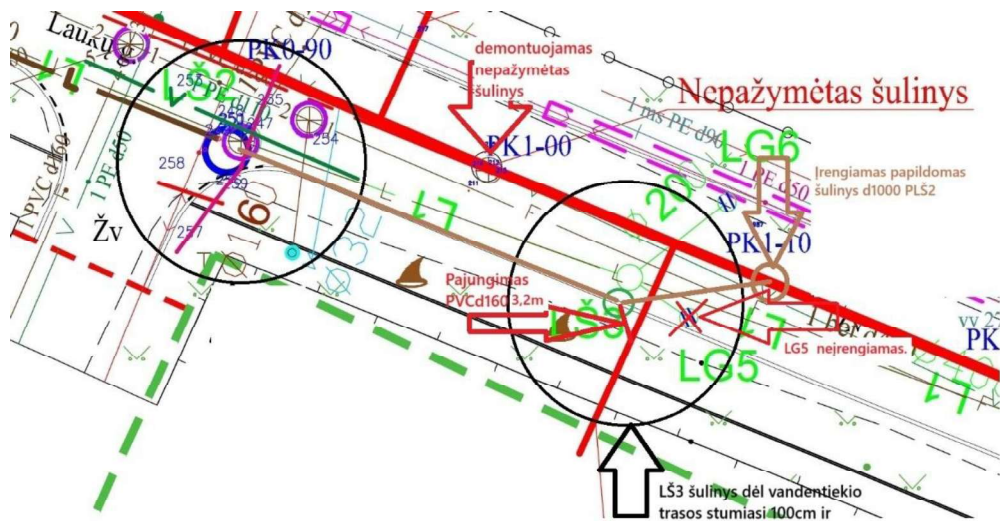

Nepažymėtas šulinys

d1000
nant

LŠ3 šulinys dėl vandentiekio
trasos stumiasi 100cm ir
atsiduria ant kelio bortų linijos
LŠ3 įrengiamas su bordiūrinėmis grotelėmis patrauktas apie 100cm
