

Kitų inžinerinių statinių Gričiupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studentų, Gričiupio, Saulės ir Rytų gatvių, Kauno m., naujos statybos projektas (Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas).

2024-01-05 Rangos sutartis Nr. SR-9

2025-07-17 36-3-304
Darbų pakeitimo aktas Nr. 4

Pavadojantis skyriaus vedėjas

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjo pavaduotojas,

Komisija, sudaryta iš:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriaus vedėja

Svajūnas Urbonavičius
20.....

Radeta Savickienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Ramūnas Judeika

MB „2 passibus anteire“ Techninės priežiūros vadovas

Audrius Šulga

UAB „Giedraitis & Architektai“ Projekto vadovas

Rimantas Giedraitis

UAB „Žilinskis ir Co“ Rangovo atstovas

Saulius Baltutis

1. Dėl papildomų darbų įrengiant pasostes ant betoninių suolų Gričiupio parke

Po atliktos apžiūros (žr. priedą Nr.1), buvo priimtas sprendimas atnaujinti betoninių suolų projektinius sprendinius. Įrengus medines pasostes, suoliukai taptų labiau praktiški naudojimui šaltesniu ar lietingu metų periodu. Projektuotojas pateikė betoninių suoliukų apdailą su mediena ant aliuminio lagių (žr. priedą Nr.2).

Darbai, kurie nėra numatyti Techninio projekto bei Sutarties apimtyje, tačiau reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui, laikytini kaip papildomi, todėl Rangovas prašo Užsakovo pritarti Techninio projekto sprendinių (specifikacijos su brėžiniais) keitimui bei patvirtinti papildomus darbus papildomu susitarimu (papildomų darbų sąmata pridedamos priede Nr.3).

Papildomi darbai: 4920,08 Eur be PVM; darbų vertė 5953,30 Eur su PVM.

Neatliekami darbai: 0,00 Eur.

Darbų pakeitimo bendra vertė: 4920,08 Eur be PVM; darbų vertė 5953,30 Eur su PVM (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai, 30 ct.)

Komisija siūlo pritarti Techninio projekto sprendinių koregavimui ir papildomiems darbams pagal prieduose pateiktą sąmatą.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas Nr.4 (1 lapas).
2. Betoninių lauko suoliukų sprendinys su medienos apdaila (1 lapas).
3. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis-sąmatą (1 lapas).
4. Komercinis pasiūlymas (2 lapai).

		<i>Pavarduojantis skyriaus vedėjas</i> Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas	Paršas Data
Komisija:	V. Pavardė		
Užsakovo atstovas	R. Savickienė	<i>Svajūnas Urbonavičius</i>	<i>2025-07-17</i>
Užsakovo atstovas	R. Judeika	<i>R. Judeika</i>	<i>2025-07-17</i>
Techninės priežiūros vadovas	A. Šulga	<i>A. Šulga</i>	<i>2025-07-15</i>
Projekto vadovas	R. Giedraitis	<i>R. Giedraitis</i>	<i>2025-07-15</i>
Rangovo atstovas	S. Baltutis	<i>SAULIUS BALTUTIS</i> ŽILINSKIS CO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VADOVAS	<i>2025-07-15</i>

APŽIŪROS AKTAS Nr. 4

2025-06-16

OBJEKTAS: Kitų inžinerinių statinių Gričiupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studentų, Gričiupio, Saulės ir Rytų gatvių, Kauno m., naujos statybos projektas (Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas).

SUTARTIS: 2024-01-05 Nr. SR-9

Apžiūros metu nustatyta:

1. Atliekant apžiūrą, nustatyta, jog naujai įrengti betoniniai parko suolai po lietaus ar žiemos metu yra nepraktiški naudojimui, nes neturi pasostės. Nutarta patikslinti sprendinius, suprojektuojant visiems betoniniams parko suolams pasostes.

Nuspręsta – patikslinus projektinius sprendinius dėl pasosčių betoniniams suolams, atlikti šių sprendinių sąmatinius skaičiavimus.

Apžiūroje dalyvavo:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriaus vedėja

Pavarduojantis skyriaus vedėjas
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Svajūnas Urbonavičius
20.....

Radeta Savickienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Ramūnas Judeika

Ramūnas Judeika

MB „2 passibus anteire“ Techninės priežiūros vadovas

Audrius Šulga

Audrius Šulga

UAB „Giedraitis & Architektai“ Projekto vadovas


Rimantas Giedraitis

Rimantas Giedraitis

UAB „Žilinskis ir Co“ Rangovo atstovas

SAULIUS BALTUTIS
ŽILINSKIS CO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VADOVAS
Saulius Baltutis

Saulius Baltutis

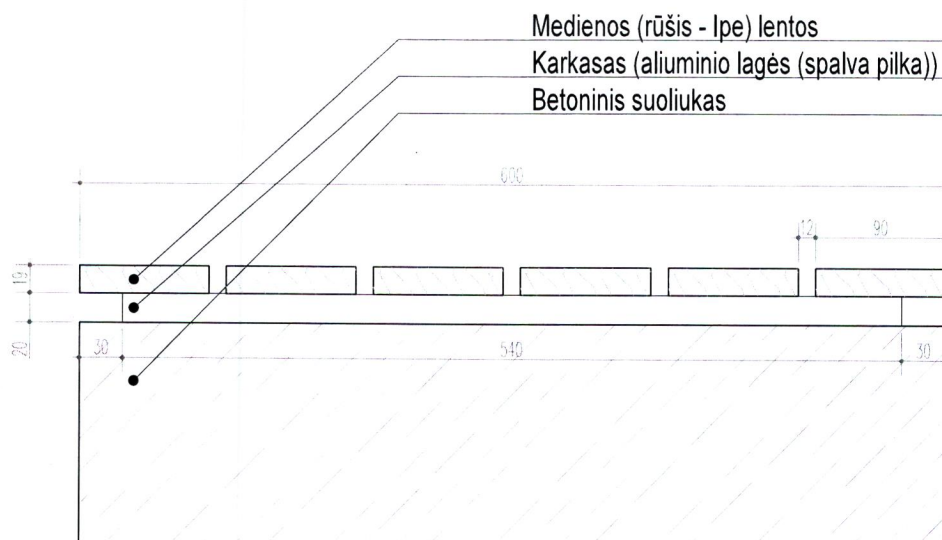

PASTABOS:

1. Medienos lentų kryptis išilga suoliuko ilgajai kraštinei.
2. Medienos lentos negali būti išilgai sudurtos iš atskirų segmentų.
3. Medienos lentų visų briaunų užapvalinimo radiusas 3 mm.
4. Karkasas turi būti išdėstytas tiksliai vienodais tarpais.
5. Medienos lentų kraštai visomis kryptimis turi sutapti su betono kraštais.
6. Karkaso kraštiniai segmentai turi būti įgilinti betono ir medienos lentų atžvilgiu 30 mm.
7. Medienos lentos prie karkaso tvirtinamos iš karkaso apačios. Tada visas segmentas kiaurai per karkasą (tarpuose tarp medienos lentų) tvirtinamas į betoną.
8. Matomi varžtai turi būti pilko metalo.
9. Suolų matmenys (betoninių dalių horizontalių plokštumų) ir kiekiai, kuriems reikalinga medienos lentų apdaila: 600 x 2400 mm (8 vnt.), 600 x 600 mm (10 vnt.).

0	2025 06	PROJEKINIAMS SPRENDIMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	GIEDRAITIS & ARCHITEKTAI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UAB "GIEDRAITIS & ARCHITEKTAI" Draugystės g. 15B, Kaunas 51228, tel. nr. +37069911770		Kitų inžinerinių statinių Gričiupio parke (NTR u. nr. 4400-1756-2559) tarp Studentų, Gričiupio, Saulės ir Rytų gatvių, Kauno m., naujos statybos projektas (Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)	
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
			-	
A1235	PV	R. Giedraitis	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Projektuojamų lauko suoliukų medienos apdaila	LAIDA
A1235	PDV	R. Giedraitis		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Žilinskis ir Co"		DOKUMENTO ŽYMUO 12-S0419-1.DP.SA. B-05	A4 / M 1 : 5
				LAPAS LAPŲ
				1 1

[Handwritten signature]

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (NAUJI ĮKAINIAI)

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 80 Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Statiny 3 Gričiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Žiniaraštis 1 Architektūrinė dalis

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Projektuojamų lauko suoliukų medienos apdaila				
1		Medinės terasinių lentų 19x90x600mm įrengimas ant aliuminio lagių	vnt	10	117.12	1171.20
2		Medinės terasinių lentų 19x90x2400mm įrengimas ant aliuminio lagių	vnt	8	468.61	3748.88
		Iš viso				4,920.08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1,033.22
		Iš viso su PVM				5,953.30



SAULIUS BALTUTIS
S ŽILINSKIS CO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VADOVAS

Komerčinis pasiūlymas 25-06/20

Užsakovas: Žilinskis ir CO
 Projekto apibūdinimas:
 Data: 2025 Birželio 20 d.
 Paruošė: Povilas Markauskas

1. TERASINĖS LENTOS

- Medinės terasinės lentos
 - 19 x 90 x 600 mm
 - 19 x 90 x 2400 mm
- FSC Certificatas: Ne
- Profiliuota – stačiakampis profilis su apvalintais kampais
- Apdaila: Bespalvė terasinė alyva iš 4 pusių
- Karkasas: Aliuminio lagės 20x40x540 mm
- Kiekis: 15m² + % = 19 m² (kiekis pagal užsakovo pateiktus matmenis)

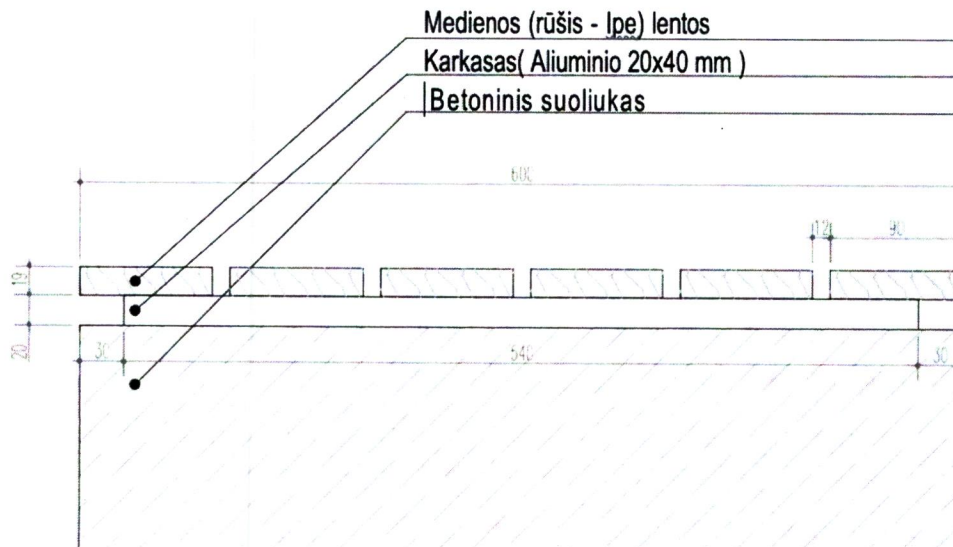

2. PASIŪLYMAS

No.	Product	Amount	Unit	Price, €	Sum
1	IPE (19x90x600mm ir 19x90x2400 mm)	19	m2	125.00 €	2,375.00
	Su nuolaida :	19	m2	117.45 €	2,231.55
2	Medžiagos				
	Alivavimas gamykloje iš 4 pusių (kietmedžio lentų)	19	m2	14.175 €	269.33
	Aluminio lagės 20x40x540	60	m1	12.825 €	769.50
	A2 medisraigčiai	800	pcs	0.2025 €	162.00
	Transportas	1	kompl.	877.5 €	877.50
	Terasinių lentelių supjaustymas reikiama ilgiais/ padengimas alyva.	1	kompl.	610.2 €	610.20
				Suma : €	4,920.08
				PVM : €	1,033.22
				Viso €	5,953.29

Šiame pasiūlyme nėra įvertinta:

- Išskrovimas - sunešimas
- Montavimo darbai

3. PARDAVIMO SĄLYGOS

- Incoterms & kainos: EXW Kaunas, Lithuania (Incoterms 2010)
- Transportas/ pristatymas bus tikslinamas atskirai prieš pristatymą.
- Avansinė įmoka 60%. 40% - prieš pristatant prekes

Pardavėjas:
UAB „Nedlit International“
