

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. BALANDŽIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SS-2021-308

2021 m. liepos 14 d. Nr. SS-2021- 580
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Balčyčio (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2021-04-23 tarp Šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2021-308 (toliau – Sutartis) atlikti antro ir trečio etapo Darbus, nurodytus techninio projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir statybos, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė“ Nr. SS2006-XX-TP apimtyse (taikoma antrai Sutarčiai) už 402 301,08 (keturi šimtai du tūkstančiai trys šimtai vienas euras 08 ct) Eur su PVM iki 2021-12-31.

I. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 3.3 papunkčiu, pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.2. Sutarties 10.1 ir 10.1.4 p., numatančiais, kad Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, kurie gali apimti bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Taip pat, kad pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius, įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

1.3. Sutarties 10.2 ir 10.2.3 p., nustatančiais, kad pakeitimai forminami tokia tvarka: papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 (penkiolika) proc. Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų darbų, t. y. papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

1.4. Sutarties 10.3 p., pagal kurį pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

1.5. VPĮ 89 str. 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

1.6. VPĮ 89 str. 1 dalies 3 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

1.7. Rangovo 2021-05-14 raštu Nr. ST21-26.


1.8. 2021-05-18 Pasitarimo protokolu Nr. PP-8.

1.9. Lokalinėmis sąmatomis.

1.10. Darbų vietos schema.

II. Šalys susitaria:

2.1. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį papildomus Darbus – nuotekų tinklų įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detalčiai įvardinti Rangovo pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.9.1 p. a)



papunktį – pritaikant Rangovo Darbų Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius, iš viso sudarančius 1417,41 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai septyniolika eurų 41 ct) su PVM;

2.2. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį papildomus Darbus – nuotekų tinklų įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detalai įvardinti Rangovo pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.9.1 p. b) papunktį – įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas, iš viso sudarančius 7 233,60 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt trys eurai 60 ct) su PVM;

2.3. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį papildomus Darbus – takų įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detalai įvardinti Rangovo pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.9.1 p. a) papunktį – pritaikant Rangovo Darbų Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius, iš viso sudarančius 40 139,94 Eur (keturiasdešimt tūkstančių šimtas trisdešimt devyni eurai 94 ct) su PVM.

III. Baigiamosios nuostatos:

4.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

4.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4.4. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama jo dalis:

4.4.1. Rangovo 2021-05-14 rašto Nr. ST21-26 kopija, 5 lapai;

4.4.2. 2021-05-18 Pasitarimo protokolo Nr. PP-8 kopija, 3 lapai;

4.4.3. Lokalinių sąmatų kopijos, 5 lapai.

4.4.4. Darbų vietos schemos kopija, 1 lapas.

4.5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

Tel. (8 425) 57 133

Faksas (8 425) 56 594

El. p. info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pakouskas



Rangovas

UAB „Storoma“

Įm. kodas 303034637

Sąskaitos Nr. LT51 7300 0101 3496 4938

AB Swedbank

PVM mokėtojo kodas LT100007629613

Mažeikių g. 17C, LT-87101 Telšiai


Tel. +370 604 45901

El. p.: info@storoma.lt

Direktorius

Nerijus Balčytis

(parašas)
A.V.



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtoji
Rimantui Muniui

2021-05-14 ST21-26

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
FIDIC inžinieriui
Sauliui Zakarauskui

Rangos sutartis: Nr. SS-2021-308, data 2021-04-23

Projektas: „Sporto paskirties inžinerinio statinio statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir statybos, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, projektas“

DĖL PRASTOS KANALIZACIJOS TINKLŲ BŪKLĖS

Rangovas UAB „Storoma“, juridinio asmens kodas 303034637 vykdo su Akmenės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188719391 (toliau – Užsakovas) 2021-04-23 pasirašytą rangos sutartį Nr. SS-2021-308 (toliau – Sutartis), dėl projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir statybos, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, projektas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo.

Projektu numatyta išardyti esamas betonines tvoras, buvusių šiltnamių pamatus, taip pat esamas takų ir kiemo aikštelės dangas. Atlikus ardymo ir paruošiamuosius darbus, įrengiami lauko lietaus nuotekų tinklai šulinių dangčius pakeliant iki naujų dangų viršaus, nauji pėčiųjų takeliai bei poilsio zonos, aplink pasodinant veją.

Rangovui pradėjus vykdyti demontavimo darbus ir atkasus esamos kanalizacijos tinklus paaiškėjo, jog esami tinklai senos statybos ir prastos būklės, t.y. prastos būklės vamzdžiai, esami šuliniai sutrūkinėję, jie pamūryti iš plytų, šulinių viršutinė dalis suaižėjusi (kai kur įrengti betoniniai kūgiai šulinių dangčiams uždėti), uždengti dangčiai laikosi nestabiliai. (priedas Nr.1). Aukščiau paminėti darbai ir jų atlikimas nenumatyti pateiktame techniniame projekte, taip pat nebuvo galimybės jų numatyti kokursinio pasiūlymo pateikimo metu.

Rangovas, būdamas suinteresuotas kokybišku darbų, pagal Sutartį, įvykdymu, informuoja Užsakovą ir FIDIC inžinierių, kad tokios būklės esamus vamzdžius ir šulinius reikėtų keisti naujais (nenumatytų darbų sąmata pateikiama priede Nr.2), kas vėliau leis sutaupyti Užsakovo lėšas, reikalingas naujai įrengtų dangų ardymui, kad būtų galima pakeisti esamus inžinerinius tinklus naujais.

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas aplinkybes Rangovas mano, kad nurodytos priežastys turėtų mažesnę įtaką Sutarties įvykdymui jei būtų pritarta šių, nenumatytų, darbų atlikimui ir jie būtų atlikti kaip įmanoma greičiau.



Rangovas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, siekdamas kokybiškai atlikti techniniame projekte numatytus darbus ir išvengti galimų nusiskundimų ar nuostolių tiek sau, tiek Užsakovui, prašo įvertinti susidariusią situaciją ir priimti sprendimą dėl esamų inžinerinių tinklų sutvarkymo/pakeitimo bei informuoti Rangovą apie tolimesnę darbų eigą.

Priedama:

Priedas Nr. 1 Esamų tinklų fotofiksacijos (3 lapai);

Priedas Nr. 2 Lokalinė sąmata (1 lapas);

UAB „Storoma“ direktorius

Nerijus Balčytis

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Nerijus Balčytis tel. Nr. +37061529219, el. p. nerijus@storoma.lt

Uždara akcine bendrovė „Storoma“
storoma@storoma.lt
www.storoma.lt


Mažeikių g. 17 C, LT-87101 Telšiai
Juridinio asmens kodas 303034637
PVM mokėtojo kodas LT100007629613

„Swedbank“ AB
A/s LT51 7300 0101 3496 4938
Banko kodas 73000

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus
Vytausioji specialistė
Greta Rimkutė
2011-07-15

Esamų tinklų fotofiksacijos

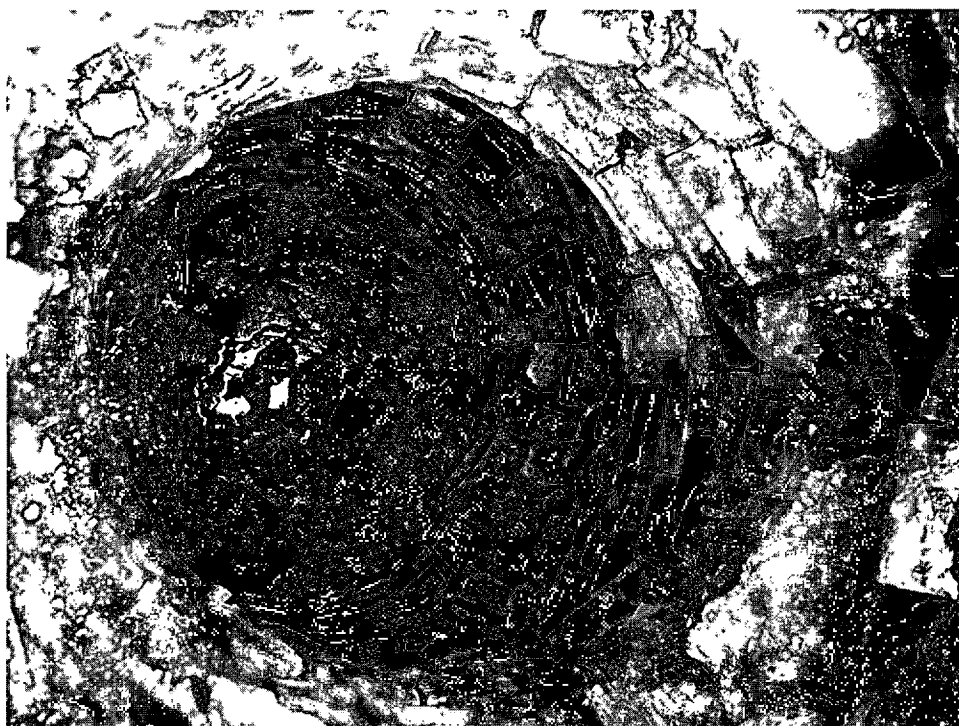

1 pav. Esamas šulinys




2 pav. Esamas šulinys

Uždara akcinė bendrovė „Storoma“
storoma@storoma.lt
www.storoma.lt

Mažeikių g. 17 C, LT-87101 Telšiai
Juridinio asmens kodas 303034637
PVM mokėtojo kodas LT100007629613

„Swedbank“ AB
A/s LT51 7300 0101 3496 4938,
Banko kodas 73000

Kopija tikra





3 pav. Esami šuliniai




4 pav. Esamų šulinių dangčiai

Uždara akcinė bendrovė „Storoma“
storoma@storoma.lt
www.storoma.lt

Mažeikių g. 17 C, LT-87101 Telšiai
Juridinio asmens kodas 303034637
PVM mokėtojo kodas LT100007629613

„Swedbank“ AB
A/s LT51 7300 0101 3496 4938,
Banko kodas 73000

Kopija tik-ra

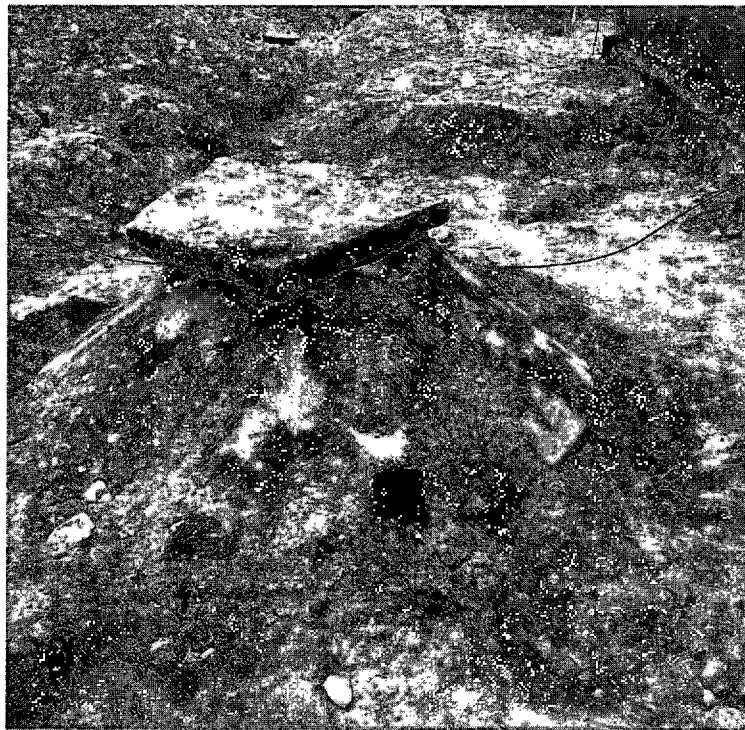

5 pav. Esamų šulinių kūgiai dangčiams



6 pav. Esamų šulinių kūgiai dangčiams

**PROJEKTO „AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
SPORTO AIKŠTYNO, VYTAUTO G. 3, NAUJOJOJE AKMENĖJE, ATNAUJINIMAS“**

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. PP- 8

2021-05-18

Naujoji Akmenė

- Pirmininkas: Birutė Baltutienė,
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktorė.
- Sekretorius: Rimantas Munius, atsakingas už sutarties vykdymą, Akmenės rajono savivaldybės
administracija statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas
- Dalyviai: *(dalyvių vardai, pavardės)*. Sąrašas pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl kanalizacijos tinklų remonto darbų;
2. Dėl papildomų darbų pėsčiųjų takų įrengimo ir atnaujinimo, bei papildomai naikintinių medžių.

SVARSTYTA:

1. Rangovas 2021m. gegužės 14 d. raštu Nr.ST21-26 informavo, kad pradėjus vykdyti demontavimo darbus ir atkasus esamos kanalizacijos tinklus paaiškėjo, jog esami tinklai senos statybos ir prastos būklės, t. y. prastos būklės vamzdžiai, esami šuliniai sutrūkinėję, jie pamūryti iš plytų, šulinių viršutinė dalis suaižėjusi (kai kur įrengti betoniniai kūgiai šulinių dangčiams uždėti). Pradėjus gerbūvio darbus, klojant grunto pasluoksnius pastebėta, kad uždengti dangčiai laikosi nestabiliai. Kad projektą užbaigti tinkamai ir kokybiškai Rangovas siūlo tokios būklės vamzdžius ir šulinius pakeisti naujais.

Užsakovas atlikdamas darbų pirkimą negalėjo numatyti, kad kanalizacijos tinklai yra prastos būklės ir kad juos reikės keisti.;

2. Objekte konsultacijai dalyvavo neįgaliųjų atstovas Šiaulių regione Rimantas Laurinavičius. Jis nurodė, kad nepriims objekto naujai įrengti takeliai susijungia su esama infrastruktūra. Esami takeliai yra prastos būklės ir nepritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Į naujai įrengtą sporto aikštyną su prieigomis pritaikytą neįgaliesiems, negalės judėjimo negalią turintys asmenys patekti dėl prastos kokybės esamų takelių. Kad tinkamai užbaigti projektą ir naujai įrengti takeliai būtų sujungti su esama infrastruktūra reikalinga koreguoti darbo projektą numatant pratęsti takelius iki esamų takelių, rekonstruoti esamą takelį palei sklypo ribą. Tam tikslui rangovas turi paskaičiuoti reikalingų atlikti darbų, kad įrengti ir atstatyti esamus takelius darbų kiekius ir pateikti atliekamų darbų sąmatas. Darbo projekte pažymėti tvarkomų takelių ribas.

Vykdamas rangos darbus nustatyta, kad senas vaismedžių sodas nebedera prie tvarkomos teritorijos įvaizdžio. Pasikonsultavus su kraštovaizdžio kūrėjais priimtas sprendimas, papildomai šalinti

Kopija tikra

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštarauja protokolo nutarimams.

nenumatytus projekte naikintinus medžius. Su Akmenės rajono savivaldybės turto skyriaus vedėjos pavaduotoju Svajūnu Vilku buvo pažymėtini nesaugotini medžiai.

NUTARTA:

Eil. Nr.	Nutarta	Atsakingas asmuo ar organizacija	Įvykdymo terminas
1.	Pateikti patikslintą darbų sąmatas papildomiems darbams vieną pagal įsigytų darbų įkainius ir kitą pagal tiesiogines netiesiogines išlaidas. Parengti papildomą susitarimą.	Rangovas Užsakovas	2021-06-02 Pateikus sąmatas
2.	Pateikti papildomai įrengiamų takelių, bei naikinamų medžių darbų kiekių žiniaraščius ir pateikti lokalines sąmatas pagal įsigytus įkainius. Pakoreguoti pakeitimus darbo projekte. Parengti papildomą susitarimą.	Rangovas Užsakovas	2021-06-02 Pateikus sąmatas
Kitas susirinkimas			

Pirmininkas

Sekretorius

Direktorė
Birutė Baltutienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus
statybos darbų priežiūrėtojas
Rimantas Munius

Kopija tikra

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruoja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.

Kopija


Projekto
pavadinimas

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO SPORTO AIKŠTyno, VYTAUTO G.
3, NAUJOJOJE AKMENĖJE, ATNAUJINIMAS

PASITARIMO
DALYVIŲ SĄRAŠAS

2021-05-18

Naujoji Akmenė

Nr.	Dalyvio vardas ir pavardė	Organizacija	Dalyvio el. paštas* ir telefonas	Dalyvio parašas
1	Rimantas Munius	Akmenės rajono savivaldybės administracija	rimantas.munius@akmene.lt 8 616 04064	
2	Saulius Zakarauskas	MB „Statybų firma“ Techninės priežiūros vadovas	sazaklt@gmail.com 8 686 06090	
3	Birutė Baltutienė	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras Direktorė	psc@akmene.lt 8 612 48843	
4	Algirdas Klimas	UAB „Storoma“ darbų vadovas	klimas.algirdas@gmail.com 8 611 36326	
5	Romualdas Balėytis	UAB „Storoma“ Komercijos direktorius	romas@storoma.lt 8 620 43915	
6	Gintaras Skirmantas	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras atstovas	gintaras.skirmantas@gmail.com 8 687 57472	
7				

Kopija tiktai

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.
Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaruja protokolo nutarimams.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 20-149 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro aikštyno, Vytauto g. 3 Naujoje Akmenėje, atnaujinimas, (lietaus nuotekų tinklai)

Žiniaraštis nuotekų tinklai

2021 05 18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM	
					Vieneto	Viso
	1	PAPILDOMI DARBAI				
1	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi. suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	1.10	192,44	211,68
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2,00	25,91	51,82
3	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	m3	7,00	32,92	230,44
5	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,27	398,44	107,58
11	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	14,00	24,70	345,80
12	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,90	117,08	105,37
13	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	100m3	0,90	131,91	118,72
		Žiniaraštyje 1				1171,41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				246,00
		Iš viso žiniaraštyje 1				1417,41

UAB „Storoma“
Darbų vadovas
Algirdas Klimas
Atestato Nr. 27334



Kopija tikra



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro aikštyno, Vytauto g.3 Naujoje Akmenėje, atnaujinimas, (lietaus nuotekų tinklai)

Žiniaraštis nuotekų tinklai

2021 05 20

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Papildomi darbai					
1 N23-151		100m		0,74		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	10,07	7,4518	8,84	65,87
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101,0	74,74	3,99	298,21
N23-151	Darbo užm. 65.87 Medžiagos 298.21					Iš viso 364.08
2 N23P-0302		m3		2,45		
	G/b nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (h - 2 m, 3vnt) k8=1.04, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	27,1	66,395	8,64	573,65
20045	Naftos bitumas	t	0,028	0,0686	523,42	35,91
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	0,025	0,06125	752,26	46,08
120030	Statybinės vinys	kg	0,24	0,588	1,1	0,65
260014	Betonas	m3	0,367139	0,89949	77,37	69,59
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	1,0	2,45	315,2	772,24
260244	Ketiniai liukai	vnt	1,22449	3,0	170,0	510,0
520050	Plieninės apkabos	t	0,015	0,03675	2328,02	85,55
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0,02	0,049	241,76	11,85
573004	Skalda	m3	0,195	0,47775	29,68	14,18
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,073	0,17885	62,07	11,1
600092	Asfalto-betono masė grindims	t	0,074	0,1813	80,62	14,62
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	3,1	7,595	29,54	224,36
N23P-0302	Darbo užm. 573.65 Medžiagos 1571.77					Iš viso 2369.78
3 N23P-0302		m3		0,7		
	G/b nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (h - 1,6 m, 1 vnt) k8=1.04, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	27,7	19,39	8,64	167,53
20045	Naftos bitumas	t	0,028	0,0196	523,42	10,26
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	0,025	0,0175	752,26	13,16
120030	Statybinės vinys	kg	0,24	0,168	1,1	0,18
260014	Betonas	m3	0,312857	0,219	77,37	16,94
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	1,0	0,7	315,2	220,64
260244	Ketiniai liukai	vnt	1,42857	1,0	170,0	170,0
520050	Plieninės apkabos	t	0,015	0,0105	2328,02	24,44
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0,02	0,014	241,76	3,38
573004	Skalda	m3	0,195	0,1365	29,68	4,05
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,073	0,0511	62,07	3,17
600092	Asfalto-betono masė grindims	t	0,074	0,0518	80,62	4,18
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	3,1	2,17	29,54	64,1
N23P-0302	Darbo užm. 167.53 Medžiagos 470.40					Iš viso 702.03
4 R16-175		vnt.		2,0		
	G/b šulinio 0,7 m aukščio angos remontas, keičiant g/b žiedus k8=1.05					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	13,25	26,5	8,42	223,13

Kopija tikra

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
260921	Gelžbetonio atraminiai žiedai	vnt	1,0	2,0	14,79	29,58
572211	Dolomito skalda	m3	0,27	0,54	29,68	16,03
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	0,2	0,4	76,21	30,48
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	2,2	4,4	8,52	37,49
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,5	1,0	28,79	28,79
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1,57	3,14	29,54	92,76
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0,37	0,74	8,52	6,3
R16-175	Darbo užm. 223.13 Medžiagos 76.09			Mechanizmai 165.34		Iš viso 464.56
5	N22-346	m3		0,24		
	Sulaužytų g/b nuotekų elementų (priskiriamų šulinėliams) pakeitimais naujais k8=1.02, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	10,3	2,472	8,95	22,12
20005	Benzinas	l	3,51	0,8424	1,11	0,94
140417	Plieniniai futliarai	t	0,021	0,00504	2328,02	11,73
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	0,18	0,0432	315,2	13,62
520050	Plieninės apkabos	t	0,00362	0,000869	2328,02	2,02
570281	Bitumo mastika	t	0,017	0,00408	523,42	2,14
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	t.vnt	0,337	0,08088	317,08	25,65
573022	Gamtinis smėlis	m3	0,014	0,00336	11,43	0,04
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0,186	0,04464	62,07	2,77
600043	Betono mišiniai	m3	1,298	0,31152	77,37	24,1
600092	Asfalto-betono masė grindims	t	0,045	0,0108	80,62	0,87
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,7	0,168	29,54	4,96
N22-346	Darbo užm. 22.12 Medžiagos 83.88			Mechanizmai 4.96		Iš viso 110.96
6	N23-137	vnt		2,0		
	Remontuojamų šulinių liukų pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,02	0,04	8,42	0,34
260244	Ketiniai liukai	vnt	1,0	2,0	170,0	340,0
N23-137	Darbo užm. 0.34 Medžiagos 340.00			Mechanizmai		Iš viso 340.34
7	N4-58	val.		10,0		
	Buitinių nuotekų pašalinimas siurbliais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,42	4,2	8,42	35,36
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	1,0	10,0	17,53	175,3
N4-58	Darbo užm. 35.36 Medžiagos			Mechanizmai 175.30		Iš viso 210.66
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 1088.00 Medžiagos 2840.35			Mechanizmai 634.06		Iš viso 4562.41
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 1088.00 Medžiagos 2840.35			Mechanizmai 634.06		Iš viso 4562.41
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			85,21		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				19,02	
	Sezoniniai darbai 15.00% (864.87)		129,73			
	Specifiniai darbai 17.00%		41,25			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1088.00+129.73+41.25)		100,72			
	Viso:		1359,7	2925,56	653,08	4938,34
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1088.00+129.73+41.25+100.72)		24,34			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1384,04	2925,56	653,08	4962,68
	Statybvietės išlaidos 9.00%					446,64
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5409,32
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1088.00+129.73+41.25+100.72)					284,18
	Pelnas 5.00%(5409.32+284.18)					284,68
	Iš viso netiesioginės išlaidos					568,86

Kopija tikra

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 5978,18


1255,42

Bendra vertė su PVM 7233,6

UAB „Storoma“
UAB „Sava“
Darbų vadovas
Algirdas Klimas
Atestato Nr. 27334
Atestato N.:



Kopija tikra



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Papildomi darbai, parko teritorijoje ir takai aplink

Statiny 1

Papildomi darbai, parko teritorijoje ir takai aplink

2020.07.02

Suma žiniaraščiui 40139,94 Eur


Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Sklypo paruošimo darbai				
1	Betono dangos ~10cm ir betoninių plytelių demontavimas	m2	392,0	2,61	1023,12
2	Vejos bortų demontavimas	m	262,0	2,2	576,4
7	Medžių kirtimas ir kelmų šalinimas	vnt	132,0	45,0	5940,0
12	Šulinių liukų su dangčiais demontavimas	vnt	7,0	55,0	385,0
14	Grunto kasimas ir išvežimas	m3	189,0	6,0	1134,0
16	Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas iki 20km	t	78,0	20,91	1630,98
	Skyriuje 1				10689,5
2	Takų įrengimas aplink pastatą				
1	Šalčiui atsparus sl. 29 cm ir jo tankinimas	m2	400,0	5,95	2378,8
2	Dolomitinės skaldos sl. 15cm, fr. 0/45, ir jo tankinimas 100MPa	m2	360,0	9,77	3517,2
3	Skaldos atsijų sl. 3cm, fr. 0/5	m2	360,0	3,05	1098,0
4	Betoninės trinkelės 20x10x8cm, siūlės užpildomos akmens dulkėmis	m2	356,0	24,0	8544,0
5	Betoninės trinkelės 20x10x8cm, ŽN trasai žymėti, siūlės užpildomos	m2	4,0	31,0	124,0
6	Vejos bortai ant betono pagrindo 100x20x8 cm	m	481,0	12,0	5772,0
7	G/b šulinio D1.0 m suvedima su projektiniu lygiu	vnt	7,0	90,0	630,0
8	Ketaus šulinio liukas su dangčiu D400 klasės	k-tas	7,0	60,0	420,0
	Skyriuje 2				22484,0
	Žiniaraštyje 1				33173,50
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6966,44
	Iš viso žiniaraštyje 1				40139,94

Sudarė :

/Pavardė/

UAB „Storoma“
Darbų vadovas
Algirdas Klimas
Atestato Nr. 27334

Kopija tikra

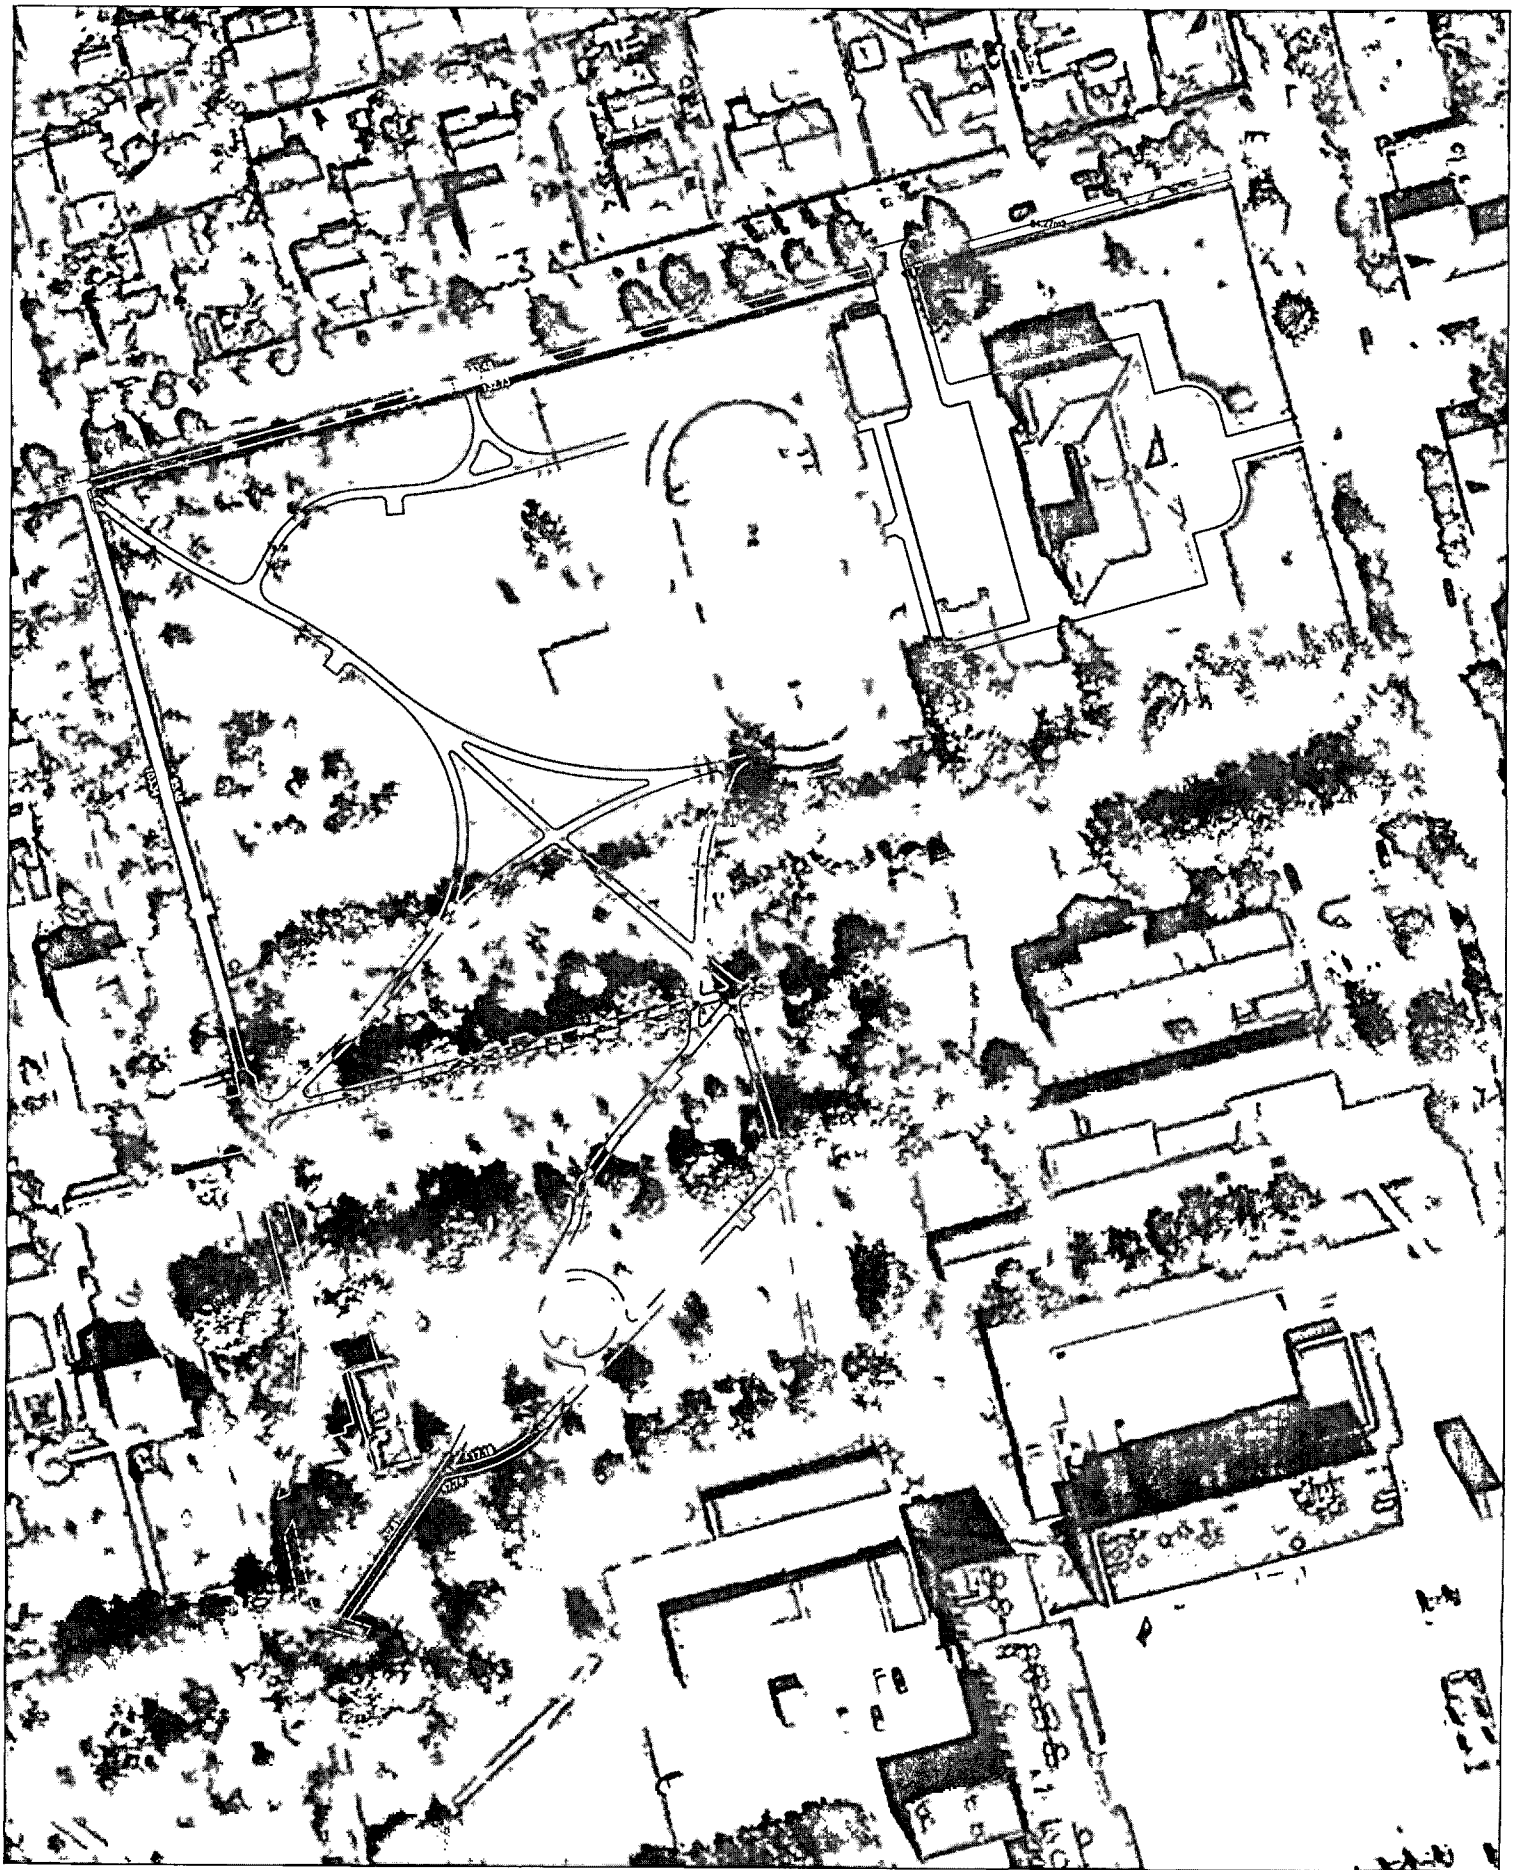

2021-07-19SS-2021-580**DERINIMAS**110 - Rimantas Munius: . Prita
2021-07-14**DERINIMAS**112 - Alvydas Statkus: Pastab
projekto A laida pateikti su pro
užbaigimu nurodant Statybos
priežiūros vadovo vizą pritariu
taip pastatyta. Pritarta 2021-0**DERINIMAS**193 - Simona Girdvainė: . Prita
2021-07-14**DERINIMAS**137 - Eglė Martysienė: . Prita
07-14**DERINIMAS**72 - Aliona Ratkevičienė: . Pri
2021-07-15**DERINIMAS**115 - Neringa Degienė: . Prita
07-15**PASIRAŠYMAS**5 - Artūras Pekauskas: . Prita
07-15**REGISTRAVIMAS**

228 - Dovilė Liaukšienė: . Nep
