

pui 15940

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15740
2020 m. gruodžio 1 d., Telšiai S-18059

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Katkaus,

UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, atstovaujama direktoriaus Raimondo Račkausko,

ir

Jungtinės veiklos partnerių: pagrindinis partneris UAB „Tilta“, įmonės kodas 142151650, adresas Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkevičiaus; UAB „Techsis“, esanti Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto; UAB „Orlis“, esantis Sedos g. 34A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 303304933, atstovaujama direktoriaus Alfredo Komžos (toliau partneriai vadinami – Rangovas) ir toliau kartu vadinimai – „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 6 prie 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740 (toliau – Sutartis) 9.17.3 punktu, 2020-06-23 apžiūros aktu Nr. 4, 2020-10-21 apžiūros aktu Nr. 13 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sutaria padidinti Sutarties vertę įrašyti **14208,24 €** (keturiolika tūkstančių du šimtai aštuoni eurai, 24 ct) su PVM. Bendra sutarties vertė yra **4217650,15 €** (keturi milijonai du šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų, 15 ct) su PVM.

2. Pakoreguoti Sutarties 9.2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„**Darbai 3** (vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis) kaina – **3243600,15** [trys milijonai du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai eurų, 15 ct] **Eur su PVM**, už tinkamai atliktus perduotus ir priimtus darbus sumoka Perkančioji organizacija.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Apžiūros aktas Nr. 4, 2 lapai;

7.2. Papildomų – nevykdomų darbų lokalinė sąmata prie Apžiūros akto Nr. 4, 2 lapai;

7.3. Apžiūros aktas Nr. 13, 2 lapai;

7.4. Papildomų darbų lokalinės sąmata prie Apžiūros akto Nr. 13, 1 lapas;

7.5. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

Perkančioji organizacija

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel/faksas (8 444) 52 229

el. p. info@telsiai.lt

A.S. LT094010042800007749,

AB LUMINOR bankas

Administracijos direktorius

Tomas Katkus

Užsakovas

UAB „Telšių vandenys“

Plungės g. 55, LT – 87327

Telšiai

Įmonės kodas: 180153137

Tel/fax: (8 444) 60741

el. p. info@telsiuvandenys.lt

A.S. LT934010042800050275,

AB LUMINOR bankas

Direktorius

Raimondas Račkauskas

Rangovas:

Pagrindinis partneris UAB „Tilta“

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

Įmonės kodas: 142151650

Tel., faks. 861033751


el. p. info@tilta.lt

A.S. LT567180000014467021,

AB Šiaulių bankas

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius



Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Adomas Žvirzdinas

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

APŽIŪROS AKTAS NR. 4
2020-06-23

UAB „Tilta“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu nustatyta jog techninio projekto sprendiniai neatitinka faktinės situacijos. Techniniame projekte, II etapo ruože nurodyti esami senamiesčio tipo šviestuvai, kurie pagal techninio projekto sprendinius nekeičiami ir neperkeliami, bet pagal faktinę situaciją šviestuvai yra cinkuotų atramų. Pridedama techninio projekto iškarpa su pažymėtais šviestuvais.

Reikalinga patikslinti techninio projekto sprendinius.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Norkus
2. UAB „Tilta“ direktorius Rimantas Vaitkevičius
3. UAB „Tilta“ projektų vadovas Laimonas Norvaišas

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25826

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g. , Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

APŽIŪROS AKTAS NR. 4
2020-06-23

UAB „Tilta“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g. , Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu nustatyta jog techninio projekto sprendiniai neatitinka faktinės situacijos. Techniniame projekte, II etapo ruože nurodyti esami senamiesčio tipo šviestuvai, kurie pagal techninio projekto sprendinius nekeičiami ir neperkeliami, bet pagal faktinę situaciją šviestuvai yra cinkuotų atramų. Pridedama techninio projekto iškarpa su pažymėtais šviestuvais.

Reikalinga patikslinti techninio projekto sprendinius.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Norkus.

(parašas)

2. UAB „Tilta“ direktorius Rimantas Vaitkevičius


(parašas)

3. UAB „Tilta“ projektų vadovas Laimonas Norvaišas

(parašas)

resčiųjų perėjų apšvietimas.
 1. Visos perėjų apšvietimo atramos pajungiamos iš esančių miesto apšvietimo tinklų linijų.
 Gatvės apšvietimas.
 1. Respublikos gatvės rekonstruojamos tik tos apšvietimo linija, kuri pagal naują įplanavimą šviestuvai patenka į gatvės važiuojamąją dalį ir yra seno tipo naatitinkamos projektavimo uždavies.
 2. Šviestuvai patenkantys į važiuojamąją dalį perkeltami į šaligatvi tolyn.
 Svesdorių pajungimas.
 1. Svesdorių kompiuterinės dėžės pajungiamos iš esančių. Tiesių būių (dėk) apakabos skydų.

PROJEKTUOJAMŲ BORDŪRŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ALKŠTYS, JE	
ESAMA "SENAMIEŠIO" TIPO APSVIETIMO ATRAMA SU "SOW" NA LEMPŲ ŠVIESTUVU	
ESAMA - PERKELIAMA "SENAMIEŠIO" TIPO APSVIETIMO ATRAMA SU "SOW" NA LEMPŲ ŠVIESTUVU	
PROJEKTUOJAMA "SENAMIEŠIO" TIPO APSVIETIMO ATRAMA SU "SOW" NA LEMPŲ ŠVIESTUVU	
PROJEKTUOJAMA "SENAMIEŠIO" TIPO REKLAMINĖ ATRAMA	
PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO 0.4 V KL	
DEMONTUOJAMA GATVĖS APSVIETIMAS	
PROJEKTUOJAMA "PEREJOJ" APSVIETIMO ATRAMA SU ASIMETRINE KRYPTINE OPTIKO ŠVIETUVU LED LEMPA	
KITŲ PROJEKTŲ SUPROJEKTUOTAS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTERŲ TINKLAS	
KITŲ PROJEKTŲ SUPROJEKTUOTAS 450X550 LIETAUS SUKINKIMO GROTELĖS	
KITŲ PROJEKTŲ SUPROJEKTUOTAS Ø700 LIETAUS SUKINKIMO GROTELĖS	
PROJEKTUOJAMAS POKONTSTRIUKCINIS DRENAŽAS	

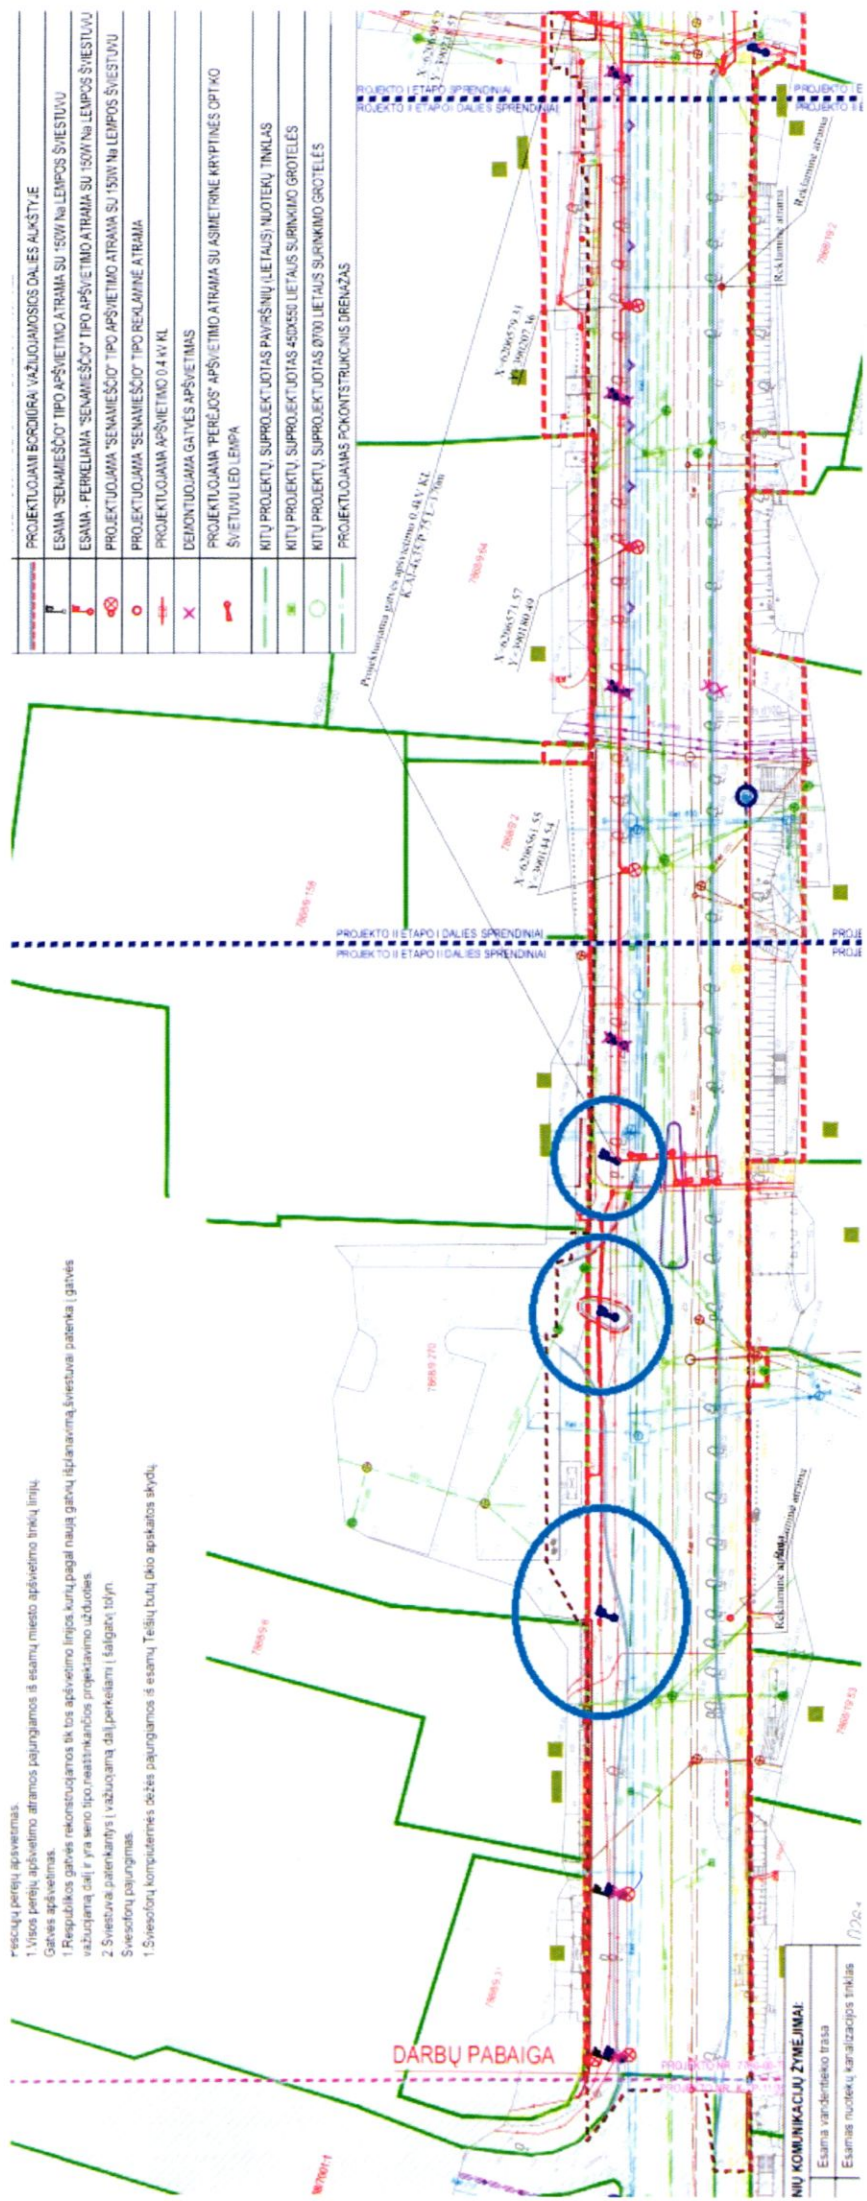

NUO KOMUNIKACIJŲ ŽYNEJIMAI	
Esama vandentekio trasa	
Esamas nuotekų kanalizacijos tinklas	

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius

SUDERINTA: 2226,48 TŪKST. EUR

TVIRTINU: 2,226 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MEN. D.

2020 M. MEN. D.

Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Adomas Žvirzdinas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "Tilta"

Statinių grupė 1--1 SAMATOS KOMPLEKSUI

Statiny 5 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste .

Žiniaraštis 14 PAPILDOMI DARBAI

2020.12.08

Suma žiniaraščiui

2226.48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 II etapas. Elektrotechnika. Pėsčiųjų perėjės apšvietimas nevykdomi darbai

1 N21-345	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	- 2,0	113,57	-	227,14
2 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	- 2,0	838,14	-	1676,28
3 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	- 0,12	350,34	-	42,04
4 N1P-1508	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte k9=1.15	km	- 0,006	1116,09	-	6,7
5 N1P-1520	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios buldožeriais iš sankasos II grupės gruntu k9=1.15	km	- 0,006	245,29	-	1,47
6 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	- 0,06	640,13	-	38,41
7 N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	- 2,0	399,0	-	798,0
8 N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	- 4,0	109,77	-	439,08
9 N21-273	Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 35 mm2 skersp. gyslų	100vnt	- 0,16	339,41	-	54,31
10 N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	- 0,01	2931,88	-	29,32
11 N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	- 0,1	565,73	-	56,57
12 N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	- 0,01	1361,56	-	13,62
13 N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	- 2,0	164,01	-	328,02
14 N57P-6408	Pamatų iš surenkamų blokų konstrukcijoms įrengimas, kai blokų masė iki 0,5 t k9=1.15	kompl.	- 2,0	573,62	-	1147,24
Skyriuje 2					-	4858,2

3 II etapas. Elektrotechnika.Gatvės apšvietimas. Papildomi darbai.

1 N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	1,0	399,0	-	399,0
-------------	--	------	-----	-------	---	-------

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N1P-1508	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15	km	0,105	1116,09	117,19
3	N1P-1520	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios buldozeriais iš sąrankos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,105	245,2	25,75
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,05	640,13	672,14
5	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	8,0	109,77	878,16
6	N21-273	Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 35 mm2 skersp. gyslų	100vnt	0,32	339,41	108,61
7	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,69	617,51	426,08
8	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,012	2931,88	35,18
9	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,12	570,48	68,46
10	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,012	1361,56	16,34
11	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	6,0	164,01	984,06

Skyriuje 3

3730,97

2 II etapas. Elektrotechnika. Gatvės apšvietimas . Papildomi darbai Sisteliniai

1	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	5,0	36,29	181,45
2	N7-4	Pamatų po kolonomis montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt	5,0	30,39	151,95
3	R23-60	Išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,0	29,6	148,0
4	MN1-119	Iki 0.7 m gylio duobių stulpams ir statramščiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	10m3	0,3	293,77	88,13
5	N7-4	Pamatų po kolonomis montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt	5,0	30,39	151,95
6	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	5,0	36,29	181,45
7	N21-345	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	5,0	31,37	156,85
8	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	24,0	79,48	1907,52

Skyriuje 2

2967,3

Žiniaraštyje

1840,07

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

386,41

Iš viso žiniaraštyje 14

2226,48

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 13
2020-10-21**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu atliekant kasimo darbus, gatvės konstrukciniuose sluoksniuose buvo rastas durpingas gruntas nuo PK: 3+46 iki PK: 4+15, kuris projekte nebuvo numatytas.

Nepašalinus durpingo grunto nėra galimybės pasiekti dangų konstrukcinio sluoksnio sutankinimo stiprio (E_{v2}), siekiant užtikrinti statinio pastovumą ir stabilumą.

Išmatuotas durpingo grunto kiekis 69 metrų ruožui 2,90x69,00x1,60 m (plotis x ilgis x aukštis), viso - 320,16 m³.

Gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas tinkamu darbams atlikti gruntu.

Priedama:

- Fotofiksacija, 2 nuotraukos;

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25326

2020 11.25

Grunto fotofiksacija dešinėje kelio pusėje nuo PK: 3+46 iki PK: 4+88



SUDERINTA: 11 981,76 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2020 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 11,98 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

Statybos ir urbanistikos skyriaus
 Statybos poskyrio vedėjas
 Adomas Žvirzdinas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 1--1 SAMATOS KOMPLEKSUI

Statiny's Darbai 3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis.

Žiniaraštis 15 PAPILDOMI DARBAI . Apžiūros aktas Nr. 13

2020.09.29

Suma žiniaraščiui 11981,76 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Išdurpinimo darbai . Apžiūros aktas Nr. 13						
1	N1P-0114	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k2=1.60	100m3	2,8814	256,47	738,99
2	N1P-0405	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis daugiau 2m	100m3	0,3202	2382,86	762,99
3	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės k2=2.00	100m3	3,2016	436,11	1396,25
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	3,2016	2075,49	6644,89
5	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100m3	1,6008	194,43	311,24
6	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	t. m3	0,32016	149,66	47,92
		Skyriuje 4				9902,28
		Žiniaraštyje 15				9902,28
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2079,48
		Iš viso žiniaraštyje 15				11981,76

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Eil. Nr.	Veikla (etapas)	Kaina, Eur
1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Pirma Grupė)	<i>401000,00</i>
1.1.	I etapo rangos darbai	350000,00
1.2.	II etapo rangos darbai	45000,00
1.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
2.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g. Birutės g., Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Antra Grupė)	<i>404000,00</i>
2.1	I etapo rangos darbai	350000,00
2.2	II etapo rangos darbai	48000,00
2.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
3.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis (Trečia Grupė)	<i>2680661,28</i>
3.1	I etapo rangos darbai	2023722,95
3.2	II etapo rangos darbai	321938,33
3.3.	III etapo rangos darbai	320000,00
3.4	Darbo projekto parengimas	15000
	VISO Eur	3485661,28
	PVM	731988,87
	Viso Eur su PVM	4217650,15
