

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

Prie 2020-12-23 170 kWp GALIOS SAULĖS JĖGAINĖS PROJEKTAVIMO, MONTAVIMO RANGOS DARBŲ),
IR RANGOS BEI 2 METŲ PRIEŽIŪROS RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 2020-100

2021-08-27, Vilnius

Eternia Solar LT, UAB (senasis pavadinimas **UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“**), atstovaujama inžinierių komandos vadovo Dariaus Vaicenavičiaus pagal 2021-08-18 įgaliojimą Nr. ETENRIA-210818-POA-55 pagrindu veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas I**),

Nogridas, UAB, atstovaujama direktorės Lolitos Šileikienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas II**),

UAB „Trakų energija“, atstovaujama direktoriaus Vaido Povilėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **Užsakovas**),

Užsakovas, Rangovas I ir Rangovas II toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai -

Šalimi, atsižvelgdamos / tai, kad:

1. Užsakovas, Rangovas I ir Rangovas II yra sudarę 2020-12-23 170 kWp galios saulės jėgainės projektavimo, montavimo rangos darbų, irangos bei 2 metų priežiūros rangos darbų sutarti Nr. 2020-100 (toliau - **Sutartis**);
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei viena Sutarties Šalis;
3. Rangovas I 2021 m. rugpjūčio 23 d. pateikė Užsakovui pranešimą Nr. Eternia-210823-SD-TE-01 dėl sutartyje numatyto termino pratęsimo, kuriuo nurodė aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei viena Sutarties Šalis, fakto egzistavimą.
4. 2021-03-19 gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, iš dalies finansuojančios projektą, neprieštaravimas, kad projektas būtų įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio mėn. 10 d., su sąlyga, įgyvendinimo laikotarpio keitimo, sąlygotas aplinkybių tiesiogiai nepriklausančių nuo Užsakovo;
5. Šalys siekia pratęsti Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus vadovaujanti šios preambulės 2 punkte nurodyto įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu dėl šios preambulės 3 punkte nurodytame rašte išdėstytų aplinkybių egzistavimo;

Sudare šį Papildomą susitarimą Nr. 2 prie Sutarties (toliau - **Papildomas susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Sutarties 5.1. punktą pakeisti ir išdėstyti naują redakciją:

„5.1. Rangovas Darbus privalo pabaigti ne vėliau kaip 2021-10-08. Jėgainės statybos Užbaigimo data yra 2021-10-08 (išskyrus Darbų dali, skirtą priežiūros paslaugai atlikti).“

2. Sutarties 5.1.2. punktą pakeisti ir išdėstyti naują redakciją:


„5.1.2. 170 kWp galios saulės elektrinės įrengimo, darbų užbaigimo akto įforminimas- ne vėliau kaip 2021-10-08.“

3. Sutarties 5.1.3 punktą pakeisti ir išdėstyti naują redakciją:

„5.1.3. Leidimo gaminti elektros energiją išdavimo, gaunamos atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos suteikimo, nuosavybė ribų akto pasirašymo, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartiessu AB „ESO“ pasirašymo parengimas- ne vėliau kaip 2021-11-12.“

4. Šalys susitarė pakeisti ir išdėstyti naują redakciją Sutarties Priedą Nr. 2:

Priedas Nr. 2 - Kalendorinis vykdymo grafikas:

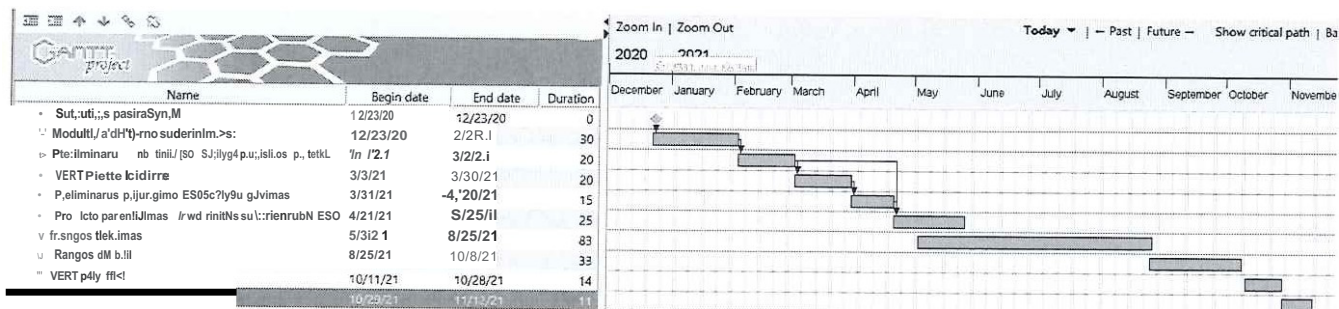

5. Šalys susitaria, kad kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios ir yra taikomos visa apimtimi.
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
Papildomas susitarimas sudaromas elektroninėmis priemonėmis ir pasirašomas Šalių elektroniniais kvalifikuotais parašais.

UŽSAKOVAS

UAB „Trakų energija“

Maironio g. 7-2, 21112 Trakai

Įmonės kodas: 170795677

Direktorius

Vaidas Povilėnas



RANGOVAS I

Eternia Solar LT, UAB

Kauno g. 16, Vilnius

Įmonės kodas 304521263

pagal 2021-08-18 Nr. ETENRIA-

210818-POA-55 įgaliojimą

Darius Vaicenavičius

RANGOVAS II

Nogridas, UAB

Kauno g. 16, Vilnius

Įmonės kodas 304287390

Direktorė Lolita Šileikienė
