



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-06-10 Nr. ORC-059

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 11

2020 m. birželio 10 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė nevykdomus ir papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Papildomų darbų vertė – 975,81 Eur be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 11 vertė yra 975,81 Eur be PVM (papildomi darbai).


Galutinė sutarties suma po 2020-05-26 pakeitimo Nr.10 padidėja 975,81 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.761.733,63 Eur be PVM.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (14 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 11

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;
Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo L.e. p. AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Žilvino Babarskio.

Rangovas 2020-05-22 raštu Nr. 102 informavome, kad šalia Rietavo ir Sinagogų g. sankryžos, ties Rietavo g. namu Nr. 12, į naujai rengiamo šaligatvio konstrukciją patenka medis. Tinkamai įrengti šaligatvio konstrukciją nepažeidus medžio – neįmanoma.

2020-05-25 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija priėmė sprendimą (2020-05-25 posėdžio protokolas Nr. LK-132), kuriuo leido pašalinti kaštoną, sumokant atkuriamąją vertę.

Vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, medžius kirsti draudžiama intensyviausiu paukščių veisimosi laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., todėl buvo kreiptasi į ekspertą-ornitologą, kuris pateikė vertinimo išvadą, kad ties Rietavo g. 12 numatytame šalinti medyje „*lizdų, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos*“.

Komisija, įvertinusi situaciją objekte, susipažinusi su pirkimo ir projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Inžinieriaus 2020-06-08 pritarimą raštu Nr. ORC-055 ir Užsakovo pritarimą 2020-06-08 raštu Nr. AS-2458, į tai, kad nenupjovus šalia Rietavo ir Sinagogų g. sankryžos, ties Rietavo g. namu Nr. 12 esančio medžio, nebus galima tinkamai įrengti šaligatvio konstrukcijos ir įgyvendinti projektinių sprendinių, patvirtina, kad, būtina atlikti papildomus darbus, susijusius su medžio kirtimu:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Paruošiamieji darbai				
1	Sutartis	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100 vnt.	0,01
2	Sutartis	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais, kai kelmo skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm (100 kelmų) k9=1.15	100 vnt.	0,01
2 Kiti darbai				
1		Ornitologiniai želdynų vertinimas	Vnt.	1,000
2		Medžių atkuriamoji vertė	Vnt.	1,000

Papildomų darbų vertė – 975,81 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-102, 3 lapai;
2. 2020-05-25 Plungės raj. želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdžio protokolas Nr. LK-132, 1 lapas;
3. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-120, 3 lapai;
4. 2020-06-03 Ornitologo vertinimo išvada, 1 lapas;
5. UAB „OR Consulting“ raštas Nr. ORC-055, 1 lapas;
6. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-2458 (be priedų), 2 lapai;
7. Papildomų darbų sąmata, 1 lapai.


Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-05-22 Nr. SDKL-102

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL LEIDIMO ŠALINTI MEDĮ

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

Šalia Rietavo ir Sinagogų g. sankryžos, ties Rietavo g. namu Nr. 12, į naujai rengiamo šaligatvio konstrukciją patenka medis. Tinkamai įrengti šaligatvio konstrukciją nepažeidus medžio – neįmanoma.

Prašome Užsakovą priimti sprendimą dėl šio medžio šalinimo.

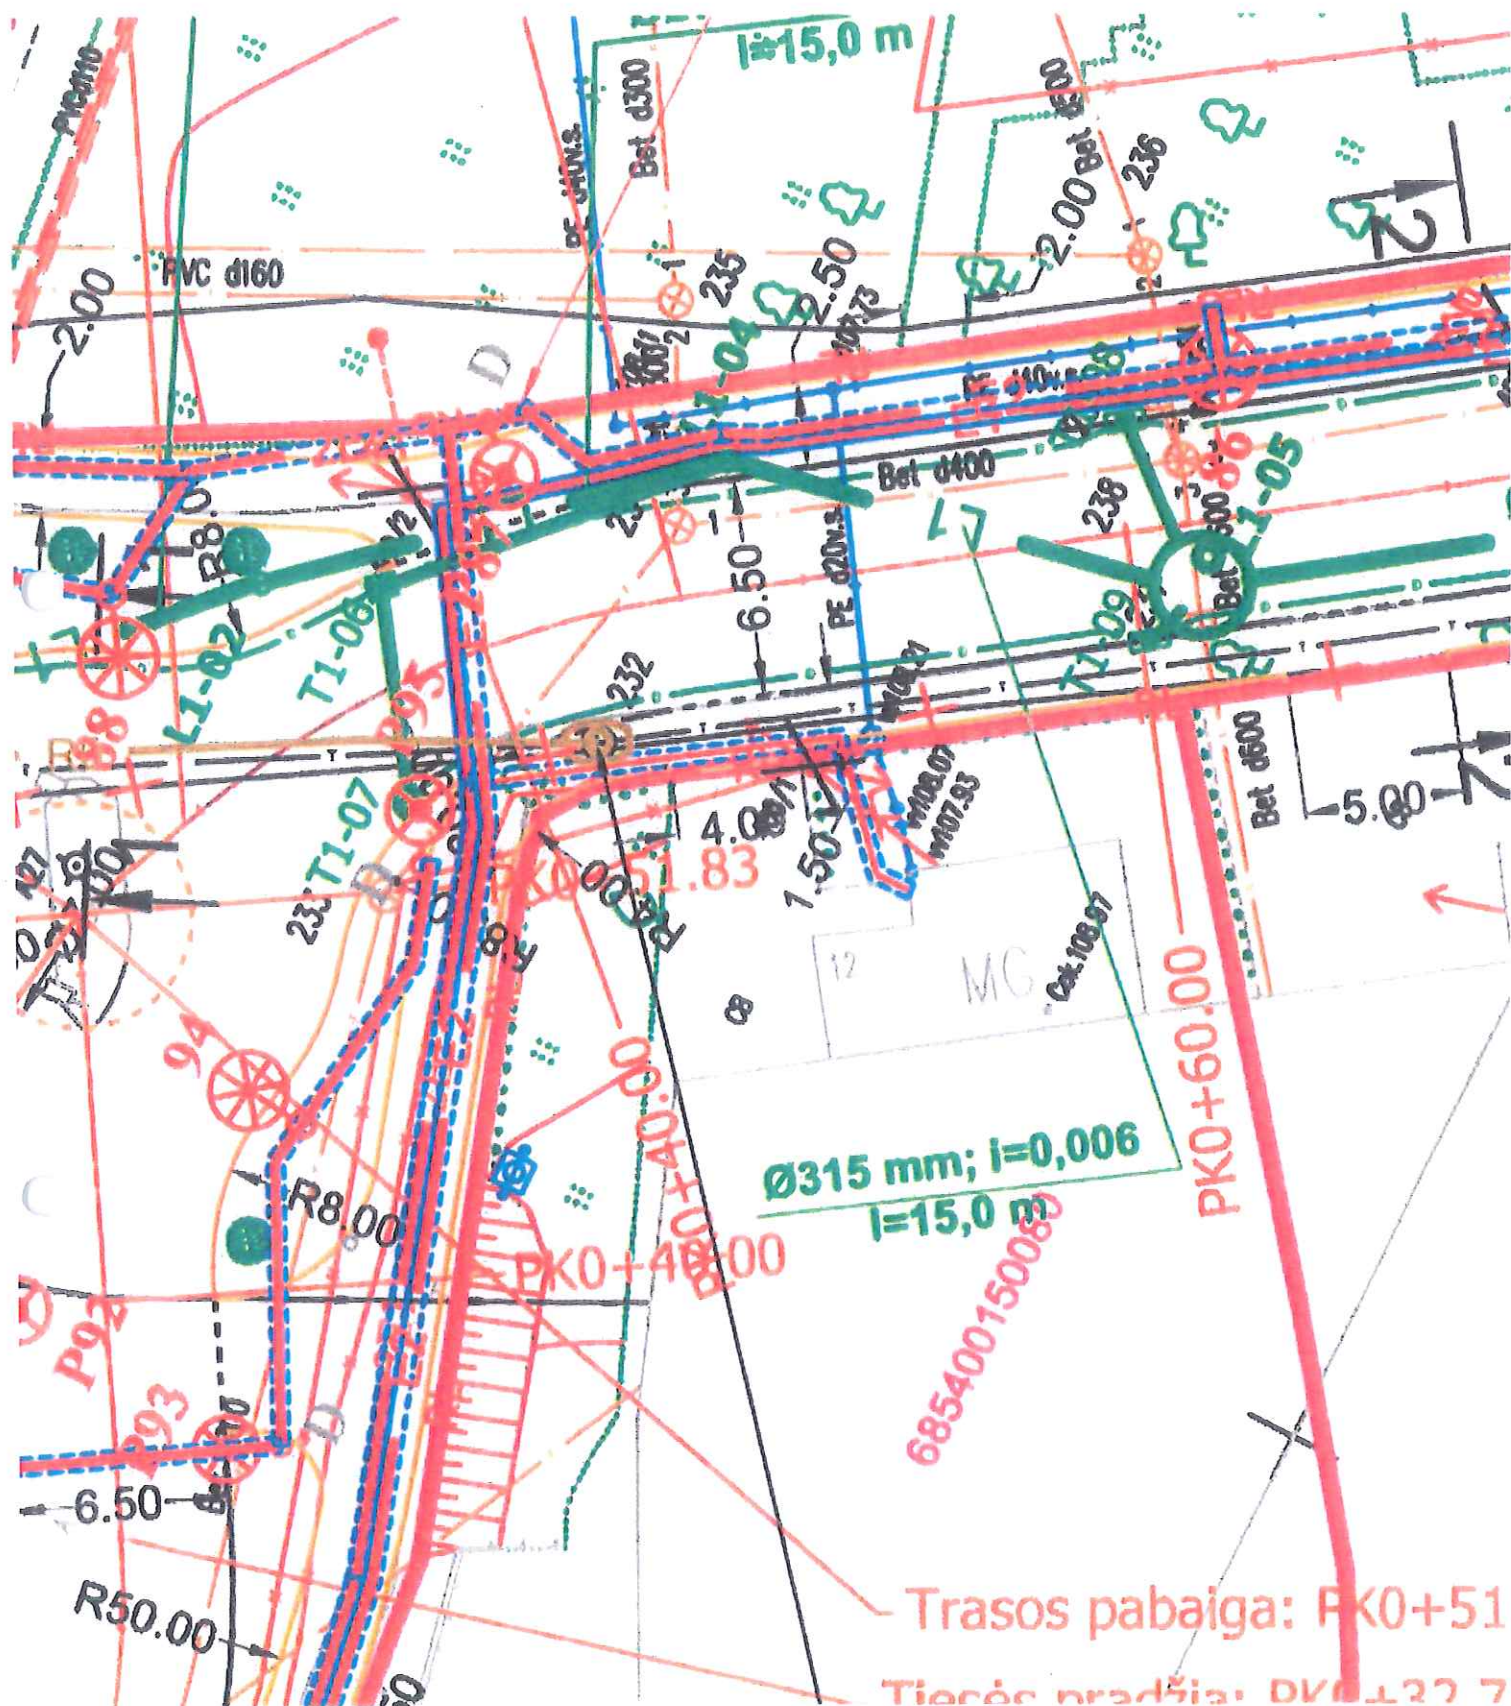
Gavę leidimą medžio šalinimui, paskaičiuosime atkuriamąją medžio vertę ir kreipsimės dėl pritarimo papildomų darbų atlikimui.

- PRIDEDAMA: 1. Ištrauka iš brėžinio, 1 lapas;
2. Situacijos nuotrauka, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys





Trasos pabaiga: PK0+51
Tiesės pradžia: DK0+22.7

pskr.

Priedas Nr. 2

Google



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PLUNGĖS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2020 m. gegužės 25 d. Nr. LK-132

Plungė

DARBOTVARKĖ. Želdinių tvarkymo Plungės miesto seniūnijoje svarstymas.

1. SVARSTYTA. 2020-05-22 gautas įmonės AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio prašymas dėl leidimo šalinti medį augantį įgyvendinamo projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ teritorijoje, šalia Rietavo g. 12 sklypo. Medį reikalinga pašalinti, nes trukdo vykdyti projekto darbus. Komisija apžiūrėjo nurodytą vietą ir vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA.

1. Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (2020-01-08 redakcija) „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka) kaštonas (46 cm skersmens) neatitinka tvarkos 5 punkte nurodytiems atvejams, kai saugotinus medžius galima kirsti neatlygintinai. Leisti pašalinti kaštoną augantį Rietavo g. 12 (ant sklypo ribos), tik prieš tai sumokėjus želdinių atkuriamąją vertę 828,00 eurų. Želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintais įkainiais (2016-02-02 redakcija). Medžių atkuriamoji vertė, pateikus prašymą, gali būti patikslinta medį nukirtus dėl aptikto kamieno puvinio.

2. Vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., kitu atveju turi būti pateikiama eksperto-ornitologo pažyma, kad kertamame medyje nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

3. Leidimas šalinti saugotinus medžius bus išduotas tik, kai bus prarastos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą LT454010043000010043, esančią Luminor Bank, AB ir pateiktas mokėjimo išrašas.

Komisijos pirmininkė

Robertta Jakumienė

Komisijos sekretorius

Sonata Serapinienė

Komisijos nariai:

Kristina Petrulevičienė

Laura Baumilė



Kopija tikra
Specialistė Sonata Serapinienė

2020 m. gegužės 25 d.



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-06-04 Nr. SDKL-120

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@ore.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

2020-05-22 raštu Nr. 102 paprašėme Užsakovą priimti sprendimą dėl šalia Rietavo ir Sinagogų g. sankryžos, ties Rietavo g. namu Nr. 12, į naujai rengiamo šaligatvio konstrukciją patenkančio medžio šalinimo.

2020-05-25 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija surašė posėdžio protokolą Nr. LK-132, kuriuo leido pašalinti kaštoną, sumokant atkuriamąją vertę.

Vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, medžius kirsti draudžiama intensyviausiu paukščių veisimosi laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., todėl buvo kreiptasi į ekspertą-ornitologą, kuris pateikė vertinimo išvadą, kad ties Rietavo g. 12 numatytame šalinti medyje „*lizdy, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos*“.

Gavę leidimą medžio šalinimui, teikiame lokalinę sąmatą šių papildomų darbų atlikimui ir prašome nedelsiant pritarti jų atlikimui, darbus įforminant sutartyje numatyta tvarka.

PRIDEDAMA: 1. 2020-06-03 ornitologo vertinimo išvada, 1 lapas;
2. lokalinė sąmata, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys



UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“

ORNITOLOGINIO VERTINIMO IŠVADA PAGAL UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ UŽSAKYMĄ
SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO,
GENĖJIMO DARBAMS LAISVĖS G. 3, RIETAVO G. 13, PLUNGĖJE

2020-06-03

Plungė

Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija), 3 skyriaus 21 punktu, prieš atliekant želdynų tvarkymo darbus numatytas būtinas saugotinių medžių ornitologinis vertinimas ir ornitologo išvada.

Numatyto želdynų tvarkymo objekto ornitologinį vertinimą atliko UAB „Ornitostogos“ kvalifikuoti ornitologai pagal UAB „Plungės lagūna“ užsakymą saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Ornitologinis medžių ir krūmų vertinimas Laisvės g. 3 ir Rietavo g. 13, Plungėje, buvo atliktas 2020 m. birželio 2 d., apsilankymo metu buvo įvertinta 1 liepa ir 1 kaštonas. **Nei viename iš patikrintų medžių patikrinimo metu lizdų, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos.**

Rekomenduojame paukščių perėjimo metu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. visus želdynų tvarkymo darbus, jei tai įmanoma, vykdyti nemotorinėmis priemonėmis, siekiant kuo labiau sumažinti galimą trikdymą gretimuose medžiuose perintiems paukščiams.

UAB „Ornitostogos“ direktorius

Marius Karlonas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"**Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje****Statinyje 64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - 0+42,25****Žinlaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Papildomi darbai**

			Suma žiniaraščiui		1 180,73 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	Sutartis	Minkėtų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,01	2053,64	20,54
2	Sutartis	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01	2727,07	27,27
Skyriuje 1						47,81
2 Kiti darbai						
1		Ornitologiniai želdynų vertinimas	vnt	1,000	100,00	100,00
2		Medžių atkuriamoji vertė	vnt	1,000	828,00	828,00
Skyriuje 2						928,00
Žiniaraštyje						975,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						204,92
Iš viso žiniaraštyje						1180,73



Projektų valdymo vadovė
Rima Činkūnaitė

UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“

ORNITOLOGINIO VERTINIMO IŠVADA PAGAL UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ UŽSAKYMĄ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS LAISVĖS G. 3, RIETAVO G. 13, PLUNGĖJE

2020-06-03

Plungė

Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija), 3 skyriaus 21 punktu, prieš atliekant želdynų tvarkymo darbus numatytas būtinas saugotinių medžių ornitologinis vertinimas ir ornitologo išvada.

Numatyto želdynų tvarkymo objekto ornitologinį vertinimą atliko UAB „Ornitostogos“ kvalifikuoti ornitologai pagal UAB „Plungės lagūna“ užsakymą saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Ornitologinis medžių ir krūmų vertinimas Laisvės g. 3 ir Rietavo g. 13, Plungėje, buvo atliktas 2020 m. birželio 2 d., apsilankymo metu buvo įvertinta 1 liepa ir 1 kaštonas. **Nei viename iš patikrintų medžių patikrinimo metu lizdų, uoksų ar kitų paukščių galimų perimviečių nerasta, todėl tvarkymo darbus galima vykdyti 10 kalendorinių dienų nuo šios išvados pateikimo datos.**

Rekomenduojame paukščių perėjimo metu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. visus želdynų tvarkymo darbus, jei tai įmanoma, vykdyti nemotorinėmis priemonėmis, siekiant kuo labiau sumažinti galimą trikdymą gretimuose medžiuose perintiems paukščiams.

UAB „Ornitostogos“ direktorius

Marius Karlonas



Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2020-06-08 Nr. ORC-055

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

UAB „Plentprojektas“
Gedimino per. 41/2-1 Vilnius
Projekto vykdymo priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliui
El. p. bendras@plentprojektas.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, siūlau Užsakovui pritarti Rangovo rašte 2020-06-04 Nr. SDKL -120 išvardintų projekto klaidų ištaisymui .



Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-06-08 Nr. AS-2458
SDKL-120/AG-
I 2020-06-04 Nr. 3652

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PRITARIMO PAPILDOMIEMS DARBAMS

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. birželio 4 d. raštą Nr. SDKL-120/AG-3652 ir informuoja, kad pritaria Rietavo g. 12 į naujai rengiamo šaligatvio konstrukciją patenkančio medžio šalinimo papildomiems darbams ir pateiktoms lokalinėms sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

Priedas Nr. 7**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"**Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje****Statinyse 64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - 0+42,25****Žinlaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Papildomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žinlaraščiui Kiekis	1 180,73 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	Sutartis	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,01	2053,64	20,54
2	Sutartis	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01	2727,07	27,27
Skyriuje 1						47,81
2 Kiti darbai						
1		Ornitologiniai želdynų vertinimas	vnt	1,000	100,00	100,00
2		Medžių atkuriamoji vertė	vnt	1,000	828,00	828,00
Skyriuje 2						928,00
Žinlaraštyje						975,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						204,92
Iš viso žinlaraštyje						1180,73



Projekto valdymo vadovė
Rima Čimulienė
