



**CONSULTING**  
OPTIMAL RELATIONSHIP

**Užsakovo atstovui**

Plungės rajono savivaldybės administracijos  
Direktoriui Mindaugui Kaunui  
El. paštas: [mindaugas.kaunas@plunge.lt](mailto:mindaugas.kaunas@plunge.lt)

2020-09-25 Nr. ORC-98

**Rangovo atstovui**

L. e. AB „Eurovia Lietuva“  
Vakarų regiono direktoriui Artūrai Valiui  
El. paštas: [eurovia@eurovia.lt](mailto:eurovia@eurovia.lt)

**Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.**

**2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844**

**DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 17**  
**2020 m. rugsėjo 25 d.**

**Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“**  
**Rangos sutarties Nr. BT6-01-174**

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

*Bendra nevykdomų darbų vertė – 13 277,29 Eur be PVM;*

*Bendra papildomų darbų vertė – 15 713,84 Eur be PVM.*

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 17 vertė yra 2 436,55 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-09-25 pakeitimo Nr. 17 padidėja 2 436,55 Eur be PVM.  
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.866.746,65 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (23 lapai).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

  
.....  
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas  
FIDIC inžinierius

  
.....  
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“  
Direktorius Vakarų regionui

  
.....  
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“  
Kalvarijų g. 300,  
LT-08318 Vilnius,  
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967  
Faks. (8 5) 243 2131  
El. p. [info@orc.lt](mailto:info@orc.lt)  
[www.orc.lt](http://www.orc.lt)

Juridinio asmens kodas: 302527068  
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610  
Bankas: „Swedbank“, AB  
A. s. LT587300010122945833

**Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.**  
**2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844**

**Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“**  
**Rangos sutarties Nr. BT6-01-174**

### **Darbų pakeitimo aktas Nr. 17**

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno  
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio  
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio  
Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio  
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

1. Laisvės ir Minijos gatvių rekonstravimo techniniuose projektuose Laisvės ir Minijos g. numatyta įrengti autobusų laukimo pavidlonus pagal pateiktas technines specifikacijas.

2020-08-20 vykusio pasitarimo Nr. 11 metu Užsakovas išsakė pageidavimą dėl autobusų laukimo pavidlonų konstrukcijos sudėtinių dalių ir įrengimo vietos. Atsižvelgdamas į autobusų stotelių pavidlonų įrengimo poreikį, Užsakovas 2020-09-04 raštu Nr. AS-4129 paprašė Minijos g. įrengti du autobusų laukimo pavidlonus su šoninėmis sienutėmis, o Laisvės g. – vieną laukimo pavidloną rengti su šoninėmis sienutėmis, o vieną – be šoninių sienučių pagal Užsakovo pridedamą pavyzdį.

Vykdydamas šį Užsakovo prašymą, rangovas 2020-09-15 raštu Nr. SDK1-215 pateikė nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas, kurioms Užsakovas pritarė 2020-09-16 raštu Nr. 4370.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Užsakovo pritarimą 2020-09-16 raštu Nr. 4370, patvirtina, kad, Laisvės ir Minijos gatvėse nereikia atlikti šių darbų:

#### ***Nevykdomi darbai:***

**- 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

| Sąm. eil.                                    | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------|
| <b>4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai</b> |             |                            |           |        |
| 20                                           |             | Autobusu pavidlonas Aureo  | vnt.      | 2,0    |

**- 52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**

| Sąm. eil.                                    | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                       | Mato vnt. | Kiekis |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai</b> |             |                                                                                                  |           |        |
| 16                                           |             | Autobusų - troleibusų stotelių pavidlonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais | vnt.      | 2,0    |

*Nevykdomų darbų vertė – 13 069,54 Eur be PVM.*

ir reikia atlikti šiuos darbus:

### **Papildomi darbai**

#### **- 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

| Sąm. eil.                                    | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                           | Mato vnt. | Kiekis |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai</b> |             |                                                      |           |        |
|                                              |             | Autobusu paviļjonas su dvejomis šoninėmis sienutėmis | vnt.      | 1,0    |
|                                              |             | Autobusu paviļjonas be šoninių sienučių              | vnt.      | 1,0    |

#### **- 52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**

| Sąm. eil.                                    | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                       | Mato vnt. | Kiekis |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai</b> |             |                                                                                                                                  |           |        |
| 1                                            |             | Autobusų - troleibusų stotelių (su dviem šoninėmis sienutėmis) paviļjonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais | vnt.      | 2,0    |

*Papildomų darbų vertė – 13 869,54 Eur be PVM.*

2. Laisvės g. rekonstravimo projekte atkarpą nuo namo Nr. 7 iki namo Nr. 13 tarp pėsčiųjų tako ir sklypų ribų buvo numatyta užpilti dirvožemiu ir užsėti veja. Įrengus pėsčiųjų taką, pastebėta, kad toks sprendinys šiame ruože nepakankamas. Virš tako esantį šlaitą būtina sutvirtinti, kad gruntas nebyrėtų ant pėsčiųjų tako. Šios problemos sprendimui 2020-08-20 vykusio pasitarimo Nr. 11 metu buvo nutarta kreiptis į projekto autorių dėl sprendimo šlaito sutvirtinimui pateikimo. Rangovas, iš projekto priežiūros vadovo gavęs projekcinį sprendinį bei nevykdymo ir papildomų darbų kiekius, taip pat Užsakovo 2020-09-04 prašymą raštu Nr. AS-4129 pateikti pasiūlymą Laisvės g. namo Nr. 7 iki namo Nr. 13 šlaito sutvirtinimui, 2020-09-15 raštu Nr. SDKI-215 pateikė pasiūlymą šių darbų atlikimui.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, gavusi Užsakovo pritarimą 2020-09-16 raštu Nr. 4370, patvirtina, kad, būtina nereikia atlikti šių darbų:

### **Nevykdomi darbai**

| Sąm. eil.                   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                            | Mato vnt. | Kiekis |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>5 Baigiamieji darbai</b> |             |                                                                                                                       |           |        |
| 1                           | N57P-2202   | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksniu 10 cm, nekasant griovelių) k9=1.15 | 100m2     | 0,49   |
| 2                           | NIP-1102    | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15                                                          | 100m2     | 0,49   |

*Nevykdomų darbų vertė – 207,75 Eur be PVM.*

ir reikia atlikti šiuos darbus:

### **Papildomi darbai**

| Sąm. eil.              | Darbo kodas      | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                          | Mato vnt. | Kiekis |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>2 Žemės sankasa</b> |                  |                                                                                                     |           |        |
| 1                      | Sutartis Nr.2.5  | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius              | t. m3     | 0,025  |
| 2                      | Sutartis Nr.2.7  | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | t. m3     | 0,025  |
| 3                      | Sutartis Nr.2.8  | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais                                                  | t. m3     | 0,025  |
| 4                      | Sutartis Nr.2.10 | Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės)                            | t.m2      | 0,025  |

### 3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija

|   |                 |                                                                                                     |       |       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Sutartis Nr.2.5 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius              | t. m3 | 0,025 |
| 2 | Sutartis Nr.2.7 | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | t. m3 | 0,025 |
| 3 | Sutartis Nr.2.8 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais                                                  | t. m3 | 0,025 |

### 5 Kelio (gavės) dangos konstrukcija

|   |                 |                                                                                                               |       |      |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1 | Sutartis Nr.5.1 | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių) | 100m2 | 0,15 |
| 2 | Sutartis Nr.5.2 | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu                                                          | 100m2 | 0,15 |

*Papildomų darbų vertė – 1 844,30 Eur be PVM.*

***Bendra nevykdomų darbų vertė – 13 277,29 Eur be PVM***

***Bendra papildomų darbų vertė – 15 713,84 Eur be PVM.***

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-09-15 raštas Nr. SDKL-215, 8 lapai;
2. 2020-08-20 protokolas Nr. 11, 2 lapai;
3. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-09-04 raštas Nr. AS-4129, 3 lapai;
4. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-09-16 raštas Nr. AS-4370, 1 lapas;
5. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
6. Lokalinės sąmatos, įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai, 6 lapai.


Komisija:

Plungės rajono savivaldybės  
Administracijos direktorius

  
.....  
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės  
administracijos vyr. specialistas

  
.....  
(parašas, data)


Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas  
FIDIC inžinierius

  
.....  
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“  
projekto vykdymo priežiūros vadovas

  
.....  
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“  
Direktorius Vakarų regionui

  
.....  
(parašas, data) 2020-09-25

Artūras Valys



Plungės rajono savivaldybės administracijos  
Direktoriui Mindaugui Kaunui  
Siunčiama el. paštu [savivaldybe@plunge.lt](mailto:savivaldybe@plunge.lt)

2020-09-15 Nr. SDKL-215  
Į 2020-09-04 Nr. AS-4129

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui  
Steponui Varkaliui  
Siunčiama el. pašto adresais:  
[info@orc.lt](mailto:info@orc.lt)  
[varkalyssteponas@gmail.com](mailto:varkalyssteponas@gmail.com)

### DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ ŠAMATŲ PATEIKIMO

**Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų**

Vykdydami Užsakovo 2020-09-04 prašymą raštu Nr. AS-4129 bei gavę projekto vykdymo priežiūros vadovo paskaičiuotus papildomų/nevykdomų darbų kiekius, teikiame Laisvės g. atliekamų šlaitų tvirtinimo, taip pat autobusų stotelių paviljonų įrengimo Laisvės ir Minijos g. papildomų/nevykdomų darbų šamatas.

Prašome Užsakovą ir FIDIC Inžinierių patvirtinti papildomų darbų lokalinę šamata.

- PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0415-02-DP-SD, 1 lapas;  
2. Laisvės g. šlaitų tvirtinimo papildomų/nevykdomų darbų lokalinė šamata, 2 lapai;  
3. Laisvės ir Minijos g. autobusų stotelių paviljonų papildomų/nevykdomų darbų lokalinė šamata, 4 lapai;

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys



**Ažūrinių trinkelų/ plastikinio korio įrengimas Pk 9+44 – Pk 10+00**

## NEVYKDOMI DARBAI

## Susisiekimo dalis

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas                    | Kiekis | Mato vnt.      |
|----------|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1        | Dirvožemio užpylimas ir užsėjimas veja h=0,10 m | 49     | m <sup>2</sup> |

## PAPILDOMI DARBAI

## Susisiekimo dalis

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas                                                                               | Kiekis | Mato vnt.      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1        | Iškasos, gruntas išvežimas rangovo pasirinktu atstumu                                                      | 25     | m <sup>3</sup> |
| 2        | Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15                                    | 49     | m <sup>2</sup> |
| 3        | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m           | 49     | m <sup>2</sup> |
| 4        | Pilkų ažūrinių trinkelų iš betoninių trinkelų dangos (600x400x80) <b>arba</b> plastikinio korio įrengimas. | 49     | m <sup>2</sup> |
| 5        | Dirvožemio užpylimas ir užsėjimas veja h=0,10 m                                                            | 15     | m <sup>2</sup> |

|                                                                                                                  |     |             |                    |         |                                                                        |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <br><b>UAB PLENTPROJEKTAS</b> |     |             |                    |         | <b>Plungės miesto Laisvės gatvės<br/>rekonstravimo darbo projektas</b> |      | <b>A</b> |
|                                                                                                                  |     |             |                    |         | Susisiekimio<br>Sąnaudų kiekių žiniaraštis                             |      |          |
| 30410                                                                                                            | PV  | A. Vilkelis | <i>[Signature]</i> | 2020-09 | 0415 – 02 – DP – SD                                                    | Lapa | Lapų     |
| 25887                                                                                                            | PDV | A. Vilkelis | <i>[Signature]</i> | 2020-09 |                                                                        | 1    | 1        |
|                                                                                                                  |     |             |                    |         |                                                                        |      |          |

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.

D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M.

MĖN.

D.

**ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statiny's **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiui

6 814,72

| Sąm.<br>eil.                          | Įrenginių<br>kodas | Įrenginių pavadinimas<br>Techniniai ir kiti duomenys | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                       |                    |                                                      |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                    |                                                      |             |        |               |          |
| 20                                    |                    | Autobusu paviljonas Aureo                            | vnt         | 2,0    | 2816,0        | 5 632,00 |
|                                       |                    | Skyriuje 4                                           |             |        |               | 5 632,00 |
|                                       |                    | žiniaraštyje 1                                       |             |        |               | 5 632,00 |
|                                       |                    | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                    |             |        |               | 1 182,72 |
|                                       |                    | Iš viso žiniaraštyje 1                               |             |        |               | 6 814,72 |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Šinkūnaitė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.



## IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Papildomi darbai**

|                                       |                    |                                                      |             |        | Suma žiniaraščiui | 6 814,72 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Sąm.<br>eil.                          | Įrenginių<br>kodas | Įrenginių pavadinimas<br>Techniniai ir kiti duomenys | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR         |          |
|                                       |                    |                                                      |             |        | Vieneto kaina     | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                    |                                                      |             |        |                   |          |
| 1                                     |                    | Autobusu paviljonas su dvejomis šoninėmis sienutėmis | vnt         | 1,0    | 3216,0            | 3 216,00 |
| 2                                     |                    | Autobusu paviljonas be šoninių sienučių              | vnt         | 1,0    | 2416,0            | 2 416,00 |
| Skyriuje 4                            |                    |                                                      |             |        |                   | 5 632,00 |
| žiniaraštyje 1                        |                    |                                                      |             |        |                   | 5 632,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                    |                                                      |             |        |                   | 1 182,72 |
| Iš viso žiniaraštyje 1                |                    |                                                      |             |        |                   | 6 814,72 |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M.

MĖN.

D.



## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinsys **52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**Žiniaraštis **1 Pk0+14,34 - Pk1+74,60, nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiui

8 999,42 EUR

| Sąm.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                          | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                       |                |                                                                                                        |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                |                                                                                                        |             |        |               |          |
| 16                                    |                | Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų<br>montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais<br>varžtais | vnt.        | 2,0    | 3 718,77      | 7 437,54 |
|                                       |                | Skyriuje 4                                                                                             |             |        |               | 7 437,54 |
|                                       |                | žiniaraštyje 1                                                                                         |             |        |               | 7 437,54 |
|                                       |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                      |             |        |               | 1 561,88 |
|                                       |                | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                 |             |        |               | 8 999,42 |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2020 M.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.



## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**

Žiniaraštis **1 Pk0+14,34 - Pk1+74,60, papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui **9 967,42 EUR**

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                               |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |

### 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai

|   |  |                                                                                                                                  |      |     |          |          |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
| 1 |  | Autobusų - troleibusų stotelių (su dviem šoninėmis sienutėmis) paviljonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais | vnt. | 2,0 | 4 118,77 | 8 237,54 |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|

Skyriuje 4 **8 237,54**

žiniaraštyje 1 **8 237,54**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% **1 729,88**

Iš viso žiniaraštyje 1 **9 967,42**

Projekto valdymo vadovė  
Irena Šimkūnaitė

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.



TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M.

MĖN.

D.

**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

**Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje****Statiny 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24****Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24, Nevykdomi darbai**

|                                   |                |                                                                                                                        |             | Suma žiniaraščiui |               | 251,38 EUR |     |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|-----|
| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                          | Mato<br>vnt | Kiekis            | Kaina         |            | EUR |
|                                   |                |                                                                                                                        |             |                   | Vieneto kaina | Iš viso    |     |
| 5 Baigiamieji darbai              |                |                                                                                                                        |             |                   |               |            |     |
| 1                                 | N57P-2202      | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15 | 100m2       | 0,49              | 406,09        | 198,98     |     |
| 2                                 | N1P-1102       | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15                                                           | 100m2       | 0,49              | 17,9          | 8,77       |     |
| Skyriuje 5                        |                |                                                                                                                        |             |                   |               | 207,75     |     |
| žiniaraštyje 1                    |                |                                                                                                                        |             |                   |               | 207,75     |     |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                                        |             |                   |               | 43,63      |     |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |                |                                                                                                                        |             |                   |               | 251,38     |     |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

Vykdojas  
Mėnasio Direktorius  
Povilas Batavičius

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

**Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje****Statinyss 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24****Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24, Papildomi darbai**

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas      | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                                       | Mato<br>vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui 2 231,60 EUR |                             |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|
|              |                     |                                                                                                                                                                     |             |        | Kaina<br>Vieneto kaina         | EUR<br>Iš viso              |
| 2            |                     | Žemės sankasa                                                                                                                                                       |             |        |                                |                             |
| 1            | Sutartis<br>Nr.2.5  | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos<br>ekskavatoriais, pakraunant gruntą į<br>autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15                                        | t. m3       | 0,025  | 1385,67                        | 34,64                       |
| 2            | Sutartis<br>Nr.2.7  | Iškasto grunto transportavimas 10 t<br>autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo<br>talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės,<br>transportavimo atstumas 15.00 km) | t. m3       | 0,025  | 6653,13                        | 166,33                      |
| 3            | Sutartis<br>Nr.2.8  | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą<br>autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15                                                                               | t. m3       | 0,025  | 165,64                         | 4,14                        |
| 4            | Sutartis<br>Nr.2.10 | Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu<br>būdu ( gruntas II grupės) k9=1.15                                                                                 | t.m2        | 0,025  | 637,14                         | 15,93                       |
| 3            |                     | Skyriuje 2<br>Kelio (gavės) dangos konstrukcija                                                                                                                     |             |        |                                | 221,04                      |
| 1            | Sutartis<br>Nr.3.13 | Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių<br>medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15                                                                   | 100m2       | 0,49   | 729,01                         | 357,21                      |
| 2            | Sutartis<br>Nr.3.14 | Šaligatvio pasluoksnių įrengimas ( akmenų<br>atsijos, sluoksnių storis 3 cm) k9=1.15                                                                                | 100m2       | 0,49   | 272,79                         | 133,67                      |
| 3            | Sutartis<br>Nr.3.20 | Šaligatvio dangos įrengimas iš aždūrinių betono<br>plytelių , kai plytelės 600x400x80 mm k9=1.15                                                                    | 100m2       | 0,49   | 2181,19                        | 1 068,78                    |
| 5            |                     | Skyriuje 3<br>Baigiamieji darbai                                                                                                                                    |             |        |                                | 1 559,66                    |
| 1            | Sutartis<br>Nr.5.1  | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant<br>gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant<br>griovelių) k9=1.15                                        | 100m2       | 0,15   | 406,09                         | 60,91                       |
| 2            | Sutartis<br>Nr.5.2  | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu<br>būdu k9=1.15                                                                                                     | 100m2       | 0,15   | 17,9                           | 2,69                        |
|              |                     | Skyriuje 5<br>Žiniaraštyje 1<br>Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                   |             |        |                                | 63,60<br>1 844,30<br>387,30 |
|              |                     | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                                                              |             |        |                                | 2 231,60                    |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Šinkūnaitė

# PASITARIMO PROTOKOLAS

## Nr. 11



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

**„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai**

**Data: 2020-08-20**

**Laikas: 10.00 val.**

**Vieta: Rietavo- Laisvės g, Plungė**

### DALYVIAI:

#### ***Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):***

1. Modestas Budrys, Arvydas Liutika, Mantas Česnauskas, Dangirutė Jurkuvienė.

#### ***FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):***

1. Steponas Varkalys.

#### ***Rangovas:***

1. Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas, Povilas Batavičius (UAB „Plungės lagūna“), Tadas Stakvilevičius (AB „Eurovia Lietuva“)

#### ***2. Projekto vykdymo priežiūros vadovas:***

1. Nedalyvavo

### DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
  - 1.1. Oro sąlygos;
  - 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
  - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
  - 1.4. Rangovo išteklių;
  - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.
4. Pretenzijos.
5. Pakitimai/Pranešimai.
  - 5.1. Darbų programa;
  - 5.2. Projektai;

# PASITARIMO PROTOKOLAS

## Nr. 11



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

### „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

5.3. Statybos darbų žurnalai;

6. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai.

7. Kito pasitarimo data 2020- 09- 25, 10 valandą.

#### SVARSTYTA IR NUTARTA:

1. Darbai vykdomi pagal grafiką, ir parengtą projektą.

2. Svarstyti klausimai dėl projekto dalinio perdavimo ir pakeitimų, sprendinių:

2.1 . Komisija peržiūrėjo Rangovo atliktus statybos darbus Plungės m. Rietavo gatvės atkarpoje nuo PK 0+0.00 iki PK 8+45.17 (t. y. nuo Sinagogų – Rietavo gatvių žiedinės sankryžos iki Laisvės – Rietavo gatvių žiedinės sankryžos), pateikė nežymias apdailos pastabas. Nutarta: Rangovas, gali pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus, kad būtų galima pradėti statybos užbaigimo procedūras.

2.2. Svarstytas autobusų stotelių paviljonų Laisvės ir Minijos g. įrengimo klausimas. Apsikeista nuomonėmis dėl stotelių, kaip įrenginio, sudėties ir pastatymo vietų.

Nutarta: Užsakovas kreipsis raštu į rangovą, nurodydamas stotelės sudėtį ir pastatymo vietą. Projektuotojas parengs reikalingus darbų kiekius projekto pakeitimui.

2.3. Svarstytas šlaitų tvirtinimo klausimas Laisvės g. tarp namų Nr. 7 ir Nr. 13.

Nutarta: Užsakovas pateiks pageidavimą. Projektuotojas paruoš sprendinį projekto pakeitimui.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

Mantas Cismantas  
E. Gombas

Steponas Varkalys



## PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“  
Liepkalnio g. 85  
02120 Vilnius  
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-09-04 Nr. AS-4129  
I Nr. \_\_\_\_\_

UAB „Plungės lagūna“  
Plungės g 28  
90317 Rietavas  
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui  
Steponui Varkaliui  
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui  
UAB „Plentprojektas“  
Gedimino pr. 41-1  
01109 Vilnius  
El. p. bendras@plentprojektas.lt

### DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS IR MINIJOS GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Vadovaudamasi Plungės miesto Laisvės ir Minijos gatvių rekonstravimo techninio projekto sprendiniais ir atsižvelgdama į autobusų stotelių paviljonų įrengimo poreikį Plungės rajono savivaldybės administracija kaip užsakovas prašo pateikti suderinimui autobusų stotelių laukimo paviljonų įrenginius. Pridedame keletą pavyzdinių schemų.

Atkreipiame dėmesį, kad Plungės rajono savivaldybės administracija pageidauja, kad trys stotelės turėtų šonines sienes iš abiejų pusių.

Taip pat prašome paskaičiuoti plastmasinio šlaitų tvirtinimo (korio) ir betoninio tvirtinimo įrengimo darbų kainas, tvirtinant šlaitą nuo namo Laisvės g. Nr.7 iki namo Nr.13.

PRIDEDAMA  
Autobusų laukimo paviljonų schemos, 2 lapai

Administracijos direktorius


Mindaugas Kaunas

**Originalas nebus siunčiamas**

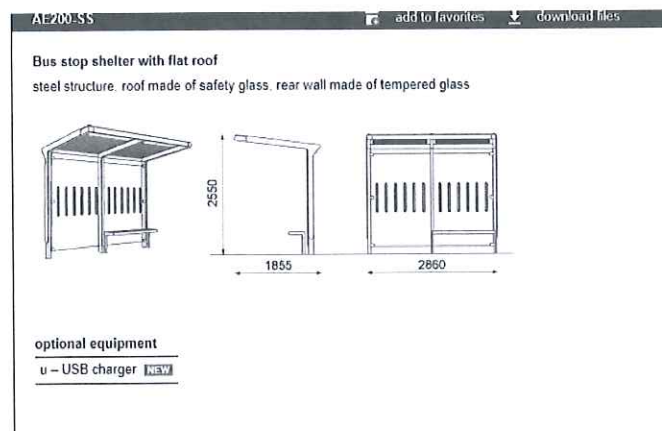
Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas [modestas.budrys@plunge.lt](mailto:modestas.budrys@plunge.lt)



**Bus stop shelter with flat roof**  
steel structure, roof made of safety glass, rear and side walls made of tempered glass, without lighted advertisement box



**optional equipment**  
u – USB charger **NEW**





AB „EUROVIA LIETUVA“

Liepkalnio g. 85

02120 Vilnius

El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-09-16

Nr.

AS-4370

SDKL-215/AG-

I 2020-09-15

Nr.

6043

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui

Steponui Varkaliui

El. p. varkalyssteponas@gmail.com

## DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. SDKL-215/AG-6043 ir informuoja, kad pritaria projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktiems sprendiniams. Taip pat pritaria Laisvės gatvės šlaitų tvirtinimo ir stotelių paviljonų įrengimo Laisvės ir Minijos gatvėse papildomų/nevykdomų darbų sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

**Originalas nebus siunčiamas**

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas [modestas.budrys@plunge.lt](mailto:modestas.budrys@plunge.lt)

SUDERINTA: \_\_\_\_\_  
ATSAKINGAS ATSTOVAS: \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
ATSAKINGAS ATSTOVAS: \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.



## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Nevykdomi darbai**

|                                       |                    |                                                      |             |        | Suma žiniaraščiui | 6 814,72 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Sąm.<br>eil.                          | Įrenginių<br>kodas | Įrenginių pavadinimas<br>Techniniai ir kiti duomenys | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR         |          |
|                                       |                    |                                                      |             |        | Vieneto kaina     | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                    |                                                      |             |        |                   |          |
| 20                                    |                    | Autobusu paviljonas Aureo                            | vnt         | 2,0    | 2816,0            | 5 632,00 |
|                                       |                    | Skyriuje 4                                           |             |        |                   | 5 632,00 |
|                                       |                    | žiniaraštyje 1                                       |             |        |                   | 5 632,00 |
|                                       |                    | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                    |             |        |                   | 1 182,72 |
|                                       |                    | Iš viso žiniaraštyje 1                               |             |        |                   | 6 814,72 |

Projekto valdymo vadovė  
Rima Šinkūnaitė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Papildomi darbai**

|                                       |                    |                                                      |             |        | Suma žiniaraščiui | 6 814,72 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Sąm.<br>eil.                          | Įrenginių<br>kodas | Įrenginių pavadinimas<br>Techniniai ir kiti duomenys | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR         |          |
|                                       |                    |                                                      |             |        | Vieneto kaina     | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                    |                                                      |             |        |                   |          |
| 1                                     |                    | Autobusu paviljonas su dvejomis šoninėmis sienutėmis | vnt         | 1,0    | 3216,0            | 3 216,00 |
| 2                                     |                    | Autobusu paviljonas be šoninių sienučių              | vnt         | 1,0    | 2416,0            | 2 416,00 |
| Skyriuje 4                            |                    |                                                      |             |        |                   | 5 632,00 |
| žiniaraštyje 1                        |                    |                                                      |             |        |                   | 5 632,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |                    |                                                      |             |        |                   | 1 182,72 |
| Iš viso žiniaraštyje 1                |                    |                                                      |             |        |                   | 6 814,72 |

Projekty valdymo vadovė  
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: **Vykdomasis direktorius**  
ATSAKINGAS ATSTOVAS **Povilas Batavičius**  
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2020 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**

Žiniaraštis **1 Pk0+14,34 - Pk1+74,60, nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiui **8 999,42 EUR**

| Sąm.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                          | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                       |                |                                                                                                        |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                |                                                                                                        |             |        |               |          |
| 16                                    |                | Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų<br>montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais<br>varžtais | vnt.        | 2,0    | 3 718,77      | 7 437,54 |
|                                       |                | Skyriuje 4                                                                                             |             |        |               | 7 437,54 |
|                                       |                | žiniaraštyje 1                                                                                         |             |        |               | 7 437,54 |
|                                       |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                      |             |        |               | 1 561,88 |
|                                       |                | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                 |             |        |               | 8 999,42 |

Projektų valdymo vadovė  
Rima Čimkūnaitė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.



## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinys **52 Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Pk0+14,34 - Pk1+74,60**

Žiniaraštis **1 Pk0+14,34 - Pk1+74,60, papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui **9 967,42 EUR**

| Sąm.<br>eil.                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                       |                |                                                                                                                                  |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai |                |                                                                                                                                  |             |        |               |          |
| 1                                     |                | Autobusų - troleibusų stotelių (su dviem šoninėmis sienutėmis) paviljonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais | vnt.        | 2,0    | 4 118,77      | 8 237,54 |
|                                       |                | Skyriuje 4                                                                                                                       |             |        |               | 8 237,54 |
|                                       |                | žiniaraštyje 1                                                                                                                   |             |        |               | 8 237,54 |
|                                       |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                |             |        |               | 1 729,88 |
|                                       |                | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                           |             |        |               | 9 967,42 |

Projekto valdymo vadovė  
Irena Šimkūnaitė

SUDERINTA: Vykdomasis direktorius  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS Povilas Batavičius  
 2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2020 M. MĖN. D.



## LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24, Nevykdomi darbai**

|              |                |                                                                                                                       |             | Suma žiniaraščiui |               | 251,38 EUR |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|
| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                         | Mato<br>vnt | Kiekis            | Kaina         |            |
|              |                |                                                                                                                       |             |                   | Vieneto kaina | Iš viso    |
|              | 5              | Baigiamieji darbai                                                                                                    |             |                   |               |            |
| 1            | N57P-2202      | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių) k9=1.15 | 100m2       | 0,49              | 406,09        | 198,98     |
| 2            | N1P-1102       | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15                                                          | 100m2       | 0,49              | 17,9          | 8,77       |
|              |                | Skryriuje 5                                                                                                           |             |                   |               | 207,75     |
|              |                | žiniaraštyje 1                                                                                                        |             |                   |               | 207,75     |
|              |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                     |             |                   |               | 43,63      |
|              |                | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                |             |                   |               | 251,38     |

Projektų valdymo vadovė  
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2020 M. \_\_\_\_\_

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

Vykdytojas  
 Povilas Batavičius

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24, Papildomi darbai**

| Suma žiniaraščiui |                  |                                                                                                                                                            |          |        | 2 231,60 EUR  |          |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|
| Sąm. eil.         | Darbo kodas      | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                 | Mato vnt | Kiekis | Kaina         | EUR      |
|                   |                  |                                                                                                                                                            |          |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 2                 |                  | Žemės sankasa                                                                                                                                              |          |        |               |          |
| 1                 | Sutartis Nr.2.5  | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15                                     | t. m3    | 0,025  | 1385,67       | 34,64    |
| 2                 | Sutartis Nr.2.7  | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, transportavimo atstumas 15.00 km) | t. m3    | 0,025  | 6653,13       | 166,33   |
| 3                 | Sutartis Nr.2.8  | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15                                                                         | t. m3    | 0,025  | 165,64        | 4,14     |
| 4                 | Sutartis Nr.2.10 | Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės) k9=1.15                                                                           | t.m2     | 0,025  | 637,14        | 15,93    |
|                   |                  | Skyriuje 2                                                                                                                                                 |          |        |               | 221,04   |
| 3                 |                  | Kelio (gavės) dangos konstrukcija                                                                                                                          |          |        |               |          |
| 1                 | Sutartis Nr.3.13 | Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15                                                             | 100m2    | 0,49   | 729,01        | 357,21   |
| 2                 | Sutartis Nr.3.14 | Šaligatvio pasluoksnių įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnių storis 3 cm) k9=1.15                                                                          | 100m2    | 0,49   | 272,79        | 133,67   |
| 3                 | Sutartis Nr.3.20 | Šaligatvio dangos įrengimas iš azūrinių betono plytelių , kai plytelės 600x400x80 mm k9=1.15                                                               | 100m2    | 0,49   | 2181,19       | 1 068,78 |
|                   |                  | Skyriuje 3                                                                                                                                                 |          |        |               | 1 559,66 |
| 5                 |                  | Baigiamieji darbai                                                                                                                                         |          |        |               |          |
| 1                 | Sutartis Nr.5.1  | Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15                                     | 100m2    | 0,15   | 406,09        | 60,91    |
| 2                 | Sutartis Nr.5.2  | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15                                                                                               | 100m2    | 0,15   | 17,9          | 2,69     |
|                   |                  | Skyriuje 5                                                                                                                                                 |          |        |               | 63,60    |
|                   |                  | žiniaraštyje 1                                                                                                                                             |          |        |               | 1 844,30 |
|                   |                  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                                          |          |        |               | 387,30   |
|                   |                  | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                                                     |          |        |               | 2 231,60 |

Projektų valdymo vadovė  
 Rima Šinkūnaitė
