

Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“, įm. kodas 301657564

Rangos sutartis Nr. S-409

Sutarties data: 2021-08-05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO IR ATSISAKOMŲ DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMO AKTAS Nr. 4.

2022-02-28

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas Arūnas Žemaitis;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktoriaus raštu 2022-02-08 SD – 11 ir rašto prieduose pateiktais brėžiniais, apžiūrėjo atliekamus darbus pagal Statybos rangos sutartį Nr. S-409, sudarytą 2021 08 05, susipažino su projektine dokumentacija ir faktine situacija ir pagal rašto 1-5 punktus nustatė atsisakomų ir vykdomų (papildomų) darbų poreikį:

1. Lentelė. Atsisakomi darbai

Aprašymo Poz. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Medinių konstrukcijų (karkaso, sijų ir pan.) įrengimas/pakylos konstrukcijos	m3	7
2.	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	100 m2	1,751
3.	Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku	100 m2	3,011
4.	Medžio plaušo ir medžio drožlių plokščių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku	100 m2	0,3
5.	Vieno sluoksnio medžio drožlių plokščių tvirtinimas prie medinio karkaso/OSB 12 mm	100 m2	0,15

2. Lentelė. Vykdomi (papildomi) darbai

Aprašymo Poz. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Iki 600mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai gruntas II grupės	Vnt.	16

2.	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	1
3.	Gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m3	3
4.	550mm storio posluoksnių iš smėlio įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	1,647
5.	Grindų šiltinamųjų (garso) 150mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes EPS100	100 m2	1,647
6.	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,6
7.	Betono posluoksnių 150mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu / C30/37	100 m2	1,647
8.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	1,647
9.	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	4,2
10.	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm/ dn 40 mm	100 m	2,5
11.	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	12,5
12.	Metalinų saramų įrengimas	t	0,11
13.	Betoninių pagalvių įrengimas*C25/30 XC1	m3	0,02
14.	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	1,31
15.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,62
16.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=20)	t	2,62
17.	Aliuminio profilio vitrinų ir langų montavimas/ pilna komplektacija	m2	5,34
18.	Išorės nuolajų (palangių) montavimas	100 m	0,03
19.	Plieninės palangės-200 (poliesteris)	m	3

Nutarta:

1. Šio akto 2 lentelėje nurodytus darbus vertinti kaip papildomus, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti vykdant viešąjį konkursą, rengiant konkursinius pasiūlymus, kurie yra neįtraukti į Rangos sutartį ir jos priedus, bei pasirašant 2021-08-05 d. Statybos darbų rangos sutartį, tačiau jų neatlikus, bus neįmanoma tinkamai vykdyti Rangos sutarties ir tinkamai užbaigti darbų (gauti statybos užbaigimo aktą). Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas.

2. Aptarti darbai bus įvertinti sutartyje numatytomis sąlygomis.

Pridedama:

Raštas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2022-02-08SD-11, 1 lapas;
Darbo projekto brėžinys 00120-01-DP-SK.B-05, 1 lapas;
Brėžinys Nr.1. fasadai, 1 lapas;
Brėžinys Nr.2, 1 lapas;
Brėžinys Nr.3, 3 lapai;
Atsisakomų darbų lokalinė sąmata Nr.1, 1 lapas;
Papildomų (vykdomų) darbų lokalinės sąmatos Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, 4 lapai.

Kazlų Rūdos raj. sav. administracijos
Ūkio ir teritorijų planavimo vedėjas

Arūnas Žemaitis

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. S. Daukanto g. 19N., LT-69430 Kazlų Rūda. tel. / faks. (8 343) 95 117 el. p. krkcentras@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188749235

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ūkio ir teritorijų 2022 02 08 SD - 11
planavimo posk., investicijų posk.,
UAB „Nimetus“

DĖL KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO RENOVACIJOS PROJEKTO TIKSLINIMO

Vykdamas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro renovacijos darbus atsirado keleto statybos konstrukcijų pozicijų tikslinimo poreikis, nes tai gali turėti įtakos universalesniam pastato pritaikymui ir kokybiškesnės veiklos organizavimui:


1. Reikalingas lango angos didinimas per vieną lango profilio konstrukciją patalpoje 1-03 (pridedamas brėžinys Nr.1, pasirinktas variantas - Nr.1).
2. Reikalingas lango įrengimas patalpoje 2-07 (pridedamas brėžinys Nr.2)
3. Prašymas pakeisti durų atvėrimo kryptį patalpoje 2-02 iš dešinės į kairę (brėžinys Nr.2), nes pagal suplanuotą durų atvėrimą užsitveria išėjimas į laiptinę gaisro atveju.
4. Reikalingas scenos pakylės pagrindo keitimas iš medinės konstrukcijos į stabilią, gelžbetoninę pakylą su užpildu dėl scenos rezonanso garsinimo ir smarkesnio judesio (pvz. šokių) atvejo. Planuojant scenos konstrukcinį brėžinį reikalinga suplanuoti iš scenos priekio 4 angas: 850 mm plotis x 650 mm aukštis ir 800 mm gylio, žemų dažnių garso kolonėlių įrengimui (brėžinys Nr.3)
5. Prieš išliejant scenos pagrindą, prašome papildomai pratiesti 40 mm diametro kabelio klojimo izoliacinės žarnos "gofras" nuo scenos vidurio iki šoninių scenos lauko durų (nuo žiūrovų dešinėje) valdymo pulto įrangai, pagal pateiktą schemą (brėžinys Nr.3)
6. Organizuojant vidaus apdailos darbus, prašome numatyti garso izoliacinės medžiagos paklojimą patalpų 2-08 ir 2-03 vidinėse sienose (pažymėta brėžinyje Nr.2)
7. Pagal pateiktas garso sistemų specialistų rekomendacijas prašome įrengti scenos įrengimų tvirtinimo taškus lubose ir sienose (pridedamas aprašymas ir brėžinys Nr.3)

Direktorius

Valdas Andriuskevičius

Brėzinys Nr. 1 (fasada)






	Projekcijašes šeruo š pervašuo		Projekcijašes šeruo š pervašuo
	Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)		Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)
	Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)		Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)
	Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)		Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)
	Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)		Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)
	Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)		Aplaušuošes šeruošes pervašuošes (pervuošes)

PASTABOS:

1. Išsamiavimai duoti milimetrų, atskirai - metrų.
2. Matavimai ir atskaitos būdine šiaurinė vėjelė.
3. Brėžiniai ir duoti nesistūrinis, sprendimus daryti su projektyvūnais.
4. Lubų ir stienų apdailos spalvų ir raštų duoti su projekto autoriumi, daryti projekto sudorę.
5. Atskirai givimo duoti, prieš projekto sudorę, būdine pūdikanti esantiems matavimams ir atskaitai, givavima - iš turini emulsiuonius, patams praddo daržius.

1 AUKŠTO PLANAS

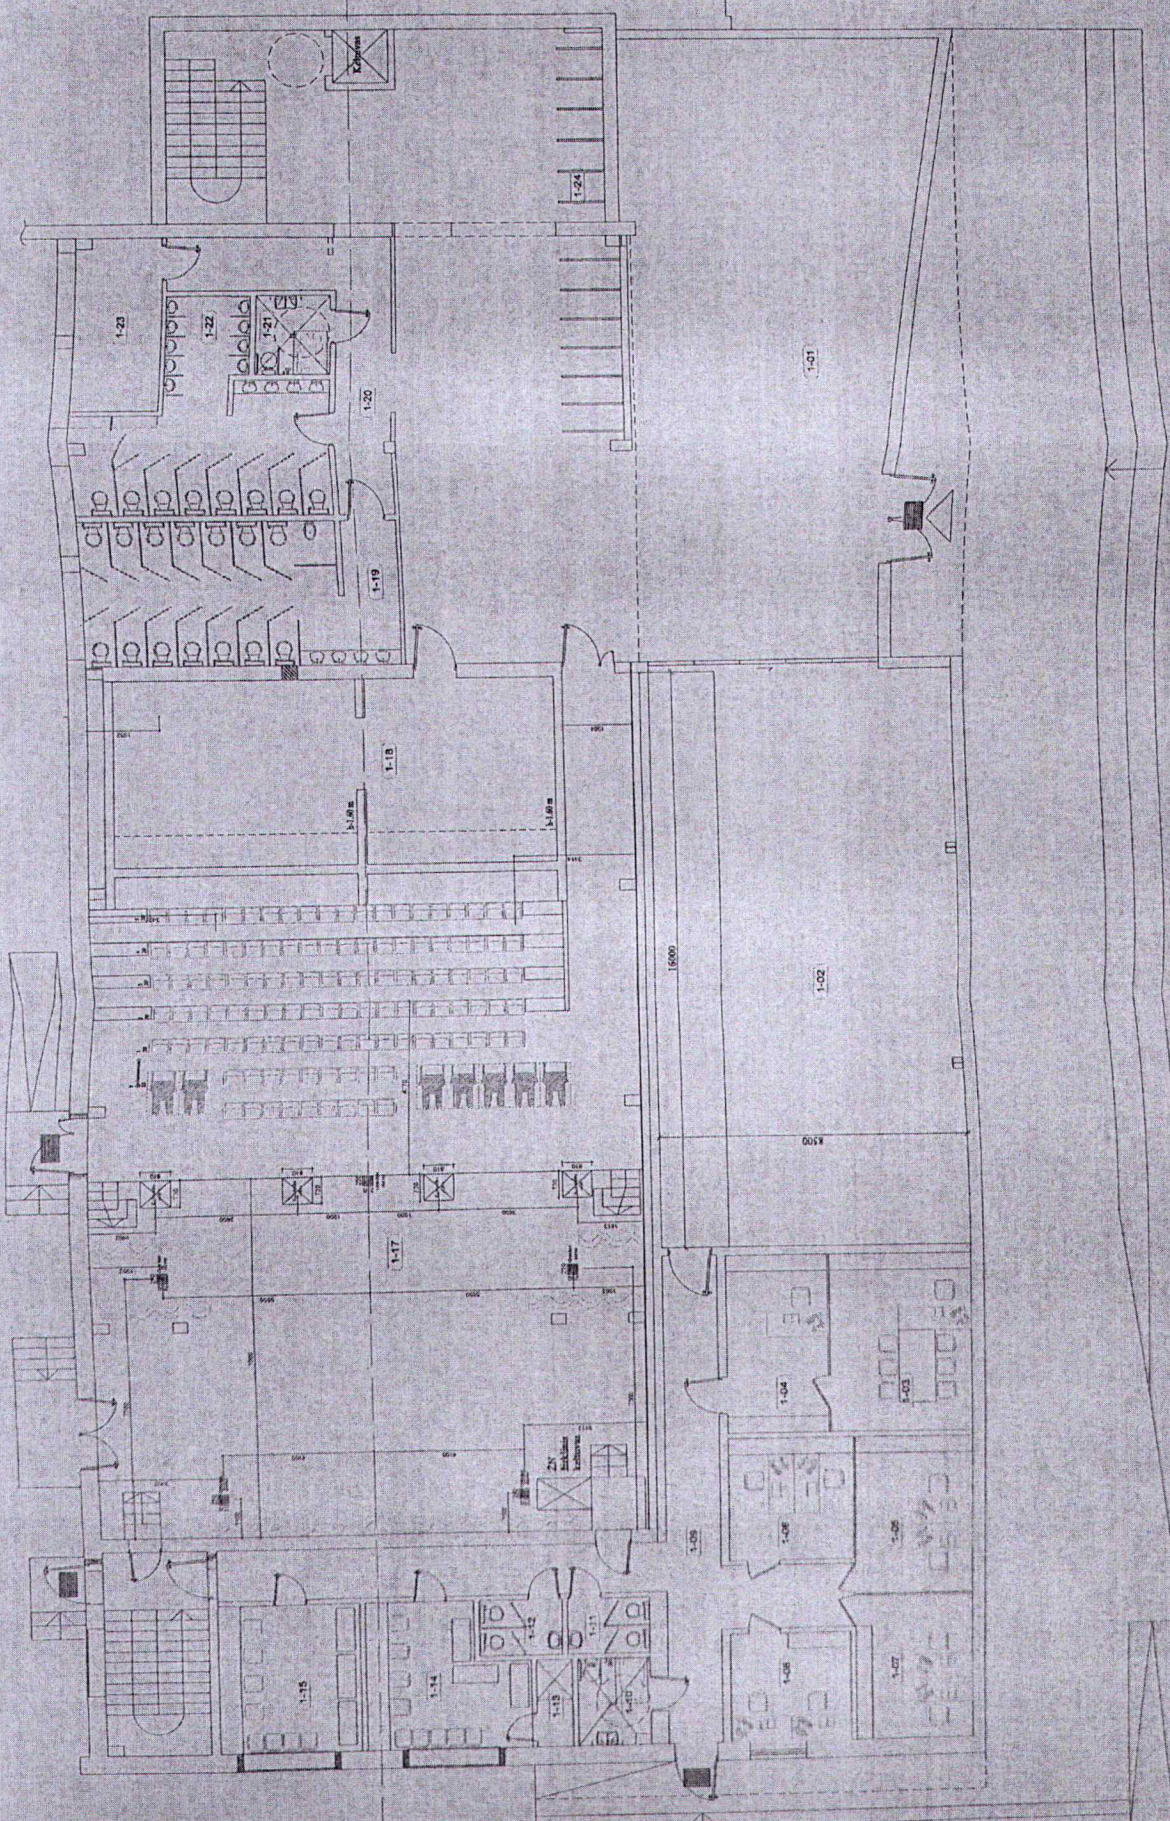


PASTABOS:

1. Brežinio matmenys pateikiami milimetrais (mm);
2. Visi matmenys ir atstumai tūkslinami darbu vykdymo metu;
3. Nuo įvado iki grindinių deželių scenoje atvedamos gošros 2x40 mm (5 vnt.)


STAKTENLAJPAZYMÉJIMAE

NO.	IN PATARON ZA VANDASIS	NO. PLANE	MUTAS m ²	IN PATARON ZA VANDASIS	NO. PLANE	MUTAS m ²
1-1	Ilizis parzija, par	28-97	1,36	Sac. masego 250	4,9	1,39
1-2	Karstas ir m.	307-23	11	Sac. masego 250	3,75	4,25
1-3	Levianimas karstas	19-50	6,2	Sac. masego 250	3,75	22,09
1-4	Levianimas karstas	12-80	1,3	Sac. masego 250	1,18	1,18
1-5	Levianimas karstas	14-40	1,4	Sac. masego 250	2,48	2,53
1-6	Karstas	11-36	1,4	Sac. masego 250	3,64	3,64
1-7	Karstas	12-56	1,7	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-8	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-9	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-10	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-11	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-12	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-13	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-14	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-15	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-16	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-17	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-18	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-19	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-20	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-21	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-22	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-23	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-24	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-25	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-26	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-27	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-28	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-29	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-30	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-31	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-32	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-33	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-34	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-35	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-36	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-37	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-38	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-39	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-40	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-41	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-42	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-43	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-44	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-45	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-46	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-47	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-48	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-49	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-50	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-51	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-52	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-53	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-54	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-55	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-56	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-57	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-58	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-59	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-60	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-61	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-62	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-63	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-64	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-65	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-66	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-67	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-68	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-69	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-70	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-71	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-72	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-73	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-74	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-75	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-76	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-77	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-78	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-79	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-80	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-81	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-82	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-83	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-84	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-85	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-86	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-87	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-88	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-89	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-90	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-91	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-92	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-93	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-94	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-95	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-96	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-97	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-98	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-99	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16
1-100	Karstas	10-46	1,8	Sac. masego 250	16,68	1137,16

5/16/17 O.W. Shivers

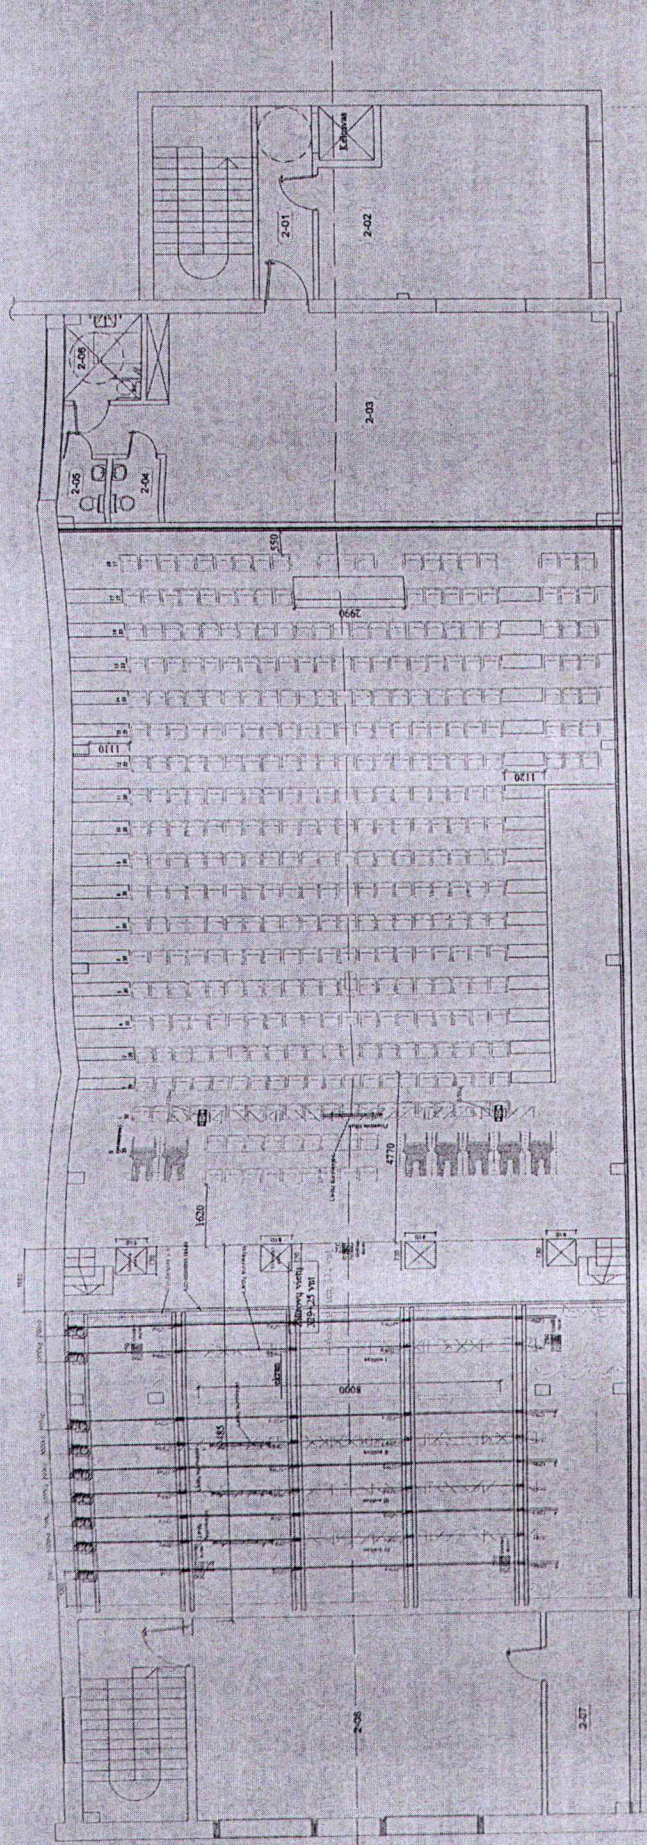

ACCESO PLANAS



SIŪLOMOS KOMPAKTIŠKOS TEATRINĖS KĖDĖS
"TIAGO ETIUDA"

NO. PLANE	2A. TALLAS PAVADIRAS	PLANTAS m ²
2-40	Escuderos	9,07
2-41	Espejitos de	37,21
2-42	Espejitos de	79,52
2-43	Espejitos de	2,47
2-44	Sec. mayor (interior)	2,39
2-45	Sec. mayor (Vrta)	5,28
2-46	Sec. mayor (2o)	13,40
2-47	Frutales pasadas	55,48
2-48	Frutales pasadas	117,10
	25001 ALBETOS m ²	200,83
	25002 ALBETOS m ²	41,35
	25003 ALBETOS m ²	130,26


SR. PLANT	LA. PATALLOS BAYALASUMAS	LOTAS m ²
A-1	Prigilone pastaje	48.35
	VPO 1 AGR. m ²	137.10
	VPO 8 AGR. m ²	201.81
	VPO 14 AGR. m ²	44.25
	VPO 17 AGR. m ²	195.55

SUBSISTENSI
 PERUMAHAN
 KOTA

PASTABOS:

1. Brežinio matmenys pateikiami milimetrais (mm);
2. Visi matmenys ir atstumai tikslinami darbu vykdymo metu;
3. Nuo įvado iki grindinių dažniųjų atvedamos gofros 2x40 mm (5 vnt.)

bindings Nr. 3 (3/4 ps)

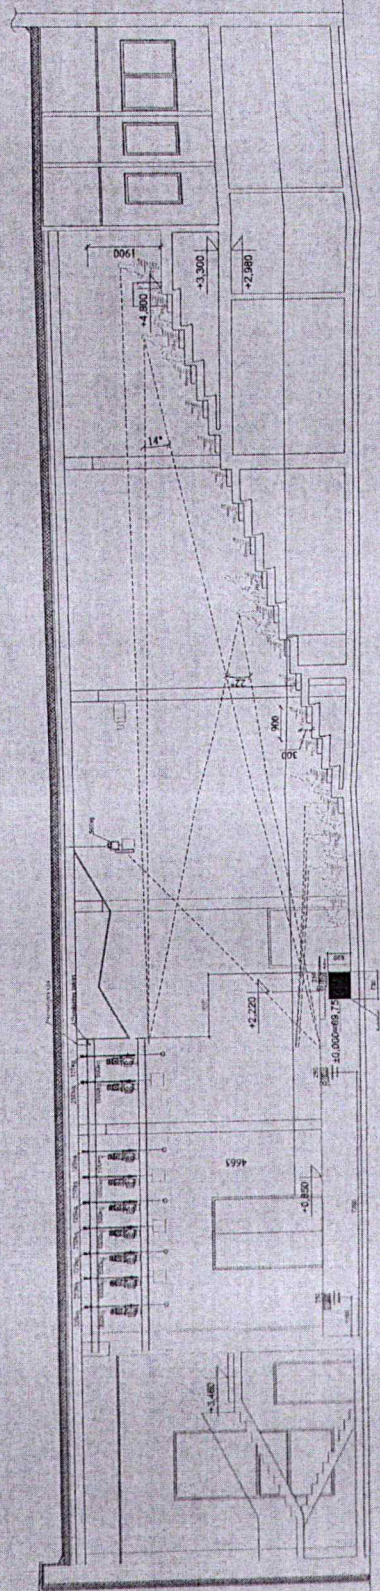

PASTABOS:

- PASTABOS:
1. Brėžinio matmenys patikiamji milimetrais (mm);
 2. Visi matmenys, jei atstumai tikslinami darbų vykdymo metu;
 3. Nuo įvado iki grindinių dežūčių scenoje atvedamos gofros 2x40 mm (5 vnt.)

LOKALINĖ SĄMATANr.1.

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 00120TP Kultūros paskirties pastato S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo ir dalies admin. pastato,
S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto projektas
Statinys Atsisakomi darbai

Žiniaraštis Scenos pakyla

Suma žiniaraščiui				11401,01		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 Scenos pakyla						
1 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, sijų ir pan.) įrengimas/pakylų konstrukcijos	m3	7,0	931,7986	6522,59
2 N10P-1101		Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementu) k8=1.17	100m2	1,751	122,7323	214,9
3 N10-210-7		Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku k8=1.17	100m2	3,011	752,6519	2266,23
4 N10-210-8		Medžio plaušo ir medžio drožlių plokščių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku k8=1.17	100m2	0,3	922,5729	276,77
5 N10P-0802		Vieno sluoksnio medžio drožlių plokščių tvirtinimas prie medinio karkaso/OSB 12 mm	100m2	0,15	945,5155	141,83
Skyriuje 9						9422,32
Žiniaraštyje						9422,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1978,69
Iš viso žiniaraštyje						11401,01

inž. sąmatininkė Reda Vyšniauskaitė

Kompleksas: 00120TP Kultūros paskirties pastato S.
Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje
rekonstravimo projektas

Objektas: Keičiami darbai naujomis kainomis
Žiniaraštis: Scenos pakyla monolitinė

Lokalinė sąmata Nr. Nr.2

Sudaryta 2021 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **13766,86€**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N11P-0103	550mm storio posluoksnių iš smėlio įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	1,647	1961,362	3230,36
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 150mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes EPS100	100 m2	1,647	1612,801	2656,28
3	N11P-0104	Betono posluoksnių 150mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu (S9=1,0425)/ C30/37	100 m2	1,647	1808,447	2978,51
4	N10P-0202	Medinių konstrukcijų izoliavimas tarpikliais	100 m	4,2	317,735	1334,49
5	N21P-0307	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm/ dn 40 mm	100 m	2,5	471,173	1177,93
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						11377,57
Bendra vertė be PVM						11377,57
PVM						2389,29
Bendra vertė su PVM						13766,86

Sudarė: inž. sąmatininkė Reda Vyšniauskaitė

Kompleksas: 00120TP Kultūros paskirties pastato S.
Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje
rekonstravimo projektas

Objektas: Keičiami darbai sutarties kainomis
Žiniaraštis: Scenos pakyla monolitinė

Lokalinė sąmata Nr. 3.

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **6213,33€**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N5P-0701	Iki 600mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai gruntas II grupės	vnt	16	51,213	819,41
2	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	1	599,808	599,81
3	N6-23	Gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų (K3=0,05; S9=1,0425; S10=1,15)	m3	3	532,218	1596,65
4	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)	t	1,6	1270,006	2032,01
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	1,647	52,887	87,10
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5134,98
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						5134,98
PVM						1078,35
Bendra vertė su PVM						6213,33

inž. sąmatininkė Reda Vyšniauskaitė

Kompleksas: 00120TP Kultūros paskirties pastato S.
Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje
rekonstravimo projektas

Lokalinė sąmata Nr.4.

Objektas: Papildomi darbai sutarties kainomis
Žiniaraštis: Vitrinos praplatinimas ir naujo aliuminio
lango įrengimas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

3146,98€

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-8	Metalinių sąramų įrengimas k8=1.07	t	0,11	3132,003	344,52
2	N46-124	Betoninių pagalvių įrengimas*C25/30 XC1	m3	0,02	2115,022	42,30
3	R6-3	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (S9=1,17)	m3	1,31	70,097	91,83
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,62	35,193	92,20
5	R23-62	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=20)	t	2,62	12,800	33,54
6	F10-4-7	Aliuminio profilio vitrinų ir langų montavimas/ pilna komplektacija	m2	5,34	364,988	1949,03
7	R62P-3404	Išorės nuolajų (palangių) montavimas	100m	0,03	1203,769	36,11
8	R1	Plieninės palangės-200 (poliesteris)	m	3	3,761	11,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2600,81
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						2600,81
PVM						546,17
Bendra vertė su PVM						3146,98

inž. sąmatininkė Reda Vyšniauskaitė

Kompleksas: 00120TP Kultūros paskirties pastato S.
Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje
rekonstravimo projektas
Objektas: Papildomi darbai naujomis kainomis
Žiniaraštis: Vitrinos praplatinimas ir naujo aliuminio
lango įrengimas

Lokalinė sąmata Nr. 5.

Sudaryta 2021 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

77,13€

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R23-199	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų (S9=1,17)	m	12,5	5,099	63,74
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						63,74
Bendra vertė be PVM						
PVM						63,74
Bendra vertė su PVM						13,39
						77,13

inž. sąmatininkė Reda Vyšniauskaitė

