

F8-76

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2018 M. GRUODŽIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. 2770 (F8-78) PAKEITIMO
2019 m. lapkričio 15 d.
Kaunas

Kauno valstybinis muzikinis teatras, adresas Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas, įstaigos kodas 190754798, atstovaujamas teatro vadovo Benjaminio Želvio (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Audiotonas“, juridinio asmens kodas 110603713, adresas Neries krant. 14, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Roberto Lučinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

Atsižvelgdami į tai, kad:

(i) tarp Šalių buvo 2018-12-19 buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. 2770 (F8-78) (toliau - Sutartis), kurios dalykas – Teatro scenos konstrukcijų projektavimas ir atnaujinimo darbai su viršutinės ir apatinės mechanizacijos, garso ir meninio apšvietimo sistemų, teatro kultūrinei veiklai reikalingos įrangos įsigijimu ir montavimu, įtraukiant ir techninio aukšto įrengimą;

(ii) Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (itin prasta grindų pagrindo (kuris yra paslėptas) būklė) išaiškėjo poreikis įsigyti papildomų – grindų remonto darbų;

(iii) Tiekėjas turi pabaigti vykdyti Sutartį iki 2019 m. gruodžio 15 d., tačiau Užsakovas jam nebegali suteikti Sutarties vykdymui bei papildomų darbų atlikimui reikalingų teatro patalpų dėl būtino repertuarinio sezono pradžios bei būtino teatro patalpų panaudojimo repeticijoms nuo 2019 m. lapkričio 29 d.;

(iv) Atsižvelgdamos į šio susitarimo priede Nr. 1 pateiktus argumentus bei vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., 89 str. 1 d. 5 p. ir VPĮ 89 str. 4 d., 89 str. 2 d. bei CK 6.46 str. 2 d. nuostatomis,

Šalys susitaria:

1. Sustabdyti Sutarties vykdymą laikotarpiui nuo 2019 lapkričio 29 d. iki 2020 m. birželio 1 d. Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas neturi teisės vykdyti Sutarties.
2. Įsigyti Sutarties priede Nr. 1 detalizuotus papildomus darbus už 13.335,54 Eur be PVM ir išdėstyti Sutarties 2.10 p. nauja redakcija:
„2.10. PREKIŲ TIEKIMO kainos detalizavimas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM
1.	Teatro scenos viršutinės ir apatinės mechanizacijos sistemos	1	vnt.	2.214.877,4
2.1	Mechanizacijos sistemų diegimo ir montavimo darbai	1	vnt.	473.480,00
2.2	Mechanizacijos sistemų konstrukcijų projektavimas	1	vnt.	19.000,00
2.3	Grindų keitimas	1	vnt.	54.492,00
2.4	Techninio aukšto įrengimas	1	vnt.	353.575,00
	VISO už mechanizacijos sistemų diegimo ir montavimo darbus, Eur be PVM (2.1 – 2.4 poz.)	-	-	900.547,00
3.	Teatro scenos garso ir meninio apšvietimo sistemos. Teatro kultūrinei veiklai reikalinga įranga.	1	vnt.	289.316,08
4.	Teatro scenos garso ir meninio apšvietimo sistemos, teatro kultūrinei veiklai reikalingos įrangos diegimo ir montavimo darbai	1	vnt.	33.452,00
5.	Papildomi darbai, susiję orkestro duobės pagrindžio įrengimu	1	kompl.	11.120,11
6.	Papildomos mobilios pakylės	10	vnt.	3.500,00
7.	Papildomi grindų remonto darbai	1	Kompl.	13.335,54

IŠ VISO Suma Eur be PVM:	3.466.148,13
PVM tarifas, %	21
PVM suma, Eur	727.891,107
IŠ VISO Suma Eur su PVM:	4.194.039,24

3. Išdėstyti Sutarties 3.3 p. nauja redakcija:
„3.3. TIEKĖJAS įsipareigoja pristatyti ir parengti naudoti visą ĮRANGĄ UŽSAKOVUI ir įvykdyti visus SUTARTIES įsipareigojimus nurodytu adresu Kaune ne vėliau kaip per 18 mėn. 20 d. nuo SUTARTIES įsigaliojimo dienos (įskaitant 185 d. sutarties sustabdymo laikotarpį, kurio metu Sutartis nevykdoma ir 15 darbo dienų laikotarpį atlikti papildomus darbus, susijusius su grindų remontu), ir nuo galutinio ĮRANGOS perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti ĮRANGAI garantiją pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.“
4. Išdėstyti Sutarties 3.3 p. nauja redakcija:
5. *„SUTARTIS sudaroma 19 mėnesių 20 d. laikotarpiui (įskaitant SUTARTIES stabdymo laikotarpį, papildomų darbų atlikimo terminą, SUTARTYJE numatytą atsiskaitymo terminą).“*
6. Šis susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

Susitarimo priedai:

1. 2019-11-05 protokolas Nr. 15 su papildomų darbų lokaline sąmata;

Užsakovo atstovas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Vadovas

Benjamins Želvys



Tiekėjo atstovas

UAB „Audiotonas“

Direktorius

Robertas Lučinskas



Teatro vadovo pavaduotojas
Rimantas Lekavičius

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas

Vadovo pavaduotoja finansams
Asta Contarckienė

KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO MODERNIZAVIMAS

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 15

2019 m. lapkričio 5 d.

Kaunas

Posėdžio pradžios laikas: 11:00 val.

Užsakovas	Kauno valstybinis muzikinis teatras
Tiekėjas	UAB „Audiotonas“
Šalys	Kauno valstybinis muzikinis teatras ir UAB „Audiotonas“
Pasitarimo pirmininkas	Rimantas Lekavičius, Užsakovo vadovo pavaduotojas
Pasitarimo sekretorius	Stasys Kriščiūnas, Užsakovo vyr. inžinierius
Dalyvavo	Česlovas Čepkauskas, UAB „Audiotonas“ projektų vadovas

DARBOTVARKĖ.

SUTARTIES SU UAB „AUDIOTONAS“ VYKDYMO IR KEITIMO KLAUSIMAI.

1. Dėl papildomų grindų remonto darbų.
2. Dėl sutarties vykdymo sustabdymo.

SVARSTYTA.

1 klausimas. Dėl papildomų grindų remonto darbų įsigijimo.

UAB „Audiotonas“ (toliau – Audiotonas arba Tiekėjas) ir Kauno valstybinio muzikinio teatro (toliau – Teatras arba Užsakovas) buvo 2018-12-19 buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. 2770 (F8-78) (toliau - Sutartis), kurios dalykas – Teatro scenos konstrukcijų projektavimas ir atnaujinimo darbai su viršutinės ir apatinės mechanizacijos, garso ir meninio apšvietimo sistemų, teatro kultūrinei veiklai reikalingos įrangos įsigijimu ir montavimu, įtraukiant ir techninio aukšto įrengimą.

Sutartyje buvo numatytas medinių scenos grindų keitimas, kurių detalizavimas buvo numatytas darbų kiekių žiniaraštyje. Scenos grindų keitimo darbai buvo numatyti atlikus vizualinį jų įvertinimą per dvi grindų angas – 1 x 0,5 m dydžio, pro kurias matėsi ant betono pagrindo pakloti mediniai gulekšniai.

Atlikus senųjų lentinių grindų, juodgrindžių ir gulekšnių ardymo darbus, išanalizavus paslėptas konstrukcijas, paaiškėjo reali situacija:


- mūrinių stulpelių, tinkamų naujų grindų tiesimui nėra;
- esama scenos perdangos konstrukcija – tarp laikančių metalo sijų įrengta monolitinio gelžbetonio plokštė;
- monolitinio gelžbetonio plokštės dalyje matomos ištrupėjusios angos, armatūros strypai neapsaugoti betono apsauginiu sluoksniu, vietomis matosi įtrūkiai.

Įrengiant naujas grindis būtina užtikrinti saugią scenos ir patalpų, esančių po scena, eksploataciją, todėl reikalinga suremontuoti esamą perdangą. Būtina atlikti papildomus darbus (toliau – Papildomi darbai), nenumatytus pirkimo dokumentuose ir sutartyje:

1. Esama scenos perdanga pilnai nuvaloma iki laikančių konstrukcijų, t.y. metalo sijų ir monolitinio gelžbetonio perdangos. Suaižęję betono gabalai pašalinami.
2. Kas 30 cm šachmatiškai išdėstyti 8 mm diametro ir 80 mm ilgio armatūros strypus (ankerius), juos įtvirtinti į išgręžtas 60 mm gylio ir 10 mm diametro kiaurymes chemine mase.
3. Susidaręs dulkių sluoksnis pašalinamas, esamos perdangos paviršius nugruntuojamas.
4. Ant armatūros strypų pritvirtinti 6 mm diametro tinklą, kurio akučių dydis 200 x 200 mm.

5. Ant viršaus pakloti 12 mm diametro tinklą, kurio akučių dydis 200 x 200 mm.
6. Remonto metu atlikti sąramų ir klojinių paramstymą ties perdangos skylėmis.
7. Įrengti cementinio skiedinio grindų išlyginamąjį sluoksnį, kurio bendras storis būtų 100 mm. suformuojant 1 laipsnio nuolydį į žiūrovų salės pusę, reikalingą medinių grindų klojimui.

Esamos situacijos foto fiksacija:

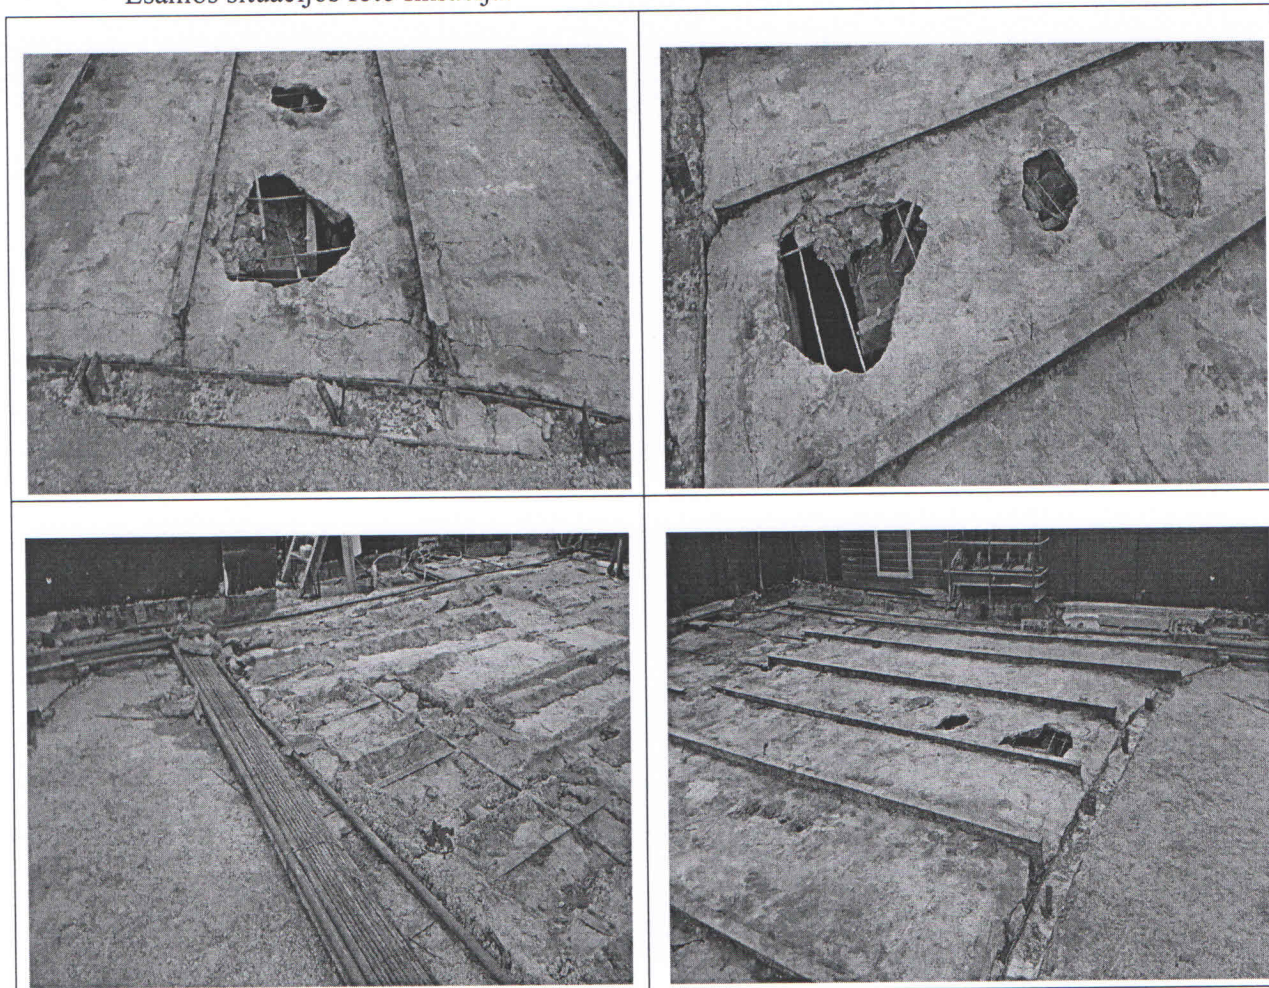

Atsižvelgiant į tai, kad būtina atlikti Papildomus darbus, kurie nėra numatyti Sutartyje, reikalinga pakeisti Sutartį, iš rangovo įsigyjant Papildomus darbus.

Šis Sutarties pakeitimas yra galimas atlikti vadovaujantis:

- 1) VPĮ 89 str. 2 d., kuriame nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:
 - a. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje (šiuo atveju – bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 195 644,43 Eur be PVM + 13 335,54 Eur be PVM = 208 979,97 Eur be PVM), t. y. neviršija tarptautinės prekių pirkimo vertės – 221 000 Eur be PVM);
 - b. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų prekių pirkimo atveju (šiuo atveju – bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 208 979,97 Eur be PVM, t. y. 6,07 % pradinės Sutarties vertės);
 - c. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

2) VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., kuriame nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:

- a. protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo šių aplinkybių (itin prasta grindų pagrindo (kuris yra paslėptas) būklė) numatyti;
- b. pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- c. šio pakeitimo vertė sudaro 16 136,00 Eur su PVM ir neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

Papildomiems darbams atlikti yra būtinas ne mažesnis kaip 15 darbo dienų terminas. Todėl būtina pakoreguoti Sutarties galiojimo trukmę, suteikiant tiekėjui laiką atlikti Papildomus darbus per ne ilgiau kaip 15 darbo dienų.

NUTARTA. Inicijuoti Sutarties pakeitimą, įsigyjant Papildomus darbus už 16 136,00 Eur su PVM.

2 klausimas. Dėl sutarties vykdymo sustabdymo.

Sutartyje nustatytas jos vykdymo terminas – 12 mėn. 26 d. (įskaitant SUTARTYJE numatytą atsiskaitymo terminą), t. y. Tiekėjas turi baigti vykdyti Sutartį gruodžio 15 d.

Vykdant Sutartį, paaiškėjo, kad Užsakovui yra būtinos Tiekėjui perduotos teatro patalpos veiklai vykdyti – t. y. būtina nuo 2019-11-29 pradėti repeticinį laikotarpį prieš 2019 m. gruodžio viduryje suplanuotą premjerą ir toliau vykdyti repertuarinę veiklą.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas nebegali suteikti Tiekėjui Sutartyje nurodyto laiko Sutarties tinkamam įvykdymui, be to Tiekėjas turi atlikti papildomus grindų remonto darbus (kurie detalizuoti šio protokolo 1 klausime), būtina sustabdyti Sutarties vykdymą ir jį nukelti (t. y. pabaigti vykdyti Sutartį) po Teatro repertuarinio sezono pabaigos (nuo 2020-06-01).

Pagal Sutartį, Tiekėjas įsipareigojo atlikti Teatro scenos konstrukcijų projektavimo ir atnaujinimo darbus, su mechanizacijos, garso ir meninio apšvietimo sistemų ir kt. reikalingos įrangos įsigijimu ir montavimu. Tiekėjas negali vykdyti šių savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei Užsakovas nesuteikia Tiekėjui Teatro patalpų, kuriose perkamos prekės ir darbai turi būti įrengti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.46 str. 2 d., skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą. Šiuo atveju, Teatras nebegali vykdyti savo pareigos suteikti Tiekėjui patalpų, kuriose Tiekėjas turi įrengti perkamą įrangą ir atlikti Papildomus darbus, todėl Tiekėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą vadovaujantis CK 6.46 str. 2 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad sustabdant Sutarties vykdymą, Tiekėjui nėra suteikiama daugiau laiko vykdyti Sutarčiai, t. y. Tiekėjas Sutartį gali vykdyti tą patį laiko tarpą, koks buvo numatytas Sutartyje, tik su pertrūkiu (kuris atsiranda ir yra daromas Užsakovo iniciatyva). Todėl toks Sutarties vykdymo sustabdymas gali būti atliekamas kaip neesminis Sutarties pakeitimas, vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. ir 89 str. 4 d., nes:

- a. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
- b. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje (t. y. Tiekėjas neįgyja daugiau laiko Sutarties vykdymui);
- c. dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis;
- d. tiekėjo, su kuriuo sudaryta Sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas.

Šis Sutarties pakeitimas (dėl sutarties vykdymo sustabdymo) taip pat yra galimas atlikti vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d. nustatytu pagrindu, nes:

a. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje (šiuo atveju – bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 195 644,43 Eur be PVM + 13 335,54 Eur be PVM = 208 979,97 Eur be PVM), t. y. neviršija tarptautinės prekių pirkimo vertės – 221 000 Eur be PVM);

b. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų prekių pirkimo atveju (šiuo atveju – bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 208 979,97 Eur be PVM, t. y. 6,07 % pradinės Sutarties vertės);

c. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

Šis Sutarties pakeitimas (dėl sutarties vykdymo sustabdymo) taip pat yra galimas atlikti vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nustatytu pagrindu, nes:

a. protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo šių aplinkybių (itin prasta grindų pagrindo (kuris yra paslėptas) būklė) numatyti. Kartu Teatras negalėjo numatyti, kad šioms darbams atlikti bus reikalingas papildomas laiko terminas, dėl kurio Sutarties vykdymą būtina pratęsti bent 10 darbo dienų, o Teatras objektyviai privalo pradėti savo suplanuotą repertuarinę veiklą 2019 m. gruodžio mėn. ir negali suteikti Tiekėjui Teatro patalpų Sutarties vykdymo užbaigimui iki 2020 m. sausio 3 d.;

b. pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio;

c. šis pakeitimas (dėl Sutarties vykdymo sustabdymo) neturi piniginės vertės, todėl ir neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

NUTARTA.

1. Sustabdyti sutarties vykdymą nuo 2019-11-29;
2. Sutarties vykdymą pratęsti pasibaigus Teatro repertuariniam sezonui ir Sutarties vykdymo sustabdymui – nuo 2020-06-01;
3. Pratęsus Sutarties vykdymą, nustatyti Tiekėjui tokį patį terminą Sutarties vykdymui pabaigti, koks buvo likęs pagal vykdytą Sutartį (t. y. likęs Sutarties vykdymui terminas yra 16 dienų – 2019-11-29 – 2019-12-15);
4. Prie Sutarties vykdymo termino pridėti 15 darbo dienų terminą Papildomiems darbams atlikti;
5. Parengti susitarimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo ir Papildomų darbų įsigijimo.

PRIEDAI:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata.

Pasitarimo pirmininkas:

Rimantas Lekavičius

Pasitarimo sekretorius:

Stasys Kriščiūnas

Tiekėjų atstovai:

Česlovas Čepkauskas

1	1	1	i8	i1
1	1	1		
1				

Val. darbo užmokestis 6,00 €
Lito kursas 1,00 Lt 0,2896

Kauno valstybinis muzikinis teatras
Scenos grindų remontas
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.
Iš viso už

16.136,00 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	N15P-0209-2	100 m2		42,06	2,82	118,61	57,12	61,42	0,07
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	2,6	7,790	7,332	57,12	57,12		0,07
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,52	0,141	0,07			
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	11	1,98	31,02	61,42		61,42	
2	10 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 60 mm	R23-169	100 vnt.		55,89	7,5	419,19	398,52	0,00	20,67
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	7,2	7,380	54	398,52	398,52		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,3	0,52	39,75	20,67			20,67
3	Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg	N6-200	t		3.770,70	0,0237	89,37	36,02	53,09	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	182	8,350	4,3134	36,02	36,02		
	Kranas	489131	maš. val.	0,4	27,26	0,00948	0,26			0,26
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,008	956,16	0,00019	0,18		0,18	
	Įdėtinės plieninės detalės	520049	t	1	2232,45	0,0237	52,91		52,91	
4	Armatūros strypų pastatymas	N9-6	100 vnt.		151,13	7,5	1133,45	1133,45	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm. val.	19,4	7,790	145,5	1133,45	1133,45		
5	Armatūros strypai	N9-6p	100 vnt.		5,90	7,5	44,25	0,00	44,25	0,00
	Armatūros strypai	1901RPM	vnt.	100	0,059	750	44,25		44,25	
6	Greito kietėjimo skiedinys remontui, ankeravimui, darbui iki -20°C Emaco T545	C1-364-7	kg		114,00	3,75	427,50	0,00	427,50	0,00
	Greito kietėjimo skiedinys remontui, ankeravimui, darbui iki -20°C Emaco T545	364_7	kg	1	114,000	3,75	427,5		427,5	
7	Betoninių grindų armavimas tinklais	N11P-1508-2	t		1.127,75	3,94	4443,35	348,93	4051,46	42,96
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12	7,380	47,28	348,93	348,93		
	Kranas	489131	maš. val.	0,4	27,26	1,576	42,96			42,96
	Armatūrinis tinklas	93389	t	1	1026,85	3,94	4045,79		4045,79	
	Plieninė viela	120341	kg	1,5	0,96	5,91	5,67		5,67	
	Fiksatoriai armatūros tinklams	572318	vnt.	600		2364				
8	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / siurbliu)	N11P-0401-1	100 m2		471,16	2,82	1328,68	401,31	699,20	228,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	19	7,490	53,58	401,31	401,31		
	Skiedinio siurblys	489091	maš. val.	2,6	22,41	7,332	164,31			164,31
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	7,4	3,06	20,868	63,86			63,86
	Cementinis skiedinys	600004	m3	4,08	60,77	11,5056	699,2		699,2	
9	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti / siurbliu	N11P-0401-3 (K1=12 K2=12 K3=12)	100 m2		515,50	2,82	1453,72	177,42	1048,79	227,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	8,4	7,490	23,688	177,42	177,42		
	Skiedinio siurblys	489091	maš. val.	3,6	22,41	10,152	227,51			227,51
	Cementinis skiedinys	600004	m3	6,12	60,77	17,2584	1048,79		1048,79	
10	Lentų klojiniai perdangos išlyginamojo sluoksnio įrengimui ties angomis ir įtrūkimais ir sąramų atrėmimui	N6-194-1	100 m2		1.168,66	0,85	993,36	655,53	337,83	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	99	7,790	84,15	655,53	655,53		
	Vinys statybinės	120030	kg	17	1,17	14,45	16,91		16,91	
	Specialus tepalas klojiniams	230451	l	4	4,51	3,4	15,33		15,33	
	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	534009	m3	0,55	99,14	0,4675	46,35		46,35	
	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	534013	m3	1,4	217,85	1,19	259,24		259,24	
Iš viso #1							10.451,48 €	3208,30	6723,54	519,64

[Signature]

[Signature]

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
							256,66 €	8,0%		
							201,71 €		3,0%	
							15,59 €			3,0%
							62,02 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						10.987,46 €	3526,98	6925,25	535,23
							988,87 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						11.976,33 €	3844,41	7548,52	583,40
								1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						11.976,33 €	3844,41	7548,52	583,40
							724,18 €	20,90%		
							635,03 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						13.335,54 €	4797,02	7925,95	612,57
							2.800,46 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						16.136,00 €	5804,39	9590,40	741,21

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Stasys Kriščiūnas
