

Keitimo siūlymas Nr. 2 Evakuacijos tiltelis

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 06 09 d.

Kam: Užsakovui


Tema: Objektas Nr. 01, Mokomasis korpusas: Tiltelio evakuacijai keitimas.

Situacijos aprašymas:


Tam, kad evakuācijas tiltelio išėjimas nekirstu sklypo ribos, koreguojasi jo išėjimo planas.

Pasiūlymas:

Pakeisti evakuacijos tiltelio formą, užsukant ties atramine sienute link 3 ašies.

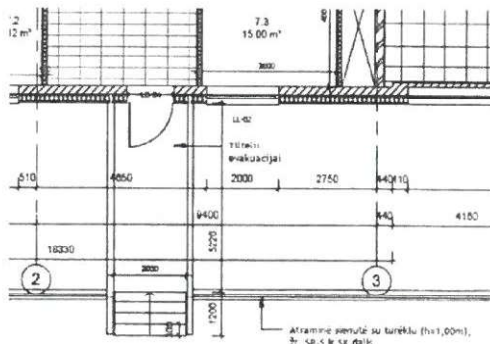

TP planas:

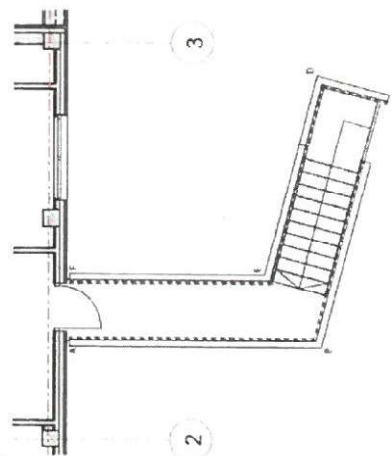


DP siūlomas planas:

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:
Yra (pagal pridedamas samatas)

Įtaka sutarties termino pokyčiui:
Nėra

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Techninės priežiūros atstovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui.

Susiję dokumentai: Priedas Nr. 1 Nevykdomų ir vykdomų darbų sąmata – 1 lapas; Priedas Nr. 2 Tiltelio konstrukciniai ir architektūriniai sprendiniai – 3 lapai;			
Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas			
Rangovo atstovas:  Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas		Projekto valdymo grupės žyma („Pritariam“ arba „Nepritariam“) V.Pavardė ir parašas: 	
Keitimo siūlymo iniciatorius:  Rangovas		Data	
SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIEŠTARAUJAME:			Įrašas apie DP korektūros atlikimą (būtiną/nebūtiną):
Darbo projekto PV Nerijus Pocijus Data	PVP vadovas Simas Remeika Data 2022-08-		
Techninės priežiūros atsakingas atstovas:			
Data			
UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:			
Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas			
Data:			
Techninio projekto dalies nauja laida: <u>reikalinga/nereikalinga</u> (pabraukti)			
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: <u>reikalinga/nereikalinga</u> (pabraukti)			
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas <u>reikalingas/nereikalingas</u> (pabraukti)			
Keitimo nurodymas suderintas:			
PVP vadovas Simas Remeika:			
Data:			
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):			
Data:			
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:			
Perduota vykdymui: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas		Priimta vykdymui: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas	
Data:		Data:	
UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:			
Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas			
Data			
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:			
Perduota vykdymui: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas		Priimta vykdymui: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas	
Data:		Data:	

Projekto pavadinimas: „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai“.

Sutartis Nr. 10.13-375

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo siūlymo Nr.

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.1.	Lauko laiptų įrengimo darbai				
1.1.1.3	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	0,2300	10 320,99	2 373,83
1.1.1.4	Metalinio karkaso įrengimas	100m ²	0,2300	2 762,07	635,28
1.1.1.5	Turėklų sienelės aptaisymas keraminėmis (akmens masės) plokštėmis	m ²	23,0000	113,43	2 608,89
1.1.1.6	Montavimo metalinių omega profilių montavimas *26 m ²	100m	0,5200	707,46	367,88
1.1.1.7	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais	100m ²	0,2600	1 962,15	510,16
1.1.1.8	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas	100m	0,012	12 068,19	144,82
1.2.	Statinio konstrukcijos				
1.2.10.	I a. metalinės sijos ir Delta sijos				
1.2.10.4	Laiptų aikštelės grotelių montavimas	m ²	12,8200	104,02	1 333,54
1.2.10.5	Metalinų laiptasijų montavimas (lauko)	t	0,6331	2 285,36	1 446,95
1.2.10.6	Smulkių plieninių konstrukcijų montavimas (plokštelės laiptasijoms)	t	0,0076	2 439,14	18,44
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					9 439,79
Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.1.	Lauko laiptų įrengimo darbai				
1.2.10.5	Metalinų laiptasijų montavimas (lauko)	t	1,7740	2 285,36	4 054,23
1.2.10.4	Laiptų aikštelės grotelių montavimas	m ²	14,4400	104,02	1 502,05
1.1.1.8	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas	100m	0,230	12 068,19	2 775,68
1.1.1.4	Metalinio karkaso įrengimas	100m ²	0,3115	2 762,07	860,38
1.1.1.5	Turėklų sienelės aptaisymas keraminėmis (akmens masės) plokštėmis	m ²	31,1500	113,43	3 533,34
1.1.4.14	Turėklų dengimas skardos lankstiniais	100m ²	0,0700	2 126,14	148,83
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					12 874,51
BENDRA SUMA (be PVM)					3 434,72
PVM:					721,29
VISO SU PVM:					4 156,01

Sudarė:

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VI „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta samatoje.
