

## SUSITARIMAS Nr. 2

DĖL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbus*“, PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo 1 d.  
Klaipėda

UAB IVRO (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus [redacted]  
veikiančio pagal 2023-01-02 įgaliojimą Nr. IVRO 23/01-02-02,  
ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama  
direktorės [redacted] veikiančios pagal bendrovės įstatus,  
toliau kartu šiame Susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –  
„Šalimi“,

### ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2023-05-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (toliau – Sutartis),
- Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 1.2 punktu, 2023-06-20 raštu Nr. IVRO 23/06-20-01 (pridedama) informavo Užsakovą dėl poreikio vykdyti papildomus darbus bei atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų,

### VADOVAUDAMOSIS:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis (toliau – VPĮ), Sutarties Specialiosios dalies 1.2 p. bei Sutarties Bendrosios dalies 4.5 p. nuostatomis,

### ŠALYS SUSITARIA DĖL SUTARTIES ŠALYGŲ PAKEITIMO:

1. Šalys atsisako Sutartyje numatytų dalies darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, kurių vertė yra 1 403,90 Eur be PVM.
2. Šalys susitaria dėl reikalingų vykdyti papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, kurių vertė yra 13 215,30 Eur be PVM.
3. Bendras atsisakomų ir papildomų darbų vertės pokytis yra 14 619,20 Eur be PVM, kas sudaro 0,87 % pradinės Sutarties vertės (1 677 423,89 Eur be PVM) ir neviršija VPĮ nustatytos 15 %

dydžio ribos. Pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

4. Sutarties pobūdis iš esmės nesikeičia, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

5. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus, nurodytus prie šio Susitarimo pridedamame 2 priede.

6. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.

7. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

9. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

### SUSITARIMO PRIEDAI

1. UAB „IVRO“ 2023-06-20 raštas Nr. IVRO 23/06-20-01, 2 lapai.

2. Atsisakomų ir papildomų darbų suvestinė (lokalinė sąmata), 2 lapai.

3. UAB „Medstatyba“ 2023-08-21 raštas Nr. 136 „Dėl gręžtinių monolitinių gelžbetoninių pamatų įrengimo“.

4. Išrašas iš darbo projekto konstrukcinės dalies nulinės laidos, 3 lapai.

5. APVA patvirtinta pakeitimo nurodymo finansinės dalies forma, excel.

### ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

**Užsakovas:**

**UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras**

Adresas korespondencijai:

Liepų g. 15, Klaipėda

Juridinio asmens kodas 163743744

PVM mok. kodas LT637437415

Tel. 8 (46)

El. paštas:

A. s. Nr. L

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100

**Rangovas:**

**UAB IVRO**

Adresas korespondencijai:

Šilutės pl. 103 – 219, Klaipėda

Juridinio asmens kodas 140216537

PVM mok. kodas: LT402165314

Tel.: +370

El. paštas:

A. s. Nr. L

Bankas AB „SWEDBANK, banko kodas 73000

Direktorė

Komercijos direktorius,

**DAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“**

Įmonės adresas: Turgaus a.2, Klaipėda. Buveinės adresas: Šilutės pl.103-219, Klaipėda  
Įm. kodas 140216537. PVM kodas LT402165314. Tel. +370 46 344659; el. paštas info@ivro.lt

**UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras**

2023-06-20 Nr. IVRO 23/06-20-01

Siunčiama el. paštu: [redacted]

Originalas nebus siunčiamas paštu

**DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ REIKALINGUMO PAGAL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTĮ NR. 23-101-AS**

2023-05-19 tarp UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas) ir UAB „IVRO“ (toliau – Rangovas) buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 23-101-AS (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbus (toliau -Darbai).

Sutarties specialiosios sąlygose (toliau – SP) 1.2 p. nurodyta, kad jeigu Rangovas, pradėjęs vykdyti Darbus, nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą raštu.

2023-06-15 Rangovas iš Užsakovo gavo Statinio konstrukcijos darbo projektą (toliau – SK-DP). Susipažinus su SK-DP tapo aišku, kad yra pasikeitę sprendiniai nei buvo pateikti Techniniame projekte (toliau – TP) prieš Sutarties pasirašymą.

SK-DP nurodyta, kad reikalinga: poliai GP-1, D – 400 mm – 61 vnt. (46 m<sup>3</sup>), poliai GP-2, D - 250 mm – 17 vnt. (12,8 m<sup>3</sup>), poliai GP-3, D-300mm – 18 vnt. (2,5 m<sup>3</sup>). **Viso pagal SK-DP polių yra: 96 vnt. (61,3m<sup>3</sup>; armatūra 3964,56kg ).** Kai tuo tarpu TP buvo nurodyta: poliai GP-1, D- 400mm – 56 vnt. (38,7 m<sup>3</sup>), poliai GP-2, D-250mm – 22 vnt. (2,4 m<sup>3</sup>). **Viso pagal TP polių yra: 78 vnt. (41,1m<sup>3</sup>; armatūra 2935 kg.). DP polių 18 vnt. ir armatūros 1029,56 kg daugiau nei buvo nurodyta TP. Taip pat TP nebuvo nurodyta polių vientisumo ir statinis apkrovos bandymai, kai tuo tarpu SK-DP tie bandymai atsirado.**

Sutarties bendrosiose sąlygose (toliau – BD) 4.5 p. nurodyta, kad darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t. y. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą.

Vadovaujantis išdėstytu bei remiantis SP 1.2 p. BD 4.5 p., Rangovas informuoja apie būtina papildomų darbų atlikimą, todėl prašo Užsakovo įvertinti papildomų darbų reikalingumą per 5 darbo dienas, kadangi Rangovas negali vykdyti Sutarties pagal prisiimtus įsipareigojimus.

PRIDEDAMA

1. Papildomų darbų sąmatą.

Komercijos direktorius



UAB"IVRO"

Reg. adresas

Buveinė

Įmonės kodas 140216537

PVM kodas LT402165314

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

**Statinių grupė** 230405 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

**Statins** 2 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Papildomi darbai pagal DP

**Žiniaraštis** 3 Statinio konstrukcijų darbai

2023.06.20

Suma žiniaraščiui

23975.36 EUR

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                               |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |

**1 Poliai**

|            |  |                                                     |        |      |         |          |
|------------|--|-----------------------------------------------------|--------|------|---------|----------|
| 1 F5-2     |  | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (18vnt.) | m3     | 20,2 | 583,96  | 11795,98 |
| 2 88003001 |  | Statinės apkrovos bandymas                          | kompl. | 1,0  | 6337,1  | 6337,1   |
| 3 88003002 |  | Polių vientiesumo bandymas                          | kompl. | 1,0  | 1681,27 | 1681,27  |
|            |  | <b>Skyriuje 1</b>                                   |        |      |         | 19814,35 |
|            |  | <b>Žiniaraštyje 3</b>                               |        |      |         | 19814,35 |
|            |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                   |        |      |         | 4161,01  |
|            |  | <b>Iš viso žiniaraštyje 3</b>                       |        |      |         | 23975,36 |

Sudarė :

/Pa



UAB"IVRO"

Reg. adr

Buvėnė

Įmonės kodas 140216537

PVM kodas LT402165314

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230405 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statiny 2 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Papildomi darbai pagal DP

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijų darbai

2023.06.20

Suma žiniaraščiui -1698,72 EUR

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                        | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |           |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|              |                |                                                      |             |        | Vieneto kaina | Iš viso   |
| 2 Poliai GP2 |                |                                                      |             |        |               |           |
| 2 F5-3       |                | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (22 vnt.) | m3          | - 2,4  | 584,96        | - 1403,9  |
|              |                | Skyriuje 2                                           |             |        |               | - 1403,9  |
|              |                | Žiniaraštyje 3                                       |             |        |               | - 1403,9  |
|              |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                    |             |        |               | - 294,82  |
|              |                | Iš viso žiniaraštyje 3                               |             |        |               | - 1698,72 |

Sudarė:

/Pavardė/

UAB"IVRO"

Reg. adre

Buveinė:

Įmonės kodas 140216537

PVM kodas LT402165314

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230405 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 2 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Papildomi darbai pagal DP

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijų darbai

2023.06.20

Suma žiniaraščiui 15990,51 EUR

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                        | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|              |                |                                                      |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 1 Poliai GP1 |                |                                                      |             |        |               |          |
| 1 F5-2       |                | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (5 vnt.)  | m3          | 7,3    | 583,96        | 4262,91  |
|              |                | Skyriuje 1                                           |             |        |               | 4262,91  |
| 2 Poliai GP2 |                |                                                      |             |        |               |          |
| 2 F5-3       |                | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (17 vnt.) | m3          | 12,8   | 584,96        | 7487,49  |
|              |                | Skyriuje 2                                           |             |        |               | 7487,49  |
| 3 Poliai GP3 |                |                                                      |             |        |               |          |
| 3 F5-4       |                | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai (18 vnt.) | m3          | 2,5    | 585,96        | 1464,9   |
|              |                | Skyriuje 3                                           |             |        |               | 1464,9   |
|              |                | Žiniaraštyje 3                                       |             |        |               | 13215,3  |
|              |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                    |             |        |               | 2775,21  |
|              |                | Iš viso žiniaraštyje 3                               |             |        |               | 15990,51 |

Sudarė:

/Pavardė



Medstatyba

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDSTATYBA“

UAB „Medstatyba“, [redacted]

el. [redacted]

el. paštas: [redacted] įmonės kodas 122603589, PVM mokėtojo kodas 226035811.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2023-08-21 Nr. 136

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“

El. paštu: [redacted]


## DĖL GRĘŽTINIŲ MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMO

Atsakydami į UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ (toliau – Užsakovas) 2023-07-03 raštą Nr. (1.10.)-2R-259 paaiškiname, kad UAB „Medstatyba“ rengdama „*Kitos paskirties – maisto mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav., statyba*“ darbo projekto konstrukcijų dalį, patikslino statinio laikančiųjų konstrukcijų schemas ir apkrovas, kaip nurodyta minėto objekto techninio projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų TS-1 7 punkte ([22-19]-TP-SK-TS-1 5 lapas). Be to, minėto techninio projekto konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad šiame projekte pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai, o visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų įrenginių eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomai vykdomi, nepriklausomai nuo to, ar šie darbai (ne)nurodyti projekto brėžiniuose ir žiniaraščiuose.


Patvirtiname, pagal UAB „Medstatyba“ parengtus ir ekspertuotus darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius rangovas privalo įrengti 96 vnt. gręžtinius pamatus (polius) (GP-1, D-400 mm – 61 vnt., GP-2, D-400 mm – 17 vnt., GP-3, D-300 mm – 18 vnt.), įrengimo darbams naudoti betoną, kurio klasė C25/30-XC2 (preliminarus kiekis apie 61,3 m³) ir armatūrą S500 (preliminarus kiekis – 3.964,56 kg).

Pagarbiai,


Direktorius



Gręžinis pamatas GP-1

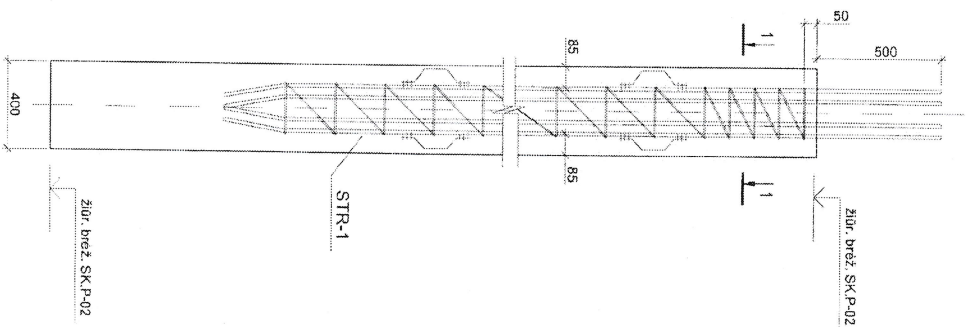


Armūros strypynas STR-1

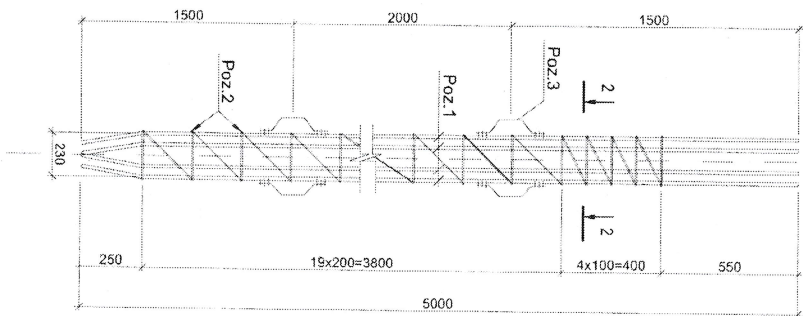


| Poz. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo               | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Papildomi duomenys |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|
|          | Gręžinio pamatas GP-1                     |                     | vnt.      | 61          | 46,0 m³            |
|          | Armūros strypynas STR-1                   |                     | vnt.      | 61          | 3203,11 kg         |
|          | Betono klasė C25/30-XC2                   | LST EN 206 - 1:2014 | m³/vnt    |             |                    |
| 1        | Armūros strypynas STR-1                   |                     | vnt.      | 1           | 31,81 kg           |
| 2        | Ø16 S500, L=5000 mm                       | LST EN 10080:2006   | vnt.      | 6           | 47,34 kg           |
| 3        | Ø6 S500, L=19000 mm                       | LST EN 10080:2006   | vnt.      | 1           | 4,22 kg            |
|          | Ø8 S500, L=400 mm                         | LST EN 10080:2006   | vnt.      | 6           | 0,95 kg            |


Pjūvis 1-1



Pjūvis 2-2



Poz. 3




Pastabos:

1. Skersinė armatūra galima vyrioti spirale apie darbinę (išilginę) brėžinyje nurodytu žingsniu.
2. Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio-projektinės padėties užtikrinimui naudoti kreipklus, kurie tvirtinami prie pačios armatūros. Kreipkliai apie strypyną išdėstyti simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje.
3. Armatūros strypai į erdvinį karkasą jungiami lydzioju elektrodu aktyvioje dalyje (pusautomatiu) pagal LST EN ISO 17660-1:2011 reikalavimus.
4. Gręžinis pamatas įrengiamas išsiskirio gręžimo būdu, betoną paduodant per tuščiaidurį grąžto stiebą.


|                      |                                                  |                                                                   |                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0                    | 2023.04.24                                       | STATYBOMS                                                         | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS, JEI TA KOKIA |
| LAIDA                | ISI EIDIMO DATA                                  | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS, JEI TA KOKIA                 | STATYBOMS                                         |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | Mediastatba                                      | UAB "MEDISTATBA" Alerio k. 10, 01101 Vilnius Tel. +370 6 817 8178 | STATYBOMS                                         |
| 1072                 | PV                                               | V. STUKAS                                                         | STATYBOMS                                         |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | konstravimas                                     | MB "Pamalia" Alerio k. 10, 01101 Vilnius Tel. +370 6 817 8178     | STATYBOMS                                         |
| 25777                | PDV                                              | K. RINKUS                                                         | STATYBOMS                                         |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | KONSTRUKT.                                       | V. DAUKŠA                                                         | STATYBOMS                                         |
| 36358                | STATYTOJAS IR JARBAI UŽSAKOJAS                   | UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"                  | STATYBOMS                                         |
| LT                   | UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" | STATYBOMS                                                         | STATYBOMS                                         |




# Gręžinis pamatas GP-2

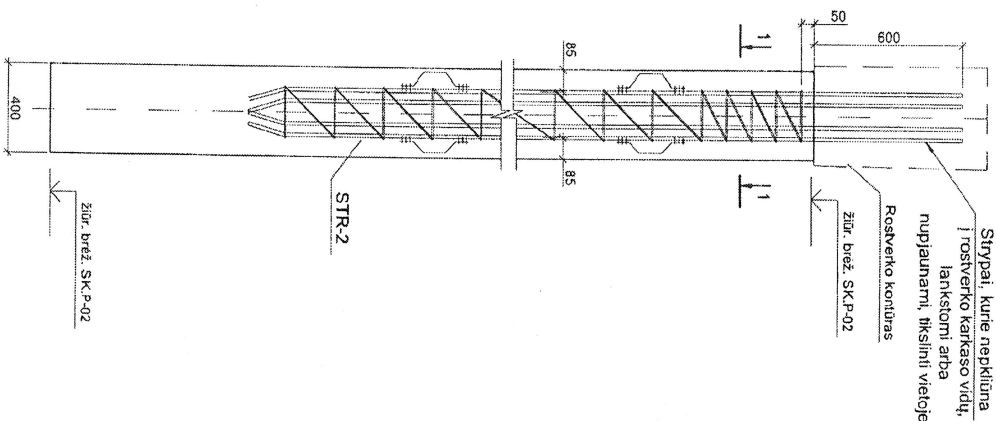

# Armatuso strypynas STR-2

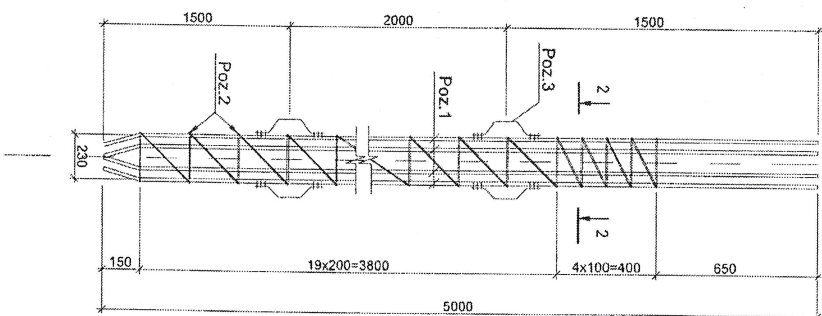


| Poz. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo             | Mato vnt. | Kiekis duomenys | Papildomi duomenys |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|
|          | Gręžinis pamatas GP-2                     |                   | vnt.      | 17              | 12,8 m³            |
|          | Armatuso strypynas STR-2                  |                   | vnt.      | 17              | 540,77 kg          |
|          | Armatuso strypynas STR-2                  |                   | m³/vnt    |                 |                    |
|          | Armatuso strypynas STR-2                  |                   | vnt.      | 1               | 3,181 kg           |
| 1        | Ø16 S500, L=5000 mm                       | LST EN 10080/2006 | vnt.      | 6               | 47,34 kg           |
| 2        | Ø6 S500, L=19000 mm                       | LST EN 10080/2006 | vnt.      | 1               | 4,22 kg            |
| 3        | Ø8 S500, L=400 mm                         | LST EN 10080/2006 | vnt.      | 6               | 0,95 kg            |

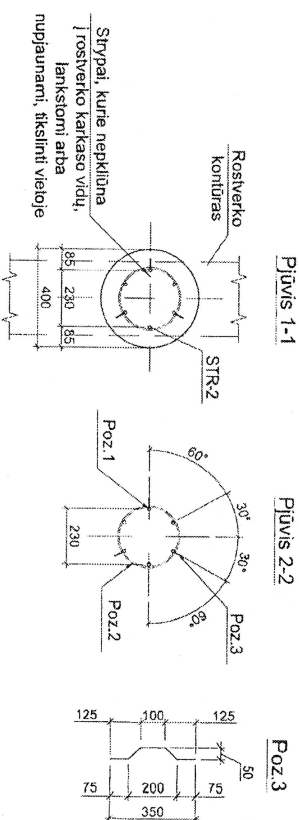


1. Skersinė armatūra galima vnyti spirale apie darbinę (išilginę) bręžinyje nurodytu žingsniu.
2. Armatuso strypyną apsauginio sluoksnio-projektines padėtis užtikrinami naudoti kreipiklius, kurie tvirtinami prie paties armatuso. Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje.
3. Armatuso strypai į erdvinį karkasą jungiami lygiuotu elektrodu dirijose (pusautomatu) pagal LST EN ISO 17660-1:2011 reikalavimus.
4. Gręžinis pamatas įrengiamas išsinio strągino gręžimo būdu, betoną paduodanti per tūščiavidurį grąžio stiebą.

|                     |                                                  |                                                      |                                                        |                                                        |           |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 0                   | 2023.04.24                                       | STATBŪNAS                                            | STATBŪNAS                                              | STATBŪNAS                                              | STATBŪNAS |
| LAIDA               | ISLEIDIMO DATA                                   | LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)     | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| KVAL. PATV. DOK.NR. | Mėšaišyba                                        | UAB "MEDSTATYBA" ATENES S. NI REKISTAS TEL: 87358800 | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| 1072                | PV                                               | V. STUKAS                                            | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| KVAL. PATV. DOK.NR. | PV                                               | K. RIMKUS                                            | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| 25777               | PV                                               | K. RIMKUS                                            | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| KVAL. PATV. DOK.NR. | PV                                               | K. RIMKUS                                            | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| 36568               | KONSTRUKT.                                       | V. DAUKŠA                                            | STATBŪNO PROJEKTO PAVADINIMAS                          | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |
| LT                  | UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" | DOKUMENTO ŽYMO                                       | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | STATBŪNO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA     |

# Gręžtinis pamatas GP-3

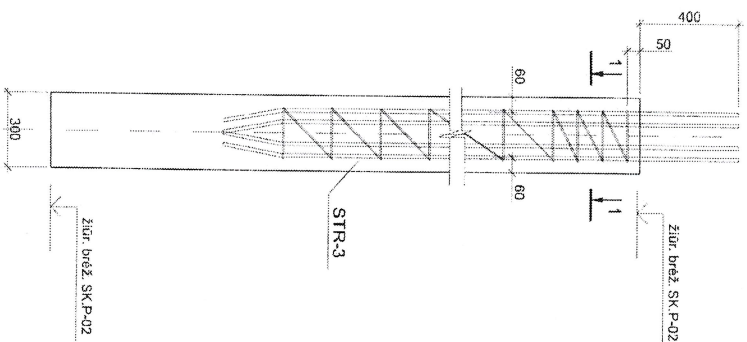


# Armaturų styrynas STR-3

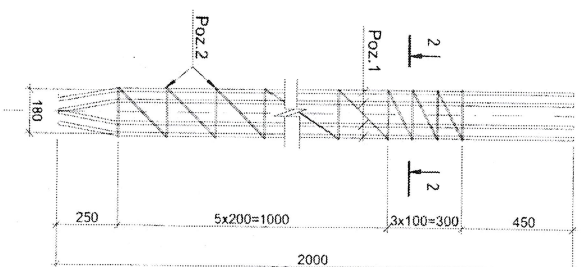


| Poz. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos    | Žymuo               | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------------------|
|          | Gręžinys pamalas GP-3                        |                     | vnt.      | 18     | 2,5 m³             |
|          | Armatus sriypas STR-3                        |                     | vnt.      | 18     | 220,68 kg          |
|          | Bejono klasė C20/25-XC2                      | LST EN 206 - 1:2014 | m³/vnt.   |        |                    |
| 1        | Armatus sriypas STR-3<br>Ø12 S500, L=2000 mm | LST EN 10080:2006   | vnt.      | 1      | 12,26 kg           |
| 2        | Ø6 S500, L=6000 mm                           | LST EN 10080:2006   | vnt.      | 6      | 10,66 kg           |
| 3        | Ø6 S500, L=200 mm                            | LST EN 10080:2005   | vnt.      | 1      | 1,33 kg            |
|          |                                              |                     |           | 6      | 0,27 kg            |

## Pjūvis 1-1



## Pjūvis 2-2



**Pastabos:**

1. Skersinę armatūrą galima vynioti spirale apie dešinę (iš šigsnę) brėžinyje nurodytu žingsniu.
2. Armatūros styryrupi apsauginio sluoksnio projeklinės padėties užtikrinimu naudoti trikampiai prie pabos armatūros. Keitpaliki apie styrypą išdėstomas simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje.
3. Armatūros styrypi ir tvirtinji karkasą jungiančių lydiuoliu elektrodu aktyviose dūjose (pusautomačių) pagal LST EN ISO 17660-1:2011 neįkaivavimus.
4. Gręždinis pamatas įengamas išsistino straišlinio gręžimo būdu, betona paduodanti per užščiavulius trąžio stieba

[illegible]



Sutarties pavadinimas:  
Sutarties Nr.:  
Užsakovas:  
Rangovas:

| Sutarės pakeitimo nurodymas Nr. 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------------|------------|---------|
| 8.24.2023                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Eil. Nr.                                                                                                                                              | Pozicijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mato vnt. | Pagal pradinę sutartį |                        |              |         | Pagal sutartį ir pakeitimus neįvertinus šio PN |              |           |        | Likutis pagal pateiktus aktus iki pakeitimo |        |           |                  | 2029682.91 |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Kiekis                | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur    | Kiekis  | Suma, Eur                                      | Kiekis       | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur                                   | Kiekis | Suma, Eur | Nevykdomi darbai |            |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           | Suma, Eur        | Kiekis     |         |
| 23-101-AS: Kitos pastildinės-maisto atliekų mechaninio apdoravimo pastato, Ketvergų g. 2, Dumplių k., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav. statybos darbai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Maisto atliekų mechaninio apdoravimo pastato statybos darbai                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| 1.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| 1.1.                                                                                                                                                  | Sklypo sutvarkymo, susieikimo darbai (SP)                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 100.00%               | 205,715.75             | 205,715.75   | 100.00% |                                                | 205,715.75   | 83.34%    |        | 171,449.96                                  |        |           | 0.00%            |            | 83.34%  |
| 1.2.                                                                                                                                                  | Statinio architektūros darbai (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 100.00%               | 196,173.43             | 196,173.43   | 100.00% |                                                | 196,173.43   | 100.00%   |        | 196,173.43                                  |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.3.                                                                                                                                                  | Statinio konstrukcijų darbai (SK)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 100.00%               | 784,192.96             | 784,192.96   | 100.00% |                                                | 784,192.96   | 97.47%    |        | 784,379.54                                  |        |           | 0.00%            | 1,403.90   | 97.29%  |
| 1.4.                                                                                                                                                  | Vandentiekio ir nuotekų darbai (VN)                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 100.00%               | 150,915.59             | 150,915.59   | 100.00% |                                                | 150,915.59   | 74.24%    |        | 112,037.73                                  |        |           | 0.00%            |            | 74.24%  |
| 1.5.                                                                                                                                                  | Sidymo, vėdinimo, oro kondicionavimo darbai (SVOK)                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 100.00%               | 174,743.44             | 174,743.44   | 100.00% |                                                | 174,743.44   | 100.00%   |        | 174,743.44                                  |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.6.                                                                                                                                                  | Elektronikos darbai (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 100.00%               | 72,764.71              | 72,764.71    | 100.00% |                                                | 72,764.71    | 100.00%   |        | 72,764.71                                   |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.7.                                                                                                                                                  | Elektroninių ryšių darbai (ER)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 100.00%               | 13,469.76              | 13,469.76    | 100.00% |                                                | 13,469.76    | 100.00%   |        | 13,469.76                                   |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.8.                                                                                                                                                  | Apsaugines signalizacijos darbai (AS)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 100.00%               | 18,055.65              | 18,055.65    | 100.00% |                                                | 18,055.65    | 100.00%   |        | 18,055.65                                   |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.9.                                                                                                                                                  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo darbai (GSS)                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 100.00%               | 9,902.45               | 9,902.45     | 100.00% |                                                | 9,902.45     | 100.00%   |        | 9,902.45                                    |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.10.                                                                                                                                                 | Gaisrinės saugos darbai (GS)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 100.00%               | 700.00                 | 700.00       | 100.00% |                                                | 700.00       | 100.00%   |        | 700.00                                      |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.11.                                                                                                                                                 | Procesų valdymo ir automatizacijos darbai (PVA)                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 100.00%               | 17,790.15              | 17,790.15    | 100.00% |                                                | 17,790.15    | 100.00%   |        | 17,790.15                                   |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
|                                                                                                                                                       | Dokumetu, nurodytą STR 1.05.01:2017 „Sąryšų leidžiančios dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir uždėjimas. Statybos sustabdomas. Savivaldos sąstybos patarinių šalinimas. Savivaldos sąstybos patarinių šalinimas ir būtinų statinio statybos užbaigimo procedūras parengimo išlaidos |           | 100.00%               | 25,000.00              | 25,000.00    | 100.00% |                                                | 25,000.00    | 100.00%   |        | 25,000.00                                   |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.13.                                                                                                                                                 | Statinių kadastinių maavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai), parengimo išlaidos                                                                                                                                                                                                   |           | 100.00%               | 2,800.00               | 2,800.00     | 100.00% |                                                | 2,800.00     | 100.00%   |        | 2,800.00                                    |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.14.                                                                                                                                                 | Zemės sklypo kadastinių maavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimo išlaidos                                                                                                                                                                                                                 |           | 100.00%               | 3,200.00               | 3,200.00     | 100.00% |                                                | 3,200.00     | 100.00%   |        | 3,200.00                                    |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
| 1.15.                                                                                                                                                 | Išlaidos, susijusios su statinio statybos užbaigimo procedūromis ir statinio registravimu Nekilnojamojo turto registre                                                                                                                                                                                             |           | 100.00%               | 2,000.00               | 2,000.00     | 100.00% |                                                | 2,000.00     | 100.00%   |        | 2,000.00                                    |        |           | 0.00%            |            | 100.00% |
|                                                                                                                                                       | Viso (Maisto atliekų mechaninio apdoravimo pastato statybos darbai) VISO DARBAMS                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       | 1,677,423.89           | 1,677,423.89 |         |                                                | 1,677,423.89 |           |        | 1,584,466.82                                |        |           | 0.00%            | 1,403.90   | 0.00%   |
|                                                                                                                                                       | Nevykdomi darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        | 1,584,466.82                                |        |           | 0.00%            | 1,403.90   |         |
| 2.                                                                                                                                                    | PAPILDOMI DARBAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |                        |              |         |                                                | 0.00         |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
|                                                                                                                                                       | Viso (PAPILDOMI DARBAI) VISO (be PVM)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       | 0.00                   | 1,677,423.89 |         |                                                | 1,677,423.89 |           |        | 1,677,423.89                                |        |           |                  | 1,403.90   | 0.00%   |
|                                                                                                                                                       | PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |                        | 352,259.02   |         |                                                | 352,259.02   |           |        | 352,259.02                                  |        |           |                  | 294.82     | 0.00%   |
|                                                                                                                                                       | VISO su PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       |                        | 2,029,682.91 |         |                                                | 2,029,682.91 |           |        | 2,029,682.91                                |        |           |                  | 1,898.72   | 0.00%   |
| Įvertinus šį PN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Suma, eurai be PVM                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Atliekamų darbų vertė iki šio PN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| 1,677,423.89                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Atliekamų darbų vertė įvertinus šį PN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| 1,689,235.29                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| Likutis nepanaudotų lėšų suma (su "u" ženklų)viršijanti lėšų suma (su "u" ir "z" ženklų)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |
| -11,811.40                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                        |              |         |                                                |              |           |        |                                             |        |           |                  |            |         |

(Parašas, Data)

**Rangovas:**

**UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"**

Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos darbai

Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos darbai

Galvojama, kad šios sąlygos gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų, nedinant esamos statybos darbų sutarties vertės;

- \*\* - keičiami darbai/ medžiagos - vieni darbai/ medžiagos yra keičiami kitais darbais/ medžiagomis
- \*\*\* - kadastriniai darbai - šie darbai atsiranda po kadastrinių matavimų. Jie gali didina sutarties pozicijų vertes, papildomi darbai atsiradę po kadastrinių matavimų gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų.



| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 163743744,<br>Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda<br>UAB Ivro 140216537                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Susitarimas Nr. 2 prie rangos darbų Sutarties Nr. 23-01-AS „Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai“                                                                                                                           |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-09-01 Nr. 23-186-AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | [redacted] Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-09-01 11:27:34 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-09-01 11:27:55 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | I [redacted] tovas, UAB Ivro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | I [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-09-01 15:16:42 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-09-01 15:17:08 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-01-28 20:14:07 – 2028-01-27 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, į.k.163743744 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-01 15:43:15)                                                                                                                                                                                          |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-09-01 15:43:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                             |
