

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024-03-08	Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE , ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS IR SKLYPO TVARKYMO DARBAI		
Sutarties data	2023-10-05	Sutarties Nr.	23-S1-635
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas	UAB „Lidora“ (302653348)		
Susitarimo pagrindas:	Šalys, atsižvelgdamos į šias aplinkybes bei Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatas: [pastaba. „BS“ Susitarime reiškia Sutarties Bendrąsias sąlygas, „SD“ – Sutarties Specialiąsias sąlygas] (a) Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (SD 7.4 p.). (b) Pradinės sutarties vertė (PSV) – 5.343.398,54 Eur be PVM. (c) Šalys, atsižvelgdamos į Statybos darbų vykdymo metu nustatytas Pastato konstrukcines savybes ir atitinkamą poreikį tikslinti (keisti) Užsakovo dokumentuose (Statinio projekte ir pan.) numatytus sprendinius ar jų įgyvendinimo būdus bei tikslinti atliktinų Darbų kiekius, taip pat į poreikį numatyti papildomas priemones, užtikrinančias tinkamas Pastato eksploatavimo ir jo naudotojo veiklos sąlygas, konstatavo būtinumą atlikti Darbų keitimus, atlikti Papildomus darbus (BS 1.1.19 p.) ir nevykdyti Atsisakomų darbų (BS 1.1.2 p.), kaip tai apibūdinta Susitarimo prieduose. Dėl susijusių su pakeitimais aspektų Šalių bei kitų statybos dalyvių atstovai pasirašė 2024-01-18 Pakeitimų aktą Nr. 1 (toliau – Aktas), kuriuo suderino konkrečias Darbų pozicijas bei jų kiekius. Susitarimas sudaromas nurodyto Akto pagrindu. Pagal šį Susitarimą atliekami Darbai, jų kainos (įkainiai) ir kiekiai apibendrinami pridedamame prie Akto Suvestiniame žiniaraštyje (toliau – Suvestinis žiniaraštis). Sutartis keičiama atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., BS 15.8 p. (įskaitant 1.1.2, 1.1.19, 5.6.5, 5.7.3 p.) ir 25 p. nuostatas. (d) Papildomų darbų suma – 79.732,41 Eur be PVM, Atsisakomų darbų suma – 18.826,79 Eur be PVM, Susitarimo (Pakeitimo) vertė (Papildomų darbų suma atėmus Atsisakomų darbų sumą) – 60.905,62 Eur be PVM. Darbų įkainiai, nurodyti Suvestiniame žiniaraštyje, nustatyti atsižvelgiant į BS 15.8.3.1 – 15.8.3.4 punktuose nurodytus kriterijus. (e) Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslas (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris tiekėjas.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: - Rangovas atliks Sutartyje numatytus Darbus, įvertindamas visus pokyčius (Darbų pozicijas, kiekius ir įkainius), nurodytus pridedamame Suvestiniame žiniaraštyje ir Akte. Užsakovas sumokės už Susitarime nurodytus Darbus pagal Suvestiniame žiniaraštyje nurodytus įkainius Sutarties nustatyta tvarka. - Rangovas kartu su Sutartyje numatytais Darbais atliks Papildomus darbus ir nevykdys Atsisakomų darbų, kaip tai nurodyta Akte ir Suvestiniame žiniaraštyje. Papildomų ir Atsisakomų darbų apibūdinimas, kiekiai ir kainos (įkainiai) nurodyti Suvestiniame žiniaraštyje ir Akte. Bendra Papildomų darbų suma – 79.732,41 Eur be PVM, Atsisakomų darbų suma – 18.826,79 Eur be PVM. Susitarimo (Pakeitimo) vertė (Papildomų darbų suma atėmus Atsisakomų darbų sumą) – 60.905,62 Eur be PVM. - Susitarime nurodyti Darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į Susitarime bei jo prieduose, Šalių pasirašytuose aktuose nurodytų duomenų visumą, kompleksiskumą ir sistemiskumą, taip pat į projektinės dokumentacijos bei teisės aktų reikalavimus. Rangovas patvirtina, kad jam yra		

	aiškos ir suprantamos Susitarime nurodytų Darbų atlikimo sąlygos, jų pobūdis bei apimtys (kiekiai).																				
	4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.																				
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina (galutinė Rangovui mokėtina suma) bus nustatyta atlikus faktiškai įvykdytų Darbų matavimus (BS 15.2.1 p.). Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po šio Susitarimo yra 5.404.304,16 EUR be PVM (5.343.398,54 + 60.905,62). Dėl šio Pakeitimo Pradinės sutarties vertė nekeičiama (VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktai). <table><tr><td></td><td>Suma be PVM, Eur</td><td>PVM, Eur</td><td>Suma su PVM, Eur</td></tr><tr><td>Pradinės sutarties vertė</td><td>5.343.398,54</td><td>1.122.113,69</td><td>6.465.512,23</td></tr><tr><td>Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo</td><td>5.343.398,54</td><td>1.122.113,69</td><td>6.465.512,23</td></tr><tr><td>Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo</td><td>5.404.304,16</td><td>1.134.903,87</td><td>6.539.208,03</td></tr><tr><td>Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)</td><td>5.343.398,54</td><td></td><td></td></tr></table>		Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pradinės sutarties vertė	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo	5.404.304,16	1.134.903,87	6.539.208,03	Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)	5.343.398,54		
	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur																		
Pradinės sutarties vertė	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23																		
Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23																		
Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo	5.404.304,16	1.134.903,87	6.539.208,03																		
Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)	5.343.398,54																				
Darbų terminai po Susitarimo	Galutinis terminas (SD 10.3 eil.) nekeičiamas																				
Susitarimo priedai:	1. Pakeitimų aktas Nr. 1, Suvestinis žiniaraštis ir kiti priedai.																				

Šalių atstovų parašai

Užsakovas: Valstybės įmonė Turto bankas Kęstučio g. 45, Vilnius Kodas 112021042 Finansų departamento direktorius, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Ernestas Česokas	Rangovas: UAB „Lidora“ Švitrigailos g. 7, Vilnius Kodas 302653348 Direktorius Linas Jakubauskas
--	---

OMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

2024-01-18

Projekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS IR SKLYPO TVARKYMO DARBAI

Užsakovas: VĮ Turto bankas projekto vadovas [redacted]

Projektuotojas: UAB „Projektai ir Co“ Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas [redacted]

Rangovas: UAB „Lidora“ statinio projekto vadovas [redacted]

Statybos techninės priežiūros vadovas: UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ [redacted]

VĮ Turto bankas atstovaujamas projekto vadovo Artūro Nestiuko ir Pirkimo laimėtojas UAB „Lidora“, atstovaujamas statinio projekto vadovo Mindaugo Nemanio, UAB „Projektai ir Co“ projektavimo Projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo Tomas Gudaičio ir UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ statinio statybos techninio prižiūrėtojo Andriaus Montvydo, pasirašydami šį aktą konstatuoja:

1. NŽT dokumentų utilizavimas

Patalpų nuomininko Nacionalinės žemės tarnybos prašymu buvo utilizuoti likę po kraustymo dokumentai. Papildomų darbų suma yra 3.000,00 eurų be PVM (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 2 – Dokumentų fotofiksacija.

2. Tentų gamyba ir jų pakabinimas

Užsakovo prašymu buvo pagaminti Turto banko reklaminiai tentai ir sukabinti ant tvorų. Papildomų darbų suma yra 2.424,40 eurų be PVM (Priedas Nr. 3 ir Priedas Nr. 4).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 4 – Fotofiksacija.

3. Dokumentų pervežimas

Pagal pirkimo dokumentuose nurodytą užduotį buvo nurodyta pervežti baldus, biuro techniką, pagal preliminarų baldų ir daiktų sąrašą. Kraustant atsirado poreikis pervežti ir pastato patalpų naudotojo dokumentus kurie sąraše nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 4.544,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 5)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 5 – Papildomų darbų sąmata;

4. Grindų plytelių išsaugojimas laiptinių holuose

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA buvo numatyta įrengti laiptinių holuose akmens masės plyteles, tačiau užsakovui įvertinus esamų plytelių būklę buvo nuspręsta esamas plyteles išsaugoti ir naujų neklijuoti 2;3;4;5;6 aukštuose. Rangovas paskaičiavo plytelių uždengimą Mpp plokšte, kad jos būtų išsaugomos statybų metų. Papildomų darbų sąmata

(įvertinus plytelių atstatymą demontuotų sienų vietose) yra 1.801,91 Eur be PVM, o nevykdomų darbų suma – 14.765,10 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 6).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 6 – Papildomų darbų sąmata.

5. Langai ir termoprofiliai

Pagal techninį darbo projektą Nr. 10838.01-01.TDP- SA, numatyta pakeisti langus. Rangovas išmatavęs esamas pastato langų angas rado neatitikimus. Angos yra didesnės nei suprojektuoti gaminiai. Padidėjo langų plotas PVC gaminių 15,5 m², EI60 priešgaisrinių langų 2,32 m². Rangovas įvertino pabrangimą ir papildomų darbų kainą yra 5.699,93 Eur be PVM.

Pagal techninį darbo projektą Nr. 10838.01-01.TDP- SK, brėžinius 10838.01-01.TDP-SK.B-20 ir 21 numatyta langus montuoti atitraukiant juos į išorinę (lauko) pusę, tačiau kaip numatyta mazge yra neįmanoma užsandarinti montavimo putomis. Buvo nuspręsta visur montuoti termoprofilus, kad tinkamai užsandarinti langus. Papildomų darbų sąmata yra 17 922.36 Eur be PVM, o nevykdomų darbų suma – 1.821,69 Eur be PVM (Priedas Nr. 7).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 7 - Papildomų darbų sąmata.

6. Saramų montavimas

Pagal techninį darbo projektą Nr. 10838.01-01.TDP- SK, numatyta įrengti metalines saramas, tačiau pirkimo darbų kiekių žiniaraštyje nebuvo numatytas reikiamas kiekis. Numatytų papildomų darbų suma 38.644,80 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 8).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 8 - papildomų darbų sąmata, saramos.

7. Grindų ant perdangos atstatymas

Pagal techninį darbo projektą Nr. 10838.01-01.TDP- SA, numatyta koridoriuose nuardyti esamas plyteles, ir įrengti PVC dangas. Nuardžius plyteles 9; 8 ir 6 aukštuose pastebėta, kad esamas smėlio cemento pagrindas yra ištrupėjęs. Nuspręsta tuose vietose kur blogas pagrindas įrengti naujus pagrindus. Numatytų papildomų darbų kaina – 5.695,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (Priedas nr. 9).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 9 – papildomų darbų sąmata, grindų ant perdangos atstatymas.

Priedas Nr. 10 – grindų fotofiksacija.

Nevykdomi darbai

Numatyti nevykdyti darbai yra dėl pasikeitusių projekto sprendinių. Nevykdomi darbai detalizuojami dokumente „Bendras suvestas vykdomi nevykdomi_Kalvarijų g. 147_Lidora“. Bendra nevykdomų darbų suma – 18.826,79 Eur be PVM.

Dėl projekto sprendinių pakeitimo.

Projekto sprendinių pakeitimai, išvardinti aukščiau, atitinka normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlikti parengiant naują techninio darbo projekto laidą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai yra įforminti EN-LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Techninis darbo projektas parengtas, o visi pakeisti, papildyti ar pataisyti dokumentai, brėžiniai pasirašyti pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus, išleisti papildomi brėžiniai ir parašytas aiškinamasis raštas.“

UAB „Lidora“ statinio projekto vadovas

UAB „Projektai ir Co“

Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

VĮ Turto banko vyr. inžinierius

VĮ Turto banko projektų vadovas

Priedas Nr.1

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS
ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D. 2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius
Statinsys NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius papildomi darbai
Žiniaraštis Dokumentų utilizavimas

2023.11.06					Suma žiniaraščiui	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1		Domumentų pakrovimas į dėžes. Dokumentų ir segtuvų išrušiavimas. Dokumentų nuvežimas sunaikinimui su atsakingų užsakovo atstovų. Segtuvų utilizavimas	kompl.	1,00	3000,00	3000,00
Iš viso už skyrių papildomi darbai						3000,00
Žiniaraštyje 1						3000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						630,00
Iš viso žiniaraštyje 1						3630,00

Sudarė :
/Pavardė/





Priedas Nr.3

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS
ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D. 2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius

Statinsys NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius papildomi darbai

Žiniaraštis Tentai

2023.11 Suma žiniaraščiui


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso


1 Papildomi darbai

1		Tentų gamyba ir kabinimas 3370*1750 24vnt.	kompl.	1,00	1386,00	1386,00
2		Tentų gamyba ir kabinimas 3370*1750 16vnt.	kompl.	1,00	1038,40	1038,40
Iš viso už skyrių papildomi darbai					2424,40	

Žiniaraštyje 1	2424,40
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	509,12
Iš viso žiniaraštyje 1	2933,52

Sudarė :
/Pavardė/

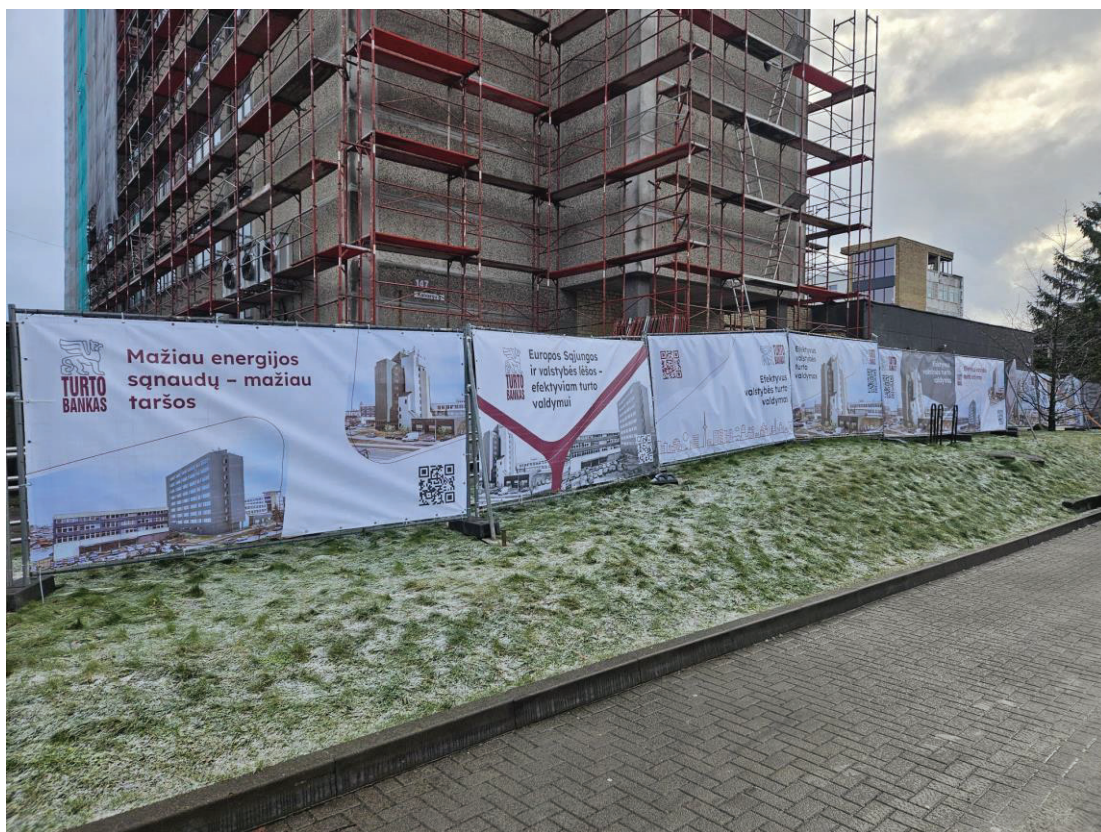

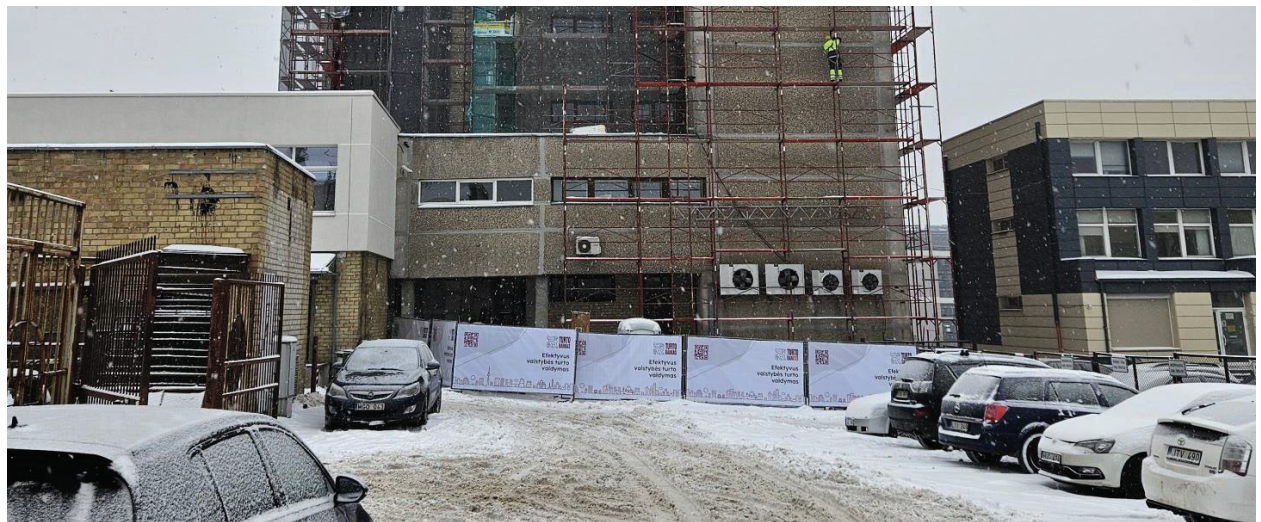

Priedas Nr.5

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS
ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D. 2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius

Statinsys NŽT, Kalvarijų g.147, Vilnius papildomi darbai

Žiniaraštis Dokumentų pervežimas

2023.11.06 Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi darbai

1	Dokumentų pervežimas	kompl.	1,00	4544,00	4544,00
---	----------------------	--------	------	---------	---------

Iš viso už skyrių papildomi darbai	4544,00
------------------------------------	---------

Žiniaraštyje 1	4544,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	954,24
Iš viso žiniaraštyje 1	5498,24

Sudarė :
/Pavardė/

Rangovas: UAB "Lidora"

VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Objektas:

Žiniaraščio Nr.: Papildomų/vykdomų/nevykdomų darbų sąmata
Žiniaraščio pavadinimas:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS		MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
						Vieneto	Iš viso
		3		4	5	6	7
I		Papildomi darbai					
4		Plytelių išsaugojimas laiptinių holuose					
		Grindų uždengimas mpp 6a.		m2	40,4	5,39	217,76
		Grindų uždengimas mpp 5a.		m2	42,88	5,39	231,12
		Grindų uždengimas mpp 4 a.		m2	42,93	5,39	231,39
		Grindų uždengimas mpp 3 a.		m2	41,86	5,39	225,63
		Grindų uždengimas mpp 2 a.		m2	42,86	5,39	231,02
		Plytelių klijavimas demontuotų sienų vietoje 5 a		m'	2	35	70,00
		Plytelių klijavimas demontuotų sienų vietoje 3 a		m'	17	35	595,00
		Iš viso papildomi darbai Eur be PVM:					1 801,91
II		Nevykdomi darbai					
1		Plytelių išsaugojimas laiptynių holose					
		Plytelių demontavimas		m2	210,93	5	1054,65
		Savaime išlyginamojo mišinio įrengimas		m2	210,93	14	2953,02
		Plytelių klijavimas		m2	210,93	51	10757,43
		Iš viso nevykdomi darbai, Eur be PVM:					14 765,10
							3 100,67
							17 865,77

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 8 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius**Statinys 2 Remontas****Žiniaraštis 1 Papildomi darbai (termoprofilų montavimas)****Suma žiniaraščiui 26378,74 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
	***	PVC gaminių padidėjimo įvertinimas	m2	15,5	258,06	3999,93
	***	EI60 lauko gaminių padidėjimas	m2	2,32	732,76	1700,0
1 R62P-3601		Langų termoprofilų montavimas	m	1204,46	14,88	17922,36
		Skyriuje 1				23622,3
2 Nevykdomi darbai						
	***	Langų kronšteinių įrengimas	m2	607,23	- 3,0	- 1821,69
		Skyriuje 2				- 1821,69
		Žiniaraštyje 1				21800,61
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4578,13
		Iš viso žiniaraštyje 1				26378,74

SUDERINTA: TŪKST.EUR

TVIRTINU: TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MÈN. D.

2023 M. MÈN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 8 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius

Statinys **1 Modernizavimas**

Žiniaraštis **1 Papildomi darbai (sąrašų montavimas)**

Suma žiniaraščiui 44049.81 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
***		Metalinės sąramos SR-1.6	t	1,78	6500,0	11 570,00
***		Metalinės sąramos SR-2.1	t	1,9332	6500,0	12 565,80
***		Gelžbetoninė pagalvė po metalinėmis SR-1.6 ir SR-2.1 sąramomis	m3	2,46	1200,0	2 952,00
***		Laikančių sąramų stiprinimas/platinimas LSS-1	t	1,068	6500,0	6 942,00
***		Nelaikančių sąramų stiprinimas/platinimas NSS-1	t	0,71	6500,0	4 615,00
Skyriuje 1						38 644,80
2 Nevykdomi darbai						
Demontuotų fasadinių panelių angos įrengimas (SK.B-55)						
***		Sąramų stiprinimas	vnt	4,0	- 500,0	-2 000,00
***		Armuotų gelžbetoninių pagalvių sąramoms įrengimas	m3	0,2	- 1200,0	-240,00
Skyriuje 2						-2 240,00
Žiniaraštyje 1						36 404,80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7 645,01
Iš viso žiniaraštyje 1						44 049,81

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 8 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius**Statinys 1 Modernizavimas****Žiniaraštis 1 Papildomi darbai (Grindų ant perdangos atstatymas)****Suma žiniaraščiui 6890,95 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
***		Smėlbetonio grindų demontavimas	m2	120,0	5,0	600,0
***		Grindų ant perdangos atstatymas smėlbetoniu	m2	120,0	29,0	3480,0
***		Mišrių statybinių atliekų išvežimas	t	19,0	85,0	1615,0
		Skyriuje 1				5695,0
		Žiniaraštyje 1				5695,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1195,95
		Iš viso žiniaraštyje 1				6890,95

















