

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-639(11.31), 2023 M.
BIRŽELIO 28 D. PAPILDOMO SUSITARIMO SUT-2023-582 (11.31) ir 2023 M. SPALIO 31
D. PAPILDOMO SUSITARIMO SUT-2023-778 (11.31) PAKEITIMO

2024 m. birželio 13 d. Nr. SUT-2024- 626 -(11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre atstovaujama Administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Detama“, juridinio asmens kodas 302503829, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r., LT- 58382, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Puidoko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**):

1. Vadovaudamosi 2022 m. rugpjūčio 3 d. rangos sutarties Nr. SUT-2022-639(11.31) „Dėl Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų viešojoje erdvėje Laisvės alėjoje Radviliškio mieste, statybos darbų atlikimo“ (toliau – **Sutartis**) X skyriaus „Sutarties keitimas dėl keičiamų darbų kiekių (apimties)“ nuostatomis, dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2024 m. birželio 3 d. Papildomų darbų aktu Nr. 3 (Susitarimo 1 priedas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės,

todėl Šalys atsižvelgdamos į anksčiau išdėstyta šiuo Susitarimu nustato papildomų darbų sumą:

Papildomų darbų suma su PVM yra 2 166,64 Eur (**du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt šeši eurai 64 ct**).

Iš viso papildomų darbų suma (vertė) su PVM yra 2 166,64 Eur (**du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt šeši eurai 64 ct**).

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui pradinė Sutarties vertė su PVM nesikeičia ir yra 410 300,00 EUR su PVM (**keturi šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct**), iš kurių PVM sudaro 71 209,09 Eur, o priimta Sutarties vertė su PVM keičiasi ir sudaro sumą 370 130,29 Eur (**trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių šimtas trisdešimt eurų 29 ct**), iš kurių PVM sudaro 64 237,49 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Adresas: Aušros a. 10, 82196 Radviliškis

Juridinio asmens kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: LT887262410

A. s. LT94 7300 0100 0257 0179

Bankas: AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel. +370 (422) 69 003

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Eglė Ivanauskytė

A. V.

(parašas)
(data)

RANGOVAS

UAB „Detama“

Adresas: Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r.

Juridinio asmens kodas: 302503829

PVM mokėtojo kodas: LT100006991814

A. s. LT05 7300 0101 2202 8682

Bankas: AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel.: +370 608 37 493

El. p. t.puidokas@detama.lt

Direktorius

Tautvydas Puidokas

A. V.

(parašas)
(data)

Projektas (OBJEKTAS): „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ VIEŠOJE ERDVĖJE LAISVĖS AL., RADVILIŠKIO MIESTE, STATYBA“.

Statybos darbų rangos sutartis Nr. SU1-2022-639(11.31), 2023 m. birželio 28 d. papildomas susitarimas SU1-2023-582 (11.31) ir 2023 m. spalio 31 d. papildomas susitarimas SU1-2023-778 (11.31).

Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Aušros g. 10, LT-82196 Radviliškis.

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 3 **2024 m. birželio 3 d.**

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo Viktoro Šmito,

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjo – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto Rolando Tamučio,

Projektuotojo atstovo – UAB „AJ archi“ statinio projekto vadovo Arūno Jelinsko.

Rangovo atstovo – UAB „Detama“ statinio statybos vadovo Mažvydo Puidoko,

atsižvelgdama į rangovo 2024 m. balandžio 19 d. pranešimą Nr. 24/04/19-1 bei išnagrinėjus projektinę dokumentaciją, įvertinant reikalingų papildomai atlikti darbų kiekius objekte, nustatė, kad nuo trenitinių vagono link geležinkelio stoties automobilių aikštelės skvero šaligatvis nesujungtas su esamu šaligatviu ties geležinkelio stoties teritorija – trūksta 12,5 metro šaligatvio, kuris užtikrintų saugų pėsčiųjų eismą neinat per važiuojamąją dalį, todėl tikslinga atlikti sekančius papildomus darbus:

Konkurso sąlygų priedo Darbų kiekių žinlaraštis Nr. SATskyriuose „Ardyma durbai“, „Žemės darbai“, „Betoninių trinkelinių dangų“ ir „Bortų įrengimas“

Papildomai vykdomų darbų vertė be PVM: 1 790,61 Eur.

Viso papildomai vykdomų darbų vertė: 1 790,61 be PVM.

PRIFIDA:

1. Rangovo 2024 m. balandžio 19 d. pranešimas Nr. 24/04/19-1 su priedais: papildomų darbų kainų ir kiekių žiniaraščiu ir papildomai įrengiamo šaligatvio schema (2 lapai);

2. UAB „AJ archi“ statinio projekto vadovo Arūno Jelinsko 2024 m. gegužės 17 d. informacinis raštas su suderinta papildomai įrengiamo šaligatvio schema (2 lapai).

Komisija:

Užsakovo atstovas

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Viktoras Šmitas

Projekto Vadovas

Statybos darbų vadovas

Rangovo atstovas

M. Puidokas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjas

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Rolandas Tamutis

	UAB "AJ archi"
	TILŽES G. 170-404, ŠIAULIAI, K.300500567, T. 8 686 89443, arunas.jelinskas@gmail.com


Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

UAB „Detama“

2024 m. gegužės 17 d.

Neprieštarauju, kad Kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Radviliškio miesto Laisvės alėjos viešojoje erdvėje statybos darbai būtų papildyti, įrengiant papildomą šaligatvį prie esamos stovėjimo aikštelės, ir kuris apjungtų šaligatvius einančius nuo geležinkelio stoties iki projekte numatyto skvero šaligatvio.

PV, architektas



Arūnas Jelinskas



UAB „Detama“

Uždaroji akcinė bendrovė, Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r., tel. 8 608 37493, Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 302503829.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

Lydraštis

2024-04-19 Nr. 24/04/19-1

Dotnuva

Informuojame, kad pagal esamą projektą šaligatvis nuo tremtinių vagono link traukinių stoties eina tiesiai į stovėjimo aikštelę ir žmonės turės eiti per važiuojamąją dalį. Mes siūlome įrengti papildomą šaligatvį palei stovėjimo aikštelę ir sujungti šaligatvius einančius nuo geležinkelio stoties su šaligatviu einančiu skvero link. Įrengus apie 12,5m papildomą šaligatvį (Užsakovo lėšomis iki sklypo ribos 8m, o nuo sklypo ribos iki esamo šaligatvio Rangovas įrengs savo sąskaitą) žmonėms einantiems iš geležinkelio stoties į skverą nebereikėtų eiti per važiuojamąją dalį, o galėtų skverą pasiekti šaligatviu. Papildomai Užsakovui reikėtų įrengti apie 16m² trinkelio dangos, apie 8m gatvės bortų ir plastikinių bortų.

Šis sprendimas padarytų žymiai saugesniu žmonių judėjimu nuo geležinkelio stoties link naujai įrengto skvero. Tai leistų išvengti galimų automobilių ir žmonių susidūrimų.

Priedama:

Preliminari papildomų darbų sąmata;

Preliminarių papildomų darbų schema.

Direktorius

Tautvydas Puidokas



DARBŲ ŽINIARAŠTIS 5.A.T (Papildomi darbai)

Užsakovas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Į.č. 188726247

Rangovas: UAB "Detama", Į.č. 302503829

Objektas: Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų vietoje Laisvės aikštyje Radviliškio mieste, statybos darbai

Pagrindinė sutartis: 2022-08-04, Nr. SUT-2022-639(11.31)

Sudarymo data: 20 24.04.19

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina € be PVM	Viso kaina € be PVM
----------	----------------------------	----------	--------	------------------------	---------------------

Ardymo darbai

486,40

1	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09 k9=1.15	m	8,0	20,0	160,0
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobilių savaivėmis, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaulais	t	0,08	80,0	6,4
4	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumodaktelio pagalba k8=1.09 k9=1.15	100m3	0,016	20000,0	320,0

Žemės darbai

306,00

1	Grunto kasimas 78kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 40 m, gruntas I grupės) k8=1.15	t m3	0,01	7000,0	70,0
2	Tranšėjų, liksų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96kW (130AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	0,1	800,0	80,0
4	Liksų arba pylių paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 78kW (108AJ) k9=1.15	t m2	0,016	1000,0	16,0
5	Grunto tankinimas savaimiu vibrovoliu, kai vibrovolio masė did 8t (I-II grupės gruntai) k9=1.15	100m3	0,1	200,0	20,0
6	Grunto pakrovimas, autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k8=1.15	100m3	0,1	800,0	80,0
7	I grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaulo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,1	700,0	70,0
8	Transportuojant I-II grupės gruntą geležies keliais 6t autosavivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4,000	100m3	0,1	300,0	30,0

Betoninių trinkelų dangos

694,31

1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,0844	2300,0	148,12
2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldais 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,16	1313,66	210,18
3	Saugio po sluoksnio įrengimas (dolomitinės skaldos atšios, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	0,16	500,0	80,00
4	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant atšias dolomitinės skaldos atšiomis k9=1.15	100m2	0,16	900,0	144,00
6	Grindinio trinkelės 60 mm	m2	16,0	7,00	112,00

Bortų įrengimas


303,90

1	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,08	1800,0	144,00
2	Saugiatvių plytelės, bordūrai	m3	0,25	70,0	17,50
5	Dolomito skaldos 22/56 su skaldais 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 25 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,016	1500,0	24,00
6	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 10,0 cm storio, klojimas iki 200 t/h) k8=1.17 k9=1.15	100m2	0,016	2400,0	38,40
9	Plastikinių bortų montavimas	100 m	0,08	300,0	24,00
10	Plastikiniai bortai	m	8,0	4,0	32,00
11	Plastikinės vinys bortų tvirtinimui	vnt	24,0	1,0	24,00

Bendra vertė €, be PVM 1 790,61

PVM 376,03

Bendra vertė €, su PVM 2 166,64

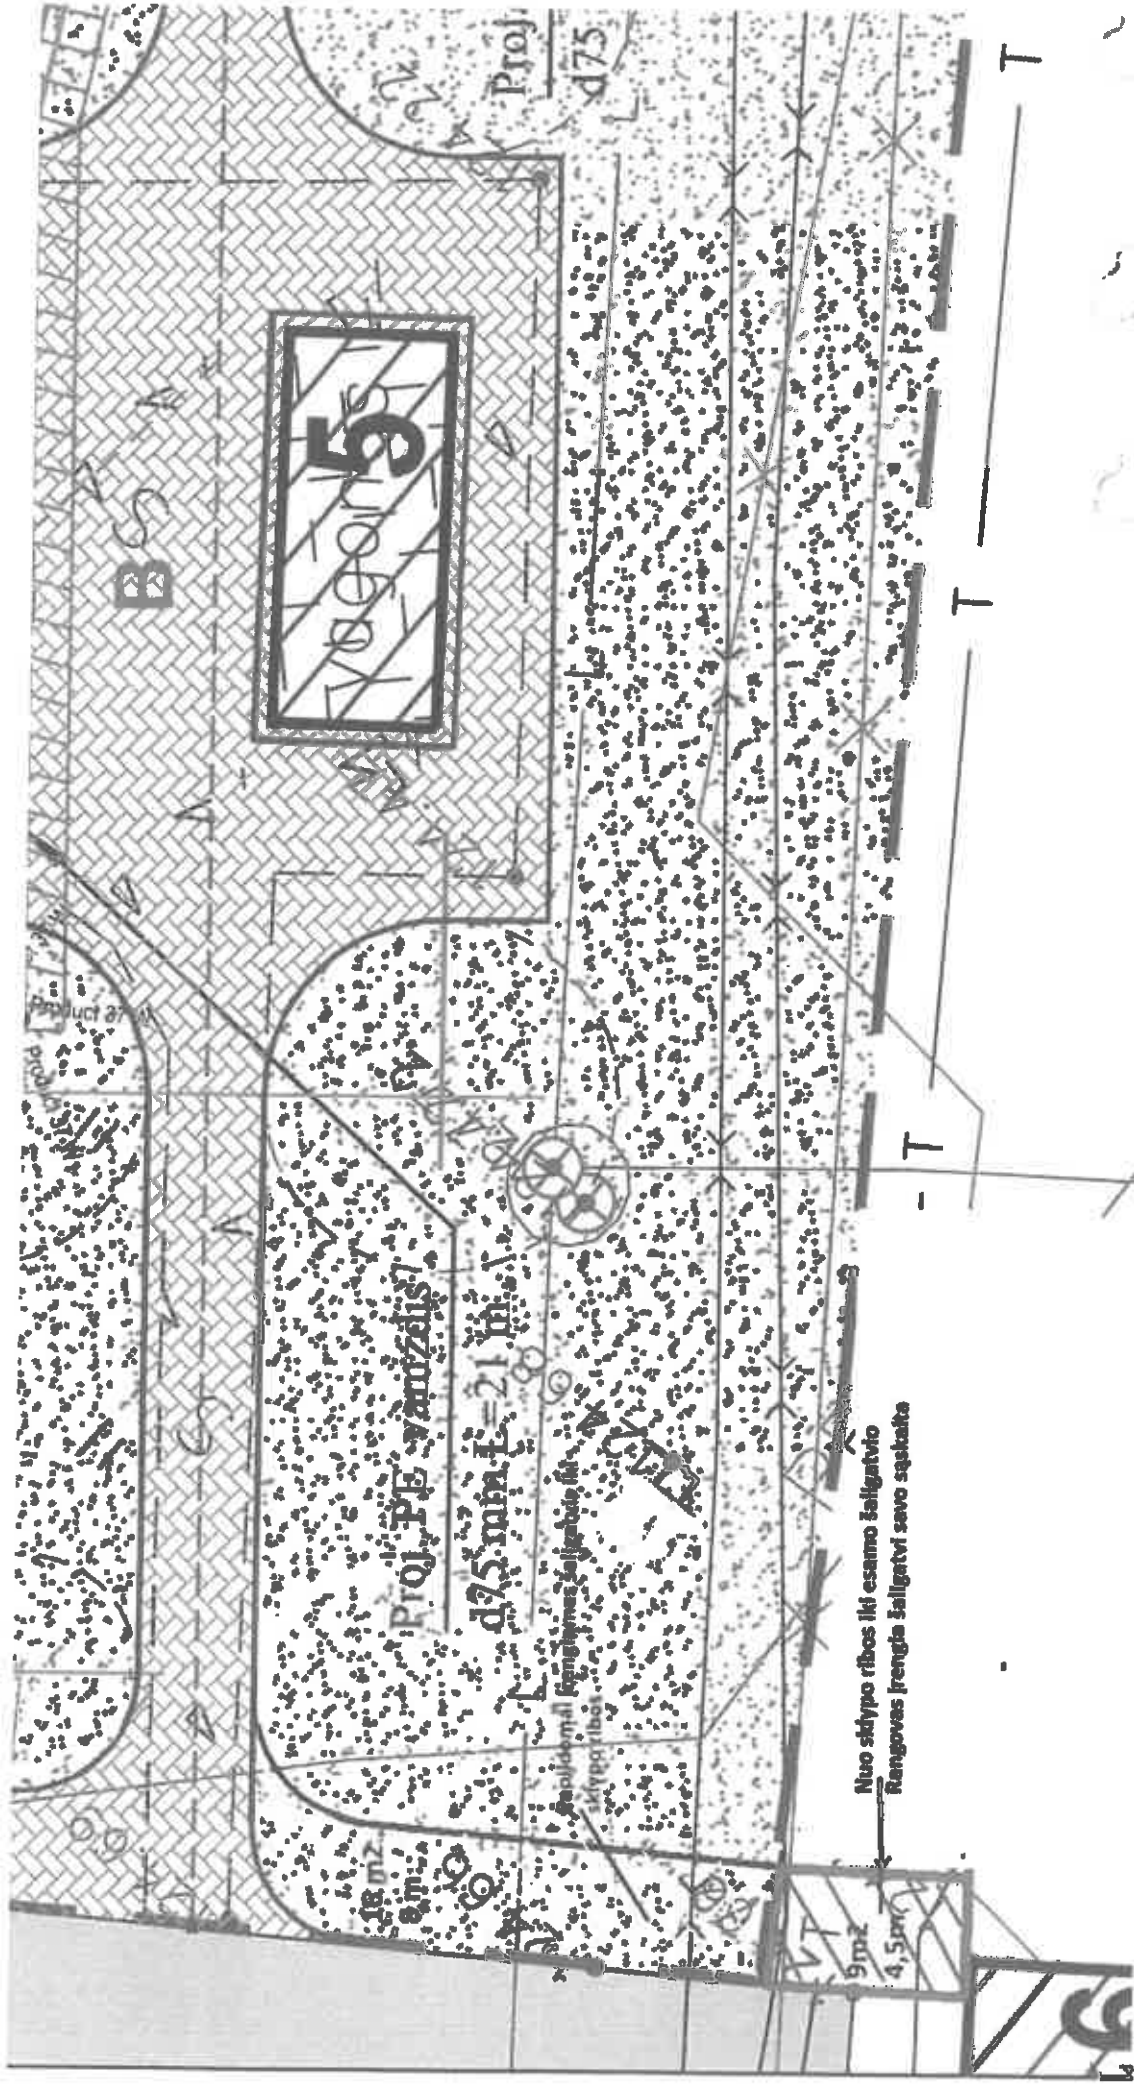

Nuo stiepo ribos iki esamo šilguteio
Rengines įrengtas šilgutei
