

SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2023-07-11 RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS – 1222 (PIRKIMO NR. 649248)

2023 m. lapkričio d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbauskio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. liepos 11 d. sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1222 „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis)

vadovaudamosi:

2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais.
3. 2023 m. spalio 31 d. Papildomų ir nevykdomų darbų aktu Nr. 2 (reg. Nr. A32-3012);
4. 2023 m. lapkričio 6 d. Pasitarimo protokolu Nr. A6-473 „Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų“;

5. Sutarties 15.3 punktu, numatančiu, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigijami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;

6. Sutarties 15.5. punktu, numatančiu, kad „Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;

7. 15.13. punktu, numatančiu, kad „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigijamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka: 15.13.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius; 15.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 15.13.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 15.13.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisyklės nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

8. Atsisakyti darbų, kurių vertė 5809,02 Eur be PVM (atsisakomi darbai nurodyti Susitarimo priede Nr. 14.1.).

9. Atlikti papildomus darbus, kurių vertė 5990,80 Eur be PVM (papildomi darbai nurodyti Susitarimo priede Nr. 14.1.).

10. Pakeisti Sutarties 5.1. punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. **Pradinės sutarties vertė** yra 399151,28 EUR be PVM. **Sutarties kaina**, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 482973,04 EUR su PVM“.

11. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

12. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. liepos 11 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-1222.

13. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14. Susitarimo priedai:

14.1. 2023 m. spalio 31 d. Papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 2 (reg. Nr. A32-3012);

14.2. 2023 m. lapkričio 6 d. Pasitarimo protokolas Nr. A6-473 “Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų“.

Užsakovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai

Kodas 188773688

A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 46) 21 11 16

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

(Parašas)

Rangovo vardu

UAB „Telšių keliai“

Mažeikių g. 18

LT-87101 Telšiai

Kodas: 180200843

PVM mokėtojo kodas: LT802008413

A. s. Nr. LT20 7181 7000 0946 7622

AB Šiaulių bankas

Banko kodas: 71800

Tel. (8 444) 69250

El. paštas: tkeliai@tkeliai.lt

Direktorius

Arnas Knystautas

(Parašas)

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 2

2023 m. spalio __ d.

Gargždai

Rangos darbų sutartis 2023-07-11 Nr. AS-1222

Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas

Komisija, sudaryta iš Algirdo Ronkaus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresniojo patarėjo, Editos Zaveckienės - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistės, Nedo Sprainaičio - MB „DPKTP“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo, Žaimanto Pastarnoko – MB „Žaimis“ projekto vykdymo priežiūros vadovo, Algimanto Plaipos - UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo gamybai, Broniaus Laučio – UAB „Telšių keliai“ statinio statybos darbų vadovo, apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

1. Pk 7+36 dešinėje Laukų g. gatvės pusėje, lygiagrečiai grioviui yra gatvelės, kurios dėl grunto paplovimo pavojingai susiaurėja. Siekiant užtikrinti remontuojamo kelio ir pasijungiančių gatvelių dangos ir kelkraščių stabilumą, siūloma pralaidos galuose įrengti sparninius antgalius. Įrengus antgalius pagerėtų eismo saugumo situacija, pralaidos zonoje praplatėtų kelio danga, nebebūtų plaunami šlaitai, pralaida būtų apsaugota nuo grunto užnešimo.

2. Dėl arti esančių privačių sklypų, kurie daugelyje vietų ribojasi su gatvės kelkraščiais, nėra galimybės įrengti pakelės griovių, o nuovažose - pralaidų vamzdžių. Pralaidas tikslinga ir pagal faktinę situaciją reikalinga rengti Pk 6+92 kairėje kelio pusėje ir Pk 7+80 kairėje kelio pusėje.

3. Ties Pk 12+00 dešinėje kelio pusėje, dėl kelio susiaurėjimo, numatyta kelkraščio ir nuovažos zonoje įrengti kelio bortus ir 60 cm pločio trinkelį dangą. Siekiant užtikrinti kelio ir nuovažos dangos vientisumą ir stiprumą, tikslinga nuovažą asfaltuoti, o trinkelį dangą pakloti iki nuovažos ir už nuovažos, kaip numatyta projekte.

Komisija siūlo:

1. PK 7+36 esančių pralaidų galuose įrengti sparninius antgalius.
2. Pralaidas per nuovažas įrengti Pk 6+92 kairėje kelio pusėje ir Pk 7+80 kairėje kelio pusėje.
3. Nuovažą PK 12+00 dešinėje kelio pusėje asfaltuoti.
4. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti Kapitalinio remonto aprašo laidą A, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

PAPILDOMI DARBAI:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3. Vandens nuvedimas (sparninių antgalių įrengimas)				
	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m ³	7,8	425,07	3.315,55
7	H72T-4	Armatūros tinklas d8 ir d10 mm armatūros tinklo akis 20cmx20cm	t	1,46	1832,36	2.675,25
		Skyriuje 3				5.990,80
Viso PAPILDOMI DARBAI Eur be PVM						5.990,80

NEVYKDOMI DARBAI:

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3. Vandens nuvedimas				
2	H31K-34	0,8m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	- 2,0	460,84	-921,68
		Skyriuje 3				-921,68
		8. kiti darbai				
6	N57P-4301	Papildomų plastikinių pralaidų DN300 mm su mova SN8 įrengimas per nuovažas, kartu su antgaliais ir visomis kitomis medžiagomis	m	-162,00	10,81	-1.751,22
7	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	-26,0	120,62	-3.136,12
		Skyriuje 8				-4.887,34
Viso NEVYKDOMI DARBAI Eur be PVM						-5.809,02

VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ be PVM	181,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	38,17
VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ su PVM	219,95

Priedai:

Priedas Nr. 1 Papildomų - nevykdomų darbų lokalinė sąmata (Pralaidos)

Priedas Nr. 2 Pralaidos antgalių įrengimo schema

Priedas Nr. 3 2023-10-10 Pasitarimo protokolas

Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 3

Priedas Nr. 5 Fotofiksacija

Išvados:

1. Remiantis Rangos darbų sutarties XV skyriaus „Pakeitimai“ nuostatomis, 2023-10-10 pasitarimo protokolo medžiaga siūloma pritarti papildomiems ir nevykdomiems darbams ir jų kiekiams, dėl sutarties pakeitimo kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją.

(nurodomi komisijos sprendimai, siūlymai)

2. Papildomas lėšų poreikis – **papildomi darbai 5.990,80 Eur be PVM, nevykdomi darbai -5.809,02 Eur be PVM = 181,78 Eur be PVM, arba 219,95 Eur su PVM.**

Komisija:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir Algirdas Ronkus
infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir Edita Zaveckienė
infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė

MB „DPKTP“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Nedas Sprainaitis

MB „Žaimis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Žaimantas Pastarnokas

UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Algimantas Plaipa

UAB „Telšių keliai“ statinio statybos darbų vadovas Bronius Laučys

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.


LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas


Statinių grupė 002 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**Statinys 2 KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423) KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 4 PAPILDOMI - NEVYKDOMI DARBAI****Suma žiniara: 219,95 EUR**

Sqm.	Darbo	Darbu ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
eil.	kodas	aprašymai	vnt		vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
	3	Vandens nuvedimas. Sparninių atgalių įrengimas					
	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio atgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	7,800000	425,07	3315,55	Kalkuliacija Nr. 3
7	H72T-4	Armatūros tinklas d8 ir d10 mm armatūros tinklo akis 20cmx20cm	t	1,460000	1832,36	2675,25	
		Skyriuje 3				5990,80	
NEVYKDOMI DARBAI							
	3	Vandens nuvedimas					
2	H31K-34	0,8m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų atgalių įrengimas (1 atngal.)	vnt.	- 2,0	460,84	-921,68	
		Skyriuje 3				-921,68	
	8	Kiti darbai					
6	N57P-4301	Papildomų plastikinių pralaidų DN300 mm su mova SN8 įrengimas per nuvažas, kartu su atngaliais ir visomis kitomis medžiagomis	m	-162,00	10,81	-1751,22	
7	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų atngalių įrengimas (1 atngal.)	vnt.	-26,0	120,62	-3136,12	
		Skyriuje 8				-4887,34	
		Viso PAPILDOMI DARBAI				5990,80	
		Viso NEVYKDOMI DARBAI				-5809,02	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ be PVM				181,78	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				38,17	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ su PVM				219,95	


Sudarė : S. Ignatas
/Pavardė/

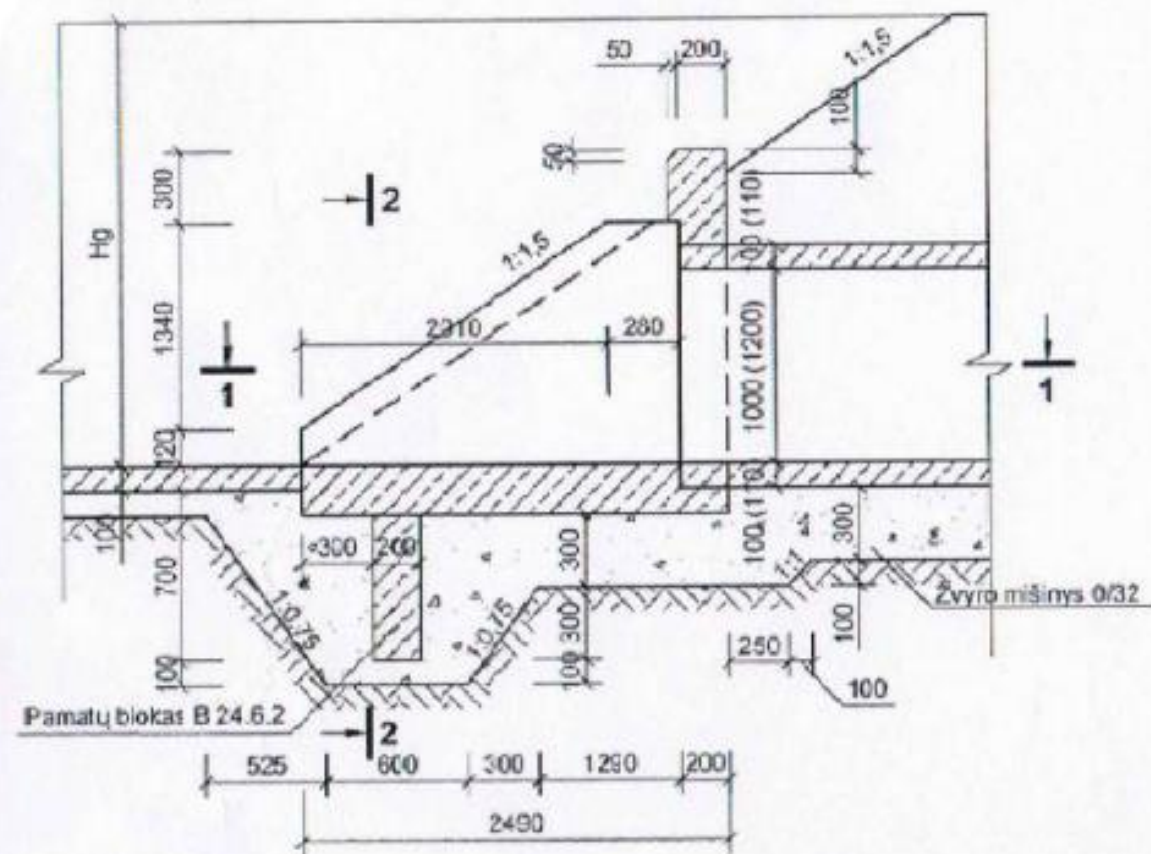

PJŪVIS 1-1

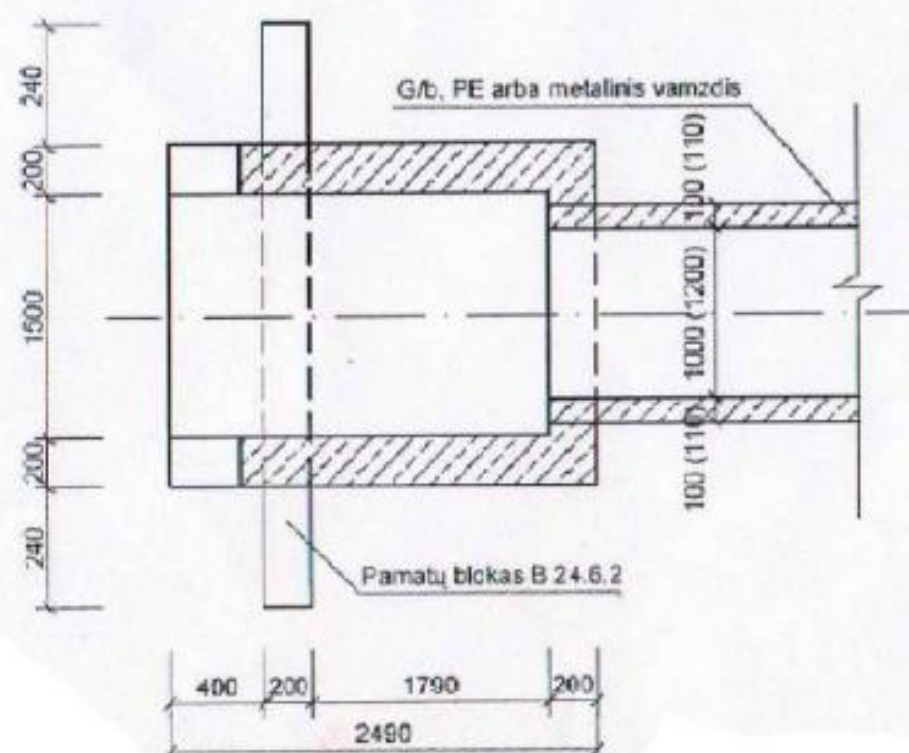

PJŪVIS 2-2, 3-3

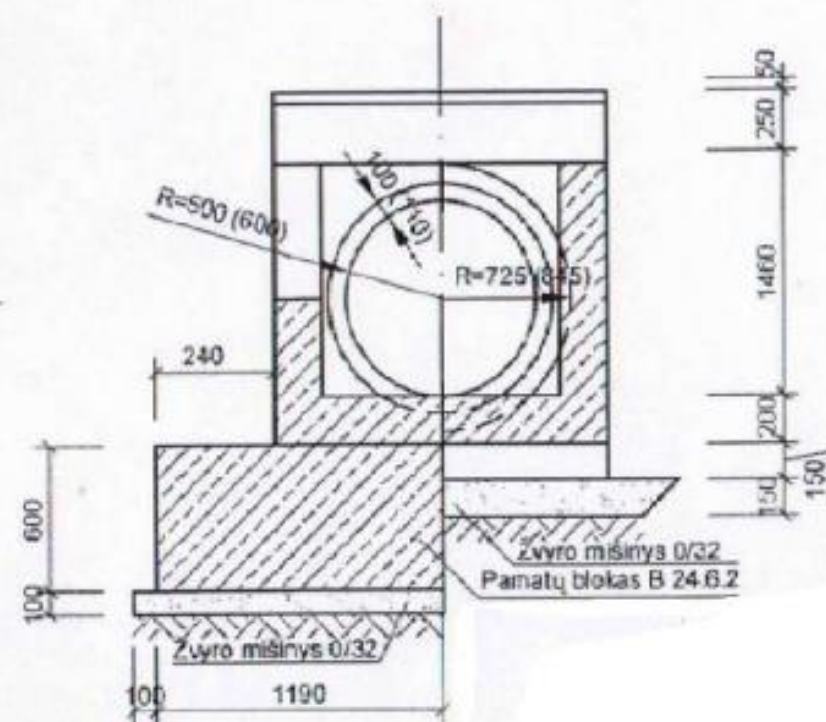

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PASITARIMO PROTOKOLAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423)
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ EIGOS

Pasitarimas vyko 2023-10-10

Pasitarimo pradžia – 13:00 val., pabaiga – 13:30 val.

Pasitarimo pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas Algirdas Ronkus.

Pasitarimo sekretorė – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zaveckienė.

Pasitarime dalyvavo: UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Algimantas Plaipa, projekto vykdymo priežiūros vadovas Žaimantas Pastarnokas (MB „Žaimis“), statybos techninės priežiūros vadovas Nedas Sprainaitis, AB Lietuvos automobilių kelių Turto ir veiklos valdymo departamento vietinė reikšmės kelių skyriaus statybos priežiūros vadovas Antanas Proberkas.

1. SVARSTYTA. 2023 m. spalio 6 d. UAB „Telšių keliai“ raštas Nr. TKS-156 „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 6 d. gavo UAB „Telšių keliai“ raštą „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“ (raštas pridedamas). Rašte Rangovas informuoja, kad PK 7+36, rytinėje Laukų g. gatvės pusėje, lygiagrečiai grioviui yra gatvelės, kurios dėl grunto paplovimo pavojingai susiaurėja. Siekiant užtikrinti remontuojamo kelio ir pasijungiančių gatvelių dangos ir kelkraščių stabilumą, Rangovas siūlo pralaidos galuose įrengti sparninius antgalius. Įrengus antgalius pagerėtų eismo saugumo situacija, pralaidos zonoje praplatėtų kelio danga, nebebūtų plaunami šlaitai, pralaida būtų apsaugota nuo grunto užnešimo.

A. Proberkas pasakė, kad sprendimas geras.

A. Plaipa dar papildė, kad tuo pačiu raštu informavo, kad dėl arti esančių privačių sklypų, kurie daugelyje vietų ribojasi su gatvės kelkraščiais, nėra galimybės įrengti pakelės griovius, o nuovažose - pralaidų vamzdžius. Pralaidas tikslinga ir pagal faktinę situaciją reikalinga rengti Pk 6+92 kairėje pusėje ir Pk 7+80 kairėje pusėje.

Esami vakuuminių buitinių nuotekų tinklų signalizacijos/duomenų perdavimo vamzdžiai (raudoni PE d40) pakloti projektiniame žemės sankasos įrengimo aukštyje. Rengiant žemės sankasą šiuos vamzdžius būtina įgilinti. Teikdamas pasiūlymą Rangovas šių darbų negalėjo numatyti.

A. Ronkus pasakė, kad dėl pralaidų viskas gerai. Darome tiek kiek reikia, atsižvelgiant į faktinę situaciją. Dėl vamzdžių/kabelių įgilinimo, manome, kad Rangovas galėjo numatyti, kad tokia situacija galima, nes praktiškai visuose objektuose ji kartojasi, visi Rangovai su tuo susiduria.

NUSPŘESTA:

- 1) PK 7+36 esančių pralaidų galuose įrengti sparninius antgalius.
- 2) Pralaidas per nuovažas įrengti Pk 6+92 kairėje pusėje ir Pk 7+80 kairėje pusėje.
- 3) Vamzdžių/kabelių įgilinimo darbų kiekiai yra didesni nei Sutartyje numatyti, tačiau neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, todėl nelaikomi papildomais darbais (sutarties Nr. AS-1222 15.3 punktas).
- 4) Rangovas turi paruošti darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir pateikti Užsakovui.

2. SVARSTYTA. Dėl PK 12+00 kairėje pusėje esančios nuvažos į Laukų g. 24

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad į Užsakovą kreipėsi Laukų g. 24 gyventojas, kuris susirūpino, kad negalės išsukti iš savo kiemo, dėl kelio susiaurinimo toje vietoje, nes vairuoja ilgą sunkią mašiną (tralą). Gyventojas buvo informuotas, kad nuvažą nesusiaurės, tačiau Rangovas susirūpino, ar nereikėtų trinkelų dangos, numatytos šioje nuvažoje pagal projektą, pakeisti į asfaltbetonio dangą.

A. Proberkas pasakė, kad mintis gera. Trinkelės reikėtų palikti iki nuvažos, o nuvažą išasfaltuoti.

A. Plaipa paprašė Žaimanto Pastarnoko pabraižyti nuvažą (pridedama).

NUSPRESTA:

- 1) Nuvažą PK 12+00 kairėje pusėje asfaltuoti.
- 2) Rangovas turi paruošti darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir pateikti Užsakovui.

PRIDEDAMA. 2023 m. spalio 6 d. UAB „Telšių keliai“ raštas Nr. TKS-156 „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“.

Posėdžio pirmininkas

Algirdas Ronkus

Posėdžio sekretorė

Edita Zaveckienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Klaipėdos rajono, Dovylių sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinio remonto darbų eigos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-16 Nr. ST3-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 14:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 17:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 10 06 TKS-156 Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-17 nuorašą suformavo Editą Zaveckienę
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 002 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**Statinyss 2 KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423) KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 5 Kalkuliacija Nr. 3**

				Suma žiniaraščiui	514.33 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 3					
1	N57P-4208	m3		1,0		
	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,40000	11,40000	10,61	120,95
120030	Statybinės vinys	kg	0,840000	0,840000	1,74	1,46
120341	Plieninė viela	kg	0,030000	0,030000	1,25	0,04
230451	Specialus tepalas klojiniams	l	0,280000	0,280000	5,99	1,68
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,104000	0,104000	316,80	32,95
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,01500	1,01500	124,96	126,83
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,440000	0,440000	40,57	17,85
489192	Vibratorius	maš.val	0,500000	0,500000	0,58	0,29
N57P-4208	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
Viso žiniaraštyje 5	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			4,89		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,54	
	Sezoniniai darbai 15.00% (120.95)		18,14			
	Specifiniai darbai 17.00%		2,42			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(120.95+18.14+2.42)		11,32			
	Viso:		152,83	167,85	18,68	339,36
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(120.95+18.14+2.42+11.32)		2,74			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	155,57	167,85	18,68	342,10
	Statybvietės išlaidos 9.00%					30,79
	Iš viso tiesioginės išlaidos					372,89
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(120.95+18.14+2.42+11.32)					31,94
	Pelnas 5.00%(372.89+31.94)					20,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos					52,18
	Bendra vertė be PVM					425,07
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					89,26
	Bendra vertė su PVM					514,33

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------







DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Telšių keliai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Laukų g Papildomų nevykdomų darbų aktas Nr 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-06 Nr. A32-3012
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Plaipa Direktorius pavaduotojas gamybai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 10:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 10:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-04 17:02 - 2026-02-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Laučys Statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 13:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 13:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 11:43 - 2028-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žaimantas Pastarnokas PDV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 14:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 14:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:27 - 2028-03-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nedas Sprainaitis Techninės priežiūros inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 18:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 18:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-28 18:01 - 2027-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 10:54 - 2024-10-09 10:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Papildomų - nevykdomų darbų lokalinė sąmata (Pralaidos).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Pralaidos antgalių įrengimo schema.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 2023-10-10 Pasitarimo protokolas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 3.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5 Fotofiksacija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-07 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASITARIMO PROTOKOLAS

DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423) KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS-1222 PAKEITIMO DĖL PAPILDOMŲ (NENUMATYTŲ) IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

Pasitarimas vyko 2023-11-06

Pasitarimo pradžia – 10:30 val., pabaiga – 11:00 val.

Pasitarimo pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

Pasitarimo sekretorė – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zaveckienė.

Pasitarime dalyvavo: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Vytautas Valantinas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas Algirdas Ronkus

DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dvilų sen., Kulų k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų

SVARSTYTA. Projekto „Klaipėdos rajono, Dvilų sen., Kulų k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimas.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad 2023-10-06 buvo gautas UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas) raštas Nr. TKS-156 (reg. Nr. ST.1-624) „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“, kuriuo buvo pateikti pasiūlymai dėl papildomų ir nevykdomų darbų. 2023 m. spalio 10 d. vykusio gamybinio susitikimo metu (Protokolas Nr. ST3-10) buvo nuspręsta, kad:

1. Pk 7+36, siekiant užtikrinti remontuojamo kelio ir pasijungiančių gatvelių dangos ir kelkraščių stabilumą, tikslinga įrengti pralaidos sparninius antgalius, nes vieta nesaugi. Tarp dviejų siaurų gatvelių esantis griovys gilus, šlaitai nestabilūs.

2. Pralaidas nuovažose tikslinga ir pagal faktinę situaciją reikalinga rengti tik Pk 6+92 kairėje pusėje ir Pk 7+80 kairėje pusėje.

3. Rangovas buvo įpareigotas pateikti darbų pakeitimo aktą, suderintą su statybos techninės priežiūros vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu.

2023 m. spalio 31 d. rangovas pateikė Papildomų ir nevykdomų darbų aktą Nr. 2, su visais reikalingais priedais (pridedama).

A. Ronkus paklausė, ar tikrai būtina keisti projekte numatytus sprendinius ir ar jie pagrįsti.

E. Zaveckienė pasakė, kad griovys, esantis PK 7+36 yra pakankamai gilus, jo šlaitai nestabilūs, gatvelės iš abiejų griovio pusių siauros, posūkiai statūs (nuotraukos pridėtos prie papildomų ir nevykdomų darbų akto Nr. 2), todėl nuo darbų objekte pradžios buvo kalbama ir su Rangovu, ir su techninės priežiūros vadovu, kad priemonių saugumui užtikrinti reikia imtis. Rangovas pasiūlė variantą su sparniniais antgaliais ir manome, kad jis šiuo atveju yra optimaliausias (statybos techninės priežiūros vadovas ir projekto priežiūros vadovas su sprendiniais sutiko) ir turėtų užtikrinti kelkraščių stabilumą.

S. Karbauskas paklausė, kokia papildomų ir nevykdomų darbų kaina.

E. Zaveckienė pasakė, kad papildomų (nenumatytų) darbų kaina 5990,80 Eur be PVM, nevykdomų darbų kaina – 5809,02 Eur be PVM. Viso darbų pakeitimo vertė 181,78 Eur be PVM (219,95 Eur su PVM).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, papildomus darbus būtina atlikti. Kadangi Rangovas, sudarydamas sutartį, neturėjo galimybės numatyti šių darbų pagal pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, bei kitą viešai prieinamą informaciją.

NUSPREŠTA vienbalsiai:

1. Pritarti papildomų–nevykdomų darbų aktui Nr. 2.
2. Darbų pakeitimus įforminti Susitarimu Nr. 2 prie 2023 m. liepos 11 d. sutarties Nr. AS-1222.

PRIDEDAMA. 2023 m. spalio 31 d. Papildomų–nevykdomų darbų aktas Nr. 2.

Posėdžio pirmininkas

Sigitas Karbauskas

Posėdžio sekretorė

Edita Zaveckienė

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 2

2023 m. spalio __ d.

Gargždai

Rangos darbų sutartis 2023-07-11 Nr. AS-1222

Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas

Komisija, sudaryta iš Algirdo Ronkaus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresniojo patarėjo, Editos Zaveckienės - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistės, Nedo Sprainaičio - MB „DPKTP“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo, Žaimanto Pastarnoko – MB „Žaimis“ projekto vykdymo priežiūros vadovo, Algimanto Plaipos - UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo gamybai, Broniaus Laučio – UAB „Telšių keliai“ statinio statybos darbų vadovo, apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

1. Pk 7+36 dešinėje Laukų g. gatvės pusėje, lygiagrečiai grioviui yra gatvelės, kurios dėl grunto paplovimo pavojingai susiaurėja. Siekiant užtikrinti remontuojamo kelio ir pasijungiančių gatvelių dangos ir kelkraščių stabilumą, siūloma pralaidos galuose įrengti sparninius antgalius. Įrengus antgalius pagerėtų eismo saugumo situacija, pralaidos zonoje praplatėtų kelio danga, nebebūtų plaunami šlaitai, pralaida būtų apsaugota nuo grunto užnešimo.

2. Dėl arti esančių privačių sklypų, kurie daugelyje vietų ribojasi su gatvės kelkraščiais, nėra galimybės įrengti pakelės griovių, o nuovažose - pralaidų vamzdžių. Pralaidas tikslinga ir pagal faktinę situaciją reikalinga rengti Pk 6+92 kairėje kelio pusėje ir Pk 7+80 kairėje kelio pusėje.

3. Ties Pk 12+00 dešinėje kelio pusėje, dėl kelio susiaurėjimo, numatyta kelkraščio ir nuovažos zonoje įrengti kelio bortus ir 60 cm pločio trinkelį dangą. Siekiant užtikrinti kelio ir nuovažos dangos vientisumą ir stiprumą, tikslinga nuovažą asfaltuoti, o trinkelį dangą pakloti iki nuovažos ir už nuovažos, kaip numatyta projekte.

Komisija siūlo:

1. PK 7+36 esančių pralaidų galuose įrengti sparninius antgalius.
2. Pralaidas per nuovažas įrengti Pk 6+92 kairėje kelio pusėje ir Pk 7+80 kairėje kelio pusėje.
3. Nuovažą PK 12+00 dešinėje kelio pusėje asfaltuoti.
4. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti Kapitalinio remonto aprašo laidą A, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ be PVM	181,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	38,17
VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ su PVM	219,95

Priedai:

Priedas Nr. 1 Papildomų - nevykdomų darbų lokalinė sąmata (Pralaidos)

Priedas Nr. 2 Pralaidos antgalių įrengimo schema

Priedas Nr. 3 2023-10-10 Pasitarimo protokolas

Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 3

Priedas Nr. 5 Fotofiksacija

Išvados:

1. Remiantis Rangos darbų sutarties XV skyriaus „Pakeitimai“ nuostatomis, 2023-10-10 pasitarimo protokolo medžiaga siūloma pritarti papildomiems ir nevykdomiems darbams ir jų kiekiams, dėl sutarties pakeitimo kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją.

(nurodomi komisijos sprendimai, siūlymai)

2. Papildomas lėšų poreikis – **papildomi darbai 5.990,80 Eur be PVM, nevykdomi darbai -5.809,02 Eur be PVM = 181,78 Eur be PVM, arba 219,95 Eur su PVM.**

Komisija:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir Algirdas Ronkus
infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir Edita Zaveckienė
infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė

MB „DPKTP“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Nedas Sprainaitis

MB „Žaimis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Žaimantas Pastarnokas

UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Algimantas Plaipa

UAB „Telšių keliai“ statinio statybos darbų vadovas Bronius Laučys

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.


LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas


Statinių grupė 002 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**Statinys 2 KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423) KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 4 PAPILDOMI - NEVYKDOMI DARBAI****Suma žiniara: 219,95 EUR**

Sqm.	Darbo	Darbu ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
eil.	kodas	aprašymai	vnt		vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
	3	Vandens nuvedimas. Sparninių atgalių įrengimas					
	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio atgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	7,800000	425,07	3315,55	Kalkuliacija Nr. 3
7	H72T-4	Armatūros tinklas d8 ir d10 mm armatūros tinklo akis 20cmx20cm	t	1,460000	1832,36	2675,25	
		Skyriuje 3				5990,80	
NEVYKDOMI DARBAI							
	3	Vandens nuvedimas					
2	H31K-34	0,8m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų atgalių įrengimas (1 atngal.)	vnt.	- 2,0	460,84	-921,68	
		Skyriuje 3				-921,68	
	8	Kiti darbai					
6	N57P-4301	Papildomų plastikinių pralaidų DN300 mm su mova SN8 įrengimas per nuovažas, kartu su atngaliais ir visomis kitomis medžiagomis	m	-162,00	10,81	-1751,22	
7	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų atngalių įrengimas (1 atngal.)	vnt.	-26,0	120,62	-3136,12	
		Skyriuje 8				-4887,34	
		Viso PAPILDOMI DARBAI				5990,80	
		Viso NEVYKDOMI DARBAI				-5809,02	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ be PVM				181,78	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				38,17	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ su PVM				219,95	


Sudarė : S. Ignatas
/Pavardė/

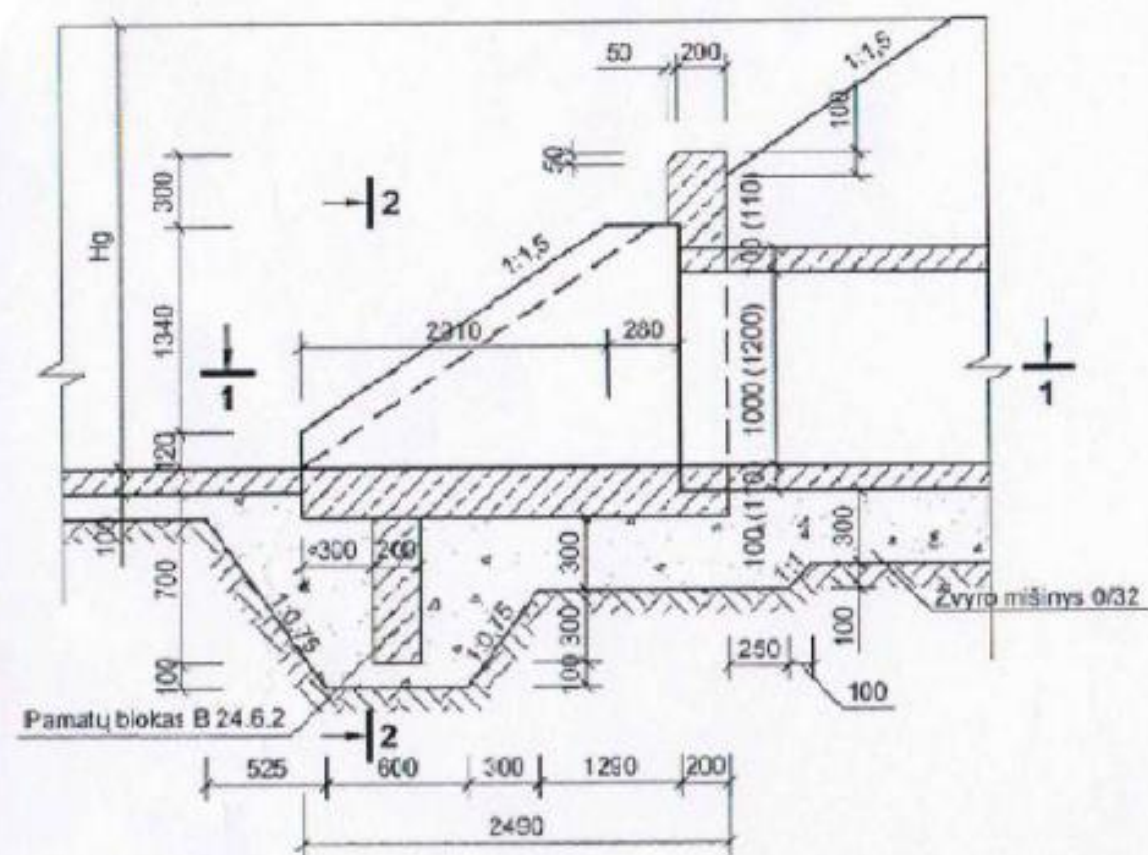

PJŪVIS 1-1

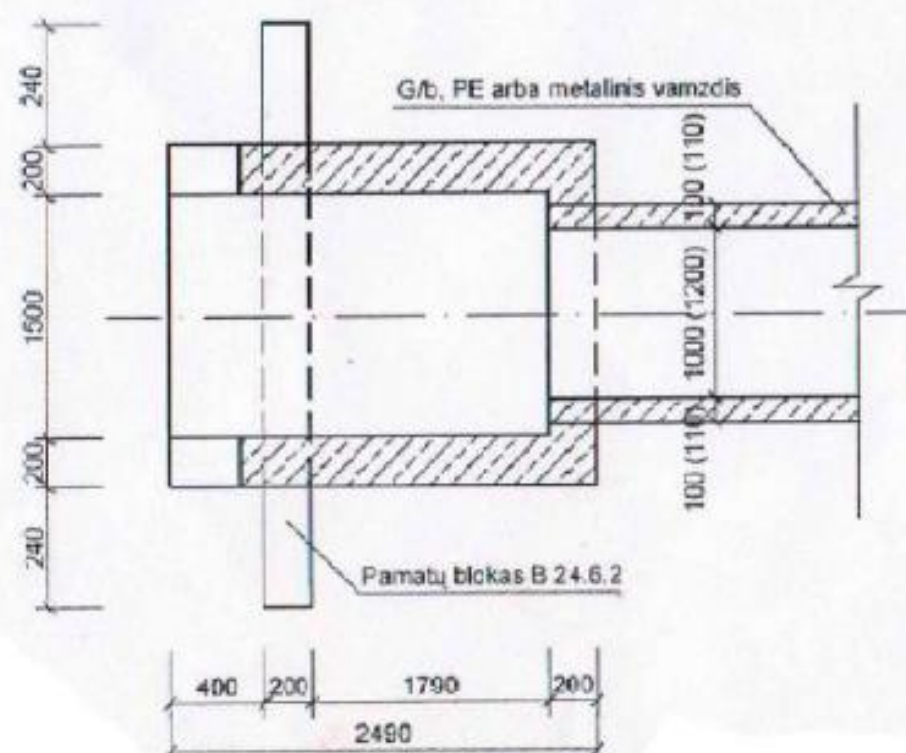

PJŪVIS 2-2, 3-3

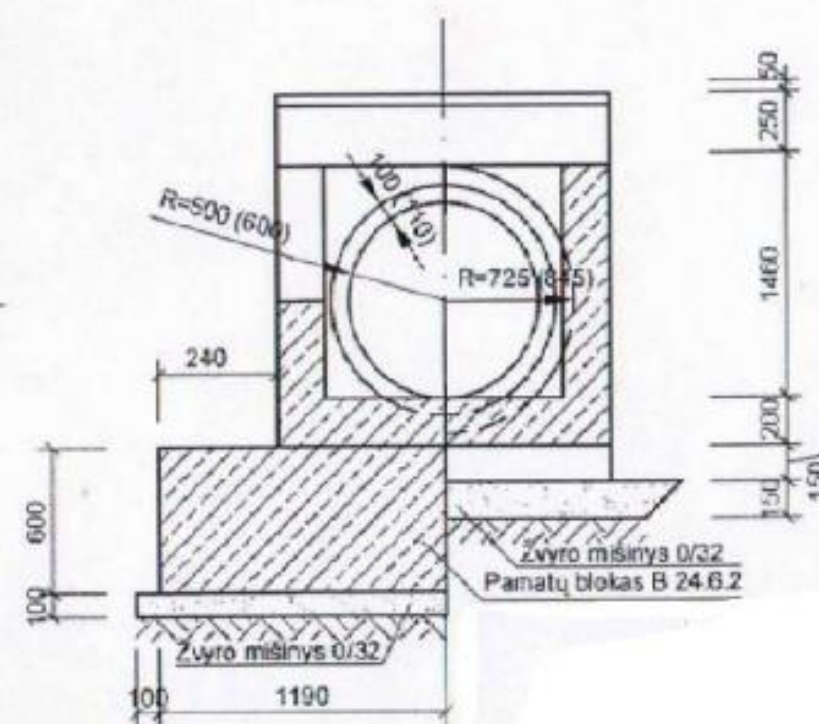

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PASITARIMO PROTOKOLAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423)
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ EIGOS

Pasitarimas vyko 2023-10-10

Pasitarimo pradžia – 13:00 val., pabaiga – 13:30 val.

Pasitarimo pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas Algirdas Ronkus.

Pasitarimo sekretorė – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zaveckienė.

Pasitarime dalyvavo: UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai Algimantas Plaipa, projekto vykdymo priežiūros vadovas Žaimantas Pastarnokas (MB „Žaimis“), statybos techninės priežiūros vadovas Nedas Sprainaitis, AB Lietuvos automobilių kelių Turto ir veiklos valdymo departamento vietinė reikšmės kelių skyriaus statybos priežiūros vadovas Antanas Proberkas.

1. SVARSTYTA. 2023 m. spalio 6 d. UAB „Telšių keliai“ raštas Nr. TKS-156 „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 6 d. gavo UAB „Telšių keliai“ raštą „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“ (raštas pridedamas). Rašte Rangovas informuoja, kad PK 7+36, rytinėje Laukų g. gatvės pusėje, lygiagrečiai grioviui yra gatvelės, kurios dėl grunto paplovimo pavojingai susiaurėja. Siekiant užtikrinti remontuojamo kelio ir pasijungiančių gatvelių dangos ir kelkraščių stabilumą, Rangovas siūlo pralaidos galuose įrengti sparninius antgalius. Įrengus antgalius pagerėtų eismo saugumo situacija, pralaidos zonoje praplatėtų kelio danga, nebebūtų plaunami šlaitai, pralaida būtų apsaugota nuo grunto užnešimo.

A. Proberkas pasakė, kad sprendimas geras.

A. Plaipa dar papildė, kad tuo pačiu raštu informavo, kad dėl arti esančių privačių sklypų, kurie daugelyje vietų ribojasi su gatvės kelkraščiais, nėra galimybės įrengti pakelės griovius, o nuovažose - pralaidų vamzdžius. Pralaidas tikslinga ir pagal faktinę situaciją reikalinga rengti Pk 6+92 kairėje pusėje ir Pk 7+80 kairėje pusėje.

Esami vakuuminių buitinių nuotekų tinklų signalizacijos/duomenų perdavimo vamzdžiai (raudoni PE d40) pakloti projektiniame žemės sankasos įrengimo aukštyje. Rengiant žemės sankasą šiuos vamzdžius būtina įgilinti. Teikdamas pasiūlymą Rangovas šių darbų negalėjo numatyti.

A. Ronkus pasakė, kad dėl pralaidų viskas gerai. Darome tiek kiek reikia, atsižvelgiant į faktinę situaciją. Dėl vamzdžių/kabelių įgilinimo, manome, kad Rangovas galėjo numatyti, kad tokia situacija galima, nes praktiškai visuose objektuose ji kartojasi, visi Rangovai su tuo susiduria.

NUSPŲSTA:

- 1) PK 7+36 esančių pralaidų galuose įrengti sparninius antgalius.
- 2) Pralaidas per nuovažas įrengti Pk 6+92 kairėje pusėje ir Pk 7+80 kairėje pusėje.
- 3) Vamzdžių/kabelių įgilinimo darbų kiekiai yra didesni nei Sutartyje numatyti, tačiau neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, todėl nelaikomi papildomais darbais (sutarties Nr. AS-1222 15.3 punktas).
- 4) Rangovas turi paruošti darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir pateikti Užsakovui.

2. SVARSTYTA. Dėl PK 12+00 kairėje pusėje esančios nuvažos į Laukų g. 24

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

E. Zaveckienė informavo, kad į Užsakovą kreipėsi Laukų g. 24 gyventojas, kuris susirūpino, kad negalės išsukti iš savo kiemo, dėl kelio susiaurinimo toje vietoje, nes vairuoja ilgą sunkią mašiną (tralą). Gyventojas buvo informuotas, kad nuvaža nesusiaurės, tačiau Rangovas susirūpino, ar nereikėtų trinkelų dangos, numatytos šioje nuvažoje pagal projektą, pakeisti į asfaltbetonio dangą.

A. Proberkas pasakė, kad mintis gera. Trinkelės reikėtų palikti iki nuvažos, o nuvažą išasfaltuoti.

A. Plaipa paprašė Žaimanto Pastarnoko pabraižyti nuvažą (pridedama).

NUSPRESTA:

- 1) Nuvažą PK 12+00 kairėje pusėje asfaltuoti.
- 2) Rangovas turi paruošti darbų pakeitimo aktą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir pateikti Užsakovui.

PRIDEDAMA. 2023 m. spalio 6 d. UAB „Telšių keliai“ raštas Nr. TKS-156 „Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo“.

Posėdžio pirmininkas

Algirdas Ronkus

Posėdžio sekretorė

Edita Zaveckienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Klaipėdos rajono, Dovylių sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinio remonto darbų eigos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-16 Nr. ST3-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 14:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 17:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 10 06 TKS-156 Dėl pralaidų antgalių ir kabelių įgilinimo.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-17 nuorašą suformavo Editą Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 002 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**Statinyss 2 KLAIPĖDOS RAJONO, DOVILŲ SEN., KULIŲ K., LAUKŲ G. (KL0423) KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 5 Kalkuliacija Nr. 3**

				Suma žiniaraščiui	514.33 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 3					
1	N57P-4208	m3		1,0		
	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,40000	11,40000	10,61	120,95
120030	Statybinės vinys	kg	0,840000	0,840000	1,74	1,46
120341	Plieninė viela	kg	0,030000	0,030000	1,25	0,04
230451	Specialus tepalas klojiniams	l	0,280000	0,280000	5,99	1,68
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,104000	0,104000	316,80	32,95
600050	Betono mišiniai C30/37	m3	1,01500	1,01500	124,96	126,83
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,440000	0,440000	40,57	17,85
489192	Vibratorius	maš.val	0,500000	0,500000	0,58	0,29
N57P-4208	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
Viso žiniaraštyje 5	Darbo užm. 120.95 Medžiagos 162.96			Mechanizmai 18.14		Iš viso 302.05
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			4,89		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,54	
	Sezoniniai darbai 15.00% (120.95)		18,14			
	Specifiniai darbai 17.00%		2,42			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(120.95+18.14+2.42)		11,32			
	Viso:		152,83	167,85	18,68	339,36
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(120.95+18.14+2.42+11.32)		2,74			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	155,57	167,85	18,68	342,10
	Statybvietės išlaidos 9.00%					30,79
	Iš viso tiesioginės išlaidos					372,89
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(120.95+18.14+2.42+11.32)					31,94
	Pelnas 5.00%(372.89+31.94)					20,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos					52,18
	Bendra vertė be PVM					425,07
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					89,26
	Bendra vertė su PVM					514,33

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------







DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Telšių keliai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Laukų g Papildomų nevykdomų darbų aktas Nr 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-06 Nr. A32-3012
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Plaipa Direktorius pavaduotojas gamybai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 10:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 10:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-04 17:02 - 2026-02-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Laučys Statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 13:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 13:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 11:43 - 2028-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žaimantas Pastarnokas PDV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 14:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 14:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:27 - 2028-03-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nedas Sprainaitis Techninės priežiūros inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-30 18:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-30 18:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-28 18:01 - 2027-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 10:54 - 2024-10-09 10:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 13:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Papildomų - nevykdomų darbų lokalinė sąmata (Pralaidos).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Pralaidos antgalių įrengimo schema.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 2023-10-10 Pasitarimo protokolas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 3.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5 Fotofiksacija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-07 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dovylių sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-09 Nr. A6-473
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 13:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 14:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Beliokaitė Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 08:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 10:00 - 2026-05-09 10:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Laukų g. Papildomų-nevykdomų darbų aktas Nr. 2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-10 nuorašą suformavo Edita Zaveckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 2 prie 2023-07-11 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS – 1222 (pirkimo nr. 649248)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-14 Nr. AS-2346
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Zaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 09:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 09:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-18 04:46 - 2025-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 09:52
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-14 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 12:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 12:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 10:08 - 2026-04-24 10:08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 11:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-14 11:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 17:17 - 2025-01-04 17:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Laukų g. Papildomų-nevykdomų darbų aktas Nr. 2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	202311_Susitikimas protokolas_nuorašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas	Elpako v.20231103.1

elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-18 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
