

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

DONATAS RIŠKUS

2024-11-07 15:45:19 GMT+2

Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

ARŪNAS DIRVINSKAS

2024-11-08 09:15:09 GMT+2

Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

VYTAUTAS VILKAS

2024-11-08 12:46:04 GMT+2

Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024 m. lapkričio 7 d.	Susitarimo Nr.	PS 2024-97-1
Sutarties pavadinimas	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO – KIEMO AIKŠTELĖS, ESANČIOS JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., STATYBOS DARBAI		
Sutarties data	2024 m. spalio 16 d.	Sutarties Nr.	PS 2024-97
Užsakovas	UAB „Toksika“		
Rangovas	UAB „Limega“		
Susitarimo pagrindas:	Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 15.9.2., 15.9.3. ir 25.4. punktais. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurie būtini sutarčiai įvykdyti, pagal pridedamą lokalinę sąmatą (priedas Nr. 2). 2) Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už papildomus darbus, Sutarties 15.9.3. punkte nustatyta tvarka. Papildomų darbų vertė – 23 930,69 EUR su PVM. 3) Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja, kol galioja Sutartis. 4) Susitarime galioja visos pagrindinės Sutarties nuostatos.		
Sutarties kaina po Susitarimo	149.730,46 EUR		
Darbų terminai po Susitarimo	nekinta		
Susitarimo priedai:	Priedas Nr. 1 – 2024-10-23 d. Rangovo raštas dėl papildomų darbų ir išlaidų kompensavimo Nr. S-413/G-427. Priedas Nr. 2 – Lokalinė sąmata.		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas:
UAB „Toksika“
Juridinio asmens kodas 244670310
PVM mokėtojo kodas LT446703113
Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius
Tel. +370 5 2505302
El. paštas: vilnius@toksika.lt
Banko sąskaitos Nr. LT907300010002397925
AB bankas „Swedbank“

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

Rangovas:
UAB „Limega“
Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
Kanapių g. 1C, LT-78138 Šiauliai
Tel. +370 41 455798
El. paštas: info@limega.lt
Banko sąskaitos Nr. LT457300010115267450
AB bankas „Swedbank“

Direktorius
Vytautas Vilkas



UAB „Toksika“

2024-10-23 Nr. S-413

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

2024 m. spalio mėn. 16 d tarp UAB „Limega“ (toliau – Rangovas) ir UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas) pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. PS 2024-97, kurioje Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą supaprastintą statybos projektą Nr. PS-240408 vykdyti ir užbaigti objekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statyba“ rangos darbus.

2024 m. spalio mėn. 21 d. pradėjus žemės darbus buvo aptiktas durpių sluoksnis esantis žemiau suprojektuotos žemės sankasos (Priedas Nr.1). Remiantis IT ŽS 17, durpės priskiriamos prie silpnųjų gruntų – mažos laikomosios galios gruntai, iš kurių įrengus žemės sankasą galimi nusėdimai ir kitos deformacijos. Tą pačią dieną buvo sukviesta komisija objekto apžiūrai, surašytas objekto apžiūros aktas (Priedas Nr.1), iškasus šurfus UAB „Altagis“ geodezininko sumatuotas ir apskaičiuotas reikalingo iškasti durpių sluoksnio ir užpylimo smėlingu gruntu kiekis (Priedas Nr.1), paskaičiuota lokalinė sąmata papildomiems darbams atlikti (Priedas Nr.1), kuri yra 29.913,37 eurai su PVM.

Prašome Jūsų kompensuoti papildomų darbų išlaidas būtinas tinkamam tolimesnių projektinių sprendinių įgyvendinimui kuo skubiau priimant sprendimą ir neįtraukti į statybos rangos sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą laikotarpio nuo rašto išsiuntimo dienos, tai yra nuo 2024-10-23 iki sprendimo priėmimo dienos, kadangi be durpių sluoksnio pakeitimo tinkamu gruntu tolimesni darbai nėra galimi.

Pridedama:

Priedas Nr.1 - 2024 m. spalio mėn. 21 d. objekto apžiūros akto nuorašas (9 lapai).

Technikos direktorius

Paulius Mačernis

Originalas siunčiamas nebus

Ruošė: projektų vadovas Laimonas Jankus (tel. 8 618 41083)

Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiaulini,
Tel.: (8-41) 45 57 98,
Faks.: (8-41) 55 06 57,
El. p. info@limega.lt

Įmonės kodas 145407247,
PVM kodas LT454072410,
AB „Swedbank“, b.k. 73000,
A.s. LT 457300010115267450.

Objektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statyba

Statybos rangos sutartis: 2024 m. lapkričio mėn. 16 d. Nr. PS 2024-97

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS

2024-10-21

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo UAB „Toksika“ Šiaulių aikštelės vadovo Donato Riškaus, techninės priežiūros vadovo Justino Kerėžiaus ir Rangovo atstovo UAB „Limega“ statinio statybos vadovo Laimono Jankaus, apžiūrėjusi kiemo aikštelę, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav. nustatė:

Pradėjus žemės darbus buvo aptiktas durpių sluoksnis (Priedas Nr.1) esantis žemiau suprojektuotos žemės sankasos. Remiantis IT ŽS 17, durpės priskiriamos prie silpnųjų gruntų – mažos laikomosios galios gruntai, iš kurių įrengus žemės sankasą galimi nusėdimai ir kitos deformacijos. UAB „Altagis“ geodezininkui atlikus matavimus (pagal iškastus šurfus) ir paskaičiavus esamų durpių tūrius (Priedas Nr.2) nustatytas jų kiekis (677 m^3), kuriam paskaičiuota lokalinė sąmata (Priedas Nr.3).

Komisija siūlo:

Iškasti esamą durpių sluoksnį ir užpilti smėliu. Papildomų darbų aktas dėl nenumatytų darbų suforminamas 2024 m. lapkričio mėn. 16 d. Statybos rangos sutarties Nr. PS 2024-97 Bendrųjų sąlygų 15.8. skyriuje nustatyta tvarka.

Pridedama:

Priedas Nr.1 – Nuotraukos (5 lapai);

Priedas Nr.2 – Iškasos tūrio paskaičiavimas (1 lapas);

Priedas Nr.3 – Lokalinė sąmata (1 lapas).

Užsakovo atstovas Donatas Riškus

Techninės priežiūros vadovas Justinas Kerėžiaus

Rangovo atstovas Laimonas Jankus










Priedas Nr.2

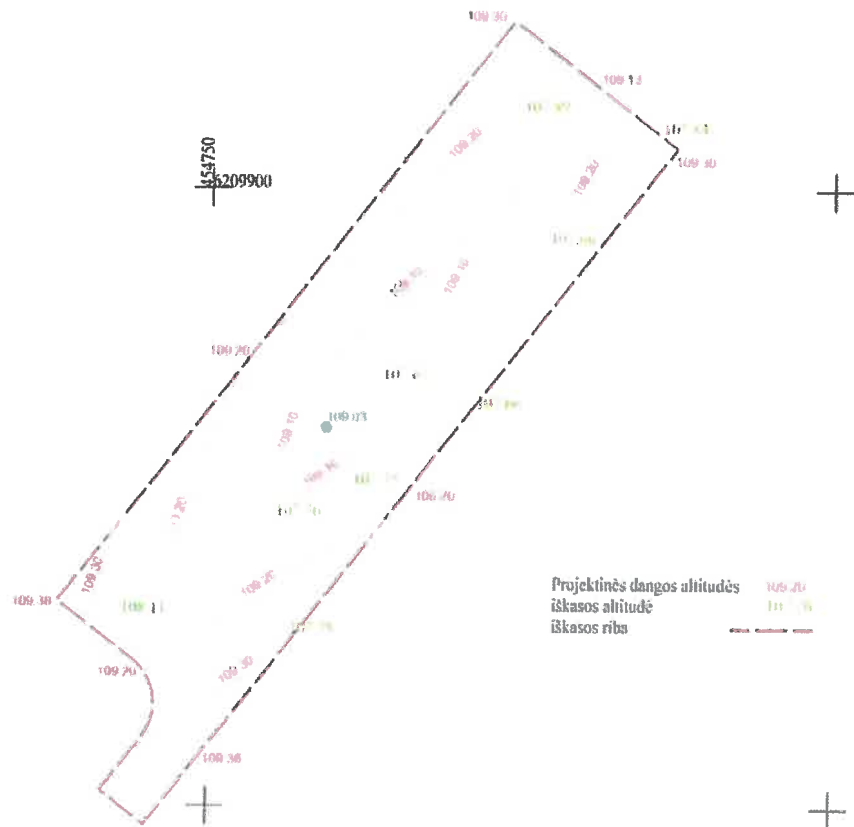

Vidutinė projektinė dangos altitudė 109,24 m
vidutinė projektinė iškaskos altitudė $109,24 - 0,80 = 108,44$ m
vidutinė iškaskos altitudė 107,79 m
iškaskos plotas 1041 m²
iškaskos tūris $108,44 - 107,79 \times 1041 = 677$ m³

 Dubijos g.11-18, LT-77145 Šiauliai Tel. +37041553333, el. paštas: altagis@altagis.lt		IŠKASOS TŪRIO PASKAIČIAVIMAS M1:500		
		Užsakovas: UAB "Limega"		
Lapo Nr.: 1		Viso lapų: 1	Direktorius Albinas Tamoliūnas	
OBJEKTAS	Šiaulių r.sav., Jurgeliškių k.10, automobilių stovėjimo aikštelės statyba			
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LÄS07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IOK-V-602			A.V.
	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	
	Viktoras Medišauskas		2024-10-21	

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2024 M. _____ MĖN. ____ D.

2024 M. _____ MĖN. ____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas 24-1201 Toksika UAB. Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šilaučių r. sav., statybos darbai

Objektas 1 Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šilaučių r. sav., statybos darbai

Žinlaraštis 1 Bendrieji statybos darbai. Papildomi durpių iškasimo ir užpylimo smėliu darbai

2024.10.21		Suma žinlaraščiui		29913,37 EUR		
Sqm. ail.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi durpių iškasimo ir užpylimo smėliu darbai						
1	N1-72	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t m3	0,677	5754,279	3895,85
2	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas įkainis pritaikytas	100m3	8,77	3078,2398	20826,14
Skyriuje 1						24721,79
Žinlaraštyje 1						24721,79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5191,58
Iš viso žinlaraštyje 1						29913,37

SUDARĖ:

Adomas...
Tadas...


SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2024 M. _____ MEN. _____ D.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2024 M. _____ MEN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas 24-1201 Toksika UAB. Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statybos darbai

Objektas 1 Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statybos darbai

Žiniaraštis 1 Bendrieji statybos darbai. Papildomi durpių iškaskimo ir užpylimo smėliu darbai

2024.10.18		Suma žiniaraščiui		23930,69 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi durpių iškaskimo ir užpylimo smėliu darbai						
1	N1-72	il grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t. m3	0,677	4603,423	3116,52
2	N27-20	Pagrindų ištyginamųjų ir paruošiamųjų pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas* (kainis pritaikytas	100m3	6,77	2460,9917	16660,91
Skiriuje 1						19777,43
Žiniaraštyje 1						19777,43
Pildoma vertė nuomos 21,00%						4143,28
Iš viso žiniaraštyje 1						23930,69

SUDARĖ

