

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024 m. lapkričio ____ d.	Susitarimo Nr. 3	S1-						
Sutarties pavadinimas	Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai								
Sutarties data	2023 m. birželio 15 d.	Sutarties Nr.	S1-609						
Užsakovas	Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus								
Rangovas	UAB „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus								
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.1 punktas, 25.2 punktas, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Darbų pakeitimo aktas Nr. 3								
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 25 straipsnio nuostatas, atsiradus būtinybei atlikti Darbų pakeitimo akte Nr. 3 nurodytus papildomus darbus bei keisti darbų apimtį (kiekius), atitinkamai koreguojami Sutarties Specialiųjų sąlygų punktai Nr. 7.1. ir 7.2.: <table><tr><td>7.1.</td><td>Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)</td><td>2 184 368,54</td></tr><tr><td>7.2.</td><td>Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)</td><td>1 805 263,26</td></tr></table> Kiti sutarties punktai nekeičiami.			7.1.	Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	2 184 368,54	7.2.	Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	1 805 263,26
7.1.	Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	2 184 368,54							
7.2.	Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	1 805 263,26							
Sutarties kaina po Susitarimo	1 805 263,26 EUR be PVM								
Darbų terminai po Susitarimo	Sutarties terminas nekeičiamas								
Susitarimo priedai:	Darbų pakeitimo aktas Nr. 3								

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Rangovas

UAB „Telšių keliai“ direktorius

Arnas Knystautas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Telšių keliai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas prie 2023 m. birželio 15 d. sutarties Nr. S1-609
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-02 Nr. S1-1098
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-29 14:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-29 16:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-02 08:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DarbuPakeitimoAktasNr.3 (1) (1).adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241128.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-06 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

TVIRTINU:
Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Telšių keliai“

Sutarties Nr.: S1-609 (2023-06-15)

Sutarties pavadinimas: „Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai“

Darbų pabaigos data: 2025-06-15

Pradinė Sutarties vertė: 1.712.661,23 Eur be PVM

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 3

2024 m. _____ mėn. ____ d.

Komisija, susidedanti iš:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjos

Sigutės Jazbutienės;

UAB „Mūsų paslaugos“ techninės priežiūros vadovo

Edgaro Šiupario;

AB „Panevėžio statybos trestas“ projekto vykdymo priež. vadovo

Mindaugo Gaigalo;

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovo

Arno Knystauto,

išnagrinėjusi Rangovo pateiktus dokumentus, apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė faktines aplinkybes:

1. Išvažiavimas iš Vytauto g. į kelią Nr. A11 numatytas tik ties „Viada“ degaline. Pagal AB „Via Lietuva“ sąlygas ir projekto sprendinius esamo aklakelio paskirtis – privažiavimo į esamus sklypus/ aptarnaujanti gatvė. Dėl eismo saugumo iš aklakelio nebenumatoma galimybė išvažiuoti į kelią Nr. A11. Numatyta, kad likęs tarpas tarp kelio Nr. A11 ir akligatvio, kuris priklauso AB „Via Lietuva“, savininko bus rekultyvuotas ir įrengta veja.

2. Tarp dviračio tako ir šaligatvio, siekiant atskirti dangas ir suformuoti aukščių skirtumą, projekte numatytas kelio bortas. Daugėjant dviračių takų rinkoje atsirado naujas gaminys – „velobortas“ – t.y. vejos bortas su viena užaukštinta kraštine. „Veloborto“ kaina ne didesnė negu vejos borto, t.y. šis bortas ženkliai pigesnis už kelio bortą ir pritaikytas dangų atskyrimui ir aukščio skirtumo suformavimui.

3. Atlikus statybos darbus susidarė projekte numatytų ir nevykdomų darbų ir papildomai vykdomų darbų kiekių.

Šie klausimai buvo apsvarstyti 2024 m. spalio 25 d. vykusiame statybos dalyvių pasitarime, ankstesniuose pasitarimuose. Pasitarimų metu nutarta:

- siekiant užtikrinti eismo saugumą, tikslinga Vytauto g. akligatvio gale (ties riba su keliu Nr. A11) įrengti kelio atitvarus (apie 8 m);
- vietoj numatyto kelio borto, dviračio tako ir šaligatvio atskyrimui rengti „velobortą“;
- parengus geodezinę išpildomąją nuotrauką, pagal gautus faktinius kiekius, rangovas parengia vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius.

Papildomų darbų kaina (Priedas Nr. 1 *Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3*) apskaičiuota pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3. punkto nuostatas, kai taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai. Nesant įkainių Sutartyje, įkainiai paskaičiuoti pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3.4. punkto nuostatą (kainos skaičiavimo kalkuliacija pridedama, Priedas Nr. 2): „*įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos...*“.

Komisija, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus ir faktines aplinkybes, vadovaujantis:

- Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.1 punkto nuostata „*Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.*“;
- Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.2. punkto nuostata „*Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPI 89 straipsnyje ir PI 97 straipsnyje nurodytos vertės.*“;
- Lietuvos Respublikoje galiojančiais reglamentais šiuo pakeitimu atliekami TDP sprendinių keitimai yra laikomi neesminiu statinio projekto pakeitimu, todėl statybos darbų leidimo tikslinimas yra nereikalingas, pakeitimu pagerinama statinio kokybė, pakeitimas neturės įtakos TDP išpildymui, darbai yra būtini tinkamam projekto įgyvendinimui,

pritaria Darbų pakeitimo akte Nr. 3 nurodytų papildomų darbų vykdymui.

Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė (Papildomi darbai): 9.716,31 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimai	Darbų Pakeitimo vertė, Eur (be PVM)	Neatliekamų darbų vertė, Eur (be PVM)	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė (Darbų pakeitimai Nr. 1 ir Nr. 2)	62.904,70	-19.981,02	82.885,75
Darbų pakeitimas Nr. 3	9.716,31	-10.798,53	20.514,84
Iš viso:	72.621,01	-30.779,55	103.400,59

Atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 25 nuostatas, atsiradus būtinybei atlikti Darbų pakeitimo akte Nr. 3 nurodytus papildomus darbus, atitinkamai koreguojama Sutarties Specialiųjų sąlygų punkte Nr. 7 nurodyta Sutarties kaina:

Sutarties kaina iki Darbų pakeitimo akto Nr. 3: 1.795.546,95 eurų be PVM;

Sutarties kaina po Darbų pakeitimo akto Nr. 3: 1 805 263,26 eurų be PVM.

Papildomi darbai apmokami Užsakovo lėšomis.

Darbų pakeitimo akte Nr. 3 papildomų darbų atlikimui papildomas terminas nesuteikiamas, darbų vykdymo grafikas nekeičiamas.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti. Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 sudaromas bei pasirašomas elektroniniu parašu adoc formatu ir yra laikomas sudėtine Rangos sutarties S1-609 (2023-06-15) dalimi.

Priedama:

Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3

Priedas Nr. 2 Kainos skaičiavimo kalkuliacija (atitvarų įrengimas)

Priedas Nr. 3 Papildomi-nevykdomi darbai Susisieikimo dalis

Priedas Nr. 4 Nevykdomi darbai LN dalis

Priedas Nr. 5 Pasitarimo protokolai D8-2509 20241025

Priedas Nr. 6 Dangių išpildomoji

Priedas Nr. 7 LN išpildomoji

Komisija:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Sigutė Jazbutienė

UAB „Mūsų paslaugos“ techninės priežiūros vadovas

Edgaras Šiuparis

AB „Panevėžio statybos trestas“ projekto vykdymo priež. vadovas

Mindaugas Gaigalas

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovas

Arnas Knystautas

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Telšių keliai"

Objektas: Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos

Sutarties Nr., data: S1-609, 2023-06-15

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Žiniaraštis 6 PAPILDOMI - NEVYKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 3

Suma žiniaraščiui: 2 541,00 EUR su PVM

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR	
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
PAPILDOMI DARBAI						
	5.	KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS				
	Kalkuliacija Nr. 6	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 2.0 m) k9=1.15	m	8,0	262,50	2 100,00
		Skyriuje 5.				2 100,00
		Viso papildomi darbai:				2 100,00
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				2 100,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				441,00
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				2 541,00

Sudarė : S. Ignatas

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statiny's 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 9 Kalkuliacija Nr. 6

Suma žiniaraščiui 317.63 EUR						
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 6					
1	N57P-5101	10m		0,1		
	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 2.0 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	6,6	0,66	11,95	7,89
572552	Kelio atitvarų elementai (vienpusiai, metal., kai atstumastarp statr. 2,0 m)	m	10,0	1,0	203,42	203,42
600043	Betono mišiniai	m3	0,35	0,035	112,31	3,93
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,18	0,018	42,85	0,77
489135	Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje	maš.val	0,6	0,06	50,54	3,03
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,4	0,04	0,58	0,02
N57P-5101	Darbo užm. 7.89 Medžiagos 207.35			Mechanizmai 3.82		Iš viso 219.06
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 7.89 Medžiagos 207.35			Mechanizmai 3.82		Iš viso 219.06
Viso žiniaraštyje 9	Darbo užm. 7.89 Medžiagos 207.35			Mechanizmai 3.82		Iš viso 219.06
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			6,22		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,11	
	Sezoniniai darbai 15.00% (7.89)		1,18			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7.89+1.18)		0,73			
	Viso:		9,8	213,57	3,93	227,3
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7.89+1.18+0.73)		0,18			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	9,98	213,57	3,93	227,48
	Statybvietės išlaidos 9.00%					20,47
	Iš viso tiesioginės išlaidos					247,95
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(7.89+1.18+0.73)					2,05
	Pelnas 5.00%(247.95+2.05)					12,5
	Iš viso netiesioginės išlaidos					14,55
					Bendra vertė be PVM	262,5
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					55,13
					Bendra vertė su PVM	317,63

Sudarė :
/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Telšių keliai"

Objektas: Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su Sutarties Nr., data: S1-609, 2023-06-15

PAPILDOMŲ-NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMO DALIS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		NEVYKDOMI DARBAI				
		1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
16	N7P-0806	Demontuojama metalinė tvora	m	-30,2	6,70	-202,34
		Iš viso:				-202,34
		3 DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
45	7-	Bortai:				
49	N57P-3601	Projektuojami skelti betoniniai bortai 100.15.22 ant betoninio pamato C12/15 (GBI 22-5)	100m	- 3,32	2686,07	-8917,75
		Iš viso:				-8917,75
		Iš viso Nevykdomi darbai:				-9120,09
		PAPILDOMI DARBAI				
		3 DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
45	7-	Bortai:				
47	N57P-3605	Projektuojami granitiniai bortai 100.15.30 ant betoninio pamato C20/25	100m	0,75	5583,00	4187,25
51	N57P-3601	Betoniniai bortai 100.20.8 ant betoninio pamato C12/15 (JB 1-20)	100m	5,18	1476,79	7649,77
52	8-	Šaligatvių įrengimas:				
53	N57P-3241	Betoninės trinkelės 200x100x80	100m ²	0,81	2835,00	2296,35
66	10-	Stovėjimo aikštelė iš trinkelų dangos:				
67	N57P-3241	Betoninės trinkelės 200x100x80	100m ²	0,35	2835,00	992,25
71	11-	Vidinio žiedo įrengimas:				
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m ²	0,31	9264,90	2872,12
		Iš viso:				17997,74
		5 KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS				
1	1-	Atraminės sienutės įrengimas:				
10	N27P-38-1	Segmentinės pėsčiųjų tvorėlės įrengimas	100m	0,0296	14091,18	417,10
		Iš viso:				417,10
		Iš viso Papildomi darbai:				18414,84
				Suma be PVM (Eur):		9294,75
				PVM 21%:		1951,90
				Bendra suma su PVM (Eur):		11246,65

Sudarė:

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Telšių keliai"

Objektas: Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su

Sutarties Nr., data: S1-609, 2023-06-15

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Žiniaraštis 3 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 LIETAUS NUOTEKYNĖ L1				
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-21,69	22,98	-498,44
2	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-28,74	26,68	-766,78
3	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-13,46	30,70	-413,22
						-1678,44
				Suma be PVM (Eur):		-1678,44
				PVM 21%: :		-352,47
				Bendra suma su PVM (Eur):		-2030,91

Statybos darbų objektas: „Vytauto gatvės, Nr. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu A11 Šiauliai-Palanga) rekonstrukcijos projektas“ Nr. CPO126737

Rangos darbų sutartis 2023 m. birželio 15 d. Nr. **S1-609**

M - 2509

PASITARIMAS Nr. 6 DĖL STATYBOS DARBŲ EIGOS

Data:	2024 m. spalio 25 d. 10:00 val.	
Vieta:	Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, Kretinga, nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą	
Dalyviai:	Užsakovas – Kretingos rajono savivaldybės administracija: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja – Sigutė Jazbutienė, Rangovas – UAB „Telšių keliai“: Direktorius pavaduotojas gamybai – Algimantas Plaipa (nuotoliniu būdu) Statybos techninės priežiūros vadovas – UAB „Mūsų paslaugos“ Edgaras Šiuparis nedalyvavo Projekto priežiūros vadovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ Mindaugas Gaigalas (nuotoliniu būdu).	
Tema	Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo darbai ir terminai
1. Sutarties klausimai susiję su objekto vykdomais darbais:		
Svarstyti neesminiai projekto patikslinimai ir papildymai.		
1.1 Išvažiavimas iš Vytauto g. į A11 kelią numatytas tik ties „Viada“ degaline. Pagal AB „Via Lietuva“ sąlygas ir projekto sprendinius esamo aklakelio paskirtis – privažiavimo į esamus sklypus/ aptarnaujanti gatvė. Dėl eismo saugumo iš aklakelio nebenumatoma galimybė išvažiuoti į A11 kelią. Numatyta, kad likęs tarpas tarp kelio A11 ir akligatvio, kuris priklauso AB „Via Lietuva“, savininko bus rekultyvuotas. Kol ši atkarpa nėra rekultyvuota, siekiant užtikrinti eismo saugumą, tikslinga Vytauto g. akligatvio gale (ties riba su A11 keliu) įrengti kelio atitvarus (apie 8 m).	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertina pakeitimus projekto „A“ laidoje, Rangovas rengia darbų kiekių žiniaraštį ir darbų pakeitimą
1.2. Tarp dviračio tako ir šaligatvio, siekiant atskirti dangas ir suformuoti aukščių skirtumą,	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertinta

projekte numatytas kelio bortas. Daugėjant dviračių takų rinkoje atsirado naujas gaminys – velobortas. Veloborto kaina ne didesnė negu vejos borto, t. y. šis bortas ženkliai pigesnis už kelio bortą ir pritaikytas dangų atskyrimui ir aukščio skirtumo suformavimui. Tikslinga vietoj numatyto kelio borto, dviračio tako ir šaligatvio atskyrimui rengti velobortą.		pakeitimus projekto „A“ laidoje, Rangovas rengia darbų kiekių žiniaraštį ir darbų pakeitimą
1.3. Atklikus statybos darbus susidarė projekte numatytų ir nevykdomų darbų ir papildomai vykdomų darbų kiekių. Rangovui parengus geodezinę išpildomąją nuotrauką, pagal gautus faktinius kiekius parengiami papildomai vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiai.	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertina pakeitimus projekto „A“ laidoje, Rangovas rengia papildomai vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį, darbų pakeitimą
1.4. Kadangi darbų metu, atsižvelgiant į faktines aplinkybes, buvo neženkliai keičiami projektiniai sprendiniai, reikalinga parengti projektų dalių „A“ laidas.	Projektuotojas	Projektuotojas, pagal pateiktas išpildomasias nuotraukas, pasitarimų protokolus parengia aktualias projekto dalių „A“ laidas.
2. Pasitarimų protokolai. Pasitarimo protokolai yra išsiunčiamas el. paštu dalyvavusioms šalims derinimui. Jei šalys per 3 d. d. nepateikia pastabų, laikoma, kad protokolas suderintas. Suderintas protokolas, pasirašytas Užsakovo, išsiunčiamas dalyviams.	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja - Sigutė Jazbutienė	Atlikti iki 2024-11-08
3. Protokolą gauna: Užsakovai – Kretingos rajono savivaldybės administracija. Rangovas – UAB „Telšių keliai“: Techninis prižiūrėtojas - UAB „Mūsų paslaugos“ Projektuotojas – AB „Panevėžio statybos trestas“		

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja



Sigutė Jazbutienė




OBJEKTAS: Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai.


SUSISIEKIMO DALIS

Kontrolinis (geodezinis) planas

M1:500



Topografinis planas M 1:500

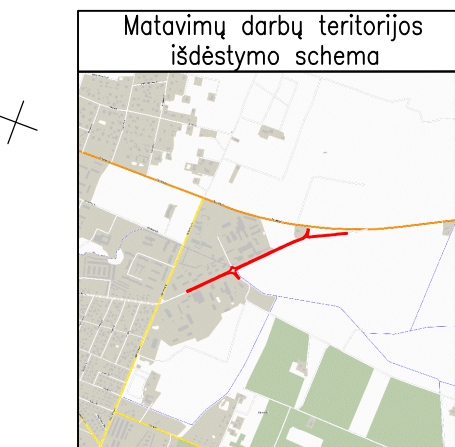

Kelių žiniaraštis			
	Gatvės asfalto danga - 7680.48 m ²		
	Nuvažų asfalto danga - 1290.64 m ²		
	Stovėjimo aikštelės asfalto danga - 883.20 m ²		
	Dviračių tako asfalto danga - 1693.14 m ²		
	Stovėjimo aikštelės trinkelų dangą - 357.85 m ²		
	Trinkelų dangą - 3024.31 m ²		
	Vejos bortai - 3070.02 m.		
	Betoniniai gatvės bortai - 1623.06 m.		
	Granitiniai bortai - 394.20 m.		
	Granitinių trinkelų dangą - 156.90 m ²		
	Tvorelė - 59.96 m.		
	Kelkraštis - 536.10 m ²		
Plano tipas: Topografinis planas - bazinis turinys (išplėtoji nuotrauka)			
Objekto adresas: Vytauto g., Kretingos m.			
Aukštųjų sistema	Koordinatinių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LA507	LKS-94	Horizontalus	iki 10
Kv. pat. Nr.		Varidas, pavardė	Pasiras
UAB "Telsių keliai"		A. Barys	Data
IGKV-1856		Užskaitas	2024.09
Kretingos rajono savivaldybė		Mastelis	1:500
		Lapų Nr.	1
		Lapų sk.	1




OBJEKTAS: Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai.

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Kontrolinis (geodezinis) planas

M1:500


Lietaus nuotekų inžinerinių tinklų planas
M1:500

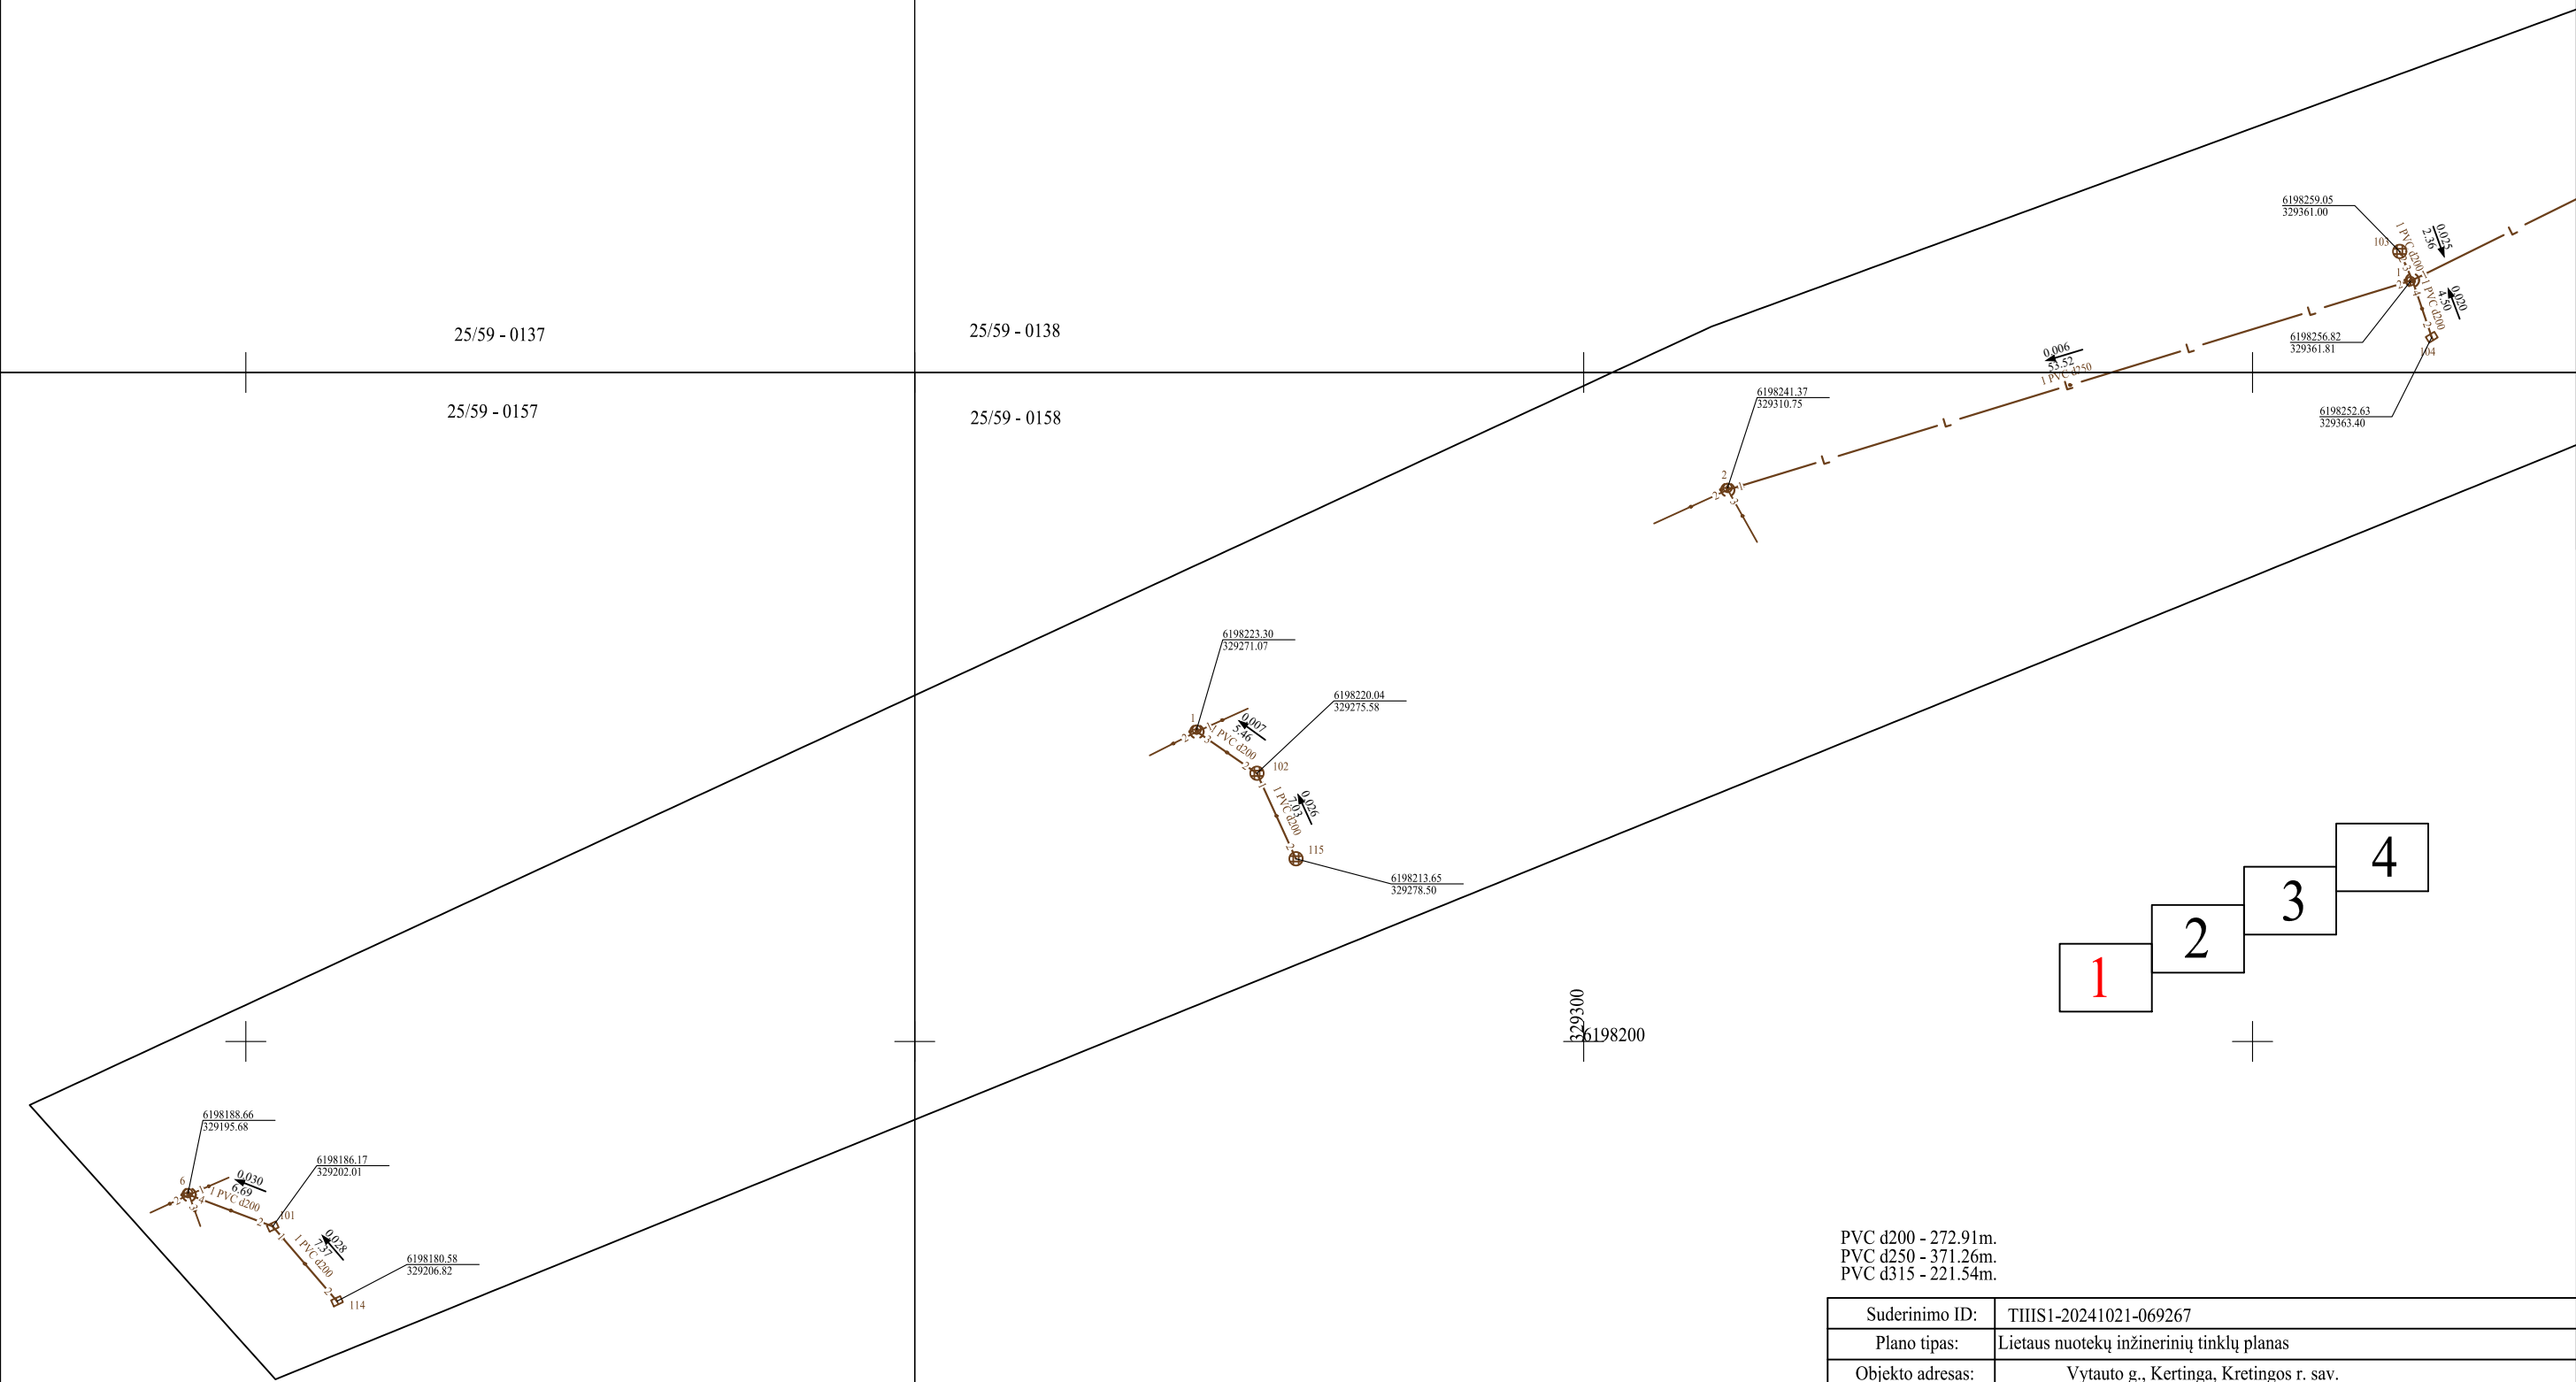


- 1
- 2
- 3
- 4

PVC d200 - 272.91m.
PVC d250 - 371.26m.
PVC d315 - 221.54m.

Suderinimo ID:		TIHS1-20241021-069267				
Plano tipas:		Lietaus nuotekų inžinerinių tinklų planas				
Objekto adresas:		Vytauto g., Kertinga, Kretingos r. sav.				
Aukščių sistema		Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07		LKS-94	Horizontalus:	5	Vertikalus:	5
	Mindaugas.GeoDinamika@gmail.com Tel. 86 852 2548 Mindaugas Eitutis		Minijos g. 42, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.			A.V.
	Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	
	1GKV-1065		Mindaugas Eitutis			
	Užsakovas		Rangovas		Mastelis	
UAB " Žemaitijos ranga"		UAB " Žemaitijos ranga"		1:500	Lapo Nr. 1	Lapų sk. 4

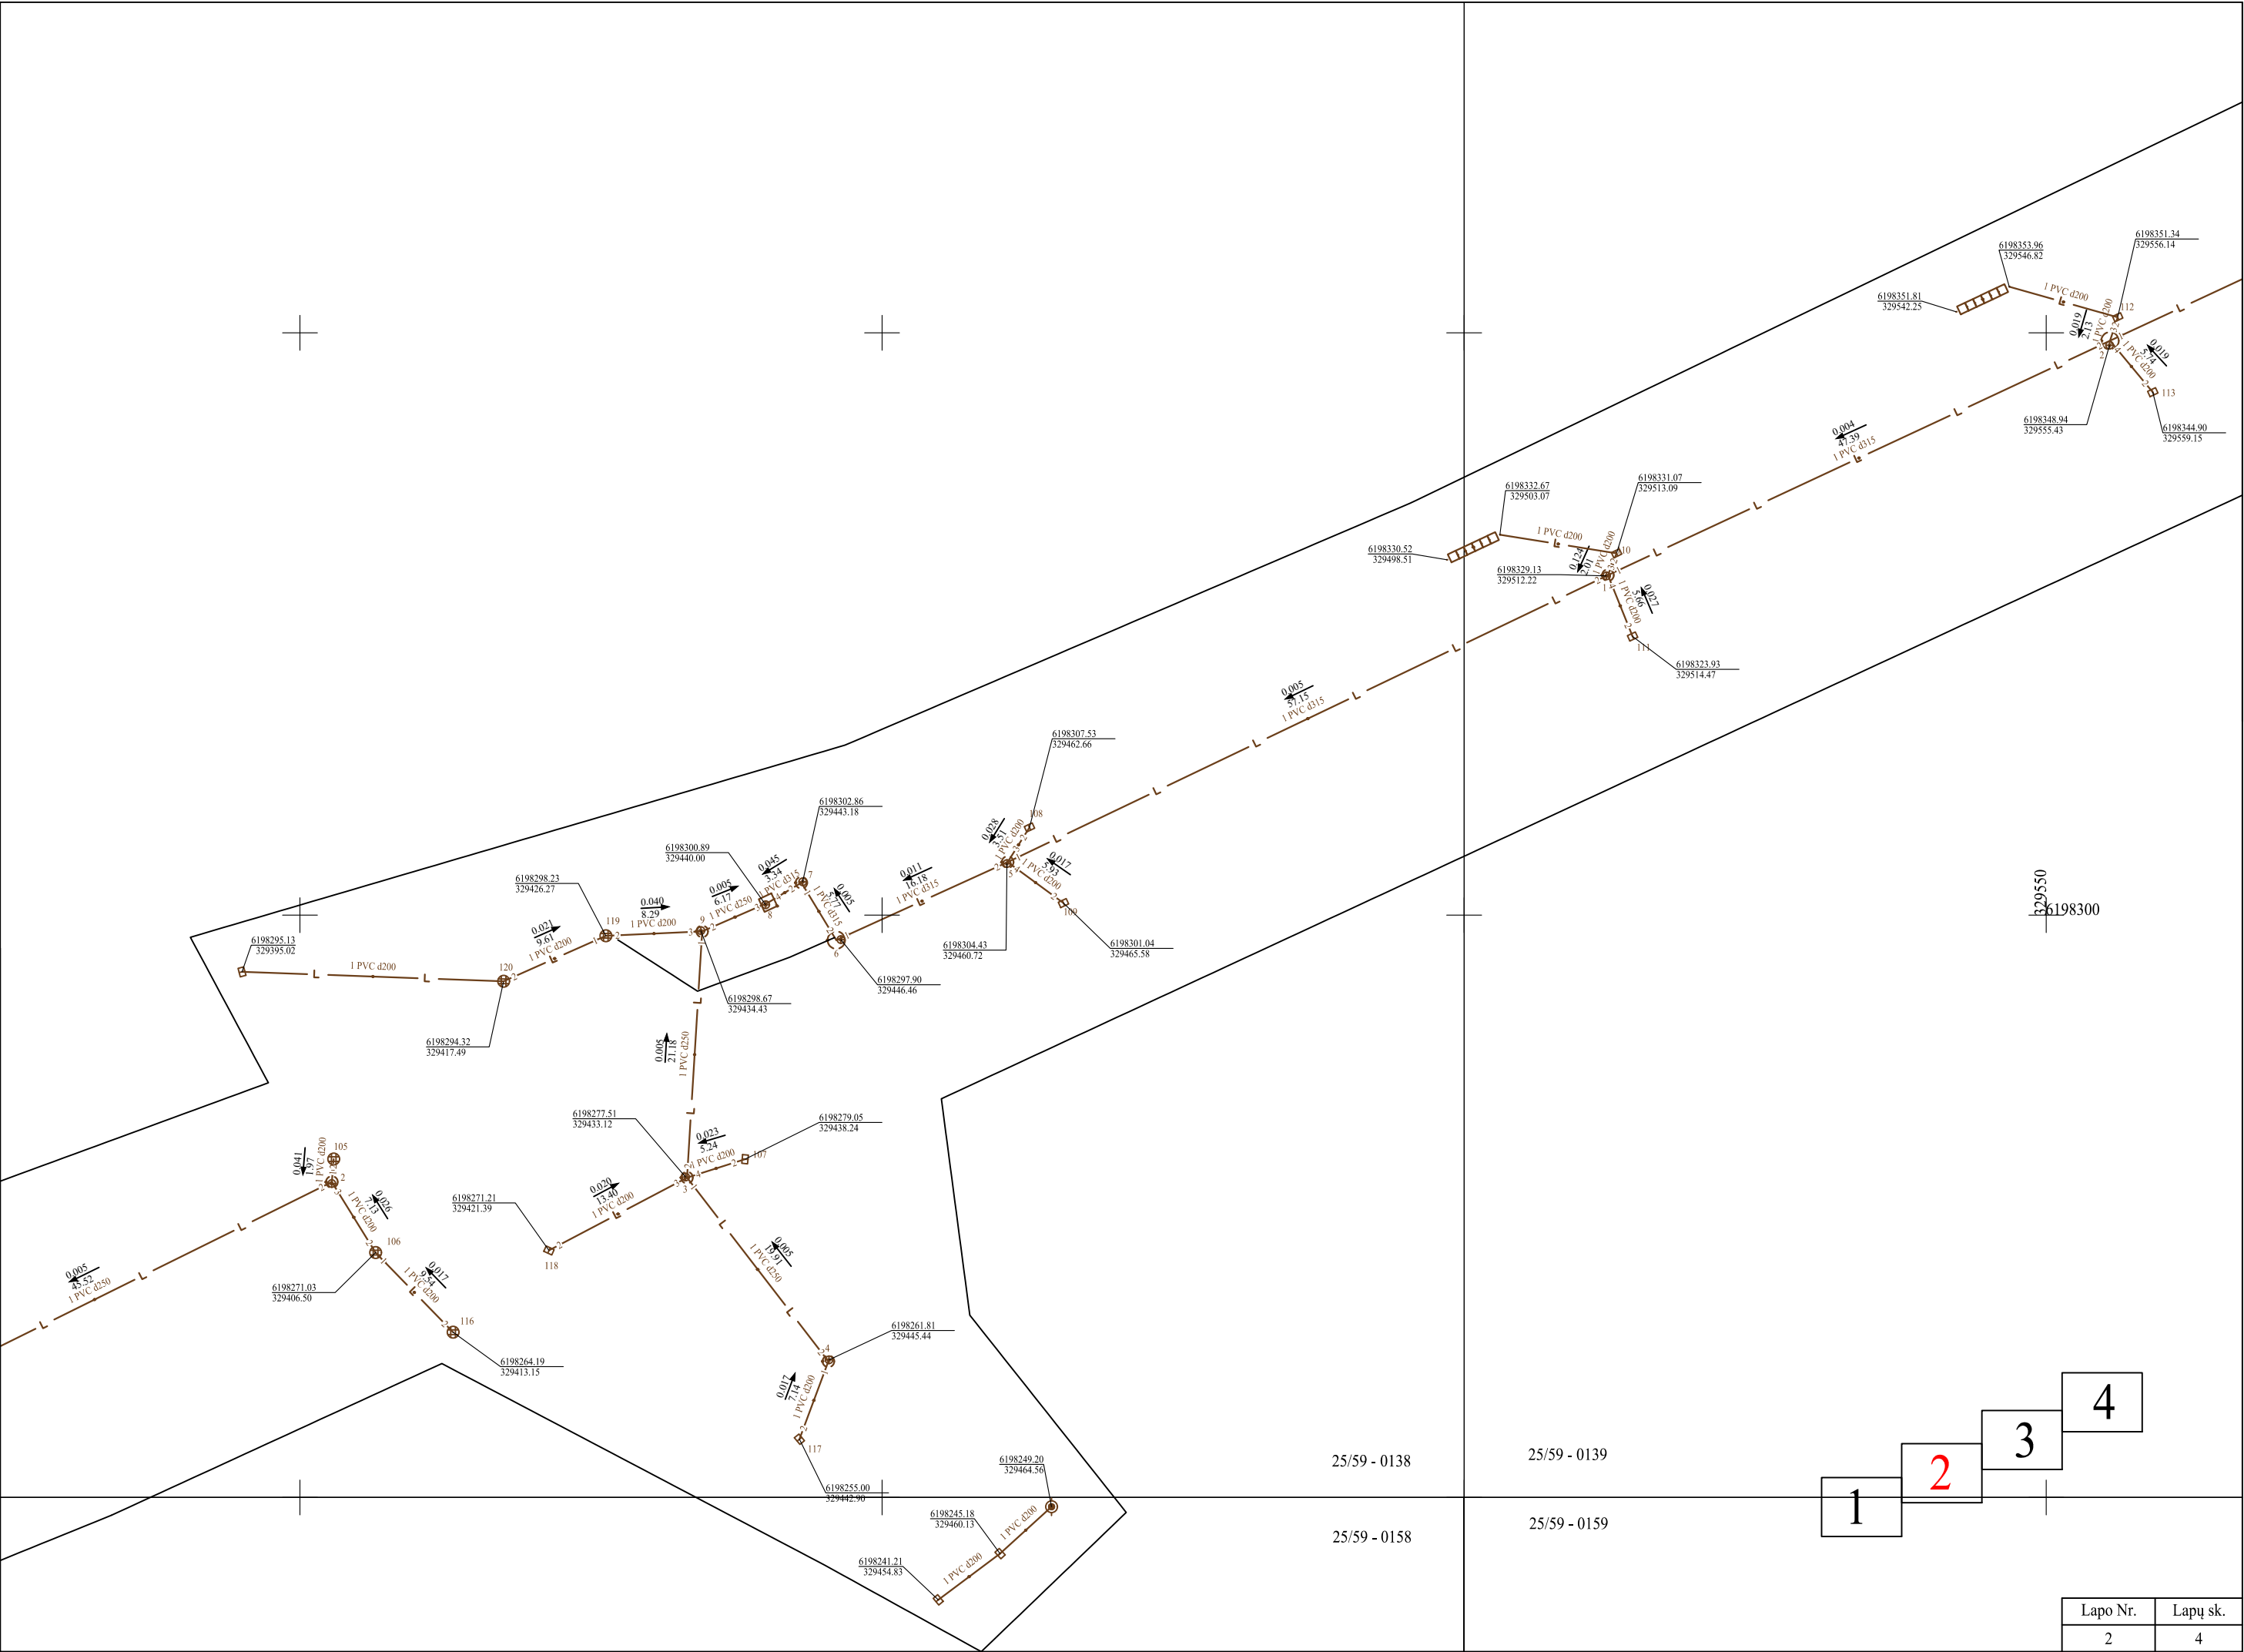

Lapo Nr.	Lapų sk.
2	4

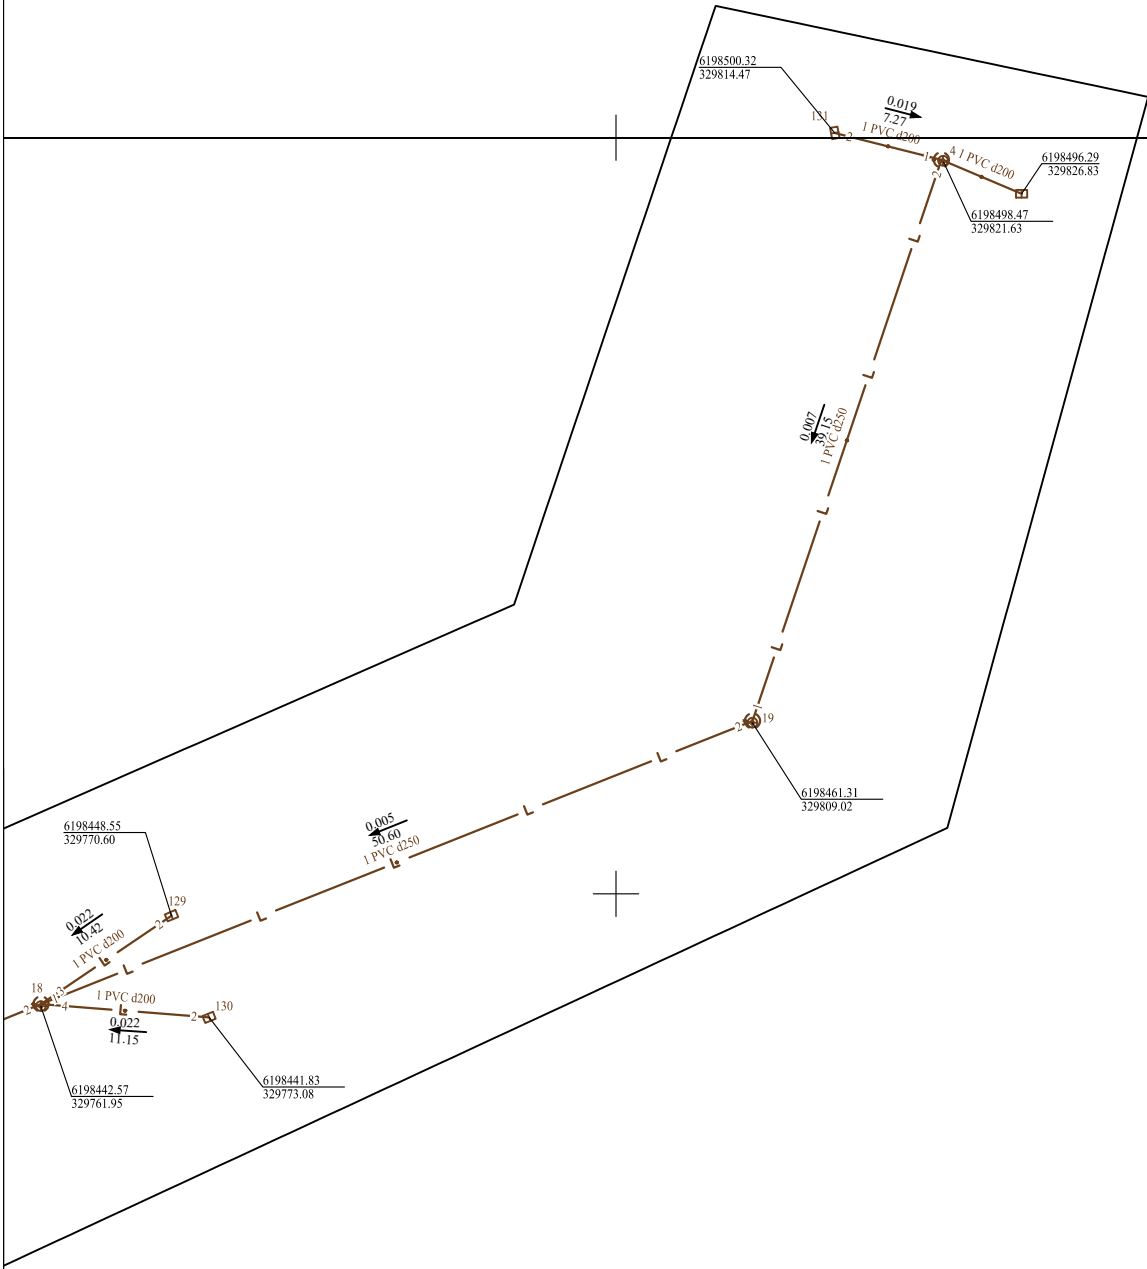

- 1
- 2
- 3
- 4

Lapo Nr.	Lapų sk.
4	4

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 Vytauto g
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-29 Nr. D8-2712
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 16:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-03 14:42 - 2025-02-02 14:42
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edgaras Šiuparis Statybos techninė priežiūra Nr.37411
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 18:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-08 11:21 - 2025-06-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MINDAUGAS GAIGALAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-27 13:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-15 20:12 - 2027-02-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigutė Jazbutienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-27 19:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-30 12:33 - 2027-08-29 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-29 07:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-29 09:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Kainos skaičiavimo kalkuliacija.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 Papildomi-nevykdomi darbai Susisiekimo dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4 Nevykdomi darbai LN dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5 Pasitarimo protokolas D8-2509 20241025.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 6 Dangų išpildomoji.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 7 LN išpildomoji.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-06 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
