

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE

prie 2025 m. rugpjūčio 20 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. VPS-190 dėl Papartynų kelio (Nr. Š-III-71), Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbų

2025 m. lapkričio d. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir **uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama „Susitarimu“.

1. *Pareiškia*, kad:

Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. rugpjūčio 20 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-190 dėl Papartynų kelio (Nr. Š-III-71), Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 723 188,98 Eur (septyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 98 ct) be PVM.

2. Šalys *įvertino aplinkybes*, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 11 punkte.

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu buvo nustatytas poreikis:

2.2.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 6 619,14 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 14 ct) be PVM, 8 009,16 Eur su PVM;

2.2.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 10 918,90 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų 90 ct) be PVM, 13 211,87 Eur su PVM.

2.3. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 727 488,74 Eur (septyni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 74 ct) be PVM, 880 261,38 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt vienas euras 38 ct) su PVM.

2.4. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1, 20.2 ir 20.5 p.

3. Šalys *sutinka ir sutaria*, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 9 p.; 11 p.; 11.2 p.; 11.3 p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.2 p.; 20.5 p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą:

3.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 6 619,14 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 14 ct) be PVM, 8 009,16 Eur su PVM;

3.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 10 918,90 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų 90 ct) be PVM, 13 211,87 Eur su PVM, kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 1,51 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (15 lapų).

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,
Tel. +370 345 60 750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Autokausta“
Juridinio asmens kodas
135007799
Marvelės g. 199B, LT-46204,
Kaunas
Tel. +370 37 397555
El. paštas statyba@autokausta.lt

Direktorius
Juozas Kriauciūnas

(pareigos, vardas pavardė, parašas)
A. V.

Rangovas: UAB „Autokausta“

Sutarties data ir Nr.: 2025-08-20 Nr.VPS-190

Sutarties pavadinimas: PAPARTYŲ KELIO (Š-III-71) ŠAKIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE, MELIORACIJOS TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2025-10-27

Komisija, susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto Rimanto Vaičiūno

Užsakovo atstovo - UAB “101 arklys” techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros

Projektuotojo atstovo – UAB “Atamis” projekto vykdymo priežiūros vadovo Rimvydo Juodkos

Rangovo atstovo - UAB „Autokausta“ Statinio statybos vadovo Justino Jasiulevičiaus

išnagrinėjusi sutarties, konkursinę ir techninę dokumentaciją nustatė, kad:

1. 2025-09-08 buvo organizuota objekto apžiūra (priedas Nr. 2). Atlikus objekto pažiūrą, įvertinus projektinę dokumentaciją ir esamą situaciją, komisija apžiūros akto išvadose teikė siūlymus:
 - Pakloti papildomą vamzdį nuo naujai projektuojamo PE ŠP-600 (D1-6) šulinio iki naujai projektuojamo PE ŠP-600 (D1-10/1) šulinio, kad būtų galimybė surinkti vandenį iš keičiamos pralaidos ties Pk 4+88;
 - Neatlikti projektinių darbų ties 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytomis vietomis (žiūrėti priedą Nr. 2).
2. Projektuotojas, remdamasis Apžiūros akto Nr.1 išvadomis, 2025 10 10 Rangovui pateikė projekto Nr. AT-24S-2232-MD A laidą su atnaujintu darbų kiekių žiniaraščiu (priedas Nr. 3) ir atnaujintu trasos planu (priedas Nr. 4)
3. Rangovas įvertinęs papildomų ir nevykdomų darbų apimtį (priedas Nr. 1) teikia jas Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

atsižvelgiant į aukščiau aprašytas aplinkybes, pateiktus dokumentus, konkursinę bei techninę dokumentaciją, pritarti priede Nr. 3 pateiktiems darbų kiekių tikslinimams bei papildomų ir nevykdomų darbų sąmatai (priedas Nr. 1), pateiktiems sąmatiniams skaičiavimams, pagrįstiems Sutarties 20 punkte numatyta tvarka: pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus darbų įkainius (20.1 punktas), pritaikant preliminariosios Sutarties 2 priede nurodytus Rangovo darbų įkainius (20.2 punktas), įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtines, statybviėtės ir pelno) išlaidas (20.5 punktas).

Papildomų darbų vertė be PVM 10918,90 €;

Nevykdomų darbų vertė be PVM -6619,14 €;

Darbų pakeitimo vertė be PVM 4299,76 €;

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Papildomų ir nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;

Priedas Nr. 2 Apžiūros aktas, 3 lapai;

Priedas Nr. 3 Darbų kiekių žiniaraštis AT-24S-2232-00-TDP-MD.SŽ 0 laidos ir A laidos skirtumai, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 AT-24S-2232-00-TDP-MD-B01 A laidos atstatomų drenazo trasų planas, 2 lapai

Komisija:

Šakių rajono savivaldybės
ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas

Martynas Remeikis

Šakių rajono savivaldybės
žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Rimantas Vaičiūnas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Rimvydas Juodka

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Statinio statybos vadovas

Justinas Jasiulevičius

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Autokasta" (įmonės kodas 135007799)
Pirkimo sutarties Nr.: VPS-190 (2025-08-20)
Sutarties pavadinimas: „Paparčių kėlio (Nr. Š-II-71) Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbai“

NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIAŠČIŠ									
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis 0 laidos	Kiekis A laidos	Skirtumas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Iš kainio pagrindimas	
NEVYKDOMI DARBAI									
Melioracijos darbai									
1.	Drenažo rinktuvai iš PVC vam-džių DN/ID Ø200 mm, SN 8 ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, bei jų užpylimu, gerbuvio atstatymu. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio grunte kasant traktoriumi, vienakausių ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio	m	100	0	-100	31,46	-3 146,00	Darbo projekto detalizavimas	
2.	Drenažo sausintuvai iš PVC gerčiuotų perforuotų vamzdžių DN/ID Ø50/58, SN 4, perforacija ≥ 24 cm2/m su geotekstiles filtru. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio grunte iki 2,0 m gylio	m	124	25,58	-98,420	21,31	-2 097,33	Darbo projekto detalizavimas	
5	PE-SP 600 tipo drenažo šulinii. įrengimas	kompl.	11	9	-2,000	685,28	-1 370,56	Darbo projekto detalizavimas	
10.	Aklių įmontavimas į projektuojamas vietas Ø50	vnt.	20	19	-1,000	5,25	-5,25	Darbo projekto detalizavimas	
						Sklypte	-6 619,14		
						Viso NEVYKDOMI DARBAI:			
						-6 619,14			
PAPILDOMI DARBAI									
Melioracijos darbai									
2.2	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosaviarčius, vežiojimas iki 1km ir darbas savyroje	1000 m3	0	0,266	0,266	2094,77	557,21	Darbo projekto detalizavimas	
2.3	Iškasto grunto transportavimo sraunų pokytis už papildomą 1km atstumą pridėti (prie 2.1 ir 2.2 pozicijų)	1000 m3	0	2,664	2,664	490,70	1 307,22	Darbo projekto detalizavimas	
2.4	Grunto kasimas rankiniais būdu	m3	0	30,00	30	26,85	805,50	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
4.14	I-II grupės grunto tankinimas vibracloksėmis	100 m3	0	0,591	0,591	650,22	384,28	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
4.12	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įe-ngimas	m3	0	19,70	19,7	31,47	619,96	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
3.19	200 mm skersmens plastmasinių įrovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0	1,9676	1,9676	1698,62	3 342,20	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
4.13	Vamzdinių pirminių (apsauginių) u-pylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	0	59,10	59,1	31,47	1 859,88	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
4.7	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0	1,97	1,97	444,98	876,61	Darbo projekto detalizavimas	
2.5	Dirvos paruošimas gezonams medl. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemo	100 m2	0	1,00	1	275,95	275,95	Darbo projekto detalizavimas	
2.6	Paprastų, patertinių ir mauritanišku, gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	0	1,00	1	170,95	170,95	Iš kainis pritaikytas iš preliminaros sutarties	
8.	PE PN-45 tipo drenažo šulinii. įrengimas su žemės darbais	kompl.	8	9	1,00	719,14	719,14	Darbo projekto detalizavimas	
						Viso PAPILDOMI DARBAI:			
						10 918,90			
						Viso NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI:			
						4 299,76			
						PVM			
						902,95			
						Viso NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI su PVM:			
						5 202,71			

Projektų v
Tomas K

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Autokausta" (įmonės kodas 135007799)

Pirkimo sutarties Nr.: VPS-190 (2025-08-20)

Sutarties pavadinimas: „Papartynų kelio (Nr. Š-III-71) Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbai“

NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIAŲ RAŠTIS								
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis 0 laidos	Kiekis A laidos	Skirtumas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Įkainio pagrindimas
NEVYKDOMI DARBAI								
	Melioracijos darbai							
1.	Drenažo rinktuvai iš PVC vamzdžių DN/ID Ø200 mm, SN 8 ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, bei jų užpylimu, gerbūvio atstatymu. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priemolio grunte kasant traktoriumi, vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio	m	100	0	-100	31,46	-3 146,00	Darbo projekto detalizavimas
2.	Drenažo sausintuvai iš PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN/ID Ø50/58, SN 4, perforacija ≥ 24 cm2/m su geotekstilės filtru. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priemolio grunte iki 2,0 m gylio	m	124	25,58	-98,420	21,31	-2 097,33	Darbo projekto detalizavimas
5.	PE-ŠP 600 tipo drenažo šulinių įrengimas	kompl.	11	9	-2,000	685,28	-1 370,56	Darbo projekto detalizavimas
10.	Aklių įmontavimas į projektuojamas vietas Ø50	vnt.	20	19	-1,000	5,25	-5,25	Darbo projekto detalizavimas
Skyriuje							-6 619,14	
Viso NEVYKDOMI DARBAI:							-6 619,14	
PAPILDOMI DARBAI								
	Melioracijos darbai							
2.2	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0	0,266	0,266	2094,77	557,21	Darbo projekto detalizavimas
2.3	Iškasto grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą pridėti (prie 2.1 ir 2.2 pozicijų)	1000 m3	0	2,664	2,664	490,70	1 307,22	Darbo projekto detalizavimas
2.4	Grunto kasimas rankinius būdu	m3	0	30,00	30	26,85	805,50	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
4.14	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0	0,591	0,591	650,22	384,28	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
4.12	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0	19,70	19,7	31,47	619,96	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
3.19	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0	1,9676	1,9676	1698,62	3 342,20	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
4.13	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	0	59,10	59,1	31,47	1 859,88	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
4.7	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0	1,97	1,97	444,98	876,61	Darbo projekto detalizavimas

2.5	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio	100 m2	0	1,00	1	275,95	275,95	Darbo projekto detalizavimas
2.6	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	0	1,00	1	170,95	170,95	Įkainis pritaikytas iš preliminarios sutarties
8.	PE PN-45 tipo drenažo šulinių įrengimas su žemės darbais	kompl.	8	9	1,00	719,14	719,14	Darbo projekto detalizavimas
Viso PAPILDOMI DARBAI:							10 918,90	
VISO NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI:							4 299,76	
PVM							902,95	
VISO NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI su PVM:							5 202,71	

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Objektas: PAPARTYNŲ KELIO (Š-III-71) ŠAKIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE, MELIORACIJOS TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Sutartis: 2025-08-20 Nr.VPS-190

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto Rimanto Vaičiūno

Užsakovo atstovo - UAB “101 arklys” techninės priežiūros vadovas Andrejaus Ūdros


Projektuotojo atstovo – UAB “Atamis” projekto vykdymo priežiūros vadovas Rimvydas Juodka

Rangovo atstovo - UAB „Autokausta“ Statinio statybos vadovo Justino Jasiulevičiaus


Nustatė:

Atliekant Papartynų kelio (Š-III-71) Šakių miesto seniūnijoje melioracijos tinklo kapitalinio remonto darbus ir drenažo linijų ieškojimo darbus buvo:


1. Nerasta drenažo linija, todėl įrengus projektuojamą pralaidą PP D600 nebus galimybės surinkti paviršinį lietaus vandenį

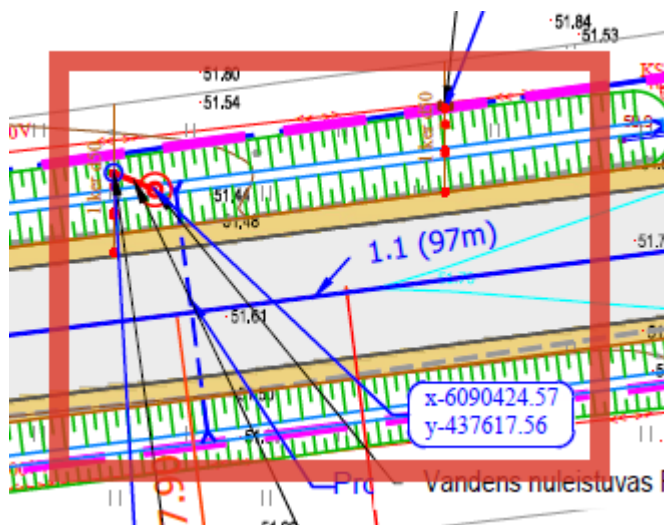


2. Nerasta drenažo linija

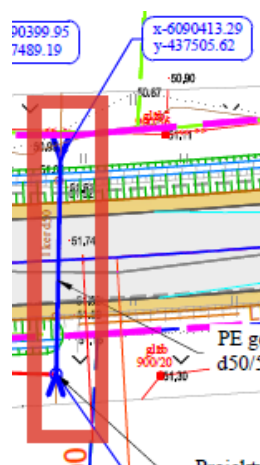


3. Nerasta drenažo linija

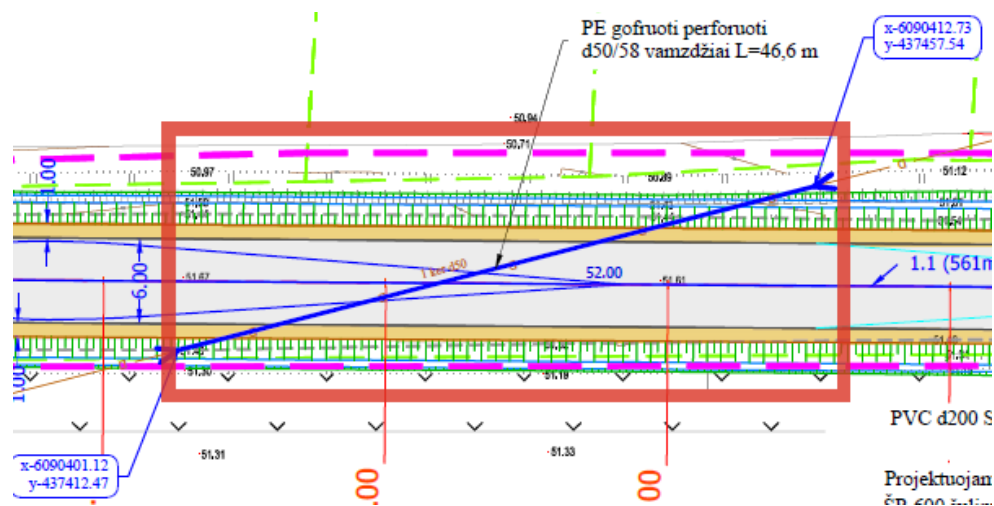

4. Nerastos drenažo linijos

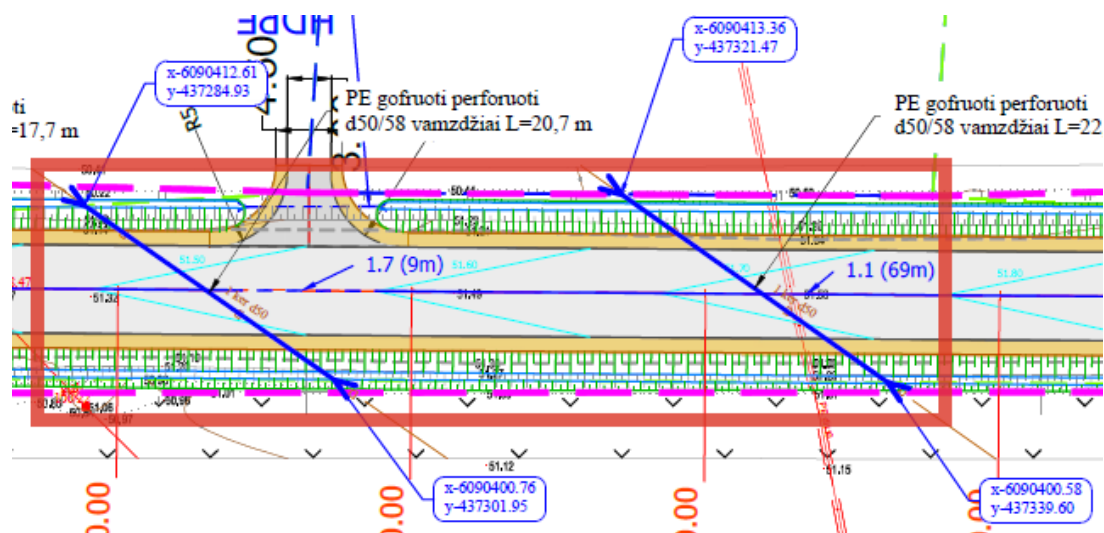

5. Nerasta drenažo linija

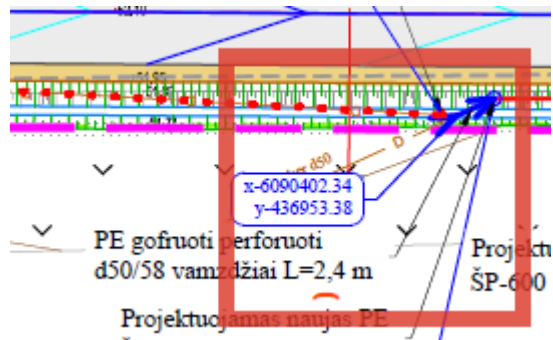

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Komisija siūlo:

1. Pakloti papildomą vamzdį nuo naujai projektuojamo PE ŠP-600 (D1-6) šulinio iki naujai projektuojamo PE ŠP-600 (D1-10/1) šulinio, kad būtų galimybė surinkti vandenį iš keičiamos pralaidos ties Pk 4+88;
2. Neatlikti projektinių darbų ties 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytomis vietomis
3. Projektuotojas turi įvertinti papildomų ir nevykdomų darbų kiekius ir patikslinti projektinę dokumentaciją
4. Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Šakių rajono savivaldybės
ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas

Martynas Remeikis

Šakių rajono savivaldybės
žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Rimantas Vaičiūnas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Rimvydas Juodka

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Statinio statybos vadovas

Justinas Jasiulevičius


DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	


SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis 0 laidos	Kiekis A laidos
1	2	3	4	5
DRENAŽO TINKLAI				
1.	Drenažo rinktuvai iš PVC vamzdžių DN/OD Ø200 mm, SN 8 ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, bei jų užpylimu, gerbūvio atstatymu. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio grunte kasant traktoriais, vienakaušiu ekskavatoriais iki 2,0 m gylio	m	100	196,76
2.	Drenažo sausintuvai iš PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN/ID Ø50/58, SN 4, perforacija $\geq 24 \text{ cm}^2/\text{m}$ su geotekstilės filtru. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio grunte iki 2,0 m gylio	m	124	25,58
3.	Kurjerinio žvyro užpylimas virš vamzdžių, kai $k_f > 3 \text{ m/d}$	m^3	36	36
4.	Naujai projektuojamo sausintuvo d50 pajungimas į esamus tinklus	vnt.	10	10
5.	PE-ŠP 600 tipo drenažo šulinių įrengimas	kompl.	11	9
6.	Naujai projektuojamų drenažo rinktuvų/sausintuvų įjungimas į naujai suprojektuotą PE-ŠP 600 šulinį su visomis reikalingomis jungtimis	vnt.	18	18
7.	Esamų drenažo rinktuvų/sausintuvų įjungimas į naujai suprojektuotą PE-ŠP 600 šulinį su visomis reikalingomis jungtimis	vnt.	9	9
8.	PE PN-45 tipo drenažo šulinių įrengimas su žemės darbais	kompl.	8	9
9.	Naujai projektuojamų drenažo rinktuvų/sausintuvų įjungimas į PE PN-45 šulinį su visomis reikalingomis jungtimis	vnt.	7	7
10.	Aklių įmontavimas į projektuojamas vietas Ø50	vnt.	20	19
11.	Esamų drenažo linijų naikinimas iškasant esamas drenas iki 2,0 m gylio ekskavatoriais	m	562	562
12.	Esamo keramikinio drenažinio vamzdžio išardymas ir pridavimas atliekų tvarkytojui	kompl.	1	1
13.	Drenažo linijų suieškojimas ekskavatoriais	m^3	404	404
14.	Esamų drenažo šulinių demontavimas	vnt.	3	3

A	2025	Korektūra pagal išpildomąsias				
0	2025	Statybos leidimui, konkursui, statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
VAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Melioracijos sistemų pertvarkymas rengiant Papartynų kelio (Š-III-71) Šakių miesto seniūnijoje, melioracijos tinklų rekonstravimo projektas			
S-624-PmAT	PV	Dainius Čepulis	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
	Proj.	Mindaugas Undaravičius	Melioracijos statiniai		A	
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2232-00-TDP-MD.SŽ		LAPAS 1	LAPŲ 2

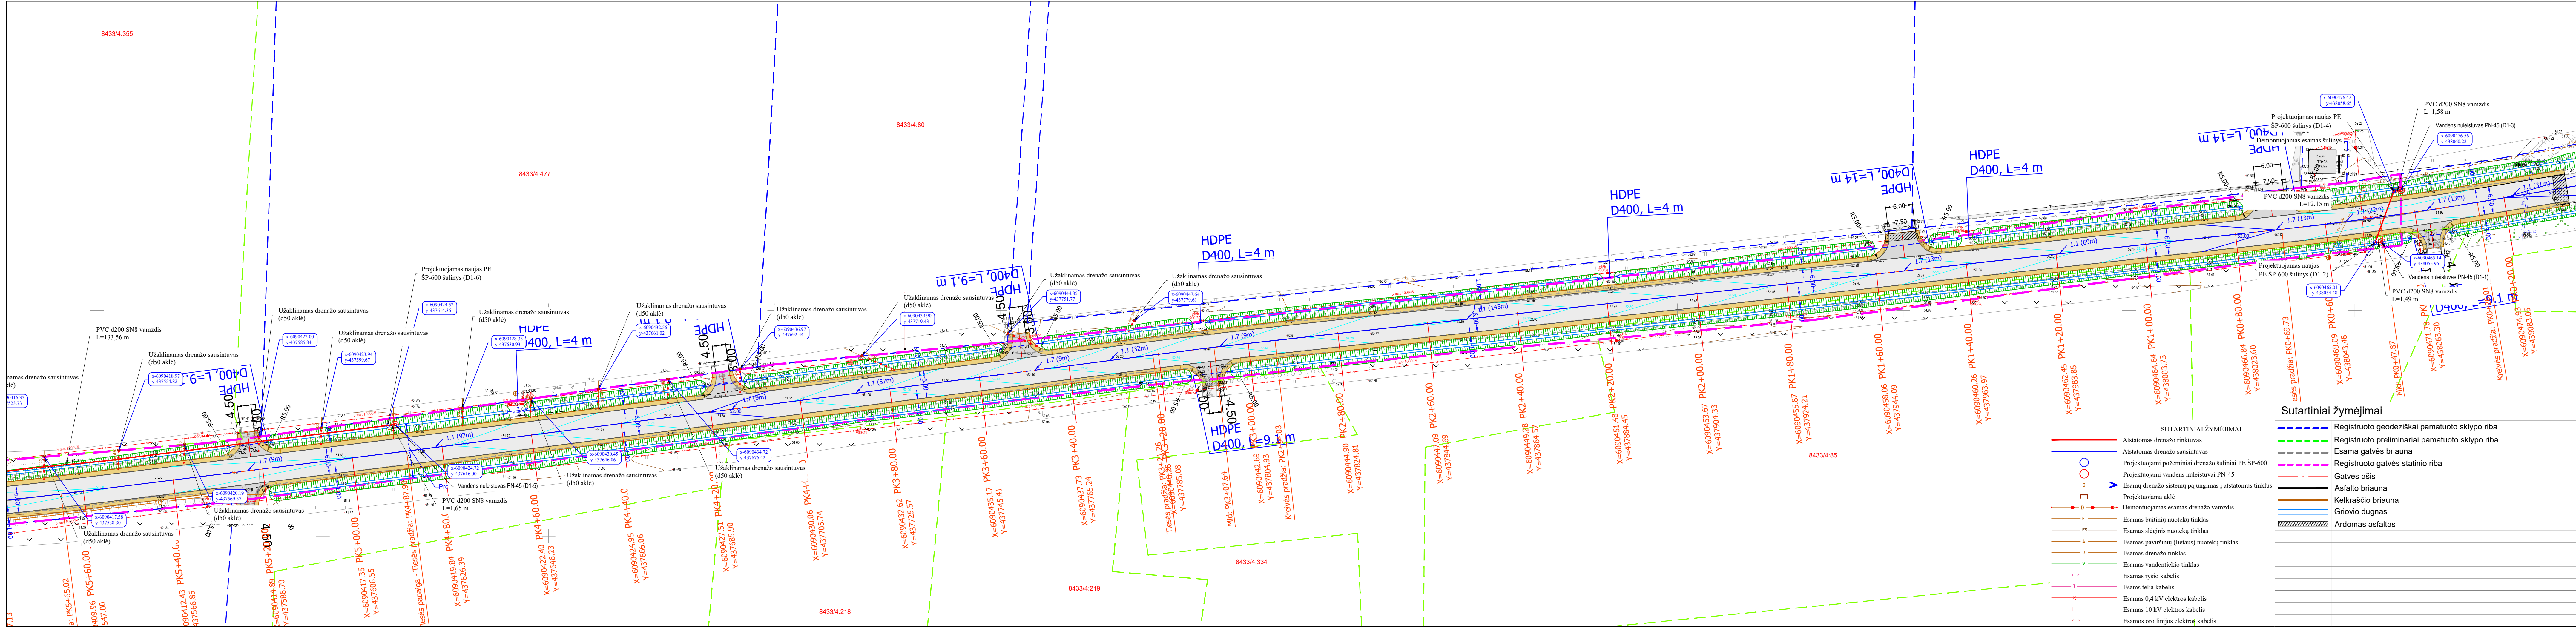


TIHS derinimo lentelė		
Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIHS)	Data	
	Pateiktas	Ivykdytas
	2024-07-01	2024-07-16
		Prašymo Nr.
		TIHS1-20240701-040905

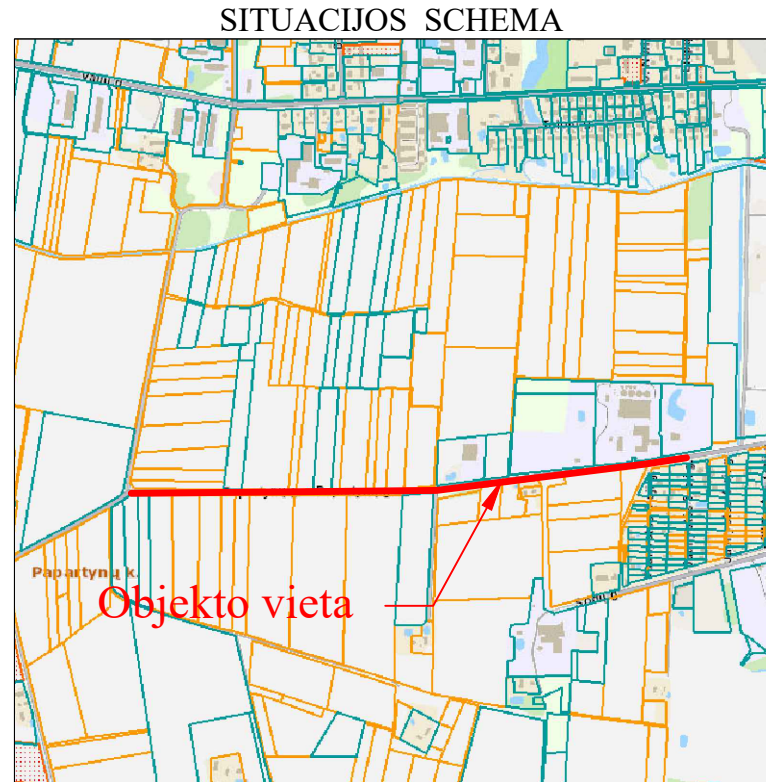


Sutartiniai žymėjimai		
---	Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba	
---	Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba	
---	Esama gatvės briauna	
---	Projektuojami požeminiai drenazo šuliniai PE SP-600	
---	Projektuojami vandens nuleistuvai PN-45	
---	Gatvės ašis	
---	Asfalto briauna	
---	Kelkraščio briauna	
---	Griovio dugnas	
---	Ardomas asfaltas	
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
---	Atstatomas drenazo rinktuvus	
---	Atstatomas drenazo sausintuvas	
---	Projektuojami požeminiai drenazo šuliniai PE SP-600	
---	Projektuojami vandens nuleistuvai PN-45	
---	Esamų drenazo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus	
---	Projektuojama akle	
---	Demontuojamas esamas drenazo vamzdis	
---	Esamas būtinių nuotekų tinklas	
---	Esamas slėginis nuotekų tinklas	
---	Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas	
---	Esamas drenazo tinklas	
---	Esamas vandentekio tinklas	
---	Esamas ryšio kabelis	
---	Esamas telia kabelis	
---	Esamas 0,4 kV elektros kabelis	
---	Esamas 10 kV elektros kabelis	
---	Esamos oro linijos elektros kabelis	

Pastaba:		
1. Statybos metu atkasus drenazo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medžiagomis;		
2. Statybos metu atkasti topografijoje nepažymėti drenazo tinklai tai pat turi būti atstatomi naujomis medžiagomis;		
LAIKA		
A	2025	Korektūra pagal išpildomąsias
0	2025	Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIKAS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		
S-624-PmAT	PV	Dainius Čepulis
Proj.	Mindaugas Undaravičius	
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
Melioracijos sistemų pertvarkymas rengiant Papartynų kelio (Š-II-71) Šakių miesto seniūnijoje, melioracijos tinklų rekonstravimo projektas		
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
Melioracijos statiniai		
Atstatomų drenazo tinklų planas		
M1:500		
DOKUMENTO ŽYMUO		
AT-24S-2232-00-TDP-MD-B01		
LAIKA LAPAS LAPU		
A	I	2



THIS derinimo lentelė		
Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (THIS)	Data	
	Pateiktas	Ivykdytas
	2024-07-01	2024-07-16
Prašymo Nr. THIS1-20240701-040905		

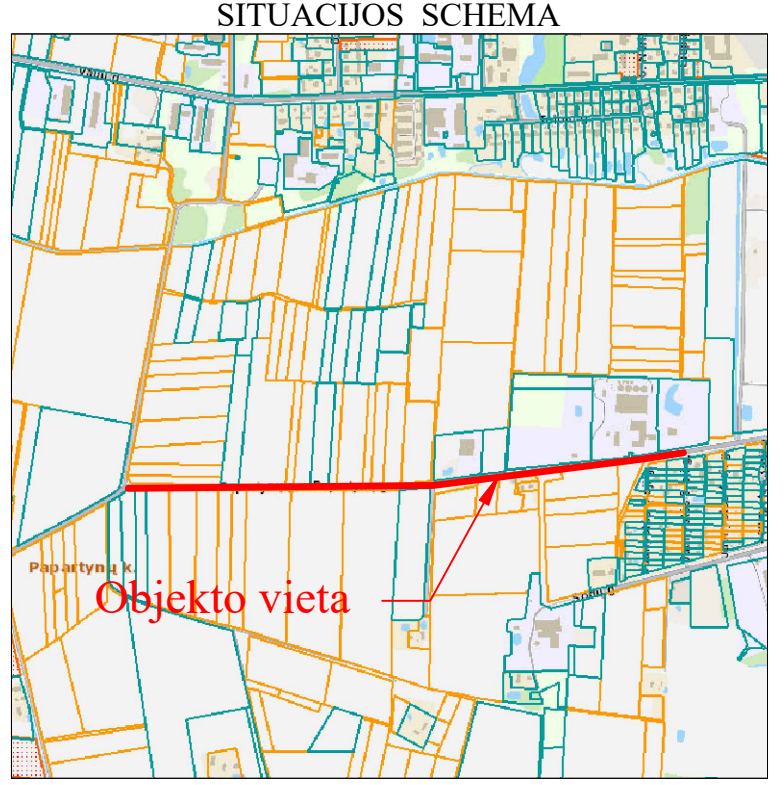

Sutartiniai žymėjimai		
---	Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba	
---	Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba	
---	Esama gatvės briauna	
---	Registruoto gatvės statinio riba	
---	Gatvės ašis	
---	Asfalto briauna	
---	Kelkraščio briauna	
---	Griovio dugnas	
---	Ardomas asfaltas	

Pastaba:
1. Statybos metu atkasus drenažo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medžiagomis;
2. Statybos metu atkasti topografijoje neparodyti drenažo tinklai tai pat turi būti atstatomi naujomis medžiagomis;

A	2025	Korektūra pagal išpildomąsias
0	2025	Statybos leidimai, konkursai, statybai
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
S-624-PnA	Melioracijos sistemos pertvarkymas rengiant Papartų kelių (S-III-71) šakių miesto senintijoje, melioracijos tinklų rekonstravimo projektas	
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
PV	Dainius Čepulis	Melioracijos statiniai
Proj.	Mindaugas Undaravičius	Atstatomų drenažo tinklų planas
M1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		AT-24S-2232-00-TDP-MD-B01
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		A 2 2

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	
