

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE

prie 2025 m. rugpjūčio 20 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. VPS-190 dėl Papartynų kelio (Nr. Š-III-71), Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbų

2025 m. gruodžio d. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir **uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama „Susitarimu“.

1. *Pareiškia*, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. rugpjūčio 20 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-190 dėl Papartynų kelio (Nr. Š-III-71), Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 723 188,98 Eur (septyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 98 ct) be PVM.

1.2. Užsakovas 2025 m. gruodžio 3 d. su Rangovu sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1, po kurio nustatyta sutarties vertė 727 488,74 Eur (septyni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 74 ct) be PVM, 880 261,38 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt vienas euras 38 ct) su PVM.

2. Šalys *įvertino aplinkybes*, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 11 punkte.

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu buvo nustatytas poreikis:

2.2.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 198 630,66 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 66 ct) be PVM, 240 343,10 Eur su PVM;

2.2.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 269 857,86 Eur (du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 86 ct) be PVM, 326 528,01 Eur su PVM.

2.3. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 798 715,94 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų 94 ct) be PVM, 966 446,29 (devyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai 29 ct) su PVM.

2.4. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1, 20.2 ir 20.5 p.

3. Šalys *sutinka ir sutaria*, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 9 p.; 11 p.; 11.2 p.; 11.3 p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.2 p.; 20.5 p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą:

3.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 198 630,66 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 66 ct) be PVM, 240 343,10 Eur su PVM;

3.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoje (1 priedo 1 priedas) ir kurių vertė yra 269 857,86 Eur (du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 86 ct) be PVM, 326 528,01 Eur su PVM, kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 37,09 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA. Darbų pakeitimo aktas su priedais (11 lapų).

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,
Tel. +370 345 60 750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Autokausta“
Juridinio asmens kodas
135007799
Marvelės g. 199B, LT-46204,
Kaunas
Tel. +370 37 397555
El. paštas statyba@autokausta.lt

Direktorius
Juozas Kriaučiūnas

(pareigos, vardas pavardė, parašas)
A. V.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Autokausta“

Sutarties data ir Nr.: 2025-08-20, VPS-190

Sutarties pavadinimas: Papartynų kelio (Š-III-71) Šakių miesto seniūnijoje, kapitalinio remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2

2025-12-08

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Techninės priežiūros atstovo – UAB „101 arklys“ Techninės priežiūros atstovo Andrejaus Ūdros;
4. Rangovo atstovo – UAB „Autokausta“ Statinio statybos vadovo Justino Jasiulevičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

2025-09-01 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 2). Apžiūros metu komisija nustatė, kad Statybos darbų metu projekto apimtyje buvo patikslintos įrengiamos gatvės konstrukcijų vietos pagal esamą-faktinę situaciją; patikslintos statybos darbų ribos bei reikalingų atlikti darbų apimtys.

Įvertinus faktines aplinkybes darbų metu buvo patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai pagal Papartynų kelio (Š-III-71) Šakių m. sen. kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Pridedama nevykdomų ir papildomų darbų sąmata (Priedas Nr. 1).

Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus Komisija pritaria patikslintai Papartynų kelio papildomų darbų sąmatai (žr. Priedas Nr. 1).

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai:	269 857,86 Eur (be PVM);
Nevykdomi darbai:	198 630,66 Eur (be PVM);
Darbų pakeitimo vertė:	71 227,20 Eur (be PVM).

Pridedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 2- 4 lapai;
2. Nevykdomų ir papildomų darbų sąmata- 2 lapai.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Andrejus Ūdra

Justinas Jasiulevičius

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Autokausta" (įmonės kodas 135007799)
Pirkimo sutarties Nr.: VPS-190 (2025-08-20)
Sutarties pavadinimas: „Papartynų kelio (Nr. Š-III-71) Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbai“

NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS								
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis 0 laidos	Kiekis A laidos	Skirtumas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Įkainio pagrindimas
NEVYKDOMI DARBAI								
	2. Žemės darbai							
2.9	20 cm kelio sankasos stabilizavimas įterpiant iki 3% cemento ir jonų mainus gerinančių priedų	m2	12450	0	-12450	10,46	-130 227,00	Darbo projekto detalizavimas
2.10	Stabilizuojamo sankasos storio pokyčiui 1 cm pridėti ar atimti	m2	124500	0	-124500	0,54	-67 230,00	Darbo projekto detalizavimas
	4. Asfalto dangos įrengimas							
4.11	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.) įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis)	100 m2	25,9	24,77	-1,13	1038,64	-1 173,66	Darbo projekto detalizavimas
Skyriuje							-198 630,66	
Viso NEVYKDOMI DARBAI:							-198 630,66	
PAPILDOMI DARBAI								
	2. Žemės darbai							
2.2	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1km ir darbas sąvartoje	1000 m3	8,853	11,478	2,625	2094,77	5 498,77	Darbo projekto detalizavimas
2.3	Iškasto grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą pridėti (prie 2.1 ir 2.2 pozicijų)	1000 m3	79,677	103,302	23,625	490,70	11 592,79	Darbo projekto detalizavimas
Naujas įk.	30 cm kelio sankasos stabilizavimas įterpiant iki 4% cemento ir jonų mainus gerinančių priedų	m2	0	12 450	12 450	19,10	237 795,00	Darbo projekto detalizavimas
	3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimas							
3.21	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	162,3	195	32,7	50,38	1 647,43	Darbo projekto detalizavimas
3.22	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	15	24	9	83,43	750,87	Darbo projekto detalizavimas
3.24	Įstrižųjų atgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m3	4	4,80	0,8	682,35	545,88	Darbo projekto detalizavimas
3.25	Įstrižųjų atgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm	m3	0,6	0,96	0,36	832,32	299,64	Darbo projekto detalizavimas
	4. Asfalto dangos įrengimas							
5.1.24	4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	74,25	74,31	0,06	1218,49	73,11	Darbo projekto detalizavimas
5.1.32	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	74,25	74,31	0,06	134,83	8,09	Darbo projekto detalizavimas

	5. Nuovažų įrengimas							
5.1.12	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	4,8	6,19	1,39	1274,88	1 772,08	Darbo projekto detalizavimas
5.1.13	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti arba atimti	100 m2	28,8	37,14	8,34	166,83	1 391,36	Darbo projekto detalizavimas
4.9	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos	100 m3	1,35	1,70	0,35	3893,19	1 362,62	Darbo projekto detalizavimas
4.10	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro	100 m3	1,62	2,04	0,42	373,14	156,72	Darbo projekto detalizavimas
	Nenumatyti darbai							
2.	Dangos ženklavimas dažais 1.7	m	145	162	17	5,50	93,50	Darbo projekto detalizavimas
3.	Dangos ženklavimas dažais 1.1	m	147	1 063	916	7,50	6 870,00	Darbo projekto detalizavimas
Viso PAPILDOMI DARBAI:							269 857,86	
VISO NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI:							71 227,20	
PVM							14 957,71	
VISO NEVYKDOMI/PAPILDOMI DARBAI su PVM:							86 184,91	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

APŽIŪROS AKTAS NR. 2

2025 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Objektas: PAPARTYŲ KELIO (Š-III-71) ŠAKIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Sutartis: 2025-08-20 Nr.VPS-190

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

Užsakovo atstovo – UAB “101 arklys” techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra

Projektuotojo atstovo – UAB “Atamis” projekto vykdymo priežiūros vadovas Rimvydas Juodka


Rangovo atstovo - UAB „Autokausta“ Statinio statybos vadovas Justinas Jasiulevičius

Nustatė:


1. Projekte Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP suprojektuota per siaura nuovaža ties Pk 0+71 d.p, todėl ją įrengus pagal projektinius sprendinius bus apsunkintas patekimas į šalia kelio esančią komercinės paskirties teritoriją



2. Projekte Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP suprojektuota per siaura nuovaža ties Pk 4+15 d.p, todėl ją įrengus pagal projektinius sprendinius bus apsunkintas patekimas į šalia kelio esančią ūkinės veiklos paskirties teritoriją

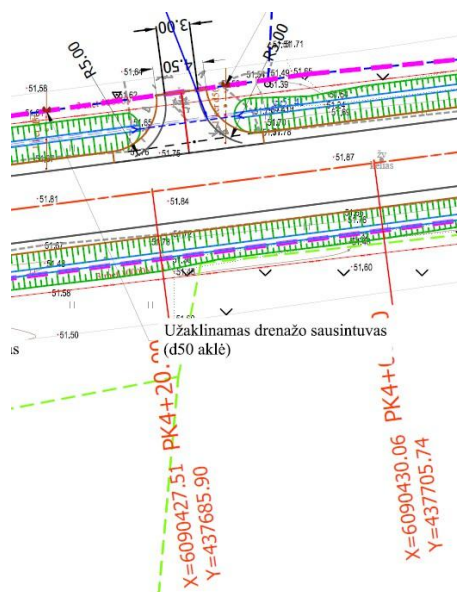

3. Projekte Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP numatoma naikinti esamą nuovažą ties Pk 4+55 d.p, tokiu būdu bus apribotas patekimas į šalia kelio esančią ūkinės veiklos paskirties teritoriją

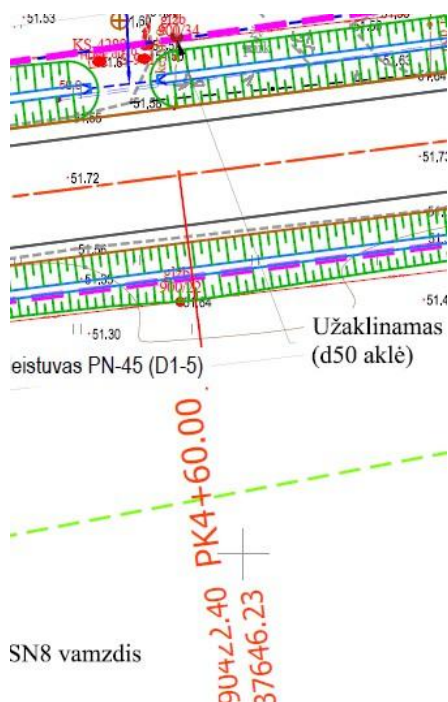

4. Esama g/b D800 pralaida po keliu ties Pk 12+27 yra užnešta gruntu, pralaidos antgaliai sulūžę, įrengus naują kelio dangos konstrukciją nebus tenkinamas minimalaus pralaidos užpylimo gruntu sluoksnio

storio reikalavimas. Pagal projekto Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP sprendinius pralaidos keitimas nenumatytas.



5. Pagal projekto Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP darbų kiekių žiniaraštį Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP - DKŽ asfalto dangos horizontaliojo ženklavimo dažais kiekis nurodytas per mažas, nes dangų, eismo organizavimo, aukščių, suvestiniame inžinerinių tinklų plane Nr. AT-24S-2232-TDP-SD-Br.2 nurodoma, kad horizontalusis ženklavimas atliekamas visoje kelio trasoje

5. BAIGIAMIEJI DARBAI				
5.1	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 0,1 m)	TS 7.0	m ² / m ³	3950/395
5.3	Žvyro dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32, h=0.15m projektinės ir esamos dangos suvedimui.	TS 4.3	m ² / m ³	700/105
5.4	Dangos ženklavimas dažais 1.7	TS 7.0	m	145
5.5	Dangos ženklavimas dažais 1.1	TS 7.0	m	147
5.6	Kelio ženklai	TS 7.0	vnt	1
5.7	Išpildomosios topo nuotraukos atlikimas		ha	1,7

6. Pagal projekto Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP darbų kiekių žiniaraštį Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP - DKŽ žemės darbų iškasoje kiekis numatytas 8853 m³. Rangovas, pradėjęs vykdyti kelio kapitalinio remonto darbus ir įvertinęs esamą situaciją, pastebi, kad iškaso grunto kiekis gali būti didesnis.
7. Pradėjus vykdyti kelio kapitalinio remonto darbus, Šakių rajono savivaldybės gyventojas pateikė prašymą dėl papildomos nuovažos įrengimo į jam priklausančią žemės ūkio paskirties sklypą.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją ir projektinius sprendinius siūloma:

1. Nuovažų ties Pk 0+71 d.p ir Pk 4+15 d.p asfalto dangų konstrukcijas suprojektuoti ir įrengti taip, kad būtų užtikrinamas patogus patekimas į šalia kelio esančias teritorijas.
2. Nenaikinti esamos nuovažos ties Pk 4+55 d.p, joje įrengiant naują dangos konstrukciją.
3. Esamą g/b D800 pralaidą pakeisti nauja.
4. Patikslinti asfalto dangos horizontaliojo ženklavimo dažais darbų kiekius
5. Patikslinti žemės darbų iškasose kiekius.
6. Įrengti papildomą nuovažą ties Pk 8+70 k.p
7. Projektuotojas turi atlikti projekto Nr. AT-24S-2232-01-SD-TDP korekcijas pagal komisijos išvadas, pateikti Rangovui, papildomų darbų ir jų atlikimui reikalingų medžiagų kiekius. Rangovas, gavęs papildomų darbų kiekius, įvertins darbų apimtį ir pateiks jas Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Šakių rajono savivaldybės
ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas

Martynas Remeikis

Šakių rajono savivaldybės
ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Karolis Olensevičius

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Rimvydas Juodka

Statinio statybos vadovas

Justinas Jasiulevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	
