

SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-709 (ATEITIES PL. TĘSINIO NUO PALEMONO G. IKI T. MASIULIO G., KAUNE, II ATKARPOS) PAKEITIMO

2025 m. d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2022 m. gruodžio 9 d. rangos sutarties Nr. SR-709 (toliau – Sutartis) 6 punktu ir 1.25 papunkčiu, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. 147-04, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą, nurodytą Sutarties 1.25 papunktyje, iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. rugsėjo 1 d., arba iki Sutarties nutraukimo.
2. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Vykdydamos Susitarimą šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.
4. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.
5. Prie Susitarimo pridedama UAB „Kauno keliai“ 2025 m. rugpjūčio 14 d. rašto Nr. 147-04 su priedais kopija, 16 lapų.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Administracijos direktorius
Tadas Metelionis

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Įmonės kodas 135640993
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
A. s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. 8 614 92 158, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno miesto savivaldybės administracijai

2025.08.14 Nr. 147-04

Statybos valdymo skyriui

info@kaunas.lt

darius.cesna@kaunas.lt

Kopija:

UAB „Laboratorinių bandymų centras“

Techninės priežiūros vadovui

Dariui Pasvenskui

dariuspasvenskas55@gmail.com

DĖL DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMO

UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) su Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) 2022 m. gruodžio mėn. 9 d. pasirašė rangos sutartį Nr. SR-709 „Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2 atkarpos nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai“ (toliau – Sutartis).

2024 m. rugsėjo mėn. 4 d. pasitarimo metu Rangovas informavo, jog negali atlikti darbų Jungiamosios gatvės Nr. 18 atkarpoje ir suvedime su Kauno HE esama dangą, kadangi Ateities pl. III-čios atkarpos dalis yra neįgyvendinta ir transporto eismas neturi galimybės važiuoti Palemono kryptimi. Sutartyje numatytos dalies projektiniuose sprendiniuose sunkiasvoriui transportui atvažiuojančiam nuo Kauno HE, sukti į Petrašiūnų pusę nėra numatytos galimybės dėl vietos trūkumo, visas sunkiasvoris transportas turi važiuoti tiesiai, III-čios atkarpos link, Palemono kryptimi. Dėl šios priežasties, Rangovas negali pilnai įgyvendinti projektinių sprendinių, kol nebus įrengta Ateities pl. III-čia atkarpa ir sunkiasvoris transportas galės važiuoti tiesiai. Projektiniuose sprendiniuose yra numatyta išardyti esamą dviejų eismų juostų atkarpą, kuria šiuo metu vyksta eismas nuo/ant Kauno HE, vietoje jos įrengiant tik vieną eismo juostą, kuri yra apribojama kelio bortais ir projektiniai aukščiai nuo esamų dangų skiriasi 1,5 m. Šia eismo juosta visas transportas atvažiuojantis



nuo Petrašiūnų užvažiuos ant Kauno HE. Jei Rangovas įgyvendins projektinius sprendinius, bus sudaryta nuolatinė transporto grūstis ant Kauno HE (Priedas Nr. 1). 2025 m. rugsėjo mėn. 19 d. buvo priimtas sprendimas atlikti tik tuos darbus, kuriuos galima, neįrengiant Jungiamosios g. Nr. 18 atkarpos, sujungimo su HE esama danga, bei lietaus nuotekų inžineriniais tinklais, nerengti dviejų troleibusų atramų ir kontaktinio tinklo (Priedas Nr. 2).

2024 m. lapkričio mėn. 27 d. po HE kanalo valymo darbų apžiūrėjus esamų gelžbetonių plokščių būklę, paaiškėjo, kad ji yra daug blogesnė nei pradinės apžiūros metu. Projekto nuotekų šalinimo dalyje yra numatytas tinklų pajungimas į AB „Ignitis gamyba“ valdomą ir prižiūrimą Kauno HE betoninį kanalą. Prieš pajungiant lietaus nuotekų inžinerinius tinklus į HE kanalą Užsakovas įsipareigojo jį sutvarkyti ir prižiūrėti, dėl šios priežasties buvo atliekami valymo darbai, norint įvertinti būtinų darbų apimtį. Pasitarimo metu Rangovas pasiūlė kanalą remontuoti panaudojant „cementinį kilimą“ (Priedas Nr. 3). Atlikus bandomąjį ruožą, buvo priimtas sprendimas remonto darbus atlikti naudojant „cementinį kilimą“, norint užtikrinti suremontuoto kanalo ilgaamžiškumą, kad Užsakovui nereikėtų dažnai atlikti kanalo remonto darbų. Rangovas gavo užduotį parengti kanalo remonto aprašą ir jį suderinti su AB „Ignitis gamyba“.

2025 m. balandžio mėn. 2 d. remonto aprašas vis dar buvo derinamas, kadangi AB „Ignitis gamyba“ pateikė savo pastabas, kurias buvo būtina pataisyti. 2025 m. balandžio mėn. 18 d. buvo gautas AB „Ignitis gamyba“ derinimas ir buvo galima forminti darbų pakeitimo aktą (Priedas Nr. 4). Darbų pakeitimo susitarimas dėl papildomų darbų, buvo pasirašytas 2025 m. birželio mėn. 11 d., po kurio buvo pradėti kanalo remonto darbai.

2025 m. balandžio mėn. 22 d. objekte ir jo prieigose iškrito didelis kiekis lietaus, kuris padarė labai daug žalos. Buvo pažeisti visi šlaitai, nuplauti laiptai prie viaduko, Jungiamosios g. Nr. 16 šlaitas nuo geležinkelio pralaidos, užneštos visos lietaus trasos ir kanalai. 2025 m. balandžio mėn. 30 d. pasitarimo metu buvo nuspręsta, jog norint apsaugoti objektą nuo tokių stichinių nelaimių, reikia peržiūrėti projektinius sprendinius ir juos koreguoti (Priedas Nr. 5). Visi projektiniai sprendiniai buvo gauti birželio mėn. pabaigoje. Nuo liepos mėn. pradžios buvo pradėti tvarkyti stichinio lietaus padaryti nuostoliai, pagal atnaujintus projektinius sprendinius. Buvo nuspręsta pertvarkyti šulinio Nr. Gr-107 sprendinius, didinant jo diametrą iki 1,0 m, įrengti paviršinių nuotekų surinkimo žiotis, suformuojant griovį nuo pralaidos iš betoninių plokščių, dugną betonuoti iki šio šulinio. Nuo pralaidų ir griovių atbėgančio vandens ištekėjimui į šulinį Gr-107 įrengti d400 vamzdį, kurio įtekėjimo angą užbaigti, įrengiant pralaidų antgalį ir groteles. Dėl susidarančio didelio kiekio paviršinių nuotekų nuo šlaitų iš miško už atraminės sienos nuspręsta pertvarkyti lietaus nuotekų šulinio ir latakų prie



atraminės sienos sprendinius. Nuspręsta įrengti 1,0 m diametro skersmens šulinį su platesne įtekėjimo anga, į jį pajungti atraminės sienos lataką prie šulinio suformuojant platų įtekėjimą iš betono. Jungiamosios g. Nr. 16 latakuose įrengti du papildomus šulinius su grotelėmis, pajungiant juos į L-125 šulinį prie geležinkelio ir šulinį po viaduko, didinant jo diametrą. Taip pat projektuotojai didesnio nuolydžio šlaitams numatė papildomą stiprinimą ten kur jis nebuvo nurodytas, o jungiamosios g. Nr. 16 pradžioje esančio šlaito prie geležinkelio stiprinimui numatytas gelžbetoninės atraminės sienutės įrengimo sprendinys. Būtina paminėti ir „AB "LTG Infra" esamų telekomunikacijų linijos iškėlimo darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje. Šie darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo papildomai pateikto „AB "LTG Infra" projekto sprendinius, kadangi nebus galimybės priduoti objektą. Šiuo metu yra rengiamas pakeitimas pagal minėtus projektinius sprendinius.

2025 m. liepos mėn. 10 d. įvykusio pasitarimo metu Užsakovui kilo abejonių, jog Jungiamųjų g. Nr. 17 ir 18 pločiai nebus pakankami sunkiasvoriam transportui pravažiuoti ir bus gadinami gatvės bortai. Projektuotojai turi peržiūrėti darbo projekto sprendinius ir pateikti pakoreguotą projektą su išplatintomis Jungiamosiomis g. Nr. 17 ir 18. Dėl projektinių sprendinių keitimo jungiamosios g. Nr. 17 ardymo ir papildomų darbų atsiradimo po projektinių sprendinių keitimo reikia numatyti galimybes pratęsti sutartį (Priedas Nr. 6).

Rangovas informuoja, jog šiai dienai dar neturi projektinių sprendinių Jungiamųjų g. Nr. 17 ir 18 platinimui ir negali pradėti papildomų darbų vykdymo. Taip pat negali atlikti Kauno HE sujungimo su viaduku dėl sunkiasvorio transporto judėjimo, kadangi dar nėra įrengta III atkarpa.

Rangovas vadovaudamasis Sutarties 47 p. „Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:“, 47.2 p. „papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Techninį projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;“, 47.3 p. „trečiųjų šalių įtaka;“, 47.6 p. „trikdžiai, susiję su greta vykdomais projektais;“, 47.7 p. „bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;“, prašo Užsakovo pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki kitų metų rugsėjo mėnesio, kadangi dar neturi projektinių sprendinių Jungiamųjų g. Nr. 17 ir 18 platinimui ir yra informuotas, jog III-čios atkarpos darbų pabaiga yra numatyta kitų metų birželio mėnesį, tad Kauno HE sujungime su viaduku ir Jungiamosios g. Nr. 18 atkarpose, įrengimo darbus galės pradėti tik kitais metais. Taip pat norime atkreipti dėmesį, jog į prašomo laikotarpio pratęsimo terminą papuola ir žiemos laikotarpis (technologinė pertrauka), t.y. Sutarties 47.11. punktas „Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoje stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.“,



bei dokumentacijos ruošimo laikotarpį, kuris yra minimas Sutarties 54 punkte „Statybos darbų užbaigimo terminas yra 55 dienos nuo Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos.“, kuris yra būtinas objekto pridavimui. Dėl visų šių priežasčių, kurios nepriklausė nuo Rangovo ir Rangovas negalėjo jų tikėtis konkurso metu, prašome Užsakovo pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2026 m. rugsėjo mėn. 01d. ir neskaičiuoti delspinigių iki 2026 m. rugsėjo mėn. 01 d.

PRIDEDAMA:

1. Pasitarimo protokolas Nr. 37 – 2 lapai;
2. Pasitarimo protokolas Nr. 39 – 1 lapas;
3. Pasitarimo protokolas Nr. 43 – 2 lapai;
4. Pasitarimo protokolas Nr. 45 – 3 lapai;
5. Pasitarimo protokolai Nr. 46, 47, 48 – 3 lapai;
6. Pasitarimo protokolas Nr. 52 – 1 lapas.

Projektų vadovė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS



Kristina Mockapetrienė



UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 37

2024 m. rugėjo mėn. 4 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2024 m. rugsėjo mėn. 4 d., 10:30 val., savivaldybėje.

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovas Giedrius Sarapinas.
5. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA. Dėl perdangos išlyginamojo sluoksnio.** Inžinierius informavo, kad perdangos išlyginamasis sluoksnis sutrūkęs. Trūkiai viršia leistinas 0,3 mm ribas.
NUTARTA. Rangovas iki 2024-09-11 parengia perdangos išlyginamojo sluoksnio remonto planą kurį turi patvirtinti konstruktorius.
2. **SVARSTYTA. Dėl atraminės sienos sklypo.**
NUTARTA. Periodiškai informuoti apie šio proceso eigą.
3. **SVARSTYTA. Dėl Projekto vykdymo priežiūros.** Projektuotojas informavo, kad projekto vykdymo priežiūrą atliks Birutė Gasiūnienė. Dar nėra aišku dėl projekto dalies vadovo susisiekimo daliai.
NUTARTA. Iki 2024-09-06 SĮ „Kauno planas“ direktorių turi pateikti įsakymą PVP ir PD vadovų.
4. **SVARSTYTA. Dėl Jungiamosios g. Nr. 18.** Rangovui reikalingas T.Masiulio g. ir nuvažiavimo nuo/ant HE sankryžos sprendinys, kadangi 2024 m. sausio mėn. 17d. pasitarimo metu buvo nuspręsta neįrengti jungiamosios g. Nr.18, nes III etapo statybos darbų pradžia nėra aiški. Rangovas šioje vietoje vykdyti darbus pagal esamą projektą negali, kadangi skiriasi esamų ir projektuojamų dangų aukščiai, apšvietimo ir troleibusų atramos numatytos įrengti esamoje važiuojamojoje gatvės dalyje.
NUTARTA. Sprendiniai dar nepateikti, Užsakovas kreipsis raštu į SĮ „Kauno planas“.
5. **SVARSTYTA. Dėl HE drenažo sistemos šulinio.** Projekte numatyta įrengti naują HE drenažo sistemos šulinį.
NUTARTA. Projektuotojas patikslina ar HE drenažo sistemos šulinys reikalingas.
6. **SVARSTYTA. Dėl darbų eigos.** Rangovas informavo, kad atliekami LN talpyklų įrengimo darbai, klojama LN trasa po T. Masiulio gatve link HE latako.
NUTARTA. Darbus vykdyti toliau.
7. **SVARSTYTA. Dėl kito pasitarimo laiko.**
NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Giedrius Sarapinas

Kristina Mockapetrienė



**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 17**

2024 m. sausio mėn. 17 d.

Kaunas

Pasitarimas įvyko 2024 m. sausio mėn. 17 d., 10.00 val., statybvietėje.

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovas Giedrius Sarapinas.
5. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA. Dėl lietaus nuotekų techninio projekto A laidos.** Projektuotojai informavo, kad projektiniai sprendiniai dar nesuderinti su AB „Ignitis gamyba“. Užsakovas pastebėjo, kad reikia derinti projektą, o ne sprendinius. Užsakovas informavo, kad savivaldybė išsiuntė AB „Ignitis gamyba“ derinti sutarties projektą. Taip pat, kad dar nėra gauta latakų ekspertizės išvada.

NUTARTA. Rengti lietaus nuotekų techninio projekto A laidos projektinę užduotį. Užduotis turi būti parengta iki 2024-01-19, techninio projekto A laida turi būti parengta iki vasario mėn. 19 d. ir teikiama AB „Ignitis gamyba“ derinimui.

2. **SVARSTYTA. Dėl atraminės sienutės techninio projekto A laidos.**

NUTARTA. Rengti atraminės sienutės techninio projekto A laidos projektinę užduotį. Užduotis turi būti parengta iki 2024-01-19 ir kaip įmanoma greičiau parengtas pats projektas.

3. **SVARSTYTA. Dėl jungiamosios gatvės Nr. 18 įrengimo.** Projektuotojai informavo, jog III etapo projektas nėra pilnai parengtas ir artimiausiu metu nebus galimybės pradėti III etapo statybos darbų. Dėl šios priežasties siūloma laikinai neįrenginėti jungiamosios gatvės Nr. 18, kad eismas galėtų vykti taip kaip vyko iki II etapo statybos darbų. Kadangi jungiamosios gatvės Nr. 16 posūkis nėra pritaikytas sunkiasvorio transporto važiavimui.

NUTARTA. Kol nebus aišku kada planuojama pradėti III etapo statybos darbus, neįrengti lietaus nuotekų tinklų nuo PK 54+50 iki PK 55+71.18 ir jungiamosios gatvės Nr. 18 zonoje, bei pačios jungiamosios gatvės Nr. 18.

4. **SVARSTYTA. Dėl darbų stabdymo.** Rangovas informavo, kadangi nėra parengta lietaus nuotekų ir atraminės sienutės techninio projekto A laidos rangovas negali toliau vykdyti darbų. Rangovas nori stabdyti darbus apie tai informuos atskiru raštu.

NUTARTA. Stabdyti darbus, pagal Rangovo pateiktą raštą.

5. **SVARSTYTA. Dėl kito pasitarimo laiko.**

NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks 2024-01-24 10:30.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Giedrius Sarapinas

Kristina Mockapetrienė

UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 39**

2024 m. rugsėjo mėn. 19 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2024 m. rugsėjo mėn. 19 d., 11:00 val., savivaldybėje.

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
 3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
 4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
 5. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.
1. **SVARSTYTA. Dėl kontaktinio tinklo.** Rangovas informavo, kad projekte nėra nurodytas kontaktinio tinklo tvirtinimo mazgas prie viaduko perdangos apačios.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia brėžinius suderintus su konstruktoriumi.
 2. **SVARSTYTA. Dėl atraminės sienos sklypo.**
NUTARTA. Periodiškai informuoti apie šio proceso eigą.
 3. **SVARSTYTA. Dėl Projekto dalies vadovo.** Dar nėra aišku dėl projekto dalies vadovo susisiekimo daliai.
NUTARTA. Projekto dalies vadovo dar nėra.
 4. **SVARSTYTA. Dėl Jungiamosios g. Nr. 18.** Rangovui reikalingas T.Masiulio g. ir nuvažiavimo nuo/ant HE sankryžos sprendinys, kadangi 2024 m. sausio mėn. 17d. pasitarimo metu buvo nuspręsta neįrengti jungiamosios g. Nr.18, nes III etapo statybos darbų pradžia nėra aiški. Rangovas šioje vietoje vykdyti darbus pagal esamą projektą negali, kadangi skiriasi esamų ir projektuojamų dangų aukščiai, apšvietimo ir troleibusų atramos numatytos įrengti esamoje važiuojamojoje gatvės dalyje.
NUTARTA. Atlikti kiek galima daugiau darbų pagal projektą. Nerengti AT5 ir AT7 troleibusų kontaktinio tinklo atramų. Taip pat nekabinti pačio kontaktinio tinklo.
 5. **SVARSTYTA. Dėl vandens nuvedimo.** Rangovas informavo, kad projekte tarp PK 51+20 ir PK 53+30 dešinėje pusėje lietaus surinkimo latakas yra toliau nuo gatvės borto ir norinti jį įrengti reikia iškasti gruntą, o įrengus lataką formuoti šlaitus iš naujo abiejose latakų pusėse. Taip pat nuo PK 51+90 iki PK 53+30 dešinėje yra numatytas griovys, o ne latakai. Vanduo nubėgęs nuo atraminės sienos plaus griovį, nes atitekės su dideliu nuolydžiu. Rangovas siūlo lataką traukti prie gatvės borto ir šlaitą formuoti tik nuo miško pusės, o vietoje griovio įrengti latakus.
NUTARTA. Aplink Gr. 105 įrengti papildomus latakus ir lataką traukti prie gatvės borto, kaip numatyta likusioje gatvės dalyje.
 6. **SVARSTYTA. Dėl kito pasitarimo laiko.**
NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Kristina Mockapetrienė



**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 43**


2024 m. lapkričio mėn. 27 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2024 m. lapkričio mėn. 27 d., 11:00 val., savivaldybėje.

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
5. SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas Rimantas Undraitis.
6. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA. Dėl HE kanalo remonto.** Rangovas informavo, kad atlikus kanalo plovimą pastebėta, kad latako būklė yra daug blogesnė nei pradinės apžiūros metu. Rangovas siūlo kanalą remontuoti „cementiniu kilimu“
NUTARTA. Atlikti bandomąjį ruožą.
2. **SVARSTYTA. Dėl atraminės sienos sklypo.**
NUTARTA. Periodiškai informuoti apie šio proceso eigą.
3. **SVARSTYTA. Dėl Projekto dalies vadovo.** Projektuotojas informavo, kad susisiekimo dalies projekto vadovas bus Rimantas Undraitis.
NUTARTA. Pateikti įsakymą Užsakovui.
4. **SVARSTYTA. Dėl šlaitų tvirtinimo.** Atlikus objekto apžiūrą pastebėta, kad Jungiamosios gatvės Nr. 16 šlaitai geležinkelio pusėje yra labai statūs ir gali nušliaužti. Projektuotojai siūlo šlaitą stiprinti dembliais kaip yra numatyta kitoje projekto atkarpoje. Rangovas informavo, jog tame šlaite yra elektros, dujos ir LTG Infra inžineriniai tinklai taip pat reikalinga pažeminti lietaus nuotekų tinklą įrengtą šlaite.
NUTARTA. Tvirtinti šlaitą įrengiant demblius, šlaito nuolydį formuoti < 1:1,5. Pažeminti lietaus nuotekų tinklą įrengtą šlaite.
5. **SVARSTYTA. Dėl lietaus nuotekų surinkėjo.** Rangovas klausia iš ko įrengti lataką nuo esamo geležinkelio latako iki Gr-137 lietaus surinkimo grotelių.

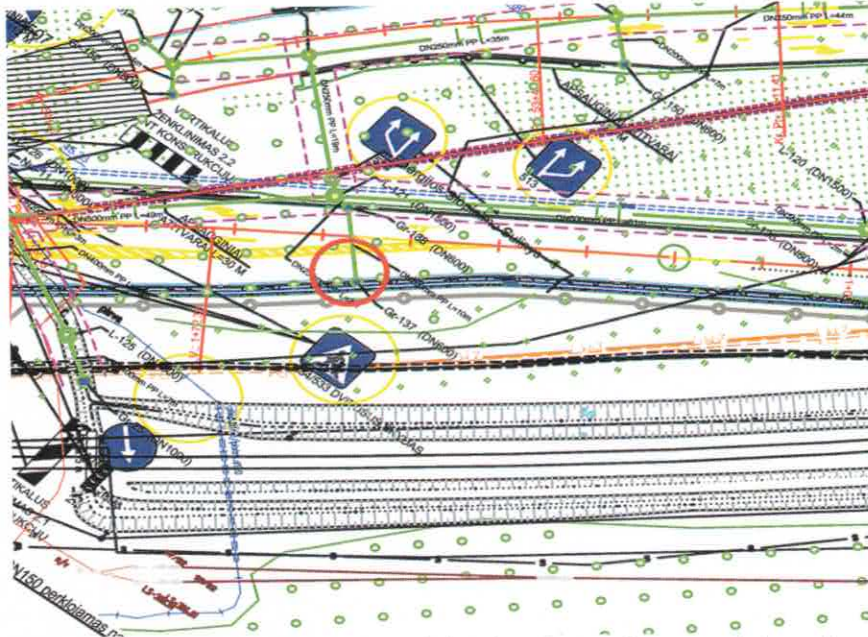

NUTARTA. Latako šonus tvirtinti iš P1 plokščių, dugną betonuoti įrengiant akmenis vandens slopinimui.

6. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.

NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Rimantas Undraitis

Kristina Mockapetrienė

[Handwritten signatures in blue ink over dotted lines]

UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 45**

2025 m. balandžio mėn. 23 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2025 m. balandžio mėn. 23 d., 10:30 val., savivaldybėje.

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
5. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA.** Dėl latako prie hidroelektrinės: gautas projekto suderinimas iš AB „Ignitis gamyba“
NUTARTA. Rengti darbų pakeitimą ir kuo greičiau pradėti darbus.
2. **SVARSTYTA.** Pakartotinai svarstytas tvorelės prie jungiamosios gatvės Nr.17 galo ir pėsčiųjų tako pratęsimas.
NUTARTA. Tvorelę įrengti.
3. **SVARSTYTA.** Darbų užbaigimui trukdančios problemos.
NUTARTA. Ieškoti būdų priduoti užbaigtą objektą.
4. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.
NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.


Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Kristina Mockapetrienė

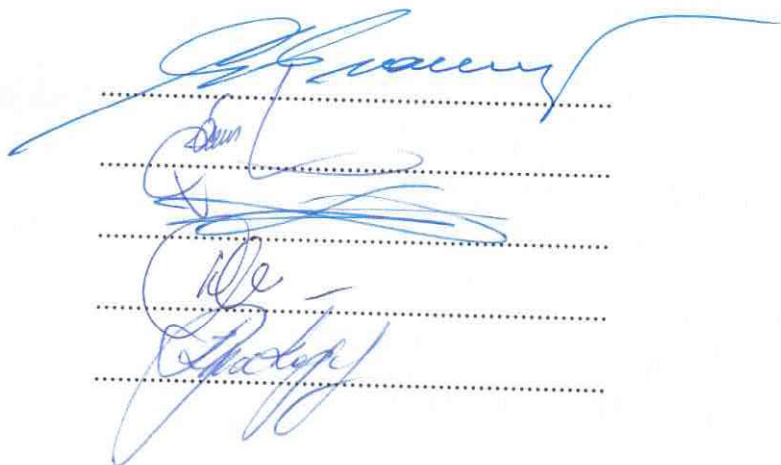

Kauno miesto savivaldybės administracija
el. p. info@kaunas.lt
Papildomai:
darius.cesna@kaunas.lt

2025-04- Nr. SD-
Į 2025-04- Nr. -

DĖL PROJEKTO DERINIMO

2025 m. balandžio 8 d. AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) iš Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Kauno m. savivaldybės) gavo prašymą pritarti parengtiems „*Kauno hidroelektrinės (A.Brazausko) žemių užtvankos žemutinio bjefo pašlaitės vandens nuvedimo kanalo (unik.nr.4400-5954-8780) paprastojo remonto aprašo*“ (toliau – Projektas) sprendiniams. Bendrovė projektiniams sprendiniams pritaria.

Bendrovė pažymi, kad Projektas yra susijęs su Servituto sutartimi (toliau – Sutartis) sudaryta tarp Bendrovės ir Kauno miesto savivaldybės. Projekto apimtyje susidarysiantys kaštai turi atitikti Sutarties sąlygas ir negali būti priskiriami Bendrovei jokia apimtimi.

Kilus klausimams, ar esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis į šio rašto rengėją žemiau nurodytais kontaktais.

Gamybos tarnybos vadovas

Darius Kucinas

Erikas Martinaitis, tel. Nr. +370 605 42458, el. paštas: erikas.martinaitis@ignitis.lt



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl projekto derinimo

Rinkmena: Dėl projekto derinimo_.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
Dėl projekto derinimo		

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	AB „Ignitis gamyba“	302648707	Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai, Lietuva	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Kauno miesto savivaldybės administracija	188764867	Laisvės al. 96, Kaunas, 44251 Kaunas, Lietuva	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2025-04-18 14:20:30	SD-173		
Dokumentą užregistravęs darbuotojas			

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GeDOC	DocLogix v12.8.7.0	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai
Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas S-SD-	

UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 46**

2025 m. balandžio mėn. 30 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2025 m. balandžio mėn. 30 d., 10:30 val., statybvietėje

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB „Laboratorinių bandymų centras“ Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė
5. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA.** Jungiamosios gatvės Nr. 16 šlaito prie viaduko tvirtinimo reikalingumas.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia šlaito tvirtinimo sprendinius, rangovas pagal pateiktus sprendinius paskaičiuoja papildomų darbų vertę.
2. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtys, nuplautas šlaitas šalia Jungiamosios g. Nr. 16, geležinkelio pusėje. Būtina koreguoti paviršinio vandens surinkimo sprendinius, numatyti lietaus vandens, atbėgančio geležinkelio kanalais ir pralaida, nubėgimą į įrengtus lietaus nuotekų tinklus.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia sprendinius.
3. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtys, buvo išplautas gruntas aplink šulinį esantį už atraminės sienutės. Reikalingas šulinio diametro ir surinkimo didinimas.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia sprendinius. Reikia įrengti D600 skersmens šulinį, suformuoti piltuvą į jį pajungiant lataką.
4. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtys buvo nuplauti šlaitai, užnešti lietaus vandens surinkimo latakai ir surinkimo trapai ties Jungiamosios gatvės Nr. 17 pėsčiųjų perėja.
NUTARTA. Lietaus lataką prie šaligatvio perversti į priešingą pusę, žemiausioje vietoje įrengti papildomą lietaus surinkėją surinkti lietaus vandeniui iš latakų, taip pat įrengti dar vieną papildomą surinkėją važiuojamojoje dalyje. Projektuotojai pateikia sprendinius šulinių įrengimui, bei šlaito nuo miško stiprinimui.
5. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.
NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Kristina Mockapetrienė



UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 47**

2025 m. gegužės mėn. 7 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2025 m. gegužės mėn. 7 d., 10:30 val., savivaldybėje

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
5. SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas Rimantas Undraitis.
6. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtis, nuplautas šlaitas šalia Jungiamosios g. Nr. 16, geležinkelio pusėje. Būtina koreguoti paviršinio vandens surinkimo sprendinius, numatyti lietaus vandens, atbėgančio geležinkelio kanalais ir pralaida, nubėgimą į įrengtus lietaus nuotekų tinklus.
NUTARTA. Suprojektuoti ir įrengti pralaidos tipo surinkėją.
2. **SVARSTYTA.** Dėl atraminės sienutės prie geležinkelio. Po 2025-04-22 liūtis, nuplautas šlaitas Jungiamosios g. Nr. 16 viršuje Pk 0+47 k.p., geležinkelio pusėje. Reikalinga stiprinti šlaitą. Dėl gatvės sklypo ir LTG infra apsaugos linijų susikirtimo nėra vietos įprastiems sprendiniams.
NUTARTA. Projektuotojai kuo greičiau pateikia sprendinius.
3. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtis buvo nuplauti šlaitai, užnešti lietaus vandens surinkimo latai ir surinkimo trapai ties Jungiamosios gatvės Nr. 17 pėsčiųjų perėja.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia sprendinius, sprendinius derina su rangovu.
4. **SVARSTYTA.** Po 2025-04-22 liūtis buvo nuplauti šlaitai aplink viaduką, pavojinga išplova atsirado ties Pk 53+70 k.p. todėl siūloma stiprinti šlaitą tinklais ir eroziją stabdančiu dembliu.
NUTARTA. Projektuotojai pateikia šlaito tvirtinimo sprendinius ir kiekius.
5. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.
NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius

Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Rimantas Undraitis

Kristina Mockapetrienė



UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 48**

2025 m. gegužės mėn. 14 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2025 m. gegužės mėn. 14 d., 10:30 val., savivaldybėje

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. SĮ „Kauno planas“ projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
5. SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas Rimantas Undraitis.
6. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA.** Projektuotojai pateikė sprendinius praeitam susirinkime svarstytu klausimu: *(Po 2025-04-22 liūtis, nuplautas šlaitas šalia Jungiamosios g. Nr. 16, geležinkelio pusėje. Būtina koreguoti paviršinio vandens surinkimo sprendinius, numatyti lietaus vandens, atbėgančio geležinkelio kanalais ir pralaida, nubėgimą į įrengtus lietaus nuotekų tinklus).*

NUTARTA. Pateikti papildomų darbų sąmatą ir vykdyti darbus pagal pateiktus brėžinius.

2. **SVARSTYTA.** Pakartotinai svarstytas praeito susirinkimo 2-as klausimas: *(Dėl atraminės sienutės prie geležinkelio. Po 2025-04-22 liūtis, nuplautas šlaitas Jungiamosios g. Nr. 16 viršuje Pk 0+47 k.p., geležinkelio pusėje. Reikalinga stiprinti šlaitą. Dėl gatvės sklypo ir LTG infra apsaugos linijų susikirtimo nėra vietos įprastiems sprendiniams).*

NUTARTA. Projektuotojams ieškoti sprendinių.

3. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.

NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Vigimantas Abramavičius


Darius Čėsna

Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Rimantas Undraitis

Kristina Mockapetrienė

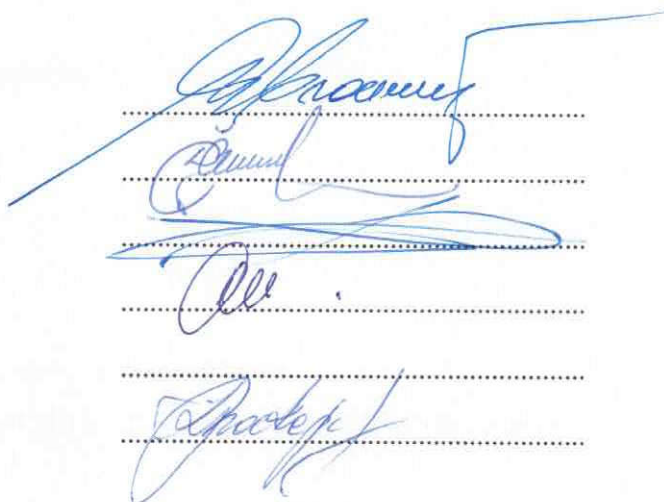

**Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g., Kaune, 2-osios atkarpos
nuo M. Gimbutienės g. (PK 48+00 iki PK 55+71) statybos darbai
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 52**

2025 m. liepos mėn. 10 d.
Kaunas

Pasitarimas įvyko 2025 m. liepos mėn. 10 d., 13:00 val., savivaldybėje

DALYVIAI:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Darius Čėsna.
3. UAB Laboratorinių bandymų centras Techninės priežiūros grupės vadovas Darius Pasvenskas.
4. UAB „Kauno planas“ statinio projekto priežiūros, darbo projekto vadovė Birutė Gasiūnienė.
5. UAB „Kauno planas“ statinio projekto priežiūros, darbo projekto susisiekimo dalies vadovas Rimantas Undraitis.
6. UAB „Kauno keliai“ gamybos direktorius Gintautas Kascenskas
7. UAB „Kauno keliai“ bendrųjų darbų vadovė Kristina Mockapetrienė.

1. **SVARSTYTA.** Jungiamųjų gatvių Nr. 17 ir Nr.18 pločiai prie T. Masiulio g. Dėl įrengtos jungiamosios gatvės Nr. 17, kurios plotis yra 4,25 m, Statytojui kilo abejonių ar jis bus pakankamas sunkiasvorių transportui pravažiuoti, tikimybė bus gadinami gatvės bortai. Brėžinyje, įvertinus Jungiamąją gatvę Nr. 18, kurios plotis numatytas 4 m, taip pat kilo abejonių dėl sunkiasvorio transporto pravažiavimo.

NUTARTA. Darbo projekto rengėjai peržiūri ir patikrina techninio projekto sprendinius dėl jungiamųjų gatvių Nr. 17 ir Nr. 18 pločių, įvertinant teisės aktų reikalavimus ir pateikia sprendinius dėl jų pločių padidinimo galimybių.

Dėl planuojamų gatvių projektinių sprendinių keitimo, numatyti rangos sutarties pratęsimo galimybę.

2. **SVARSTYTA.** Transporto pravažiavimo uždarymo galimybės per Kauno HE (KHE) tiltą. Rangovas informavo, kad įrenginėjant Jungiamąją gatvę Nr. 18 ir sujungiant statomą viaduką su T. Masiulio g. KHE kryptimi reikės sustabdyti transporto eismą apie 3 mėnesius. Lietaus nuotekų trasos įrengimo darbai bus vykdomi viduryje esamos T. Masiulio gatvės tarp statomo viaduko, KHE sklypo šlaito, esamo geležinkelio šlaito ir nėra pakankamo teritorijos ploto, kad būtų galima eismą organizuoti bent viena eismo juosta. Taip pat numatomos įrengti Jungiamosiomis gatvės Nr. 18 pradžia ir pabaiga tarp statomo viaduko ir KHE sklypo šlaito praktiškai užims visą dabartinės T. Masiulio g. važiuojamąją dalį.

NUTARTA. Rangovas turi pateikti grafiką.

3. **SVARSTYTA.** Dėl kito pasitarimo laiko.

NUTARTA. Kitas pasitarimas vyks pagal poreikį.

Tadas Metelionis

Darius Čėsna


Darius Pasvenskas

Birutė Gasiūnienė

Rimantas Undraitis

Gintautas Kascenskas

Kristina Mockapetrienė

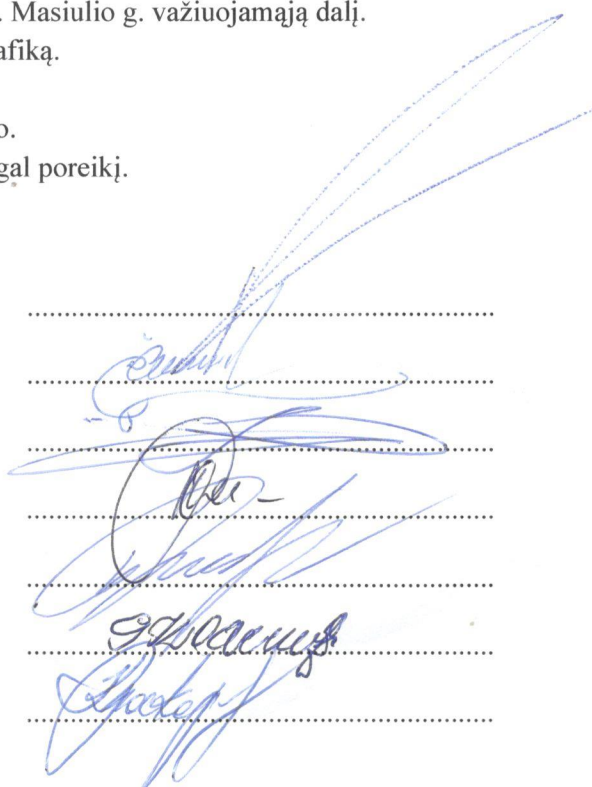

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kauno keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022 M. GRUODŽIO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-709 (ATEITIES PL. TĘSINIO NUO PALEMONO G. IKI T. MASIULIO G., KAUNE, II ATKARPOS) PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-19 Nr. SR1-244
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 16:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 16:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAMŪNAS ŠILINIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-19 10:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-20 00:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-17 11:28 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Račkauskienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-19 11:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-19 11:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-11 13:44 - 2028-03-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 08 14 Raštas dėl terminų pratęsimo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-20 nuorašą suformavo Žaneta Gurskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
