

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ VYKDYMO PAGAL SUTARTĮ
DĖL ŠVIESIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ 6 X 20 000 M³ REZERVUARŲ
PROJEKTAVIMO, ĮSIGIJIMO IR STATYBOS DARBŲ**

Šis susitarimas sudarytas 2018 m. balandžio 18 d. tarp :

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (juridinio asmens kodas 110648893), registruotos adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva, kuriai atstovauja generalinis direktorius Mindaugas Jusius, veikiantis pagal bendrovės įstatus (toliau – *Užsakovas*);

ir

Konsorciumas, susidedantis iš **SIA SKH**, juridinio asmens kodas 40103113004, registruota adresu Saremas g. 3, Riga LV-1005, Latvijos Respublika, ir **UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“**, juridinio asmens kodas 302151534, registruota adresu Tarybų g. 6, LT-31136, Visaginas, kuriam atstovauja **SIA SKH** valdybos pirmininkas Sergejs Gulko, veikiantis pagal 2016-12-20 jungtinės veiklos sutartį (toliau – *Rangovas*),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas *Šalimi*, o kartu *Šalimis*.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (i) Šalys 2017 m. birželio 12 d. sudarė Šviesiųjų naftos produktų 6 x20 000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį Nr. J4-141-2017 (toliau – *Sutartis*), kuria Užsakovas nusprendė už fiksuotą užmokestį pasitelkti Rangovą vykdyti Darbus, kaip jie apibrėžti Sutartyje;
- (ii) 2018 m. balandžio 4 d. Rangovas raštu Nr. SKH-KN-034L informavo Užsakovą, kad vykdant grunto nukasimo darbus, aptiko radinius, kurie trukdo tolesnei Darbų atlikimo eigai;
- (iii) Vadovaujantis Sutarties 22.2. punktu, šių radinių pašalinimas (toliau – *Papildomi darbai*) iš Statybvietės neapima Rangovo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje;
- (iv) Vadovaujantis Sutarties 34.3. punktu Užsakovas gali pirkti bet kokius papildomus darbus, kurie gali būti reikalingi pagal šią Sutartį ir negali viršyti 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės;
- (v) Atsižvelgiant į tai, jog šie papildomi darbai nebuvo įtraukti į Sutarties objektą, o dėl techninių priežasčių rangovo pakeitimas negalimas ir sukeltų didelių nepatogumų Šalims;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 str. 2 d. ir Sutartyje nustatyta keitimų tvarka,

ŠALYS SUSITARIA TAIP:

1. Užsakovas, įvertinęs visas su Užsakovo Rangovui nurodytų vykdyti darbų susijusias aplinkybes, atsižvelgdamas į poreikį vykdyti Papildomus darbus Užsakovo nurodyta būtina apimtimi, padidina Sutartyje numatytą Darbų apimtį, nurodant Rangovui atlikti


papildomus darbus, kurie detalizuoti šio susitarimo priede Nr. 1 ir įsipareigoja už nurodytus papildomus darbus sumokėti Rangovui šiame susitarime nurodytą kainą;

2. Užsakovas už šiame Susitarime nurodytus papildomus darbus sumoka Rangovui **1820,80** (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt eurų ir 80 ct), be PVM.
3. Šalys susitaria, kad kaina, mokėtina už Papildomus darbus, aprašytus šiame susitarime, Rangovui bus sumokama Rangovui atlikus visus šiuos Papildomus darbus, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutarties kainos mokėjimo tvarką. Avansinis mokėjimas nebus mokamas.
4. Rangovas šiame Susitarime numatytus Papildomus darbus atlieka iki Perėmimo laiko. Dėl Keitimo vykdymo Perėmimo laikas nėra keičiamas;
5. Šis Susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame Susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Šiame Susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam Susitarimui.
6. Šis Susitarimas laikomas sudarytu nuo jo pasirašymo dienos;
7. Šis Susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo
8. Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienas egzempliorius lietuvių kalba.
9. Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – 2018 m. balandžio 4 d. Rangovo raštas Nr. SKH-KN-034L;
Priedas Nr. 2 – 2018-04-04 lokalinė sąmata.
Priedas Nr. 3 – Sklypo planas.

Užsakovo vardu

Generalinis direktorius

Mindaugas Jusius

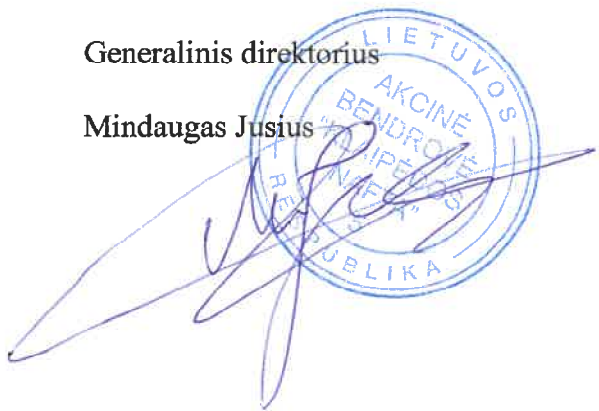

Rangovo vardu

Valdybos pirmininkas

Sergejs Gulko

