

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2025 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. As-246 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų, spalio mėnesio _____
diena

Marijampolės savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769113, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, kurios registruota buveinė yra Gėlyno skg. 5, Marijampolė. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2024 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus Algirdo Brazio įgaliojimą (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgiant į Rangovo 2025 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. 2-136 „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“, Užsakovo 2025 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. SA-10406 (10.169 Mr) „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“ ir Rangovo 2025 m. spalio 3 d. raštą Nr. 2-150 „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“, bei 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-246 (5.44 E) (toliau – Sutartis) pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 10.9. punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Akte nurodytas aplinkybes ir papildomų darbų kiekius, atlikti būtinus papildomus, Sutartyje nenumatytus statybos rangos darbus, kurių vertė yra 12 531,99 Eur be PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 3,81 proc. Pradinės Sutarties vertės, pakeitimu nėra keičiamas Sutarties pobūdis.

1.3. pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Sutarties kaina **341 419,17** Eur (trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų ir 17 ct.) be PVM; PVM – **71 698,03 Eur** (septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 03 ct.) **413 117,20** Eur (keturi šimtai tryliką tūkstančių šimtas septyniolika eurų ir 20 ct.) su PVM.“

1.4. pakeisti Sutarties 9 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir išdėstyti priedą nauja redakcija (redakcija pridedama).

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes, jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. PRIDEDAMA:

7.1. Rangovo 2025 m. spalio 3 d. raštas Nr. 2-150 „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“ – 2 lapai.

7.2. Pakoreguotas Sutarties 9 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas – 1 lapas.

7.3. Papildomų darbų lokalinė sąmata – 1 lapas.

7.4. Rangovo 2025 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. 2-136 „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“ – 5 lapai.

7.5. Užsakovo 2025 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. SA-10406 (10.169 Mr) „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. As-246 (5.44 E) vykdymo“ – 3 lapai.

8. Susitarimo šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307
Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
A.S. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Ne PVM mokėtojas
Tel. Nr. +370 343 90062
El. p. administracija@marijampole.lt

Rangovas:

UAB „Kelranga“
Gėlyno skg. 5, LT-68229,
Marijampolė
Įmonės kodas 151004973
A.S. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT651088314
Tel. Nr. +370 343 71735
El. p. info@kelranga.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

UAB „Kelranga“ projektų vadovė
viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-09-23 Nr. 2-136

DĖL 2025 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. AS-246 (5.44E) VYKDYMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas), vykdydamas 2025 m. balandžio 30 d. su Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarytą sutartį Nr. AS-246 (5.44E) (toliau – Sutartis), atlieka Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) statybos darbus Marijampolės m., Vilkaviškio g. 7A (toliau – Darbai).

Vykdydamas Sutartį, Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu dėl leidimo kirsti medžius ir 2025 m. rugsėjo 19 gavo raštą Nr. AL-7702 (15.4 Mr), kuriame nurodyta, kad Rangovas turi sumokėti 21 213,75 Eur už saugotinių želdynų atkuriamąją vertę.

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo pirkimo metu tiekėjams pateiktame atsakyme į klausimus buvo aiškiai nurodyta: „Bendra suma, mokėtina už saugotinių želdynų atkūrimą, yra 6 232,5 EUR.“ (dokumentas pridedamas)

Remiantis šiuo atsakymu, tiekėjai, įskaitant Rangovą, pasiūlymus rengė įsivertinę nurodytą 6 232,5 Eur sumą. Šiuo metu nurodyta atkuriamosios vertės suma – 21 213,75 Eur – beveik keturis kartus viršija pirkimo metu pateiktą informaciją ir yra reikšminga Sutarties įgyvendinimo aspektu. Pažymėtina, kad toks žymus išlaidų padidėjimas negali būti laikomas Rangovo rizika ar atsakomybe.

Atsižvelgiant į tai, kad toks papildomas mokėjimas laikytinas Sutarties sąlygų pasikeitimu, kuris pirkimo metu nebuvo žinomas, bei vadovaujantis Sutarties 12.1–12.3 punktais, prašome inicijuoti Sutarties keitimą, įtraukiant papildomas išlaidas už saugotinių želdynų atkūrimą, arba kitu būdu išspręsti susidariusią situaciją.

Prašome informuoti apie sprendimą ir tolesnius veiksmus.

PRIDEDAMA:

1. 2025-03-27 Nr. SA-3520 (35.3 Mr) Dėl gauto rašytinio paklausimo, 3 lapai.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTO RAŠYTINIO PAKLAUSIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. kovo 12 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1594455.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. kovo 10 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-127 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 27 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktų paklausimų.

1. Klausimas. Prašome patikslinti, kaip vertinti oro linijos perkėlimo darbus, kadangi elektrotechninės dalies (GAET) ir BDS dalies žiniaraščiuose nėra numatyta G/b atramų demontavimo, tačiau oro linijų demontavimas yra numatytas aiškinamajame rašte ir plane. Ar šie demontavimo darbai turėtų būti įtraukti į pasiūlymo kainą, ar jie nėra numatyti projekte? Taip pat prašytume informuoti, ar oro linijos perkėlimo darbams yra išduotos atitinkamos techninės sąlygos.

Atsakymas į 1 klausimą. OL laidai išmontuojami atskiru AB ESO projektu (Inv. Nr. E2N6380673). G/b atramos (be Nr.) su ramsčiu išmontavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. G/b atramos išmontavimui nėra išduotos techninės sąlygos, kadangi atrama yra ne ESO.

2. Klausimas. BDS projekto dalyje yra pastaba, kad demontuojasi dvi (2vnt.) apšvietimo atramos, tačiau šie kiekiai taip pat yra nenumatyti projektiniuose žiniaraščiuose. Kaip vertinti šiuos darbus?

Atsakymas į 2 klausimą. G/b atramos (be Nr.) su ramsčiu išmontavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

3. Klausimas. Dialux skaičiavimuose naudotas šviestuvas ir 52 psl. pateikta detali jo specifikacija neatitinka techninių specifikacijų 4.2 punkte šviestuvui keliamų reikalavimų. Kuo vadovautis?

Atsakymas į 3 klausimą. Vadovautis Dialux skaičiavimais.

4. Klausimas. TS 4.10 punkte Atramos rašoma, kad atrama turi būti karštai cinkuota. 3 punkte Apšvietimo sistemos rašoma, kad "Atramų korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengto antikorozine danga." Kuo vadovautis?

Atsakymas į 4 klausimą. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

5. Klausimas. 2.4. punkte Lauko elektros tinklai rašoma "Atrama Šv43 projektuojama 8m su 1,5m gembe, nukreipta į užtvankos pusę. Ši atrama montuojama vietoje esamos išmontuojamos g/b atramos, nuo kurios išmontuojami 2 gatvės apšvietimo šviestuvai ir 1 kryptinis šviestuvai. Išmontuoti šviestuvai montuojami ant naujai montuojamos 8m atramos su gembe." Prašome paaiškinti, kaip turėtų būti montuojami trys demontuoti šviestuvai?

Atsakymas į 5 klausimą. Vienas nukreiptas į gatvę, antras montuojamas prie gembės, kryptinis nukreiptas į tiltą.

6. Klausimas. Sujungimų schemeje nurodytas neteisingas laido atramoje ilgis.

Atsakymas į 6 klausimą. Pastaba priimta – turi būti 4m.

7. Klausimas. Prašome patikslinti 8 atsakymą. iš jūsų atsakymo tiekėjams vis tiek nėra aišku, KOKIĄ PINIGŲ SUMĄ tiekėjas turi įsivertinti. Prašome parašyti sumą EURAIS. Koks yra galutinis kertamų medžių KIEKIS ?

Atsakymas į 7 klausimą. Bendra suma, mokėtina už saugotinių želdynų atkūrimą, yra 6 232,5 EUR (kurie reikalingi įgyvendinti projektą). Iš viso 34 medžiai, pagal lentelę:

Projekte yra numatyta naikinti medžius trukdančius įgyvendinti projektui.

Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Medžių skaičius pagal skersmenis				
		<12	12-16	17-24	25-32	>32
1.	Juodalksnis	0	1	1		
2.	Uosis paprastasis	1				
3.	Gluosnis baltasis				2	4
4.	klevas paprastasis	2				2
5.	skroblas paprastasis	1	1			
6.	Beržas kapotasis					1
7.	Gluosnis trapusis			2	1	2
8.	Slyva naminė	1	5	2		
9.	Tuopa pilkoji					1
10.	Vyšnia paprastoji	1		1		
11.	Ažuolas paprastasis					1
12.	Obelis naminė		1			
Iš viso:		6	8	6	3	11

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Viktorija Griškaitė, +370 343 90035, viktorija.griskaite@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gauto rašytinio paklausimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-27 Nr. SA-3520 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-27 11:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-27 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-09-23_Nr.2-136
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Lukšienė Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-23 14:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-03-27 Atsakymas į paklausimą.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-03 nuorašą suformavo Tomas Astrauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

UAB „Kelranga“
info@kelranga.lt

Į 2025-09-23 raštą

DĖL 2025 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. As-246 (5.44 E) VYKDYMO

Marijampolės savivaldybės administracija ir Uždaroji akcinė bendrovė „Kelranga“ 2025 m. balandžio 30 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. As-246 (5.44 E) „Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbai“. Atsakydami į Jūsų 2025 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. 2-136 „Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-246 (5.44E) vykdymo“ informuojame, kad dėl išaugusios medžių atkuriamosios vertės, bus rengiamas papildomas susitarimas, kadangi pirkimuose pateiktoje projektinėje dokumentacijoje apskaičiuojant šalintinių želdinių atkuriamąją vertę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, buvo neatsižvelgta į želdinių augimo vietą, todėl buvo netinkamai parinktas šalinamų želdinių atkuriamosios vertės įkainis, taip pat, atsižvelgiant į numatomų atlikti darbų mastą, netinkamai nurodytas šalinamų želdinių kiekis ir netiksliai išmatuoti želdinių kamienų skersmenys.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip, gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai Regionų administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (<https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Violeta Sagaitienė, +370 343 90 013; violeta.sagaitiene@marijampole.lt

Tomas Astrauskas, +370 343 90 080; +370 616 54 781;
tomas.astrauskas@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties nr. As-246 (5.44E) vykdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-25 Nr. SA-10406 (10.169 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB 'Kelranga', Sidona Jašinskienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-25 13:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-03 nuorašą suformavo Tomas Astrauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-10-03 Nr. 2-150

DĖL 2025 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. AS-246 (5.44E) VYKDYMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas), vykdydamas 2025 m. balandžio 30 d. su Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarytą sutartį Nr. As-246 (5.44E) (toliau – Sutartis), atlieka kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) statybos darbus Marijampolės m., Vilkaviškio g. 7A (toliau – Darbai).

Primename, kad vykdydamas Sutartį, Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti kirsti medžius ir 2025 m. rugsėjo 19 d. gavo raštą Nr. AL-7702 (15.4 Mr), kuriame nurodyta didesnė saugotinių želdinių atkuriamoji vertė nei buvo pateikta viešojo pirkimo metu. Atsižvelgdamas į tai, Rangovas pateikė prašymą inicijuoti Sutarties keitimą, įtraukiant papildomas išlaidas už želdinių atkūrimą arba kitu būdu išspręsti susidariusią situaciją.

Užsakovas 2025 m. rugsėjo 25 d. rašte Nr. SA-10406 (10.169 Mr) nurodė, kad viešojo pirkimo dokumentuose, apskaičiuojant želdinių atkuriamąją vertę pagal LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-343, nebuvo atsižvelgta į jų augimo vietą, todėl netinkamai parinktas atkuriamosios vertės įkainis. Taip pat nurodė, kad buvo netiksliai nustatytas šalinamų želdinių kiekis ir jų kamienų skersmenys. Dėl šių priežasčių planuojama rengti papildomą susitarimą.

Remdamasis Sutartimi, viešojo pirkimo metu pateiktais dokumentais, atsakymais į tiekėjų klausimus bei Užsakovo raštais (2025-09-19 Nr. AL-7702 ir 2025-09-25 Nr. SA-10406), Rangovas parengė papildomų darbų sąmatą, susijusią su želdinių atkuriamosios vertės pasikeitimu bei koreguotu šalinamų medžių kiekiu. Sąmata pridedama prie šio rašto.

Patvirtiname, kad sąmata sudaryta vadovaujantis Sutarties 10.4.1 papunktyje nustatytais darbų kainų nustatymo principais.

Papildomi darbai: 12531,99 Eur be PVM

Neatliekami darbai: -

Darbų pakeitimo vertė: 12531,99 Eur be PVM

	Darbų pakeitimo vertė, Eur (be PVM)	Neatliekamų darbų vertė, Eur (be PVM)	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	0,00	0,00	0,00
Darbų pakeitimo vertė	12531,99	0,00	12531,99
Iš viso:	12531,99	0,00	12531,99

Prašome įvertinti pateiktus skaičiavimus ir parengti papildomą susitarimą prie Sutarties dėl nurodytų pakeitimų.




PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

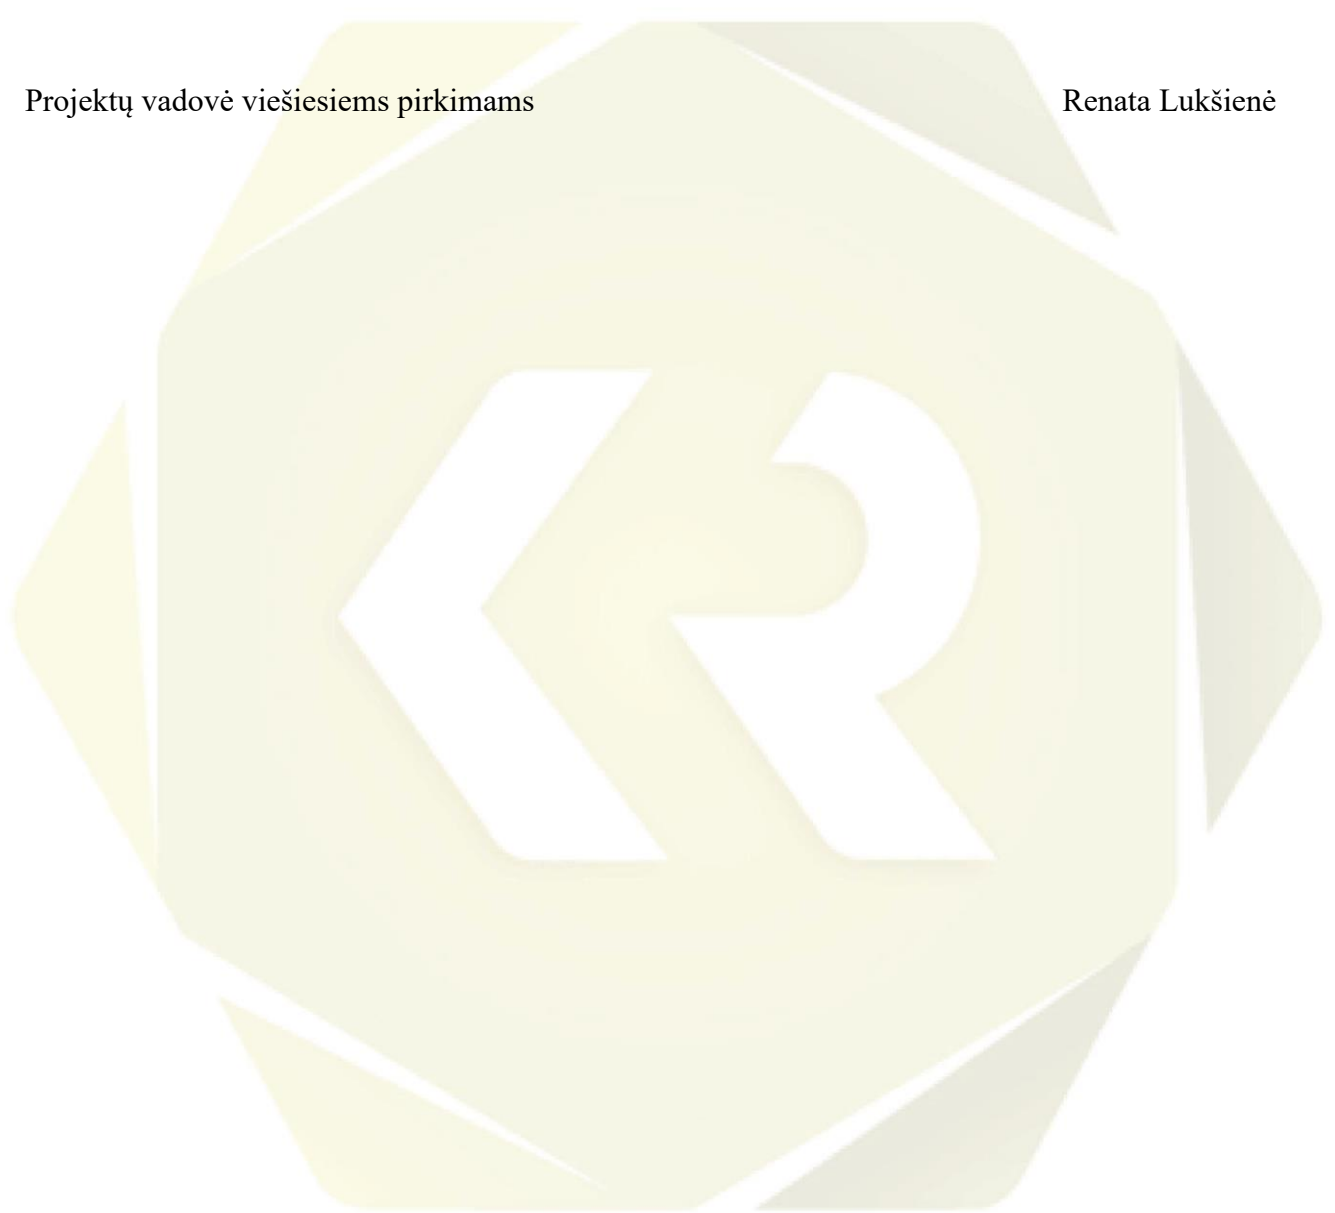

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 15,163 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

Algirdas Brazauskas



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-03-29 Kelių (pėsčiųjų ir dviračių) takų Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statyba

Statinys 1 Kelių (pėsčiųjų ir dviračių) takų Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statyba

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis, papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
2	H02K-2	Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas	100vnt	0,01	11849,49	118,49
3	MN4P-0113	Kelmų rovimas 96 kW (130 AG) galingumo kelmarovėmis , kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,01	3230,6	32,31
		Skyriuje 1				150,8
2 Žemės darbai						
4	CALKK-	Medžių atstatomoji vertė	kompl.	1,0	12381,19	12381,19
		Skyriuje 2				12381,19
		Žiniaraštyje 1				12531,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2631,72
		Iš viso žiniaraštyje 1				15163,71

Sudarė :

Sąmatininkė
Kristina Kasparavičienė

/Pavardė/

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statyba

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapu) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo rangovas]																								Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM	
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	15 mėn.	16 mėn.	17 mėn.	18 mėn.	19 mėn.	20 mėn.	21 mėn.	22 mėn.	23 mėn.	24 mėn.		[Pildo rangovas]
1.	Susisiekimo dalis (SD - 02)	6587,00	8965,00	6541,00	1258,00													6598,00	12654,00	14258,00	25369,00	27654,00	32698,00	45621,00	7029,70	195232,70	
2.	Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai (E(GAET))			3265,00	2041,00									5698,00	6541,00	3698,00	5510,00	6632,00	2002,72								35387,72
3.	Nuotekų šalinimo dalis (LVN)					2443,72																				2443,72	
4.	Konstrukcijų dalis (SK)		6541,00	3698,00	2654,00	3365,00						7895,00	6598,00	1257,00	12365,00	6598,00	7895,00	12654,00	12657,00	9646,04						93823,04	
5.	Informacinio stendo pagaminimas ir jo pastatymas pagal nustatytus reikalavimus nuoroje: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas	1000,00																								1000,00	
6.	Kadastrinių matavimų ir išpldomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktu nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas																								1000,00	1000,00	
7.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 1	12531,99																								12531,99	
		Suma be PVM*:																								341419,17	
		PVM [tarifas] suma*:																								71698,03	
		Bendra suma Eur su PVM*:																								413117,2	

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant į kainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą;

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-10-03Nr.2-150
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Lukšienė Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-03 11:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	sąmata papildomų.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklu sarasas 10-03 (002)-s1003.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-03 nuorašą suformavo Tomas Astrauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. balandžio 30 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. As-246 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-08 Nr. As-508 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-08 13:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-09 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA, LUKŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-08 15:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-09 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Česnavičiūtė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-08 15:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-08 15:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-09 11:24 - 2028-07-08 11:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-09-23 Nr. 2-136 (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-09-24 Dėl informacijos pateikimo (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-10-03,Nr.2-150_dėl_Vilkaviškio 7A.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-10 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-10 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
