

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

Prie 2017 m. balandžio 24 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. ASR-141

Susitarimas sudarytas 2019 m. rugsėjo 2 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio keliai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra adresu: S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmano Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi Rangos sutarties Nr. ASR-141 (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. balandžio 24 d., 13.1, 13.3 punktais, atsižvelgdami į 2019 m. gegužės 14 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 2019/01 (toliau – Darbų pakeitimo aktas) įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su papildomais darbais, kurie nebuvo numatyti, tačiau būtini Sutartčiai įvykdyti (užbaigti) ir kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas savo pasiūlymą ir sudarydamas šią Sutartį, bei nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Statybos darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą statybos darbą ar jo dalį būtina keisti kitu Statybos darbu, raštu pagrindžiant objektyvias aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti tokius Statybos darbus, kurie yra numatyti Darbų pakeitimo akte, sudarėme šį papildomą susitarimą:

1. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimo akte įvardintų keičiamų kitais darbais bei papildomų darbų vertė yra **19 523,22 Eur su PVM**. Vertė nustatyta pagal Rangovo pateiktus įkainuotus žiniaraščius (lokalines sąmatas), kurie numatyti Darbų pakeitimo akto prieduose ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Priimta Sutarties suma be PVM **1 042 709,89 Eur** (vienas milijonas keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai 89 ct);

PVM (21%) **218 969,08 Eur** (du šimtai aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 08 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) **1 261 678,97 Eur** (vienas milijonas du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 97 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Nazilaitė

5. Susitarimo priedas: 2017-04-24 Rangos sutarties Nr. ASR-141 Darbų pakeitimo 2019-05-14 aktas Nr. 2019/01, 6 lapai.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Įstaigos
kodas 188753657
Banko pavadinimas Swedbank, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT79 7300 0101 3530 3352
PVM mokėtojo kodas LT887536515
Tel. (8 451) 54 133,
Faks. (8 451) 54 134
El. paštas: rastine@pasvalys.lt

Povilas Balčiūnas
Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:

Data:




RANGOVAS

AB „Panevėžio keliai“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
Telefonas (8 45) 502 601
Faksas (8 45) 502 602
El. paštas: sekretore@paneveziokeliai.lt
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank, AB, b. k. 40100.

Virmantas Puidokas
Pareigos: AB „Panevėžio keliai“
Generalinis direktorius

Parašas:

Data:



Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja
Viktorija Kluogytė

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Sąjūdžio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja
Gylys Vilkas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas
Aidotas Kuodis

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Apkabinio skyriaus vedėja
Vaidija Ivicijūnaitė

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Baziliene

Projekto pavadinimas: Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas
Projekto: Nr.06.2.1 – TID – R – 511-51-0001
Rangos sutartis: Nr.ASR-141, 2017.04.24

Rekonstrukcijos objektas: Pasvalio miesto Biržų gatvės atkarpa (nuo Vilniaus g. iki Šiaurinio Pasvalio apvažiavimo)
rekonstravimas
Techninis ir darbo projektas: (ASR-240)-00-TP,DP
Data: 2019.05.14

Darbų pakeitimo aktas Nr.2019/01

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo-	Raimondo Endziulaičio
FIDIC Inžinieriaus	Povilo Meldaikio
Projektuotojo atstovo-	Andriaus Vaičiullo
Rangovo atstovo-	Roberto Petraičio

Ivertinusi statybos objekte vykdomus darbus, nustatė, kad:

Statybvietėje Rangovas vykdo 2019 rekonstrukcijos metų etapą: tęsiami betono trinkelų, dangų klojimo darbai.

1. Rekonstrukcijos objekte, atkarpoje nuo PK 0+56 iki PK 7+82, atkarpos ilgis L=726 m trinkelų dangos šaligatvis klojamas abejose gatvės pusėse. Šaligatvio plotis PL=1,5 m.

Atkarpoje nuo PK 7+82 iki PK 19+49, atkarpos ilgis L=1167 m trinkelų dangos šaligatvis klojamas vienoje (kairėje) gatvės pusėje. Plotis taip pat PL=1,5 m.

Iš gatvės, kertant rengiamą šaligatvį gyventojai patenka į savo kiemus (namų valdas).

Įvažiavimų į namų valdas kertant šaligatvį, konstrukcija yra sustiprinta, taip pat klojamos juodos spalvos trinkelės.

Nuovažų su trinkelų (juodų) danga žiniaraščiai (ASR-240)-00-DP-S.SŽ-3 (lapai 4) laida O. Su šia danga suprojektuota 61 (šešiasdešimt viena) nuovaža.

Atskiruose įvažiavimuose į namų valdas dėl esamų, susiformavusių pločių reikalingas atskirų nuovažų platinimas nuo 1 iki 2 m: tai nuovažos kurių numeriai nuovažų įrengimo darbų kiekių žiniaraštyje: 3,7,8,9,19,21,32,37,49,51,80,86 viso 12 vnt. ir 10,39,40,41,44,45,52 viso: 7vnt.

Taip pat Projekte numatytos įrengti nuovažos į namų valdas ties PK 11+25 ir PK 11+45 (kairė pusė) reikalingi pločiai atitinkamai 3,0 ir 5,0 metrai: žiniaraštis (ASR-240)-00-DP-S.SŽ lapas 6 (7), laida A.

Rangovas, aprašytų, laidos A, dokumentų pagrindu, parengė patikslintą lokalinę sąmatą.

1. Darbų pakeitimo akto punktui 1 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai -691,82 Eur. be PVM

Papildomi darbai 4332,97 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: 3641,15 Eur. (be PVM)

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilionienė

2. Projekte kaip viena iš eismo saugumo priemonių numatyti ties PK 6+03 ir PK 19+45 greičio mažinimo kalneliai. Įrengiant šią priemonę susidarytų gatvės išilginiame profilyje, dėl dangos skersinių nuolydžių ir gatvės išilginio nuolydžio patvankos paviršinėms lietaus nuotekoms. Tai išsprendžiama, kalnelių galuose, ties gatvės bortu įrengiant lataką su metalinėmis grotelėmis. Latakų poreikis ties PK 6+03, $L=(4+4)=8\text{m.}$, ties PK 19+45 $L=4\text{ m.}$ Taip pat per šaligatvį ties rekonstruojama gatve ir Gėlių g. sankryža (PK 5+80) $L=1,6\text{ m.}$ Viso latakų $L=8+4+1,6=13,6\text{ (m).}$ Tai žiniaraščio (ASR-240)-00-DP-S.SŽ. lapas 5(7) laida A. Rangovas, aprašytų laidos A, dokumentų pagrindu, parengė patikslintą lokalinę sąmatą.

2.darbų pakeitimo akto punktu 2 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai 0,00 Eur. be PVM

Papildomi darbai 1986,82 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: **1986,82 Eur. (be PVM)**

3. Rekonstruojamos gatvės sankryža su Gėlių gatve. Gėlių gatvei „įsijungiant“ į rekonstruojamą Biržų gatvę tiek posūkyje į kairę, taip pat į dešinę pėstiesiems einantiems Biržų gatvės šaligatviu (dešinė pusė) dėl tankaus pastatų užstatymo, nėra gero matomumo transportui atvažiuojančiam Gėlių gatvę link sankryžos.

Dėl didesnio pėsčiųjų saugumo, papildomai įrengiami saugos atitvarai. Bendras atitvarų kiekis $L=(10+6)=16\text{ m.}$

Tai žiniaraščio (ASR-240)-00-DP-S.SŽ, lapas 7(7) laida A, taip pat brėžinys: „gatvės planas“(ASR-240)-00-DP-S.SŽ, lapas 2(4) laida A.

Rangovas, aprašytų laidos A dokumentų pagrindu, parengė patikslintą lokalinę sąmatą

3. darbų pakeitimo akto punktu 3 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai 0,00 Eur. be PVM

Papildomi darbai 1192,29 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: **1192,29 Eur. (be PVM)**

4. Lietaus nuotekų tinklo įrengimo tikslinimas.

4.1. Iki Biržų gatvės rekonstrukcijos, gatvėje nebuvo lietaus nuotekų (paviršinio vandens) nuleidimo tinklo. Šiuo Projektu tai numatyta ir tinklas įrengtas.

Klojant lietaus nuotekynės atkarpą nuo šulinio LŠ-3 link LŠ-5, brėžinys „lietaus nuotekynės išilginis profilis“ (ASR-240)-00-DP-S.B-07, lapas 1(6), laida A.

Atliekant klojimo darbus, atkarpoje tarp šulinių LŠ-4 ir LŠ-5, ties PK 6+00 „atsiremta“ į esamos šiluminės trasos kanalą. Problema išspręsta:

- Atkarpa LŠ-3 iki LŠ-4 baigiama kloti projekto variante.
- Šulinius TR-10 ir TR-11, bei šulinį LŠ-5 įrengti projektinėse vietose.
- Pakeitimas: kloti atkarpą LŠ-5 iki LŠ-5.1. nuo LŠ-5.1 pakloti išleidėją į Lėvens upę.

Aprašytas tikslinimo varijantas pateikiamas rekonstruojamo objekto darbo projekto (DP) laida A brėžinyje: „gatvės planas“ (ASR-24)-00-DP-S.B-02, lapas 2(4), laida A „lietaus nuotekynės išilginis profilis“ (ASR-240)-00-DP-S.B-07 lapas 1(6), laida A. Taip pat suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (ASR-240)-00-DP-S.SŽ lapas 3,4,5 (7) laida A.

4.2. rekonstruojamos gatvės atkarpoje PK12+09÷12+89 (kairė) yra garažų kooperatyvas. Iki gatvės rekonstrukcijos paviršinis vanduo pagal teritorijos vertikalųjį planą ištekėdavo visu atkarpos ilgiu į gatvę. Žiemos metu minėtos atkarpos danga apledėdavo. Problemą išsprendžia papildomai paklota lietaus nuotekynės atkarpa LŠ-6, LŠ-6.1, LŠ-6.2, LŠ-6.3 viso: $L=80,4\text{ m.}$ PVCØ250 vamzdžių linija; brėžinys: „gatvės planas“ (ASR-240-00-DP-S.B-03, lapas 3(4), laida A, taip pat brėžinys: „lietaus nuotekynės išilginis profilis“ (ASR-240)-00-DP-S.B-07, lapas 1(6).laida A.

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
A. MUKA D. KULIŠ

4. Darbų pakeitimo akto punktui 4 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai -1045,05 Eur. be PVM

Papildomi darbai 5601,44 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: **4556,39 Eur. (be PVM)**

5. Iki šios gatvės rekonstrukcijos, ties šio Projekto PK 0+00 (pradžia ir jungimasis su prieš kelius metus įgyvendintu Projektu), yra įrengta eisimo organizavimo salelė: (PK0+57÷PK0+80), žiniaraštis (ASR-240)-00-DP-S.SŽ-2, lapai 2,3 (3), taip pat brėžinys „gatvės planas“ (ASR-240)-00-DP-S.B-01, lapas 1(4), laida A, brėžinys: (ASR-240)-00-DP-S.B-01 lapas 1(4), laida A.

Esamos ir numatytos įrengti salelės (išardžius esamą) paskirtis ta pati-atiskirti gatvės važiuojamąją dalį nuo transporto stovėjimo aikštelės. Tikslinga esamos salelės (granito bortai, tašyto akmens trinkelės) neardyti, palikti esamą.

5. Darbų pakeitimo akto punktui 5 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai -185,38 Eur. be PVM

Papildomi darbai 41,90 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: **-143,48 Eur. (be PVM)**

6. Projekte numatyta gatvės važiuojamoje dalyje esančius požeminių komunikacijų liukus pakeisti „plaukiojančio“ tipo liukais sunkiai apkrovai, sumontuojant gatvės asfaltbetonio dangos altitudėje. Tai nurodyta ir Projekto brėžinyje: (ASR-240)-00-DP-S.B-01, lapas 1(4), laida A.

Rangovas tai yra įvertinęs pateikdamas Užsakovui įkainotą darbų kiekį žiniaraštį: žiniaraštis, 1 gatvės konstrukcija, skyrius 1 paruošiamieji darbai, eil.Nr.31 „požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus liukus, pritaikytus sunkiai apkrovai“ 114 vnt.

Atliekant šį darbą atkasus rekonstruojamų šulinių viršutines dalis, nustatyta, kad dalis šulinių g/b dangčių, esančių žemiau liukų paaukštinimų yra sutrukę – būtinas jų keitimas:

Vandentiekio šuliniai, 3 vnt. Nr.225,162,Nr.36

Ūkio nuotekų šuliniai, 15 vnt.Nr.221,181,142,102,131,132,91,23,25,125,133,94,92,233,153. Viso: 18 vnt. komunikacijų šulinių.

6. Darbų pakeitimo akto punktui 6 lokalinė sąmata:

Nevykdomi darbai 0,00 Eur. be PVM

Papildomi darbai 4901,72 Eur. be PVM

Darbų kaina atlikus pakeitimą: **4901,72 Eur. (be PVM)**

Komisija siūlo:


Komisija:

Raimondas Endziulaitis

Povilas Meldaikis

Andrius Vaičiulis

Robertas Petraitis

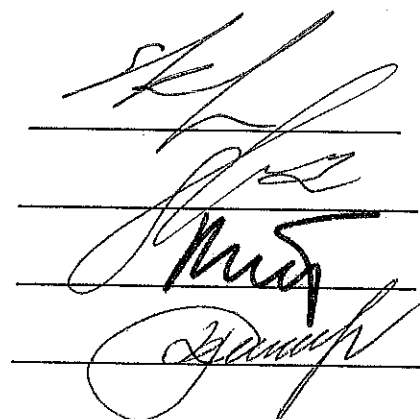

PAVEŽIO KELIAI
Tiesės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Baziliūnaitė
