

**SUSITARIMAS NR.
DĖL 2019-05-22 SUTARTIES NR. J4-110-2019 PRATĖSIMO**

2020 m. sausio 21 d.
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (juridinio asmens kodas 110648893), registruota adresu Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, kuriai atstovauja SGD verslo vystymo direktorius Tadas Matulionis, pavaduojantis generalinį direktorių, veikiantis pagal generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. P4-7 (toliau – **Užsakovas**),

ir

Jungtinės veiklos grupė UAB „Automatinių sistemų servisas“ ir **UAB „Elektrifikacijos paslaugos“**, kuriai atstovauja UAB „Automatinių sistemų servisas“ direktorius Almantas Sutkus, veikiantis pagal 2019-02-15 jungtinės veiklos sutartį Nr. 2019-32-R, (toliau – **Rangovas**),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o kartu **Šalimis**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (i) Šalys 2019 m. gegužės 22 d. sudarė Rangos sutartį Nr. J4-110-2019 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Rezervuarų parkų automatikos sistemų įrengimo darbus (toliau – **Darbai**) per Sutartyje nustatytą terminą – per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos (toliau – **Darbų atlikimo terminas**), t.y. iki **2020 m. sausio 21 d.**;
- (ii) Rangovas 2020 m. sausio 15 d. pateikė raštą dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo Nr. SR-2020-003 (pridedama), kuriuo prašoma pratęsti Sutarties įvykdymo terminą 35 (trisdešimt penkioms) kalendorinėms dienoms;
- (iii) Sutarties 3.3 punkto nuostatos numato, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovui pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, esant minėtame Sutarties punkte nustatytoms aplinkybėms. Bendra Darbų atlikimo termino pratęsimų trukmė negali būti ilgesnė nei 8 (aštuonios) savaitės;
- (iv) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad viešojo pirkimo sutarties termino pakeitimas galimas su sąlyga, kad tokio pakeitimo apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant jis gali būti atliekamas, yra iš anksto tiksliai aptartas pirkimo sutartyje.
- (v) Sutarties 6.1.1. numato, jog pratęsus Darbų atlikimo terminą Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atitinkamam terminui pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei pateikti jį Užsakovui.

Ir besivadovaudamos Sutarties 3.3.1., 3.3.3., 3.5. ir 6.1.1. punktais,


SUSITARIA TAIP:

1. Pratęsti Sutarties 3.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų, t.y. iki 2020 m. vasario 20 d..
2. Rangovas, atsižvelgdamas į šiuo susitarimu numatytą Darbų atlikimo termino pratęsimą, esant poreikiui savo sąskaita pratęs Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei pateiks jį Užsakovui.
3. Darbų atlikimo termino pratęsimas nekeičia Darbų kainos, o bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl termino pratęsimo, Užsakovo nebus atlyginami.
4. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu.
5. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje.
6. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui.
7. Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.

8. Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienas egzempliorius lietuvių kalba – po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai.
9. Pridedama – Raštas Dėl sutarties Nr. 2019-88-R vykdymo termino pratęsimo.

Užsakovo vardu

SGD verslo vystymo direktorius
Tadas Matulionis

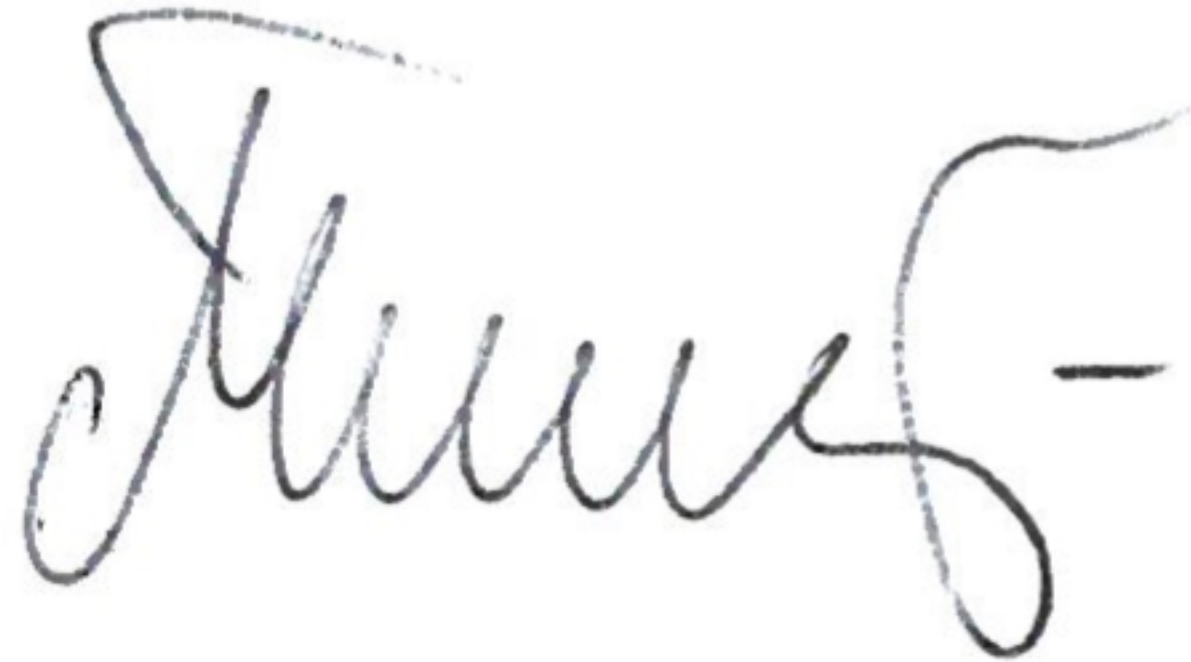

Rangovo vardu

Direktorius
Almantas Sutkus

