

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. LIEPOS 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-241
DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO

2020 m. lapkričio d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė AB „Anykščių melioracija“ ir UAB „Melingos keliai“, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio AB „Anykščių melioracija“ direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi LR VPĮ 89 str. 1 d. 2 ir 3 punktais, 2020 m. liepos 7 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. B5-241 (toliau – Sutartis) 9.8.1, 10.1 ir 10.4 papunkčiais ir atsižvelgdami į 2020 m. spalio 7 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.1. Sutarties kaina yra **138 641,61** Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 61 centas), iš kurių PVM sudaro 24 061,77 (dvidešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras, 77 centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“.

2. Koreguoti Veiklų sąrašą.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo akto Nr.1 su priedais kopija, 6 lapai.

2. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188774975
 Vytauto g. 2,
 LT-40115 Kupiškis
 Tel. (8 459) 35 500
 Faksas (8 459) 35 510
 El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt
 a. s. LT58 4010 0434 0001 0067
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
 Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Parašas

Data

A.V.

RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“
 Juridinio asmens kodas 154110362
 Mindaugo g. 23E,
 LT-29141 Anykščiai
 Tel. (8 381) 58 166
 Fakss (8 381) 58 166
 El. anyksciumelioracija@gmail.com
 a. s. LT45 7182 1000 1046 7416
 AB „Šiaulių bankas“
 Banko kodas 71821

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

Parašas.....

Data.....

A.V.

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.1

2020-10-07

Projekto pavadinimas: Kupiškio raj., Šimonių sen., Adomynės k., Šlapių g. Nr.3v29 kapitalinis remontas pagal 2020-07-07 statybos rangos sutartį Nr.B5-241.

Komisija, sudaryta iš: užsakovo atstovo, Kupiškio r. sav. Infrastruktūros skyriaus vedėjo **Mažvydo Šalkausko**; techninio priežiūrėtojo, UAB „Optimum Projektai“ techninės priežiūros vadovo **Rytauto Jakulio**; projekto vykdymo priežiūros UAB „Senergy Solutions“ atsakingo atstovo **Edvardo Černiausko**; rangovo, AB „Anykščių melioracija“, statybos darbų vadovo **Juozo Puzono**.

Komisija, apžiūrėjusi projekte vykdomus darbus ir susipažinusi su kapitalinio remonto aprašo SS1951-01-A brėžiniais bei sąnaudų kiekių žiniaraščiu **nustatė**, kad rangovui, nusižymėjus statinį ir pradėjus vykdyti darbus yra neatitikimai tarp pagal brėžinius reikalingų atlikti darbų kiekių ir projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytų kiekių. Kai kurių reikalingų atlikti darbų kiekiai yra didesni už kiekius nurodytus žiniaraštyje:

1. Kiekių žiniaraščio 2 skyriuje(„Žemės darbai“) eil. Nr.2.1 („Dirvožemio pašalinimas hvid.-0,15m ir sustūmimas <...>“) ir eil. Nr.2.2 („Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas<....>“) numatyta pašalinti dirvožemį po 1m pločio juostą į abi puses nuo esamos gatvės dangos per visą jos ilgį (pagal žiniaraštį tai sudaro $94,7\text{m}^3$), tačiau pagal brėžinius rengiant kelio konstrukciją dirvožemį reikia pašalinti po 2,5m pločio nuo esamos dangos, todėl pašalinamo dirvožemio kiekis yra $247,4\text{m}^3$ (brėžinys ,priedas Nr.1).

2. Žiniaraščio eil.Nr.2.9 („Šlaitų, griovio dugno ir teritorijos šalia planiravimas mechanizuotu būdu“), eil. Nr.2.10 („Šlaitų, griovio dugno, ir teritorijos šalia planiravimas rankiniu būdu“) ir eil.Nr.2.11 („Šlaitų ir teritorijos šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h-0,1m ir apsėjimas“) numatyta suplaniruoti, padengti dirvožemiu h-0,1m ir apsėti šlaitų, griovių ir teritorijos šalia po 1,5m nuo kelkraščio krašto (pagal žiniaraštį tai sudaro $946,0\text{m}^2$), bet kadangi dirvožemis reikalinga pašalinti nuo didesnio (1785m^2) ploto ir projektuojamas gatvės aukštis vidutiniškai yra 0,5 m aukščiau už esamą gatvės aukštį, todėl susidaro didesnis reikalingų atlikti šių darbų kiekis (1570m^2), nes pagal projektą privaloma sutvarkyti ir apsėti šlaitus, griovius ir pažeistas teritorijas šalia (brėžinys priedas Nr.2).


3. Žiniaraščio eil.Nr.3.2 („Skaldos pagrindo sluoksnio<...>įrengimas frakcija 0/45,h-0,2 m<...>“)numatyta $1692,7\text{m}^2$, tačiau pagal projekto gatvės skersinio pjūvio brėžinį SS1951-01-A.B-04 apskaičiuojamas įrengiamas skaldos pagrindo sluoksnio plotas sudaro 1705m^2 .

Komisija siūlo:

1.Papildomai $152,7\text{m}^3$ pasalinti dirvožemio h-0,15m,sustumiant į krūvas ir išvežant jį į sandėliavimo aikštelę iki 1 km atstumu.

2.Papildomai $624,0\text{m}^2$ šlaitų, griovių ir teritorijų šalia suplaniruoti, padengti dirvožemio sluoksniu h-0,1 m ir apsėti veja.

3.Papildomai įrengti 12m^2 skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio ,frakcija 0/45, h-0,2m.



Komisija siūlo šiuos papildomus darbus įtraukti į projekto vykdomų darbų kiekius, kad būtų įvykdyti visi projekto sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai.

Papildomų darbų vertė-3393,84 EUR be PVM (4106,55 EUR su PVM)

Priedama:

Priedas Nr.1. Brėžiniai pašalinamo dirvožemio kiekiui apskaičiuoti (2 vnt.).

Priedas Nr.2. Brėžinys sutvarkomam ir apsėjamam plotui apskaičiuoti.

Priedas Nr.3. Papildomų darbų sąmata.

Komisija:

Mažvydas Šalkauskas

Rytautas Jakulis

Edvardas Černiauskas

Juozas Puzonas



SĄMATA


Objektas: Vietinės reikšmės kelio Nr. 3v29 Šlapių g. Adomynės k. ruožo nuo 0,349 iki 0,655 km kapitalinio remonto darbų atlikimas

Žiniaraštis:

Iš viso: **4 106,55 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
2	Skyrius Žemės darbai				
2.1	Dirvožemio pašalinimas h=0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu	m3	152,7	1,50	229,05
2.2	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikštes iki 1 km atstumu	m3	152,7	2,50	381,75
2.9	Šlaitų, griovio dugno ir teritorijos šalia planiravimas mechanizuotu būdu	m2	624	0,69	430,56
2.11	Šlaitų ir teritorijos šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas veja	m2	624	3,52	2196,48
	Iš viso už skyrių Žemės darbai				3237,84
3	Skyrius Kelio dangos konstrukcijos įrengimas				
3.2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas frakcija 0/45, h=20 mm	m2	12	13,00	156,00
	Iš viso skyriu už Kelio dangos konstrukcijos įrengimas				156,00
	Bendra vertė be PVM				3393,84
	PVM				712,71
	Bendra vertė su PVM				4106,55

Sudarė: Statinio statybos darbų vadovas J. Puzonas



Edvardas Jankauskas
At. Nr. 33739



PK 1+00,00

Pastabos: Projekte duotas tik šlato padengimas dirvožemiui (1,5m), norint, kad kelias atrodytų estetiškai ir tvarkingai būitna dirvožemiui dengti dar 1,0 m papildomai, kitaip nepavyks šlato sklandžiai suvesti su esama situacija.


Esamas paviršius

1,50
1,00

Stang, Jos. enoch
W. 2485
June 5 Puzonas



Problema No. 1. (primera lección) Diagrama de distribución de velocidades

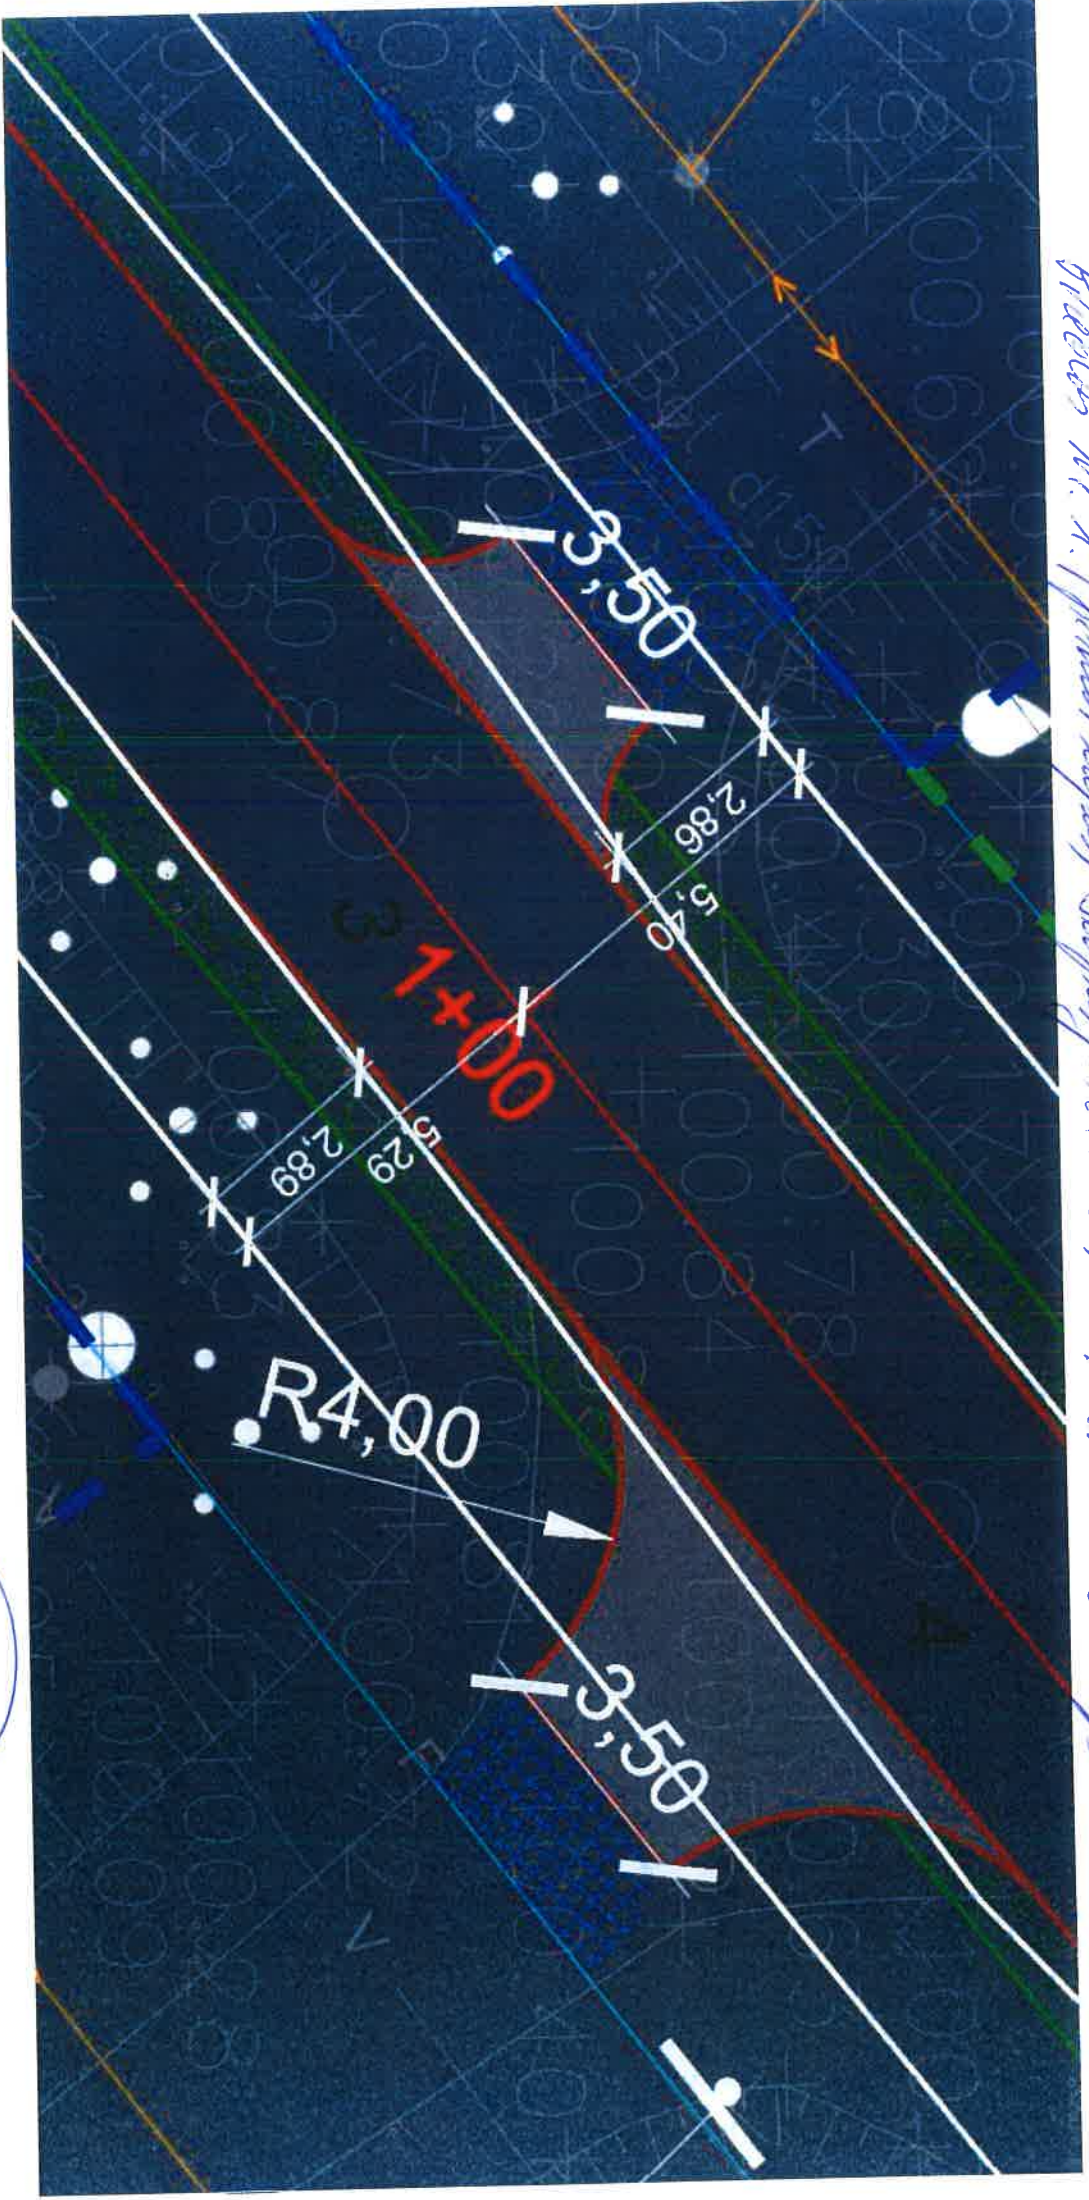


Señales de
velocidad
Jorge Pizarro

[Firma]

Proekta Nr.1 (2 lapas) Šilpiai g. dešiniojo pėsčiųjų kėčiūgas.

PK 1+00,00

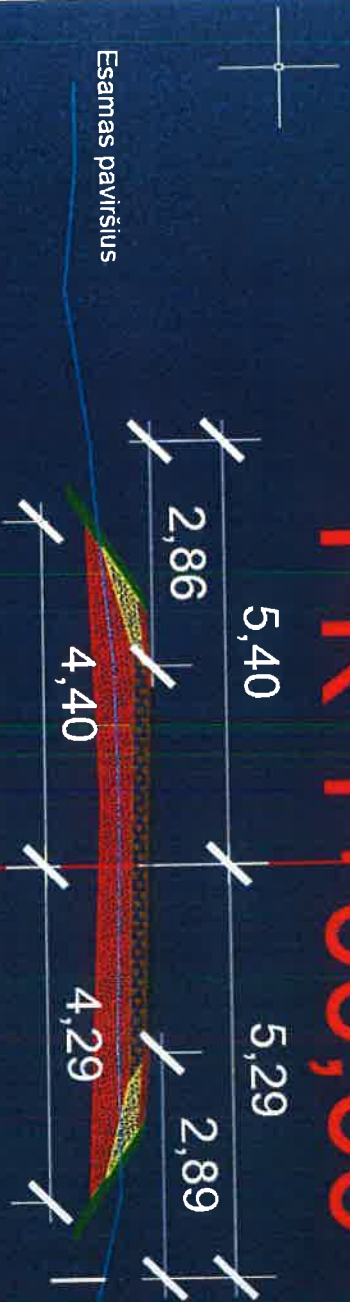

- 1) Technologinė, minimali, darbų zona be augalinio grunto
- 2) Atstumas nuo senos dangos iki augalinio šalinimo ribos
- 3) Žemės sankasos plotis

Pastabos: Paimtas vienas pjūvis kaip pavyzdys, kaip skaičiuotas augalinio grunto šalinimo plotas.

Sąlygos šilpiai
vėdinimas
Jugos Puzonas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 3V29 ŠLAPIŲ G. ADOMYNĖS K. RUOŽO NUO 0,349 IKI 0,655 KM KAPITALINIO
REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	2020 m.						Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	
1.	Kapitalinio remonto darbai:							
1.1.	Pruošiamieji ir ardymo darbai	8190,00						8190,00
1.2.	Žemės darbai		13000,00	10000,00				23000,00
1.3.	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas			30000,00	30676,00			60676,00
1.4.	Sankryžų/nuovazų įrengimas				4000,00	4465,00		8465,00
1.5.	Dangų suvedimų įrengimas				2915,00			2915,00
1.6.	Kelkraščių įrengimas						3915,00	3915,00
1.7.	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje						530,00	530,00
1.8.	Esami inžineriniai tinklai		250,00					250,00
1.3.	Vandens nuvedimo sprendiniai		1850,00					1850,00

2.	Išpildomosios nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos patikslinimas									1395,00	1395,00
3.	Papildomi darbai									3393,84	3393,84
										Suma be PVM:	114579,84
										PVM [21 proc.] suma:	24061,77
										BENDRA SUMA su PVM:	138641,61

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Projekte, techninėje specifikacijoje (projekte) numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pilnas kartu su galimais numatoma rangovo rizika, prievolės ir išpareigojimai apibūdinti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdam. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Direktorius Gintaras Pauliukevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2020 M. LIEPOS 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-241 DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-19 Nr. B5-431 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 11:36
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Pauliukevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 18:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-19 18:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-20 14:00 - 2021-06-19 14:00
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-20 11:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo Nr. 1 priedas. Aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo Nr. 1 priedas. Veiklų sąrašas.PDF
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201117.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-22 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
