

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ,
BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE
Rangos sutartis Nr. 21-03-26/PS-**

Šia sutartimi, sudaryta 2021 metų kovo mėnesio 26 dieną tarp:

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu/Užsakovu“), atstovaujanti vieną sutarties šalį,

ir

UAB „SROS“, juridinio asmens kodas 144696222, kurio registruota buveinė yra Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šmočiuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Perkantysis subjektas/Užsakovas priima Rangovo 2021 metų vasario 23 d. pasiūlymą pilnai atlikti **sutarties „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“** (toliau – Sutartis) darbus, kurie apima techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvninkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ **II-ame etape** numatytus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtos darbus, kaip jie yra aprašyti techninio projekto aiškinamajame rašte bei detalizuoti kitose techninio projekto dalyse, taip pat ištaisyti atsiradusius darbų defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos sutartis, 2 lapai.
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, 6 lapai.
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, 6 lapai.
- (d) Konkrečios Sutarties sąlygos, 19 lapų.
- (e) Bendrosios Sutarties sąlygos, 1 lapas.
- (f) Techninis projektas „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvninkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“, 161 lapas.
- (g) Įkainoti darbų kainų žiniaraščiai, 3 lapai.

3. Sutarties galiojimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos (8 mėn. darbų baigimo laikas + 1 mėn. statybos užbaigimo procedūroms ir galutiniam atsiskaitymui įvykdyti). Darbų baigimo laikas (kartu ir Sutarties galiojimo terminas) gali būti pratęstas esant aplinkybėms, numatytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkte, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesių laikotarpiui.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.

5. Priimtą **Sutarties kainą** sudaro:

618 440,00 Eur (šeši šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct),

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) :

129 872,40 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 40 ct),

Priimta sutarties suma su PVM:

748 312,40 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvylika eurų ir 40 ct).

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Sutarčiai bus taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašant 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai arba Šalims pasirašant vieną sutarties egzempliorių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9. Tai patvirtindamos šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

Sutarties šalių rekvizitai:

UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva, įmonės kodas 144133366, PVM mokėtojo kodas LT 441333610, A.s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590, AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71800, tel. Nr.: (8 41) 525 550, fakso Nr.: (8 41) 592 266, el. paštas: office@siauliuvandenys.lt,

ir

UAB „SROS“, Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai, Lietuva, įmonės kodas 144696222, PVM mokėtojo kodas LT446962219, sąskaitos numeris LT78 7300 0100 0239 9208, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. Nr.: (8 41) 540 001, fakso Nr. (8 41) 540 290, el. paštas: info@sros.lt.

PERKANTYSIS SUBJEKTAS/UŽSAKOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

.....
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

.....
Pareigos

.....
Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti UAB „Šiaulių vandenys“ vardu

Data.....

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

.....
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

.....
Pareigos

.....
Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti UAB „SROS“ vardu

Data.....

Rangos sutarties
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO
JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ, BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE

sudedamoji dalis (b)

Pirkimo dokumentų paaiškinimai, 6 lapai.



Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PRAŠYMUS

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2021-02-08 10:32 val., 2021-02-09 15:09 val., 2021-02-10 09:44 val. CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2021-02-05 CVP IS, pirkimo Nr. 530637) sąlygas:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Techninio projekto punkte 10.22. Nuotekų siurblinės - 10.22.1. Bendri reikalavimai nuotekų siurblinei- nurodyta „Nuotekų siurblinių medžiaga – armuotas stiklo pluoštas, siurblinės korpuso skersmuo ne mažiau kaip 1500 mm (parenkamas priklausomai nuo perpumpuojamų nuotekų debito). Siurblinės aptarnavimo dangtis iš armuoto stiklo pluošto su apšiltinimu.

Ar galima siūlyti siurblines, pagamintas iš ne prastesnių fizinių, mechaninių savybių medžiagos – aukšto tankio polietileno (HDPE) dviguba dienele?“

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Projekte nurodoma siurblinėms naudoti armuotas stiklo pluoštas. Ar galima naudoti siurblines, pagamintas iš ne prastesnių fizinių, mechaninių savybių medžiagos – aukšto tankio polietileno (HDPE) dviguba dienele?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Techninio projekto sprendiniuose projektuotojo parinktas nuotekų perpumpavimo siurblinių korpusas numatytas iš armuoto stiklo pluošto, tačiau rangovui rengiant darbo projektą, darbo projekto rengėjas (projektuotojas) nuotekų siurblinių korpusus galės parinkti ir iš kitų lygiaverčių techninių charakteristikų medžiagų.

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar konkurse pateiktam projektui atlikta ekspertizė, gautas NŽT sutikimas, statybos leidimas?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Uždaroji akcinė bendrovė
Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai
Tel. (8 41) 525 550
Faks. (8 41) 592 266
El. p. office@siauliuvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 144133366
PVM mokėtojo kodas LT441333610

A. s. LT37 7180 0000 0246 7590
AB Šiaulių bankas

Perkantysis subjektas turi galiojantį, techniniame projekte „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ suprojektuotų statinių statybą leidžiantį dokumentą.

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kas vykdys projekto vykdymo priežiūros paslaugas?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Projekto vykdymo priežiūrą vykdys techninį projektą parengęs projekto vadovas.

5 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Nebegalioja ESO prisijungimo sąl. Kas bus atsakingas už naujų sąlygų gavimą? Ar reikia įsivertinti AB ESO projektų parengimą?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Pateikiame atnaujintas ESO prisijungimo sąlygas (pridedama). Elektrinės, automatikos projekto dalių parengimas, vadovaujantis techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ aiškinamojo rašto 5 punkto nuostata, yra Rangovo atliekamų darbų apimtyje.

6 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kokia numatyta pirkimo vertė ? Ar konkursuojamasi tik II etapas ?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Pirkimo objektas yra nurodytas Pirkimo sąlygų 13 punkte. Siekiant skatinti konkurencingų pasiūlymų pateikimą bei užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, pirkimui numatytų lėšų suma tiekėjams nebus atskleista.

Komisijos pirmininkas

Aurimas Rutkauskas

V. Preikšaitienė, tel. (8 615) 0285



Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PRAŠYMAS

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2021-02-11 12:19 val., 2021-02-12 09:49 ir 2021-02-12 13:30 CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2021-02-05 CVP IS, pirkimo Nr. 530637) sąlygas:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašau pateikti II etapo vandentiekio, nuotekų tinklų išilginius profilius.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Tinklų išilginiai profiliai nėra sudėtinė techninio projekto dalis, todėl Perkantysis subjektas jais nedisponuoja.

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašau nurodyti II etapo slėginės nuotekų linijos išleidimo ir nuorinimo šulinius.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Perkantysis subjektas šia informacija nedisponuoja. Nuorinimo ir išleidimo šulinius turi numatyti projektuotojas darbo projekto sprendiniuose.

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar II etapo siurblinėse reikalingos smulkinančios grotos ir teritorijos apšvietimas?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Reikalavimai siurblinėms ir jų įrengimui detalizuoti techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ aiškinamojo rašto 3 skyriuje bei techninio projekto Priedo Nr. 1 „Nuotekų siurblinių valdymo automatikos skydų (SVAS) elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo minimalūs reikalavimai“ 1.1.3. punkte. Vadovaujantis nustatytais reikalavimais, smulkinančios grotos ir siurblinių teritorijų apšvietimas nenumatomas.

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašau nurodyti programinį išeities kodą Scada sistemai.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Naudojama Scada vizualizacijos programa WinCC.

5 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašau pateikti reikalavimus ar nurodymus programiniai projekto daliai.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Reikalavimai elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalims detalizuoti techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ Priede Nr. 1 „Nuotekų siurblių valdymo automatikos skydų (SVAS) elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo minimalūs reikalavimai“.

6 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar reikia į siurblių kainą įvertinti debitomačius?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Reikalavimai siurbliams ir jų įrengimui detalizuoti techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ Priedo Nr. 1 „Nuotekų siurblių valdymo automatikos skydų (SVAS) elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo minimalūs reikalavimai“ 1.1.1. ir 1.2.2.1.5. punktuose. Vadovaujantis nustatytais reikalavimais, debitomačiai turi būti įvertinti pasiūlymo kainoje.

7 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar reikalinga į siurblių kainą įvertinti valdymo skydus ir plūdės?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Reikalavimai siurbliams ir jų įrengimui detalizuoti techninio projekto „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“ Priedo Nr. 1 „Nuotekų siurblių valdymo automatikos skydų (SVAS) elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo minimalūs reikalavimai“ 1.1.2., 1.2.2.1.1. punktuose ir 1.1. skyriuje. Vadovaujantis nustatytais reikalavimais, skydai ir plūdės turi būti įvertinti pasiūlymo kainoje.

Komisijos pirmininkas

Aurimas Rutkauskas



Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PRAŠYMUS

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2021-02-12 16:23, 2021-02-15 09:59, 2021-02-15 14:19 ir 2021-02-17 13:10 CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2021-02-05 CVP IS, pirkimo Nr. 530637) sąlygas:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar teisingai suprantame, kad vandentiekio įvadus numatyta jungti nuo magistralinės linijos dn 315 ir dn 200 panaudojant virinamus PE balnus?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Techninio projekto sprendiniuose (Aiškinamojo rašto 3 skyrius, Techninės specifikacijos 6.1 punktas) projektuotojo numatyta vandentiekio įvadų ir hidrantų atšakų prijungimą prie skirstomojo vandentiekio tinklo, atlikti PE trišakiais.

Rangovui rengiant darbo projektą, darbo projekto rengėjas (projektuotojas) požeminių vandentiekio atšakų įvadų pajungimo būdą galės parinkti ir iš kitų lygiaverčių techninių charakteristikų medžiagų, t.y. pajungimui naudoti virinamus PE balnus.

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome nurodyti kas ruošė techninį projektą?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Techninio projekto rengėjas yra nurodytas techninio projekto tituliniam lape.

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar pateiksite techninį projektą DVG formatu?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Perkantysis subjektas techninį projektą redaguojamu formatu (dwg brėžinius) pateiks Konkurso laimėtojai po sutarties pasirašymo.

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašau nurodyti II etapu kurie gaisriniai hidrantai montuojami, nes darbų kiekių žiniaraštyje ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje projekte yra 6 vnt. skaičiuojant II etapo gatvėse numatytus gaisrinius hidrantus gaunasi 9 vnt (GH 20; GH 22; GH 23; GH 25; GH 26; GH 27; GH28; GH 29; GH 32). Kokie gaisriniai hidrantai nemontuojami vykdant II etapo darbus?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

II etapu montuojami šie gaisriniai hidrantai: GH20, GH21, GH22, GH23, GH26 ir GH32 (6 vnt.).

Komisijos pirmininkas

Aurimas Rutkauskas

Rangos sutarties
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO
JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ, BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE

sudedamoji dalis (c)

Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, 6 lapai.

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo numeris: 530637

Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“

Šiauliai 2021-02-23

Perkantysis subjektas/Užsakovas:

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai, Lietuva
Tel. Nr. (8 41) 525 550, Fakso Nr. (8 41) 592 266

Konkurso dalyvis:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB „SROS“, įmonės kodas: 144696222, Metalistų g. 1g, LT-78109 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su Perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Marius Šmočiukas, tel. - 8 41 540001, faks. - 8 41 540290, el. p., adresas - info@sros.lt

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į Jūsų skelbimą apie pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“, teikdami šį Pasiūlymo raštą pareiškiame, kad:

1. Išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2021 m. 02 mėn. 05 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 530637 bei pirkimo dokumentų turiniu visoje CVP IS sistemoje skelbtoje apimtyje, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi pirkimo dokumentuose ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, siūlome atlikti pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus.

3. Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Mūsų pasiūlymo kaina **be PVM** yra:

618 440,00 Eur (šeši šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct).

5. PVM yra:

129 872,40 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 40 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo atveju), jis „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis (tikslas nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas), dėl kurių PVM nemoka.

6. Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra:

748 312,40 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvylika eurų ir 40 ct).

7. Pasiūlymas galioja iki **2021 m. gegužės 24 d. (įskaitytinai)**.

8. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti pirkimo sutartį, pateiksime sutarties įvykdymo užtikrinimą, vadovaujantis Konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punkto nuostatomis.

9. Patvirtiname, kad nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį.

10. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodamas šia teise, Perkantysis subjektas nebus mums jokių būdu atsakingas.

11. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos **ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamės**, siekiant atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

(nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas (jei toks yra, Kvazisubtiekiejo vardas ir pavardė)	Ūkio subjektui ir /ar kvazisubtiekiejui numatomi perduoti darbai	Sutarties dalis (apimtis Eur, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą ir/ar kvazisubtiekieją	Kvalifikacinis reikalavimas (nuoroda į pirkimo sąlygų punktą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ir/ar kvazisubtiekiejų pajėgumais
1.	MB „Palaimos projektai“, į/k 304398152, Mikalajūnų g. 9, LT-19201 Širvintų r.	darbo projekto rengimo darbai	14000,00 €, 2,26 %	34.2 p.

12. * Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekiejus:

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekieją
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei yra žinomi subtiekiejai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui, bet jų pajėgumais nebus remiamasi, siekiant atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

13. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios **atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai su žyma „Konfidencialu“):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis/ puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Paiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs
1	Konfidencialu Ketinimų protokolas.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
2	Konfidencialu Sutikimas_0005.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
3	Konfidencialu Atsiliep ir dekl Aukst..pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
4	Konfidencialu Informacija apie sutarti.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
5	Konfidencialu Sutikimas_0001.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
6	Konfidencialu Sutikimas_0002.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
7	Konfidencialu Sutikimas_0003.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
8	Konfidencialu Sutikimas_0004.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
9	Konfidencialu_Specialist u sarašas.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
10	Konfidencialu Mokėjimas už garantiją.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis
11	Konfidencilu Imones istatai.pdf	Visa	Komercinė – gamybinė paslaptis

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.** Tuomet, Konkurso laimėjimo atveju, Perkantysis subjektas turės teisę visą laimėjusiam pasiūlyme esančią informaciją (išskyrus informaciją, kurios konfidencialumą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, pavišinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	espd-response_P.pdf	14
2	Jungtine_pazyma 20210214.pdf	2
3	Konfidencialu Ketinimų protokolas.pdf	1
4	Konfidencialu Sutikimas_0005.pdf	1
5	Kvalif atestatai df	2
6	RC isplestinis P.pdf	2
7	atestatai.pdf	2
8	espd-response_SROS pdf	15

9	Garantija.asice	1
10	Garantija.pdf	1
11	Geodezininko paz.pdf	1
12	Igaliojimas_Arunas Gaucas.pdf	1
13	ISO setr_SROS_LT.pdf	3
14	Jungtine_pazyma_SROS.pdf	2
15	Konfidencialu Atsiliep ir dekl Aukst..pdf	11
16	Konfidencialu Informacija apie sutarti.pdf	1
17	Konfidencialu Sutikimas_0001.pdf	1
18	Konfidencialu Sutikimas_0002.pdf	1
19	Konfidencialu Sutikimas_0003.pdf	1
20	Konfidencialu Sutikimas_0004.pdf	1
21	Konfidencialu_Specialistu sarašas.pdf	1
22	Konfidencilu Imones istatai.pdf	3
23	Konkursinis žiniaraštis.pdf	3
24	Matininko paz.pdf	1
25	Pasiūlymo priedas.pdf	2
26	_____ .pdf	1
27	RC išplestinis israsas_SROS.pdf	8
28	_____ atest.pdf	1
29	SROS ŠPSC atestatas 2018.pdf	1
30	VEI Atestatas Elektra.pdf	2
31	_____ pdf	1
32	Konfidencialu Mokejimas už garantiją.pdf	1

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marius Šmočiukas

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARIUS ŠMOČIUKAS
Data: 2021-02-23 16:13:2

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečių sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva Tel. (8 41) 52 55 50 Faks. (8 41) 59 22 66
Perkantysis subjektas	1.1.2.11	UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva Tel. (8 41) 52 55 50 Faks. (8 41) 59 22 66 Perkančiojo subjekto vadovo už sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmuo: Techninės priežiūros vadovas Vladas Jakas Tel. (8 41) 52 55 80 El. paštas: vladas.j@siauliuvandenys.lt
Rangovas	1.1.2.3	UAB „SROS“ Metalistų g. 1g, LT-78109 Šiauliai 8 41 540001 / 8 41 540290 / info@sros.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Marius Šmočiukas Metalistų g. 1g, LT-78109 Šiauliai 8 41 540001 / 8 41 540290 / info@sros.lt
Inžinierius	1.1.2.4	Užsakovas paskirs Inžinierių iš savo personalo, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžios data yra Sutarties įsigaliojimo data.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	8 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data.
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečių sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2	Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbo baigimo terminas + 60 dienų po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Programos pateikimo laikas	8.3	Per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimą sąlygos nurodytos Bendrųjų sąlygų 8.4 punkte ir Rangos sutarties 3 punkte.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,03 % kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas asmuo.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Marius Šmočiukas

(Vardas ir pavardė)

Rangos sutarties
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO
JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ, BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE

sudedamoji dalis (d)

Konkrečios Sutarties sąlygos, 19 lapų.

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.6	Žiniaraščiai
	<i>Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainos žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	<i>Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:</i> „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat vykdo Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkantysis subjektas
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas“:</i> Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede. Perkančiojo subjekto vadovo už sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmuo nurodytas Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.

1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	<i>1.1.3.7 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>
1.1.3.8	Atlikimo pažyma
	<i>1.1.3.8 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>
1.1.3.10	Statybos užbaigimo dokumentai
	<i>Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentai“</i> Statybos užbaigimo dokumentai – Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomi dokumentai, patvirtinantys, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	<i>Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Priimta Sutar ties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.4.4	Galutinio mokėjimo pažyma
	<i>1.1.4.4 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>
1.1.4.5	Galutinė ataskaita
	<i>1.1.4.5 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>
1.1.4.10	Rezervinė suma
	<i>1.1.4.10 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>
1.1.4.11	Sulaikomi pinigai
	<i>1.1.4.11 papunkčio nuostatos netaikomos.</i>

1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	<i>Papildyti 1.1.6.1 papunktį</i> Ši sąvoka taip pat apima darbo projektą, rengiamą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir techniniame projekte nustatytais reikalavimais, taip pat statinių (vandentiekio / nuotekų tinklų, nuotekų siurblių) kadastrinių matavimų bylų parengimą ir žemės sklypų planų, kuriuose bus pastatyti statiniai, atnaujinimą (žemės sklypo kadastro duomenų atnaujinimą), kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose ir kituose teisės aktuose. Už šiame papunktyje nurodytų dokumentų parengimą yra atsakingas Rangovas.
1.1.6.5	Įstatymai
	<i>Papildyti 1.1.6.5 papunktį</i> Ši sąvoka apima Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybą reglamentuojančius aktus.
1.1.6.7	Statybvietė
	<i>Papildyti 1.1.6.7 papunktį:</i> „Statybvietė“ - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos techniniame ir (arba) darbo projekte, atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų.
1.7 punktas	Teisių perleidimas
	<i>1.7 punkto a) papunktis netaikomas.</i>
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>Papildyti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas/Perkantysis subjektas turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija

	<i>Papildyti 1.12 punktą naujomis pastraipomis:</i> Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente. Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų ir vykdyti visas šiuose teisės aktuose rangovams nustatytas prievolės ir pareigas.
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos prieš jungtinės veiklos partnerio pakeitimą, Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. Sutarties šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl jungtinės veiklos partnerio pakeitimo. Susitarimas dėl jungtinės veiklos partnerio pakeitimo yra neatskiriama Sutarties dalis.
1.15 punktas	Perkančiojo subjekto funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“</i> Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo jai nustatytas funkcijas.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.1 punktas	Teisė naudotis statybviete
	<i>Papildyti 2.1 punktą:</i> Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo

	datos. Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą ir leidimą.
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Papildyti 2.2 punktą sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų (jei reikalinga) perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“:</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę, Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti Sutarties vykdymo metu gautus Užsakovo nurodymus jeigu jie neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	<i>Išdėstyti 3.1 punkto pirmą pastraipą taip:</i> Užsakovas paskiria Inžinierių, kuris atlieka pareigas, numatytas pagal Sutartį. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subtiekėjus, (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą, (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą <i>[Teisė daryti Pakeitimus]</i> atlikti Pakeitimus.
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	<i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalausti Sutarties

	Šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus Sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems susirinkimo dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu:</i> Rangovas privalo parengti darbo projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis bei Užsakovo reikalavimais. <i>Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu:</i> Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti Sutartyje reikalaujami dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. <i>Papildyti 4.1 punkto ketvirtą pastraipą sakiniu:</i> Rangovas privalo statybos darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų bei Užsakovo reikalavimais.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	<i>Panaikinti 4.2 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pristatyti Užsakovui sutarties atlikimo užtikrinimo dokumento (-ų) originalą (-us) arba pervesti užstatą į UAB „Šiaulių vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT457180000005467365, esančią AB „Šiaulių bankas“. Atlikimo užtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas kaip Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko ar kredito unijos besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu ir mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta arba užstatu, pervedamu į UAB „Šiaulių vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT457180000005467365, esančią AB „Šiaulių bankas“. Tuo atveju, kai teikiama Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko ar kredito unijos besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu,

	Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (ir turinį) ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdydė. Sutarties vykdymo metu Atlikimo užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškomis aplinkybėms, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą Atlikimo užtikrinimą. <i>Panaikinti 4.2 punkto trečią pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 60 dienų po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Jeigu 28 dienas prieš Atlikimo galiojimo termino pabaigą dar nėra išduota Perėmimo pažyma, tai Rangovas privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką pastraipoje aukščiau nurodytomis sąlygomis, t.y. Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 60 dienų po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. <i>Papildyti 4.2 punkto ketvirtos pastraipos (d) papunktį ir jo pabaigoje įrašyti:</i> Nutraukus Sutartį pagal 15.2 punktą, Užsakovas įgyja teisę į visą Atlikimo užtikrinimo sumą. <i>Panaikinti 4.2 punkto šeštą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Rangovui pareikalavus, Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	<i>Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą:</i> Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas Sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. <i>Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą:</i> Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	<i>Pakeisti 4.4 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> 4.4 punktas. Subtiekiejai. Sutarties vykdymui numatomi pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, ir subtiekiejai (toliau šiame punkte bendrai vadinami „subtiekiejai“) nurodyti Pasiūlymo rašte. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti taip pat ir apie kitus tuo metu

	žinomus subtiekęjus, nurodydamas jų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti naują (-us) subtiekęją (-us) arba kai subtiekęjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjas (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekęją (-us). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekęjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo priežastis bei pateikdamas šio punkto 3-ioje pastraipoje numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekęjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties vykdymo metu, kai Rangovas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekęjų. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas šio punkto 3-ioje pastraipoje numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekęjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei keičiamas arba atsisakoma ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais Rangovas rėmėsi, siekiant atitikti pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, naujai paskirtas subtiekęjas (-ai) (arba Rangovas, jeigu atsisakoma subtiekęjo) privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienos prieš subtiekęjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. Pažeidus šiame punkte nustatytą subtiekęjų keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį. Subtiekęjo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekęjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už subtiekęjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	<i>4.5. punktas netaikomas</i>
4.12 punktas	Nenumatomos fizinės sąlygos
	<i>Pakeisti ketvirtą 4.12 punkto pastraipą (įskaitant ir jos (a) ir (b) papunkčius) ir visą pastraipą išdėstyti taip:</i> Jeigu Rangovas susiduria su fizinėmis sąlygomis, kurias nenumatomos, apie tai praneša ir dėl jų uždelsia, tai Rangovas turi teisę pagal 20.1 punktą [<i>Rangovo pretenzijos</i>] reikalauti pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to vėluojama arba bus vėluojama užbaigti Darbus, pagal 8.4 punktą [<i>Baigimo laiko pratęsimas</i>]. <i>Panaikinti šeštą 4.12 punkto pastraipą.</i>

4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir dokumentus, patvirtinančius atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms“.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas Sutarties vykdymui medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	4.21 punkto nuostatos netaikomos.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietyje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų pastatymu ir priežiūra visą statybos laikotarpį.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 „Esamos inžinerinės komunikacijos“: Vykdam žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietyje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą inžineriniams tinklams ir (arba) susisiekimo komunikacijoms atliekant Darbus, įskaitant ir subtiekjų (subrangovų) atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.
5 straipsnis. Paskirtieji subrangovai	
5 straipsnio nuostatos netaikomos.	
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.

6.9 punktas	Rangovo personalas
	<i>Papildyti 6.9 punktą po antro sakinio įterpiant:</i> Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbo kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	<i>Papildyti 7.1 punkto (a) papunktį, sakinio gale pridedant:</i> (a) bei galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. <i>Papildyti 7.1 punktą, įrašant paskutinę pastraipą:</i> Visais atvejais, darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.2 punktas	Pavyzdžiai
	<i>Pakeisti 7.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas prieš pristatydamas į statybą turi pateikti Užsakovui ir Inžinieriui patvirtinti medžiagų / įrangos, kurios bus naudojamos vykdant Darbus, sąrašą ir atitiktį standartams ir kitiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Užsakovo arba Inžinieriaus pareikalavimu, Rangovas turi pateikti numatomų naudoti medžiagų / įrangos pavyzdžius. Darbams naudojamos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai. Užsakovas turi teisę savo sąskaita užsakyti nepriklausomų laboratorijų ar ekspertų vertinimą, kuriuo būtų patikrinta ir patvirtinta Rangovo siūlomų naudoti medžiagų / įrangos savybių ir techninių parametrų atitiktis deklaracijose ir (arba) standartuose nurodytiems parametrams.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	<i>Papildyti 7.6 punkto (c) papunkčio pirmą pastraipą:</i> c) po „Darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	<i>Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Darbo pradžios data yra Sutarties įsigaliojimo data.
8.3 punktas	Programa
	<i>Pakeisti 8.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i>

	Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos privalo pateikti išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia Darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė Programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Programa turi apimti: a) Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti darbo projekto (-ų) parengimo terminai, statybos darbų statiniuose terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui terminai ir datos. b) Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Darbų eiliškumas turi būti planuojamas taip, kad iki planuojamos darbų technologinės pertraukos (pvz. šaltuoju metų laiku), būtų baigti atitinkamose gatvėse arba jų atkarpose pradėti vykdyti vamzdynų statybos darbai, atstatant laikiną arba nuolatinę gatvės dangą. c) statybos darbų technologijos projekto, rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis, parengimą. Programa turi būti aiški ir apimti visas Darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkiają pagalbinių informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Užsakovas / Inžinierius per 5 dienas po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, raštu nurodymas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius / Užsakovas per 5 dienas po Programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodymas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal Programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis Programa. Rangovas, nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą Programą. Pataisytos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti Darbus Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelsimą
	<i>Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Kompensacija už uždelsimą yra vienintelė kompensacija, kurią už tokį nevykdymą Užsakovo pareikalavimu privalo mokėti Rangovas. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. Rangovui per 30 dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo nesumokėjus priskaičiuotos kompensacijos už uždelsimą sumos, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 4.2 punkto (b) papunkčiu.

	Papildyti 8.7 punktą: Jei taikomos šio punkto nuostatos, laikoma kad Sutartis yra galiojanti ir lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus techninio projekto specifikacijose ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	Papildyti 10.1 punktą, po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 punkto (b) papunktį ir jį išdėstyti taip: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pataisyti / pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju, Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti / ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo dokumentas (-ai) ir įvykdytos visos prievolės.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	

11 straipsnio nuostatos sutarčiai netaikomos.	
Sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatos dėl statinio garantinio termino ir rangovo prievolių per garantinį terminą.	
12 straipsnis. Bandymai po baigimo	
12.1 punktas	Bandymų po baigimo procedūra
	<i>Papildyti 12.1 punktą pastraipa:</i> Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti Pakeitimus
	<i>Pakeisti 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. Sutarties sąlygų keitimų nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	<i>Pakeisti 13.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma pagal Rangovo pasiūlyme Darbų kainos žiniaraštyje nurodytus įkainius, o jeigu tokio įkainio nėra, vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą.
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	<i>Pakeisti 13.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis (Užsakovas, Rangovas ar Inžinierius), inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia raštišką pasiūlymą (prašymą) keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
13.4 punktas	Mokėjimas tinkama valiuta
	<i>13.4 punkto nuostatos netaikomos</i>

13.5 punktas	Rezervinės sumos
	<i>13.5 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.6 punktas	Padienis darbas
	<i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	<i>Pakeisti 13.7 punktą:</i> Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Sutarties kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis įforminamas sutarties šalių sudarytu raštišku sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>Pakeisti 13.8 punktą:</i> Sutarties vykdymo laikotarpiu Darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu per šį laikotarpį statybos sąnaudų kainų indeksas pasikeičia daugiau negu 10 proc. Perskaičiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt duomenų bazėse paskelbtus mėnesinius Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (toliau – SSKI). Perskaičiavimas atliekamas neatliktų Darbų kainą/neišmokėtos Sutarties kainos dalį / Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas taip: $SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$; $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos; $SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos. Perskaičiavimo formulė taikoma tik neatliktiems (neužaktuotiems) Darbų kiekiams (apimtims). Darbų kainos pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies / neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, statybos sąnaudų kainų indeksas pasikeičia daugiau negu 10 procentinių punktų, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusiu SSKI.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	<i>Pakeisti 14.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties kaina apskaičiuota taikant fiksuotos kainos su peržiūra būdą. Kainos

	peržiūros sąlygos ir tvarka nustatyta 13.8 punkte. Užsakovas už visą Rangos sutartyje numatytą objektą sumokės Rangovui visą Pasiūlymo rašte nurodytą kainą, jeigu faktinė Darbų kainos žiniaraštyje nurodyta darbų kiekių apimtis nesiskirs daugiau kaip 10 (dešimt) proc. Tuo atveju, jei vykdant sutartį atsiras poreikis atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 proc. Darbų kainos žiniaraštyje nurodytų darbų kiekių apimties, šie darbai bus atsisakomi / įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.
14.2 punktas	Išankstinis mokėjimas
	<i>14.2 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	<i>Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos atliktų darbų aktą (du egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu atliktų darbų aktu privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu), atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygi už darbus, įrašytus pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Rangovui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, apskaičiuotą už darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (<i>Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas</i>). Rangovo teikiamame paskutiniame atliktų darbų akte nurodoma, kad tai galutinis atliktų darbų aktas.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	<i>14.4 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	<i>Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:</i> Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 7 dienas nuo jų gavimo. <i>Papildyti punktą paskutine pastraipa:</i> Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei atliktų statybos darbų atitiktį techniniam projektui patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.7 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Užsakovas už atliktus darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po pasirašyto atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už darbus, įrašytus pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Rangovui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, apskaičiuotą už darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (Jei taikomas atvirkštinis apmokestinimas). Užsakovas už darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangos sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo banko sąskaitą. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai ar nesilaikydamas Sutarties sąlygų.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>Išbraukti 14.8 punkto antrą ir trečią pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>14.9 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>14.10 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.11 punktas	Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

	<i>Pakeisti 14.11 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Užsakovo atliktas mokėjimas pagal 14.3 punkte nustatyta tvarka pateiktus dokumentus, t.y. paskutinį atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, laikomas galutiniu ir visišku atsiskaitymu su Rangovu.
14.12 punktas	Prievolių įvykdymas
	<i>14.12 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.13 punktas	Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas
	<i>14.13 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.14 punktas	Užsakovo atsakomybės pabaiga
	<i>14.14 punkto nuostatos netaikomos</i>
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	<i>Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“</i> Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti Šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva	
15.2 punktas	Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva
	<i>Papildyti 15.2 punktą naujais papunkčiais (g) ir (h):</i> (g) uždelsia darbų vykdymą ilgiau nei 180 dienų nuo Darbų baigimo laiko termino, nustatyto pagal 8.2 punktą <i>[Baigimo laikas]</i> arba nuo Darbų baigimo laiko termino, nustatyto (pratęsto) pagal 8.4 punktą <i>[Baigimo laiko pratęsimas]</i>; (h) Sutarties vykdymo metu yra įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. <i>Papildyti 15.2 punktą naujomis pastraipomis:</i> Šio punkto (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ir (h) papunkčiuose nurodytos aplinkybės yra laikomos esminiais sutarties pažeidimais. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,

	energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešus Rangovui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos atlyginimą.
16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva	
16.2 punktas	Nutraukimas Rangovo iniciatyva
	<i>Pakeisti 16.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais: (a) kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; (b) kai Užsakovas neatsiskaito už darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>Pakeisti 18.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo (įskaitant subrangovus) civilinė atsakomybė būtų apdrausta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti nuo darbų pradžios iki statybos užbaigimo dienos.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>18.2 punktas netaikomas.</i>
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	<i>18.3 punktas netaikomas.</i>
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	<i>18.4 punkto reikalavimai netaikomi.</i>
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	<i>Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą</i>

	<i>pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 [Užsakovo rizika] bei 19.1 [Nenugalimos jėgos sąvoka] punktų, taikomas 19.1 [Nenugalimos jėgos sąvoka] punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas Pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Arbitražas netaikomas. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismo jurisdikcijos pareikšimas pagal Užsakovo buveinės vietą.

Rangos sutarties
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO
JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ, BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE

sudedamoji dalis (e)

Bendrosios Sutarties sąlygos, 1 lapas.

Sutarties

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ

Statybos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas:

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ 2 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.

Rangos sutarties
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO
JOTVINGIŲ, ŽIEMGALIŲ, BARTŲ, TYRAVOS GATVĖSE

sudedamoji dalis (f)

Techninis projektas „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g., Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvninkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.) statybos projektas“, 161 lapas.



OBJEKTAS: LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ
ŠIAULIŲ MIESTO LIEPORIŲ - ŠVENTUPIO GYVENAMOJO
RAJONO DALYJE (AISČIŲ G., BALTŲ G., BARTŲ G.,
JOTVINGIŲ G., KALNIŠKIŲ G., LIETUVININKŲ G.,
SEMBOS G., TYRAVOS G., ŽIEMGALIŲ G.)
STATYBOS PROJEKTAS

KATEGORIJA: NEYPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

STADIJA: TECHNINIS PROJEKTAS

DALIS: LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

TECHNIKOS DIREKTORIUS: VYTAUTAS PELECKIS

PROJEKTO VADOVAS: VITA STASIŪNĖ
Atestato Nr. 34629

STATYTOJAS: UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS"

TVIRTINU

Uždarnosios akcinės bendrovės
ŠIAULIŲ VANDENYS
technikos direktorius


Vytautas Peleckis

2017 m. 09 mėn. 21 d.

TURINYS

Eil. Nr.	Dokumentai:	ŠIFRAS	Puslapio Nr.
1	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	19-45-TP-VN-PDSŽ	2
2	Topografinė nuotrauka		3-44
3	Medžiagų žiniaraštis	19-45-TP-VN -MŽ	45-58
4	Bendrieji statinio rodikliai	19-45-TP-VN-BSR	59-60
5	Aiškinamasis raštas	19-45-TP-VN -AR	61-71
6	Techninė specifikacija	19-45-TP-VN -TS	72-94
7	Etapų suskirstymo schema		95
8	Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklais M1:500	19-45-TP-VN -SP	96-102
9	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis M1:800	19-45-TP-VN -AZ	103-105
10	Vandentiekio šulinių detalizacija	19-45-TP-VN -B1	106-109
11	Vandens apskaitos šulinių principinės schemos	19-45-TP-VN -B2	110
12	Slėgio gesinimo šulinių principinės schemos	19-45-TP-VN -B3	111
13	Principinė antžeminio priešgaisrinio hidranto montavimo schema	19-45-TP-VN -B4	112
14	Aikštelės prie siurblinės NS1 schema	19-45-TP-VN -SPP1	113
15	Aikštelės prie siurblinės NS2 schema	19-45-TP-VN -SPP2	114
16	Aikštelės prie siurblinės NS3 schema	19-45-TP-VN -SPP3	115
17	Projektuojamo privažiavimo ir aikštelės prie siurblinės NS4 schema	19-45-TP-VN -SPP4	116
18	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklų darbų vykdymo zonų schema	19-45-TP-VN -DVZ	117-119
19	PRIEDAS NR.1		120-139
20	PRIEDAS NR.2		140-148
21	PRIEDAS NR.3		149-161


Atestato Nr.	UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“				LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ŠIAULIŲ MIESTO LIEPORIŲ - ŠVENTUPIO GYVENAMOJO RAJONO DALYJE (AISČIŲ G., BALTŲ G., BARTŲ G., JOTVINGIŲ G., KALNIŠKIŲ G., LIETUVININKŲ G., SEMBOS G., TYRAVOS G., ŽIEMGALIŲ G.) STATYBOS PROJEKTAS	
34629	PV	V. STASIŪNĖ		2019	PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
26070	PDV	V. STASIŪNĖ		2019		0
LT	STATYTOJAS: UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“				19-45-TP-VN-PDSŽ	

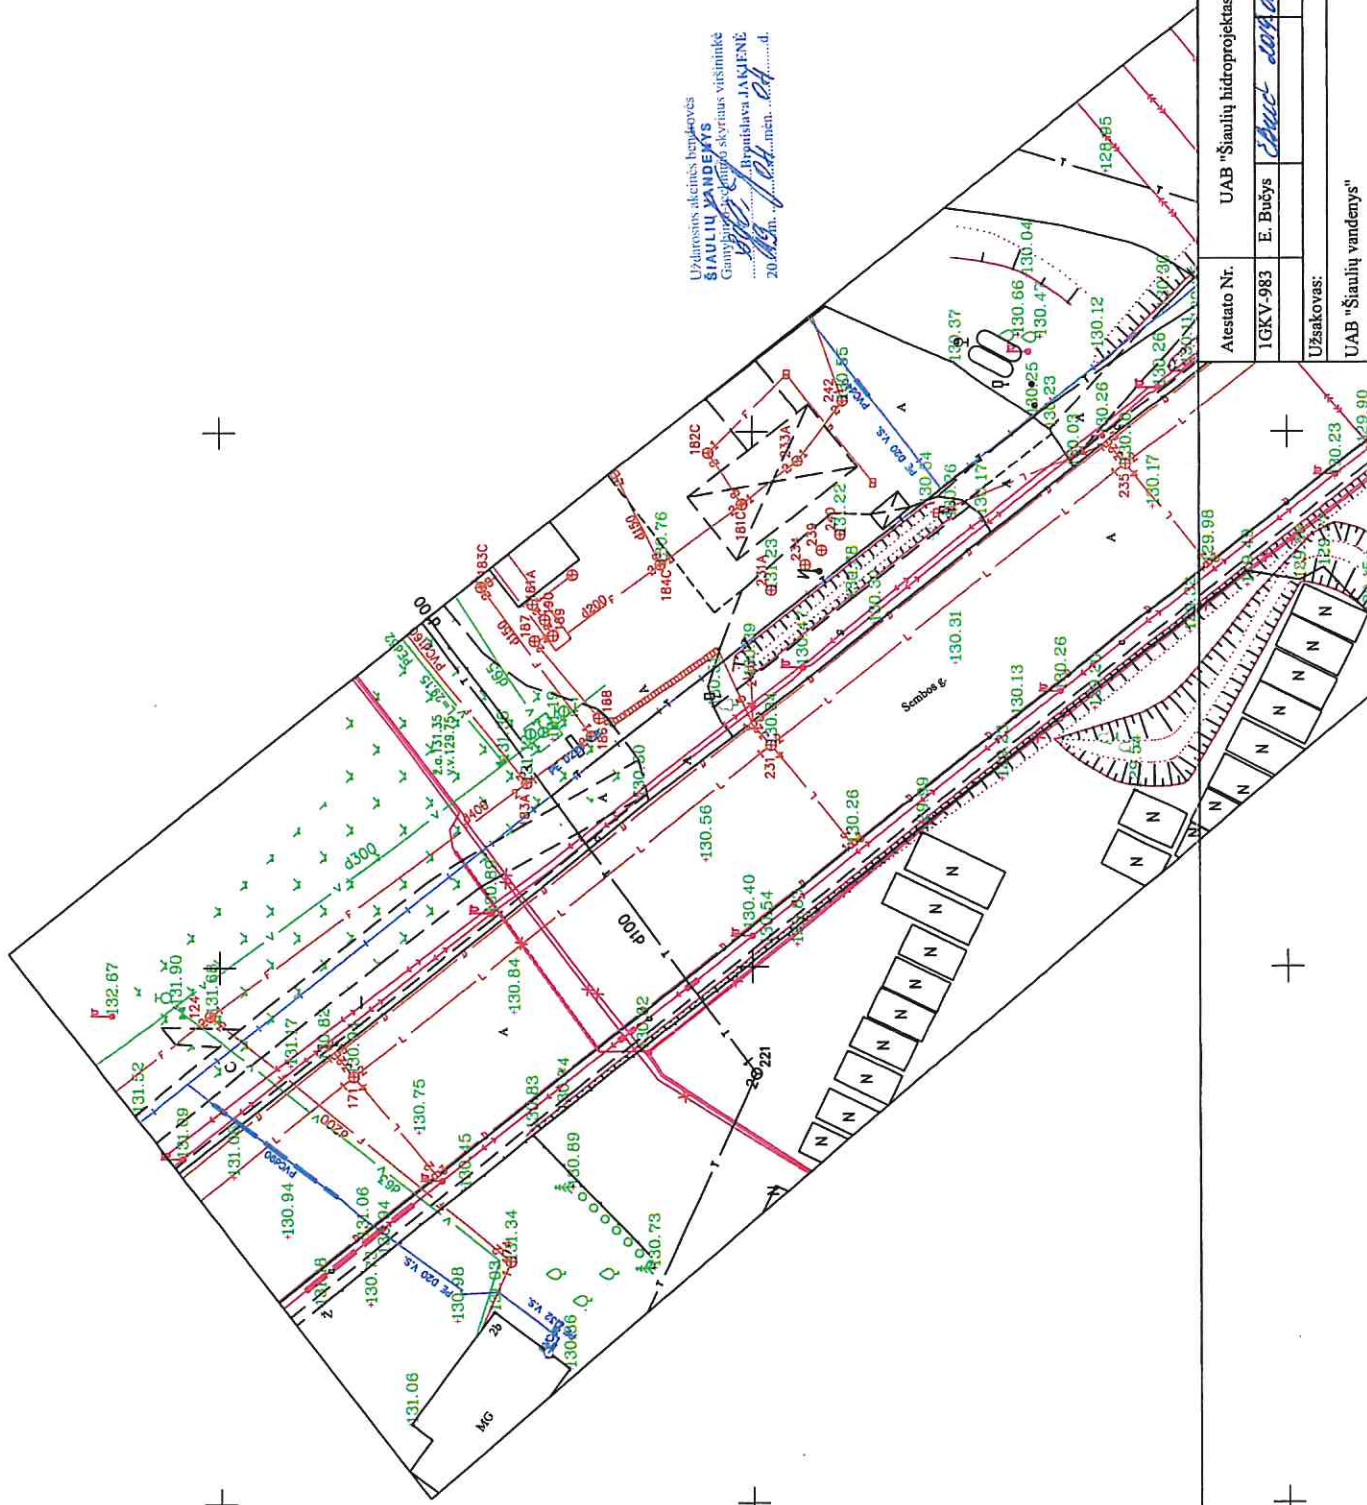


Uždarojo akcinio bendrovės
ŠIAULIŲ VANDENYS
 Gaminių ir paslaugų skyrius
 Projektavimas ir inžineriniai darbai
 2019 m. 12 mėn. 24 d.

25	34
16	26
17	27
18	28
19	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
21	41
22	42
23	43
24	44
25	45
26	46
27	47
28	48
29	49
30	50
31	51
32	52
33	53
34	54
35	55
36	56
37	57
38	58
39	59
40	60
41	61
42	62
43	63
44	64
45	65
46	66
47	67
48	68
49	69
50	70
51	71
52	72
53	73
54	74
55	75
56	76
57	77
58	78
59	79
60	80
61	81
62	82
63	83
64	84
65	85
66	86
67	87
68	88
69	89
70	90
71	91
72	92
73	93
74	94
75	95
76	96
77	97
78	98
79	99
80	100


Objektas: GKTR2014-15-7573	UAB "Šiaulių hidroprojekta"	Atestato Nr.:	1GKV-983	E. Bučys	2019-12-24
Verdukliai	TOPD Nr. 29:19:344	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500			
		Aukščių sistema - LAS07			
		Koordinatų sistema - LKS94			
		Lapų	1	41	

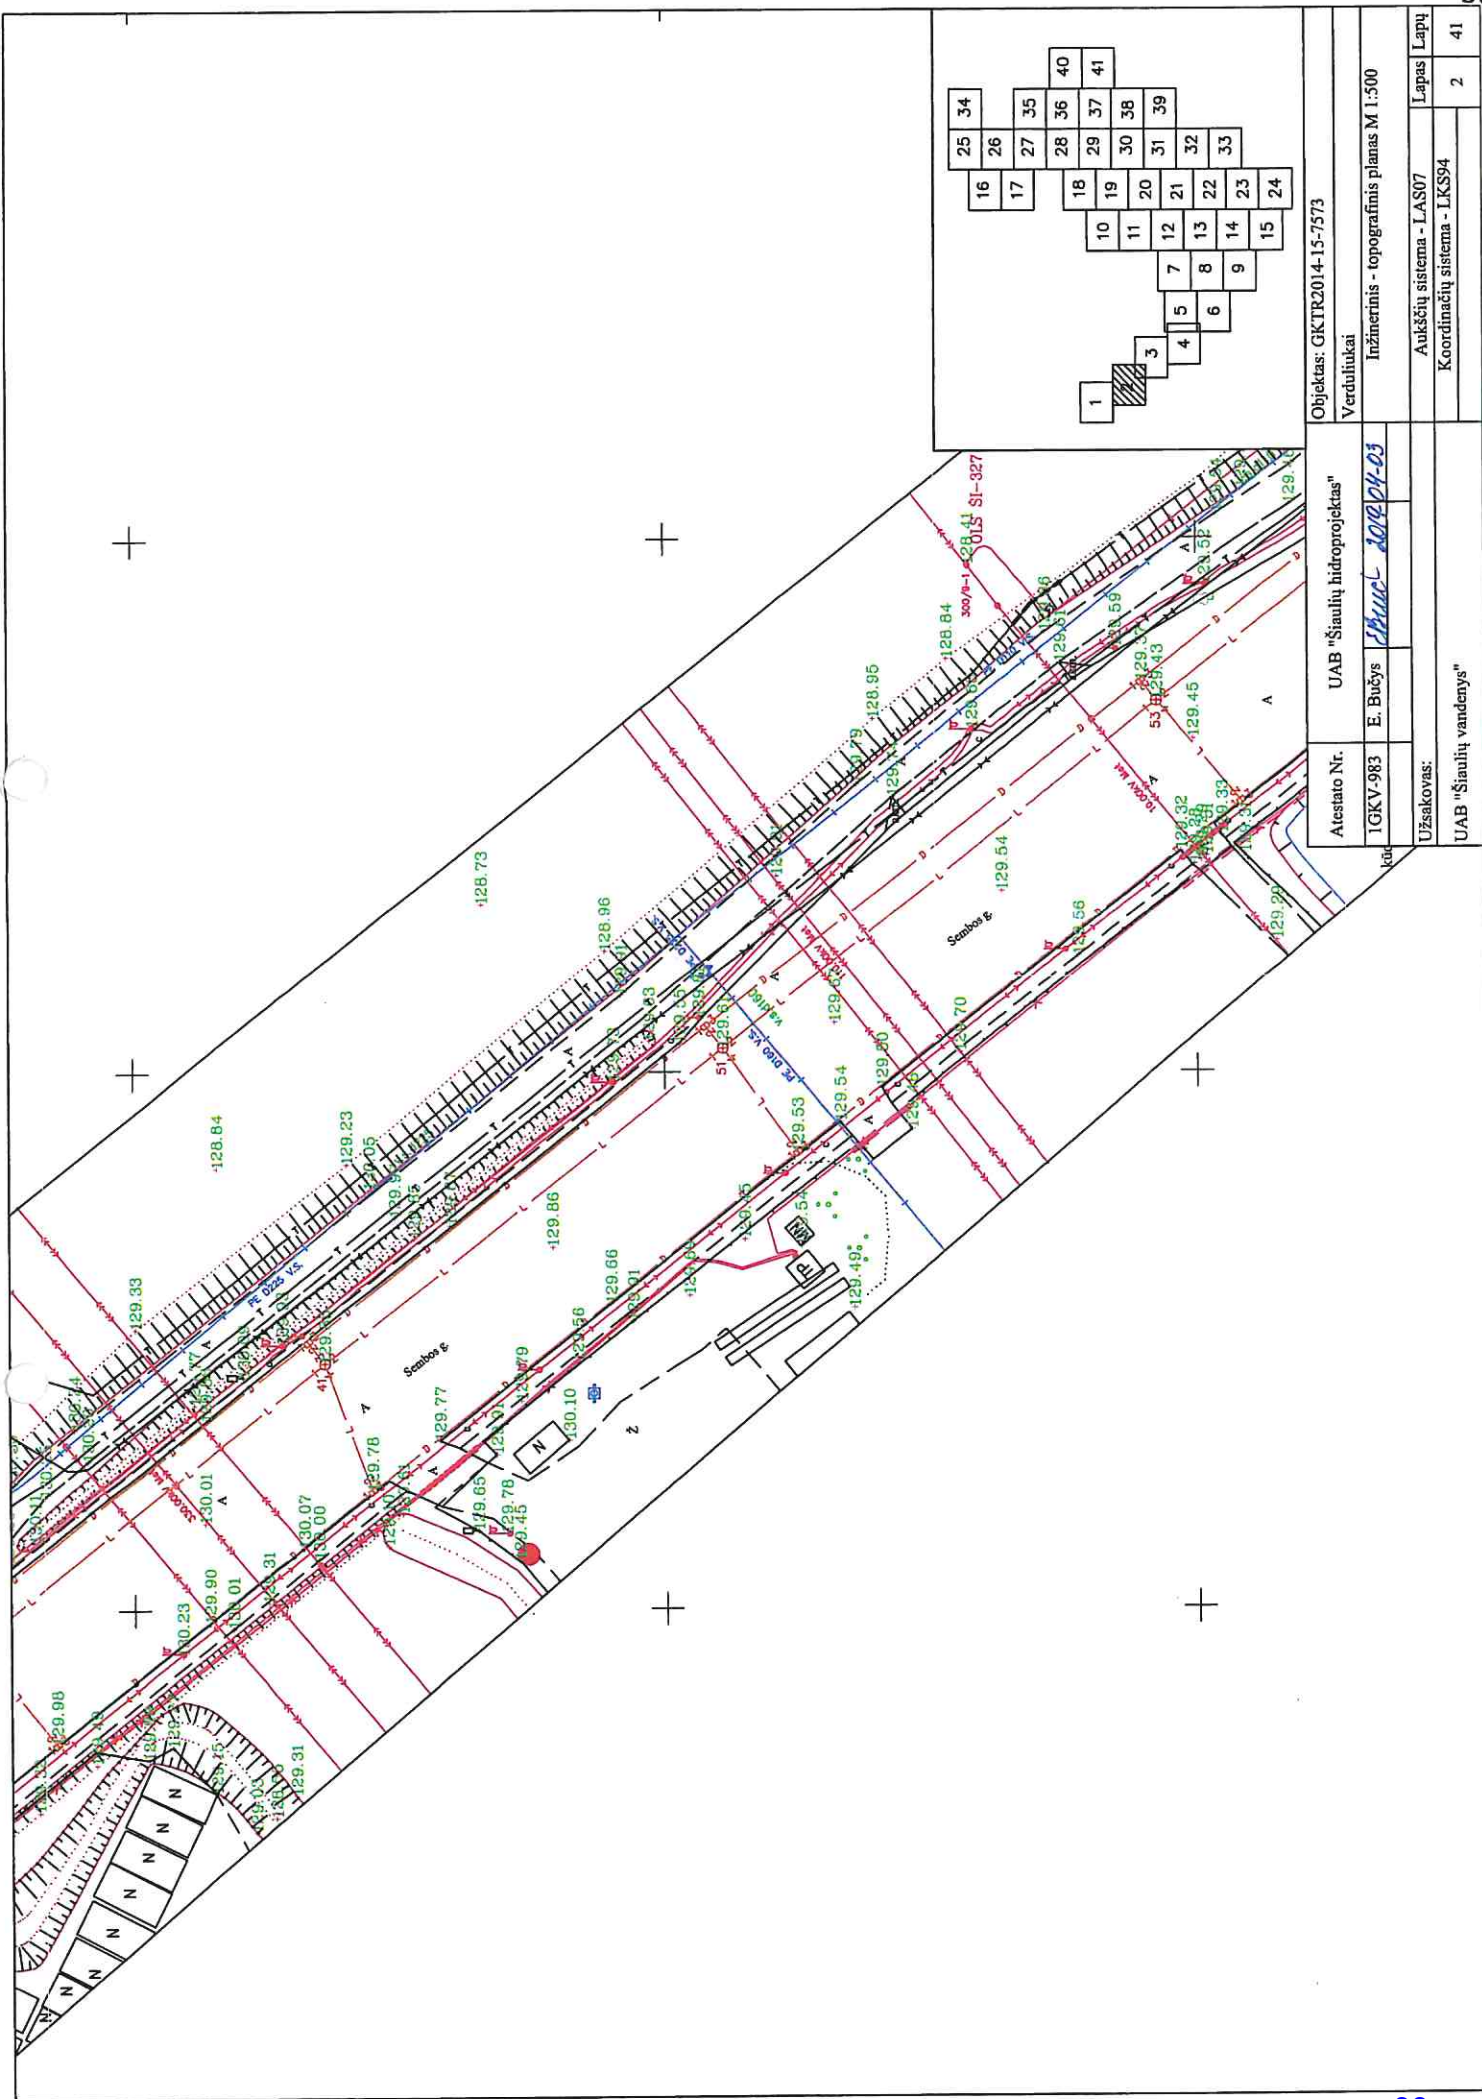

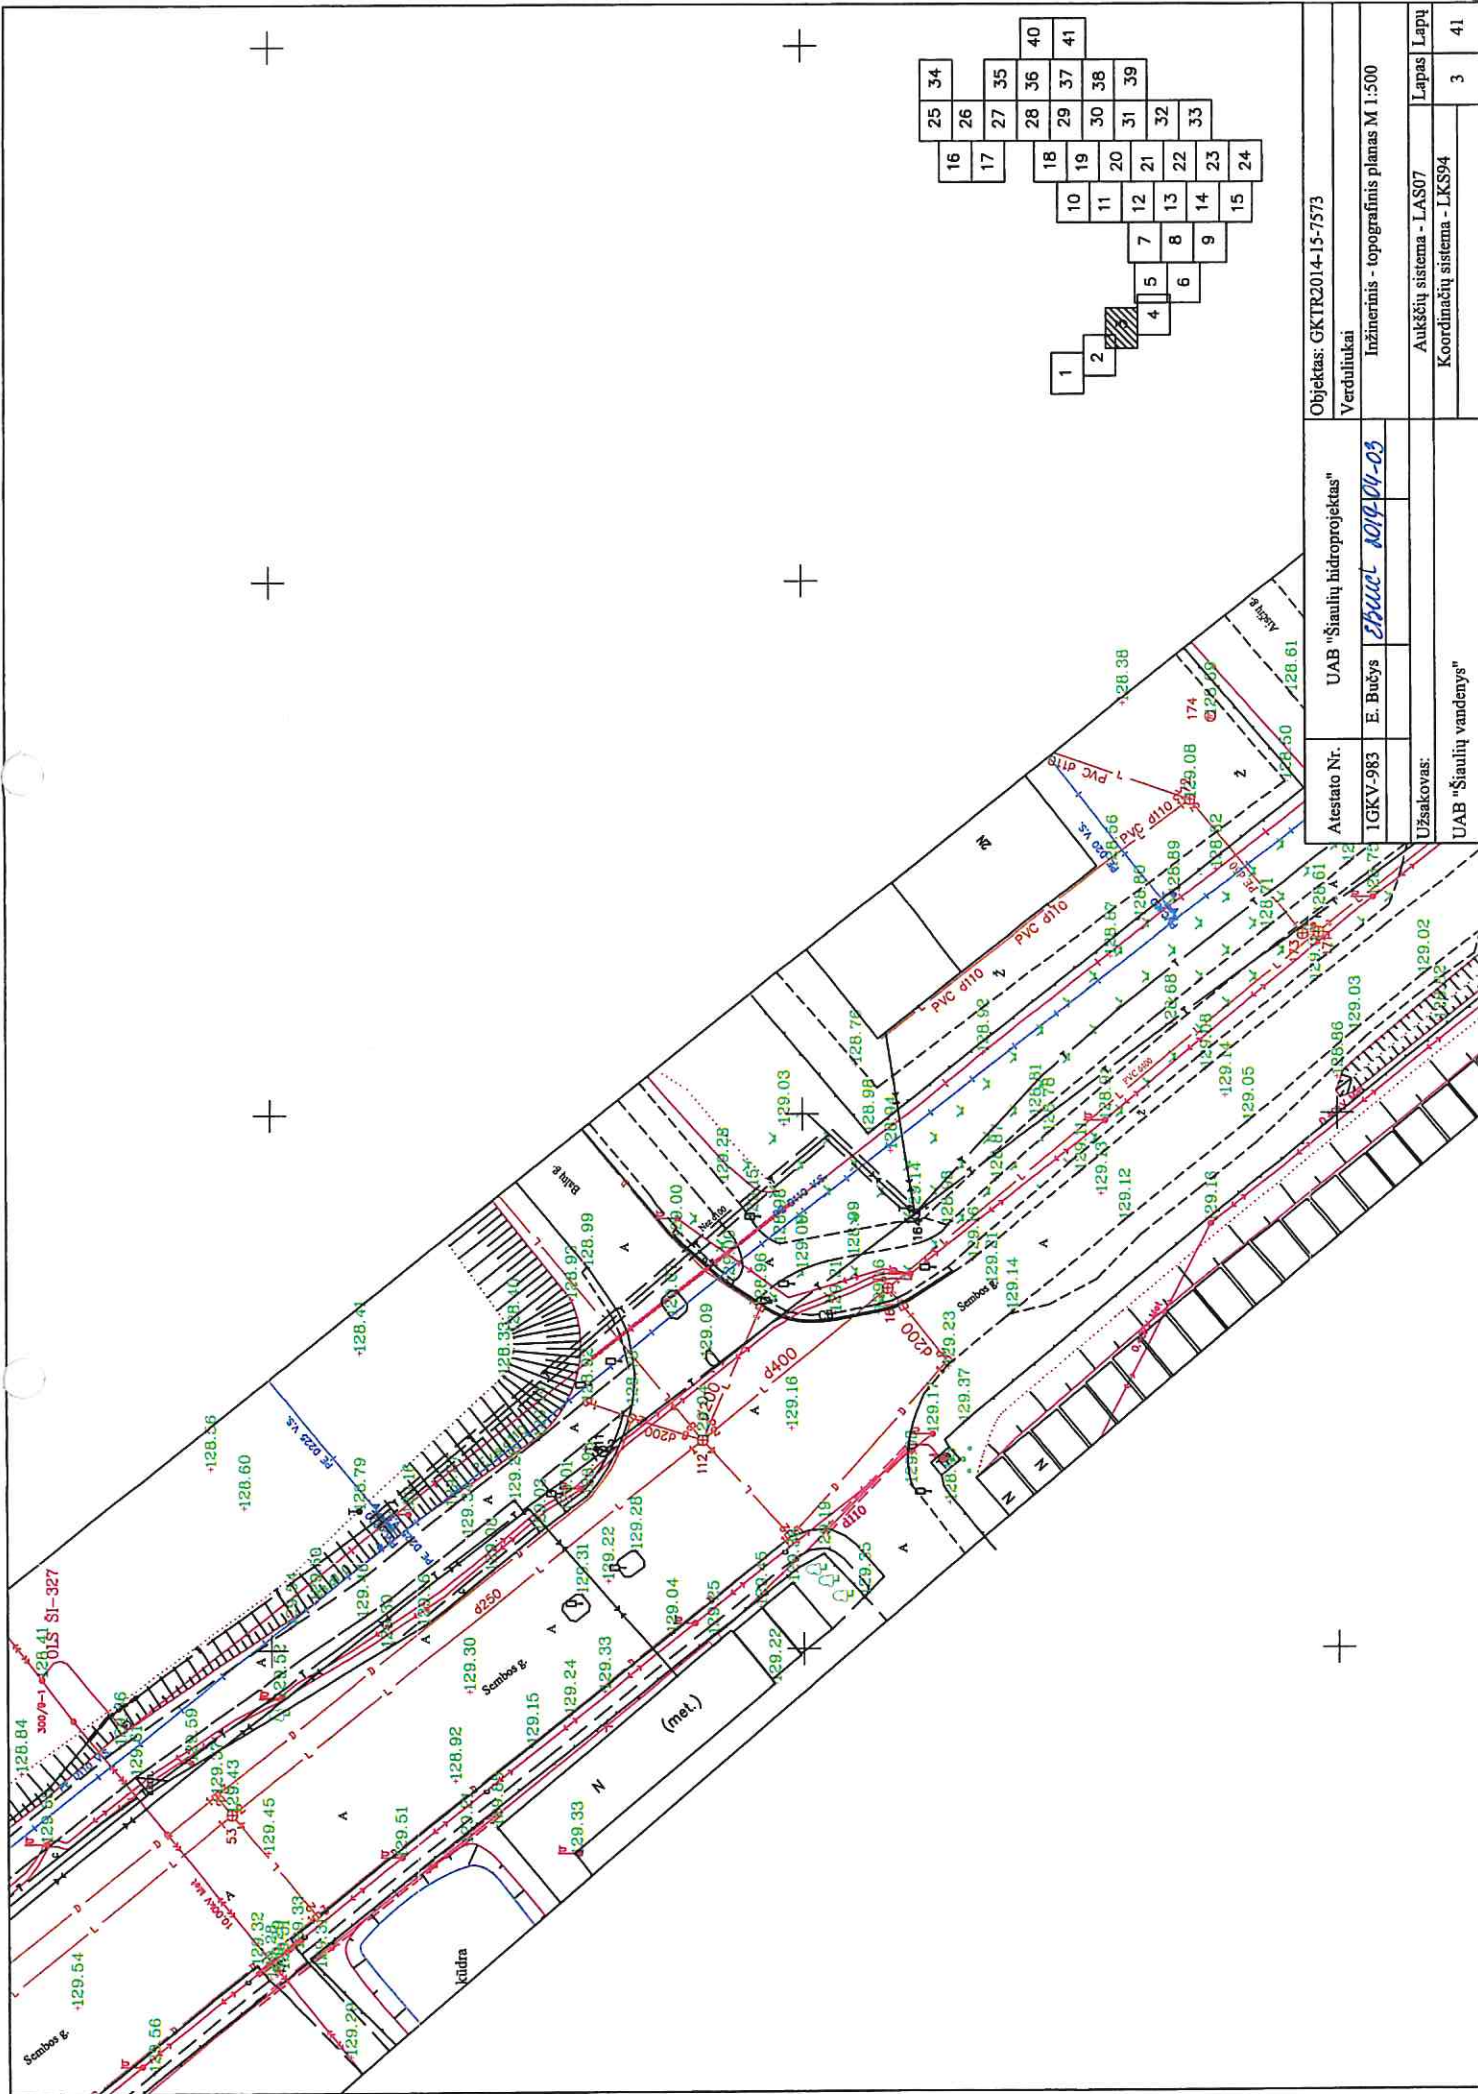


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48


Objektas: GKTR2014-15-7573	Atestato Nr.:	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Verdukliai
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	IGKV-983	E. Bučys	1019-04-03
Aukščių sistema - LAS07	Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Lapas
Koordinatų sistema - LKS94			Lapų
			3
			41

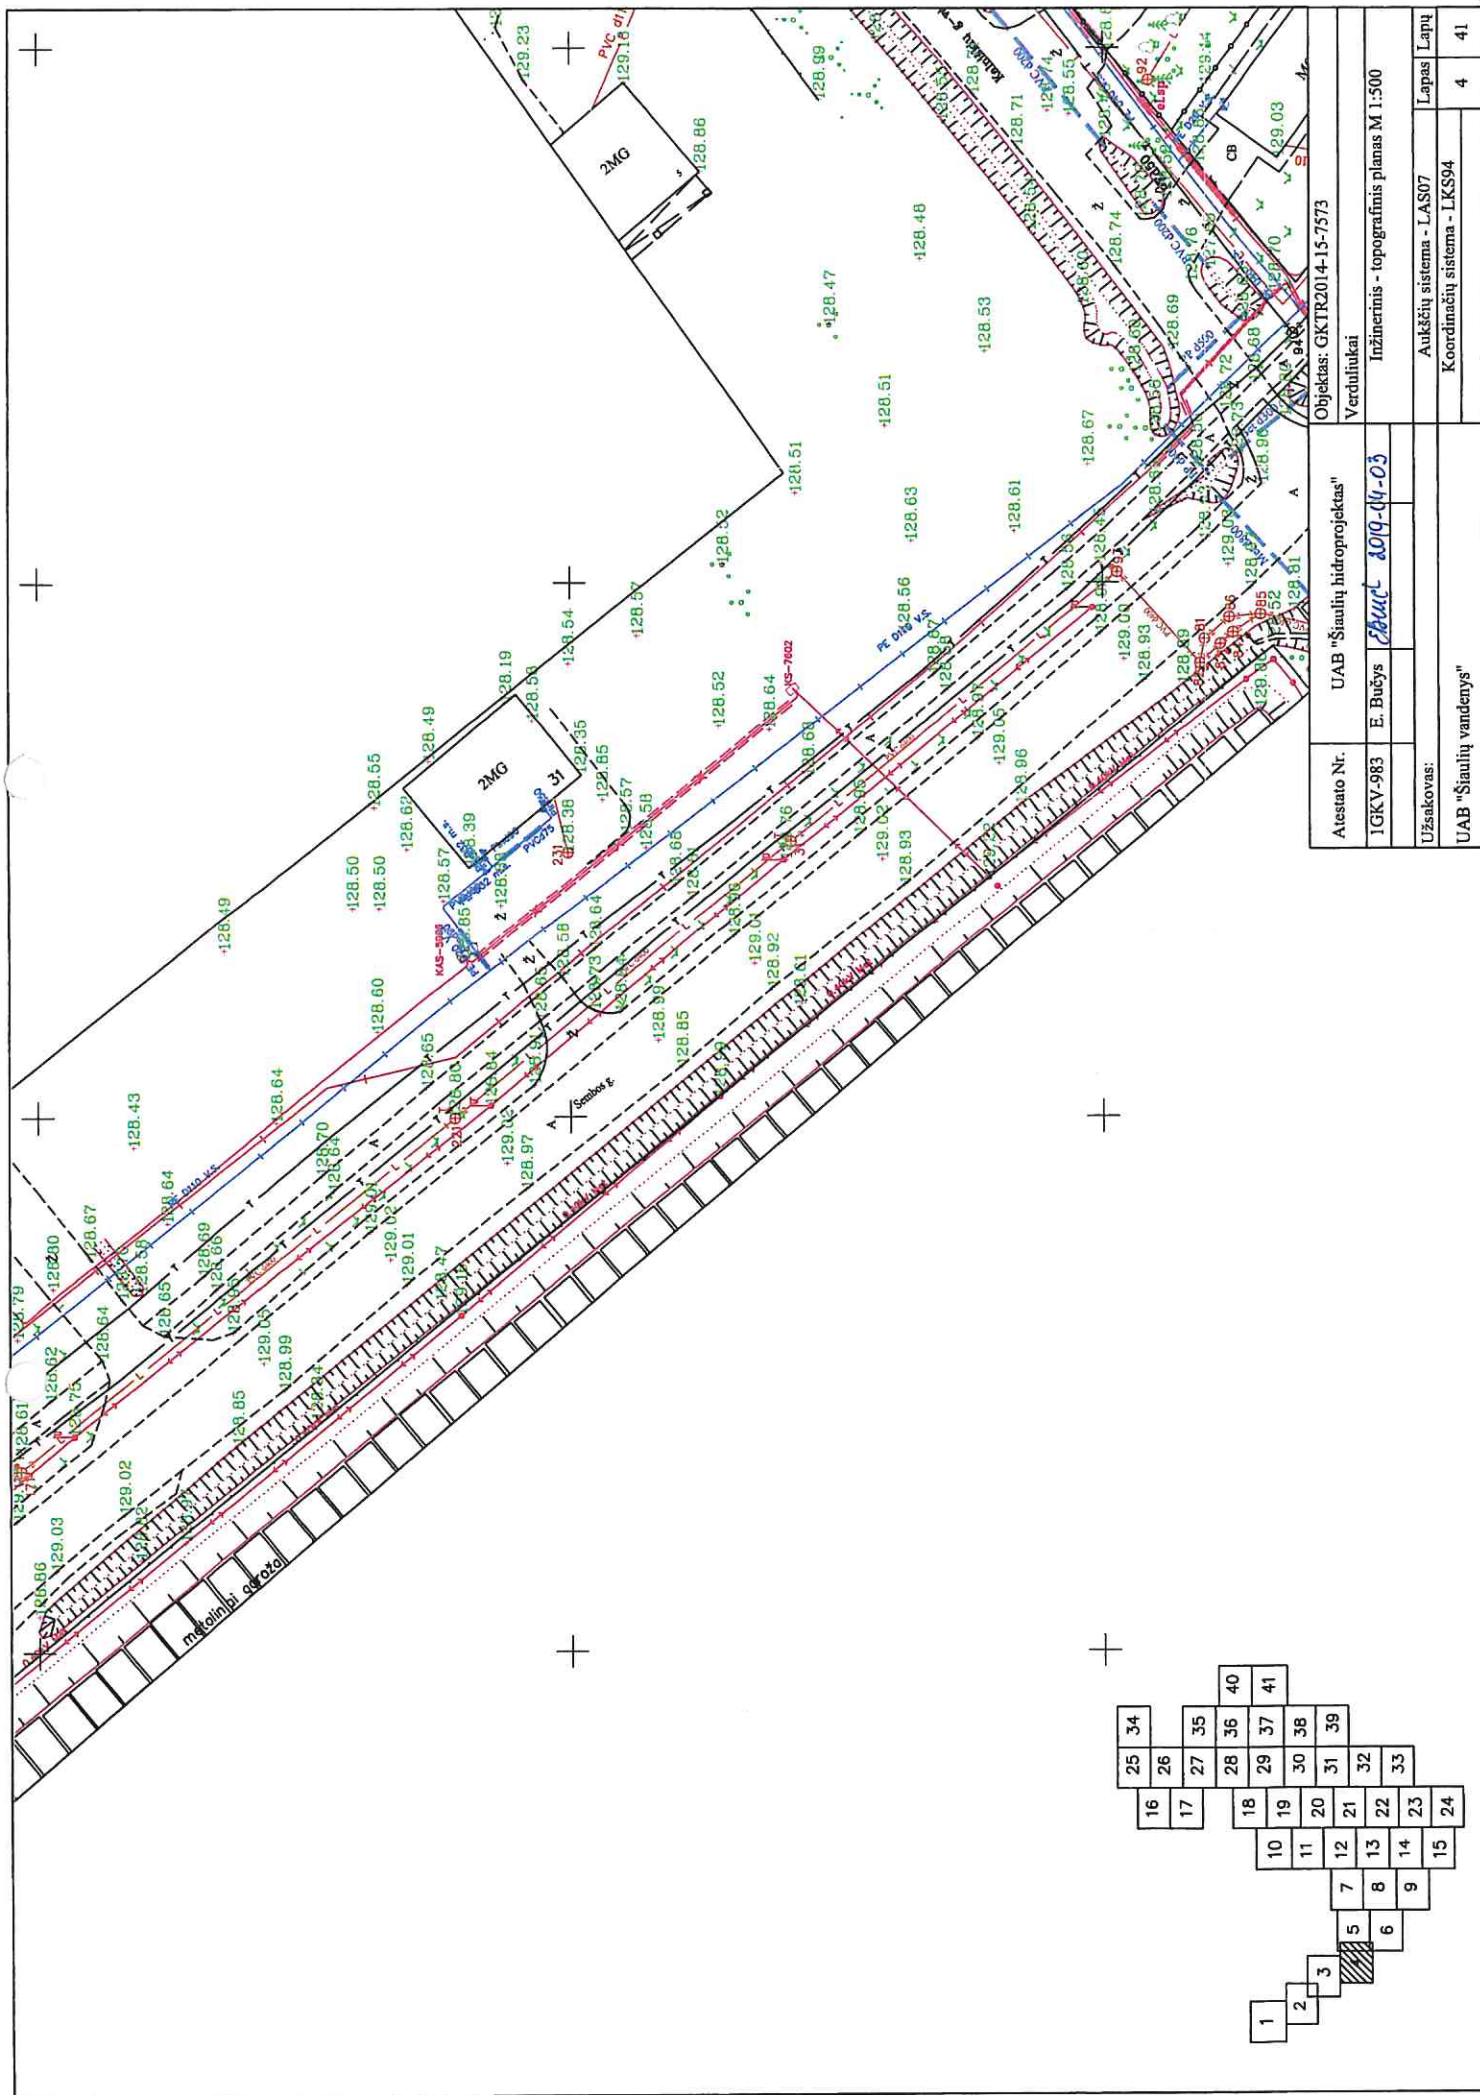


Atestato Nr.		Objektas: GKTR2014-15-7573	
1GKV-983		Verduliukai	
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
UAB "Šiaulių vandenys"		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
E. Bučys		Aukštųjų sistema - LAS07	
2019-04-03		Koordinatinių sistema - LKS94	
		Lapas	
		4	
		41	

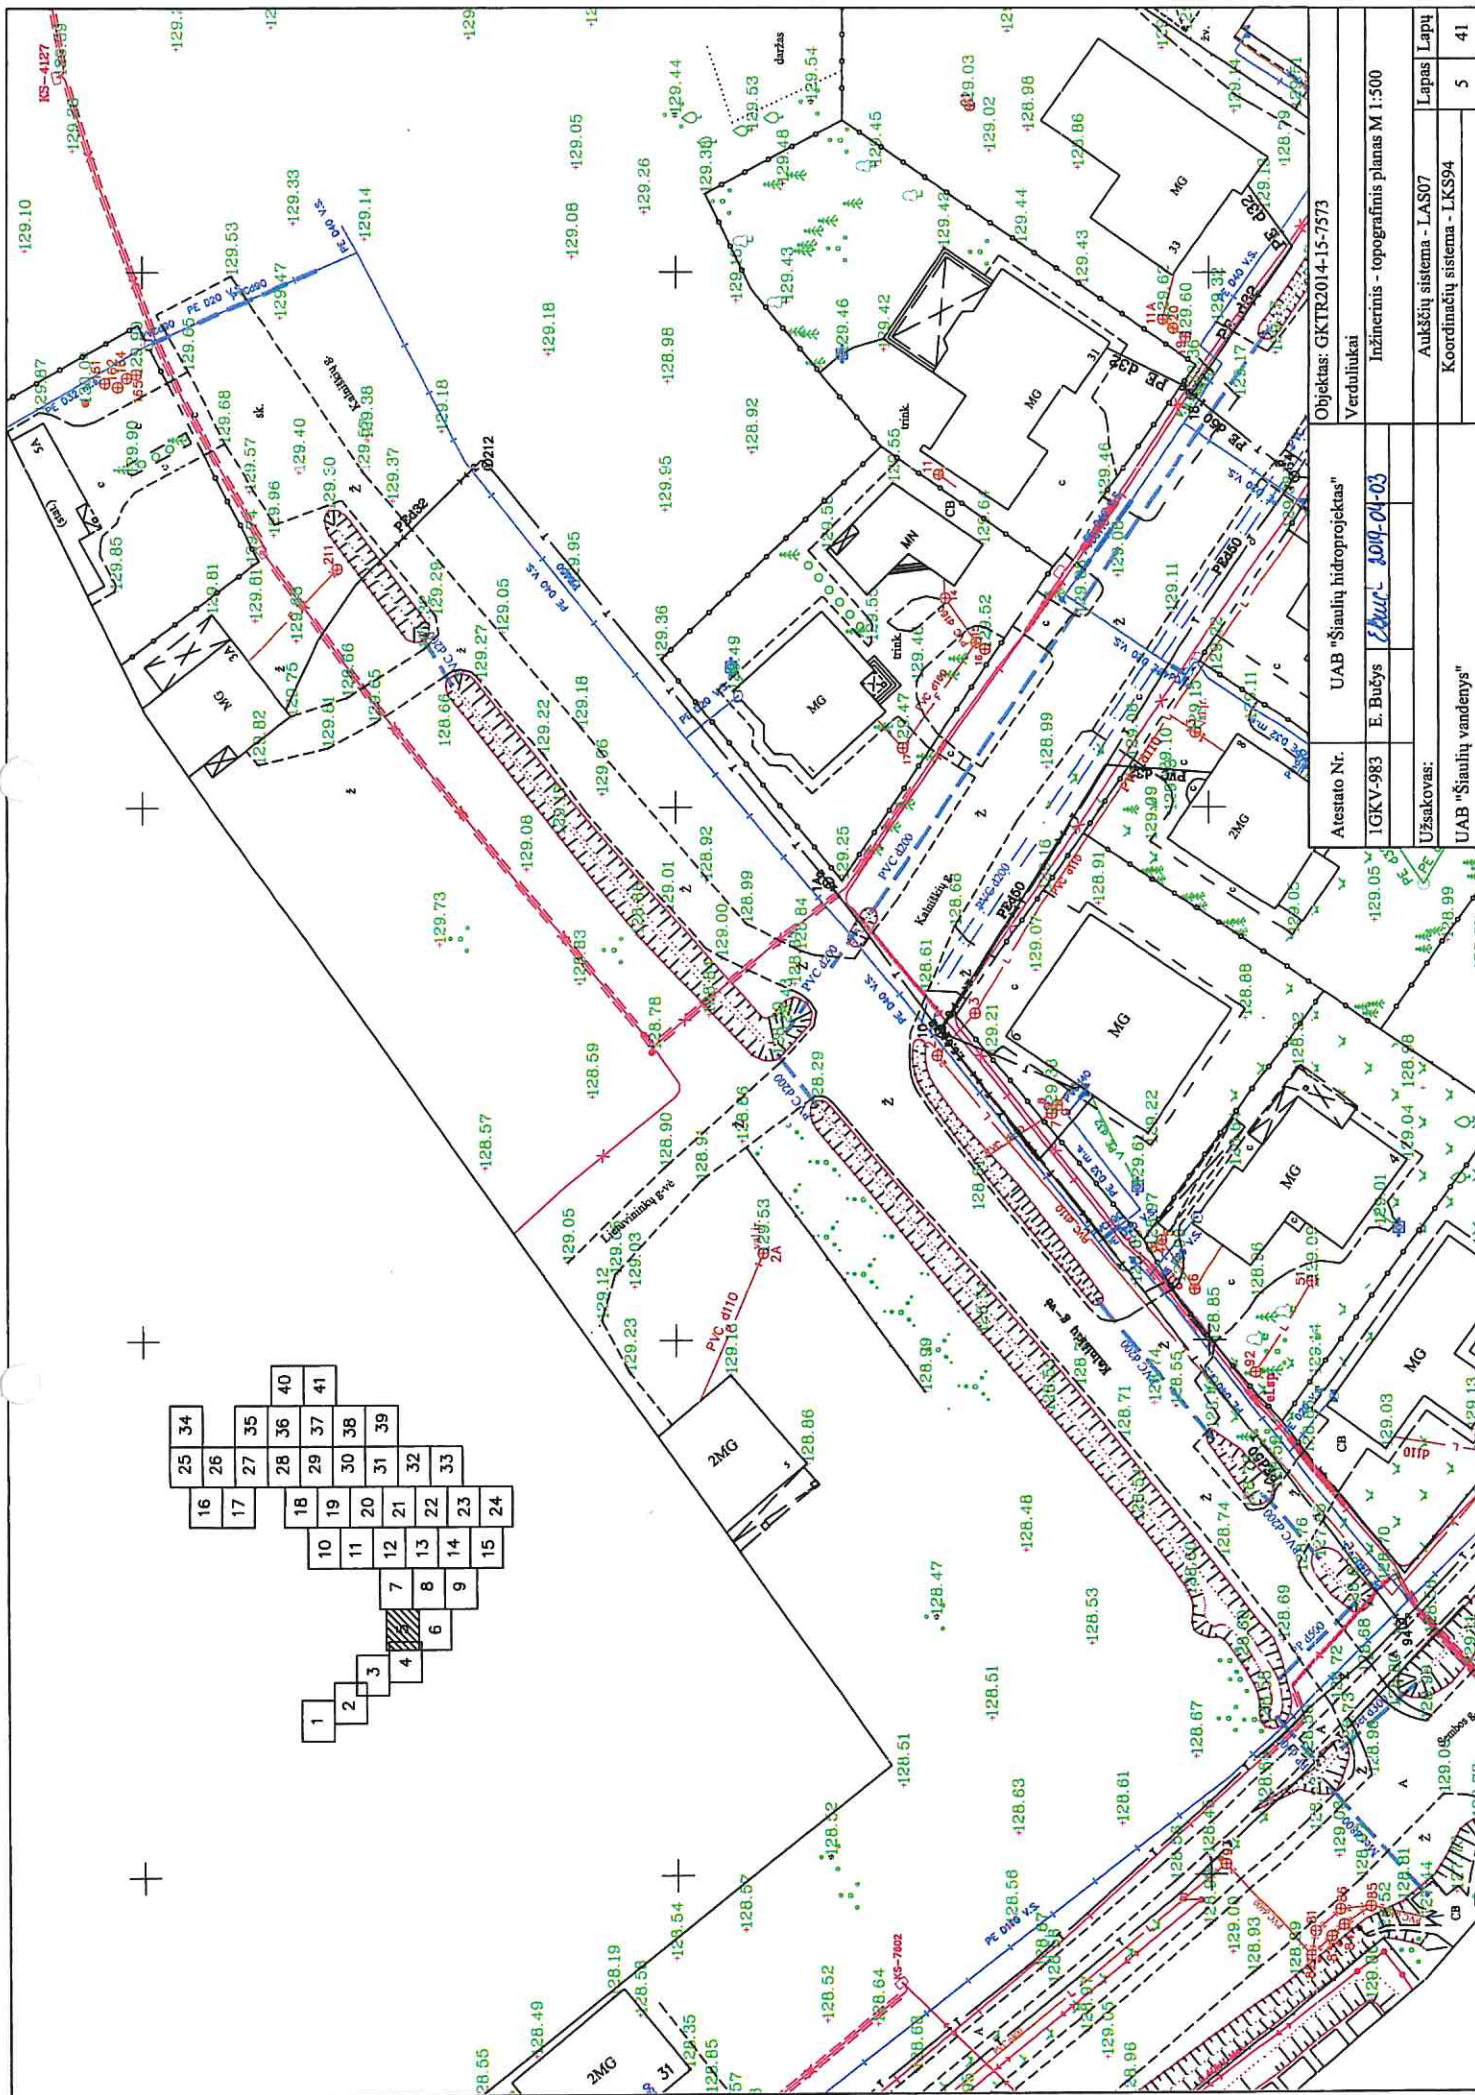


Objektas: GKTR2014-15-7573	
Verduliukai	
Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"
1GKV-983	E. Butėys <i>1019.04-03</i>
Užsakovas:	
UAB "Šiaulių vandenys"	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07	
Koordinatų sistema - LKS94	
Lapas	5
Lapų	41

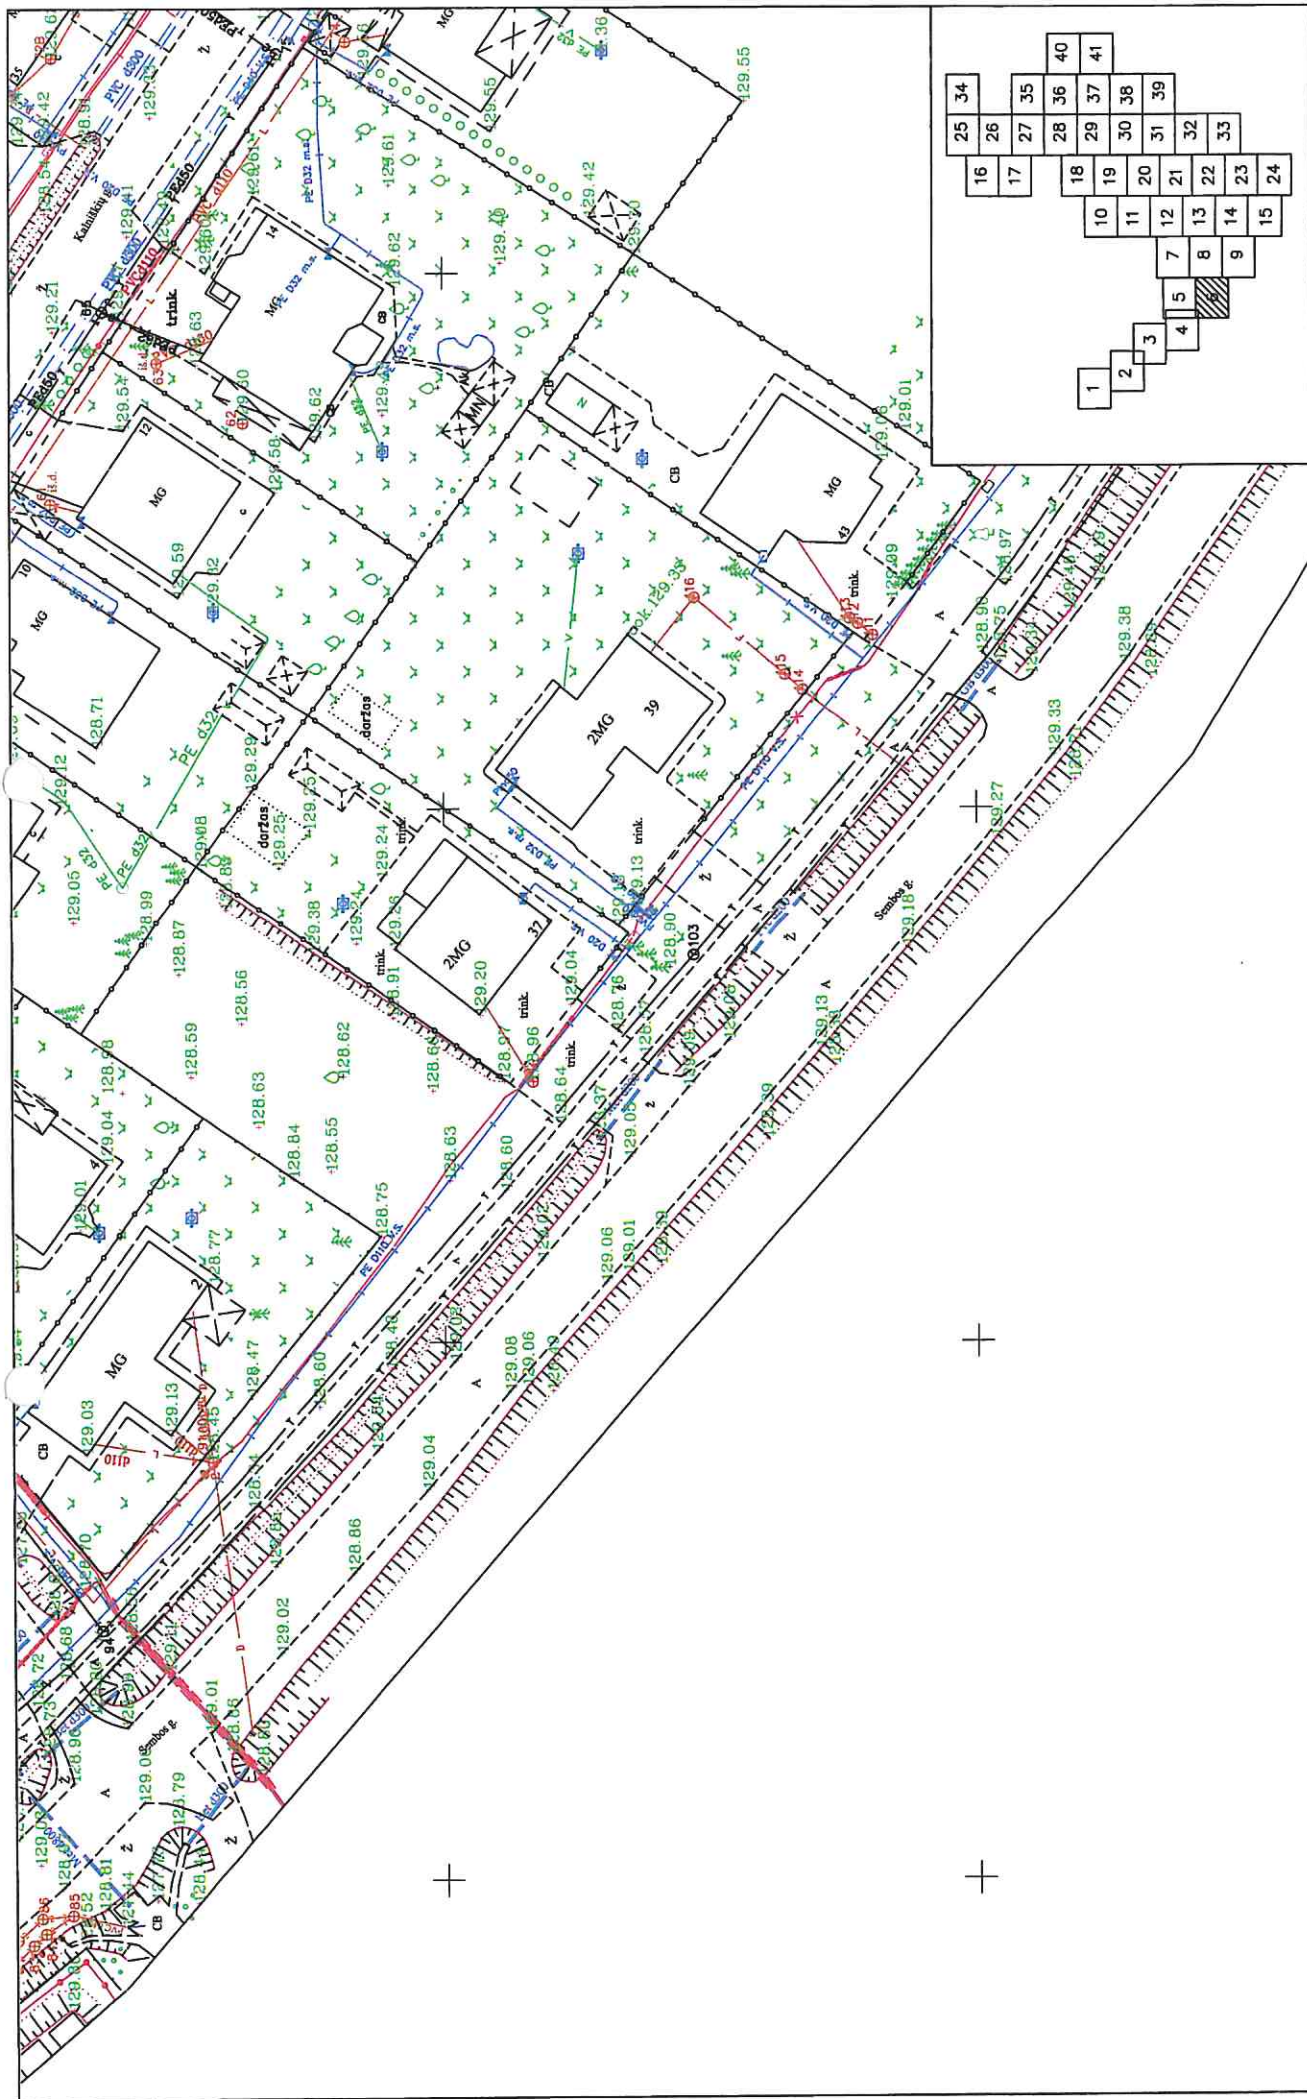


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Butys	Verduoliai
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
UAB "Šiaulių vandenys"		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		Lapų
		6
		41

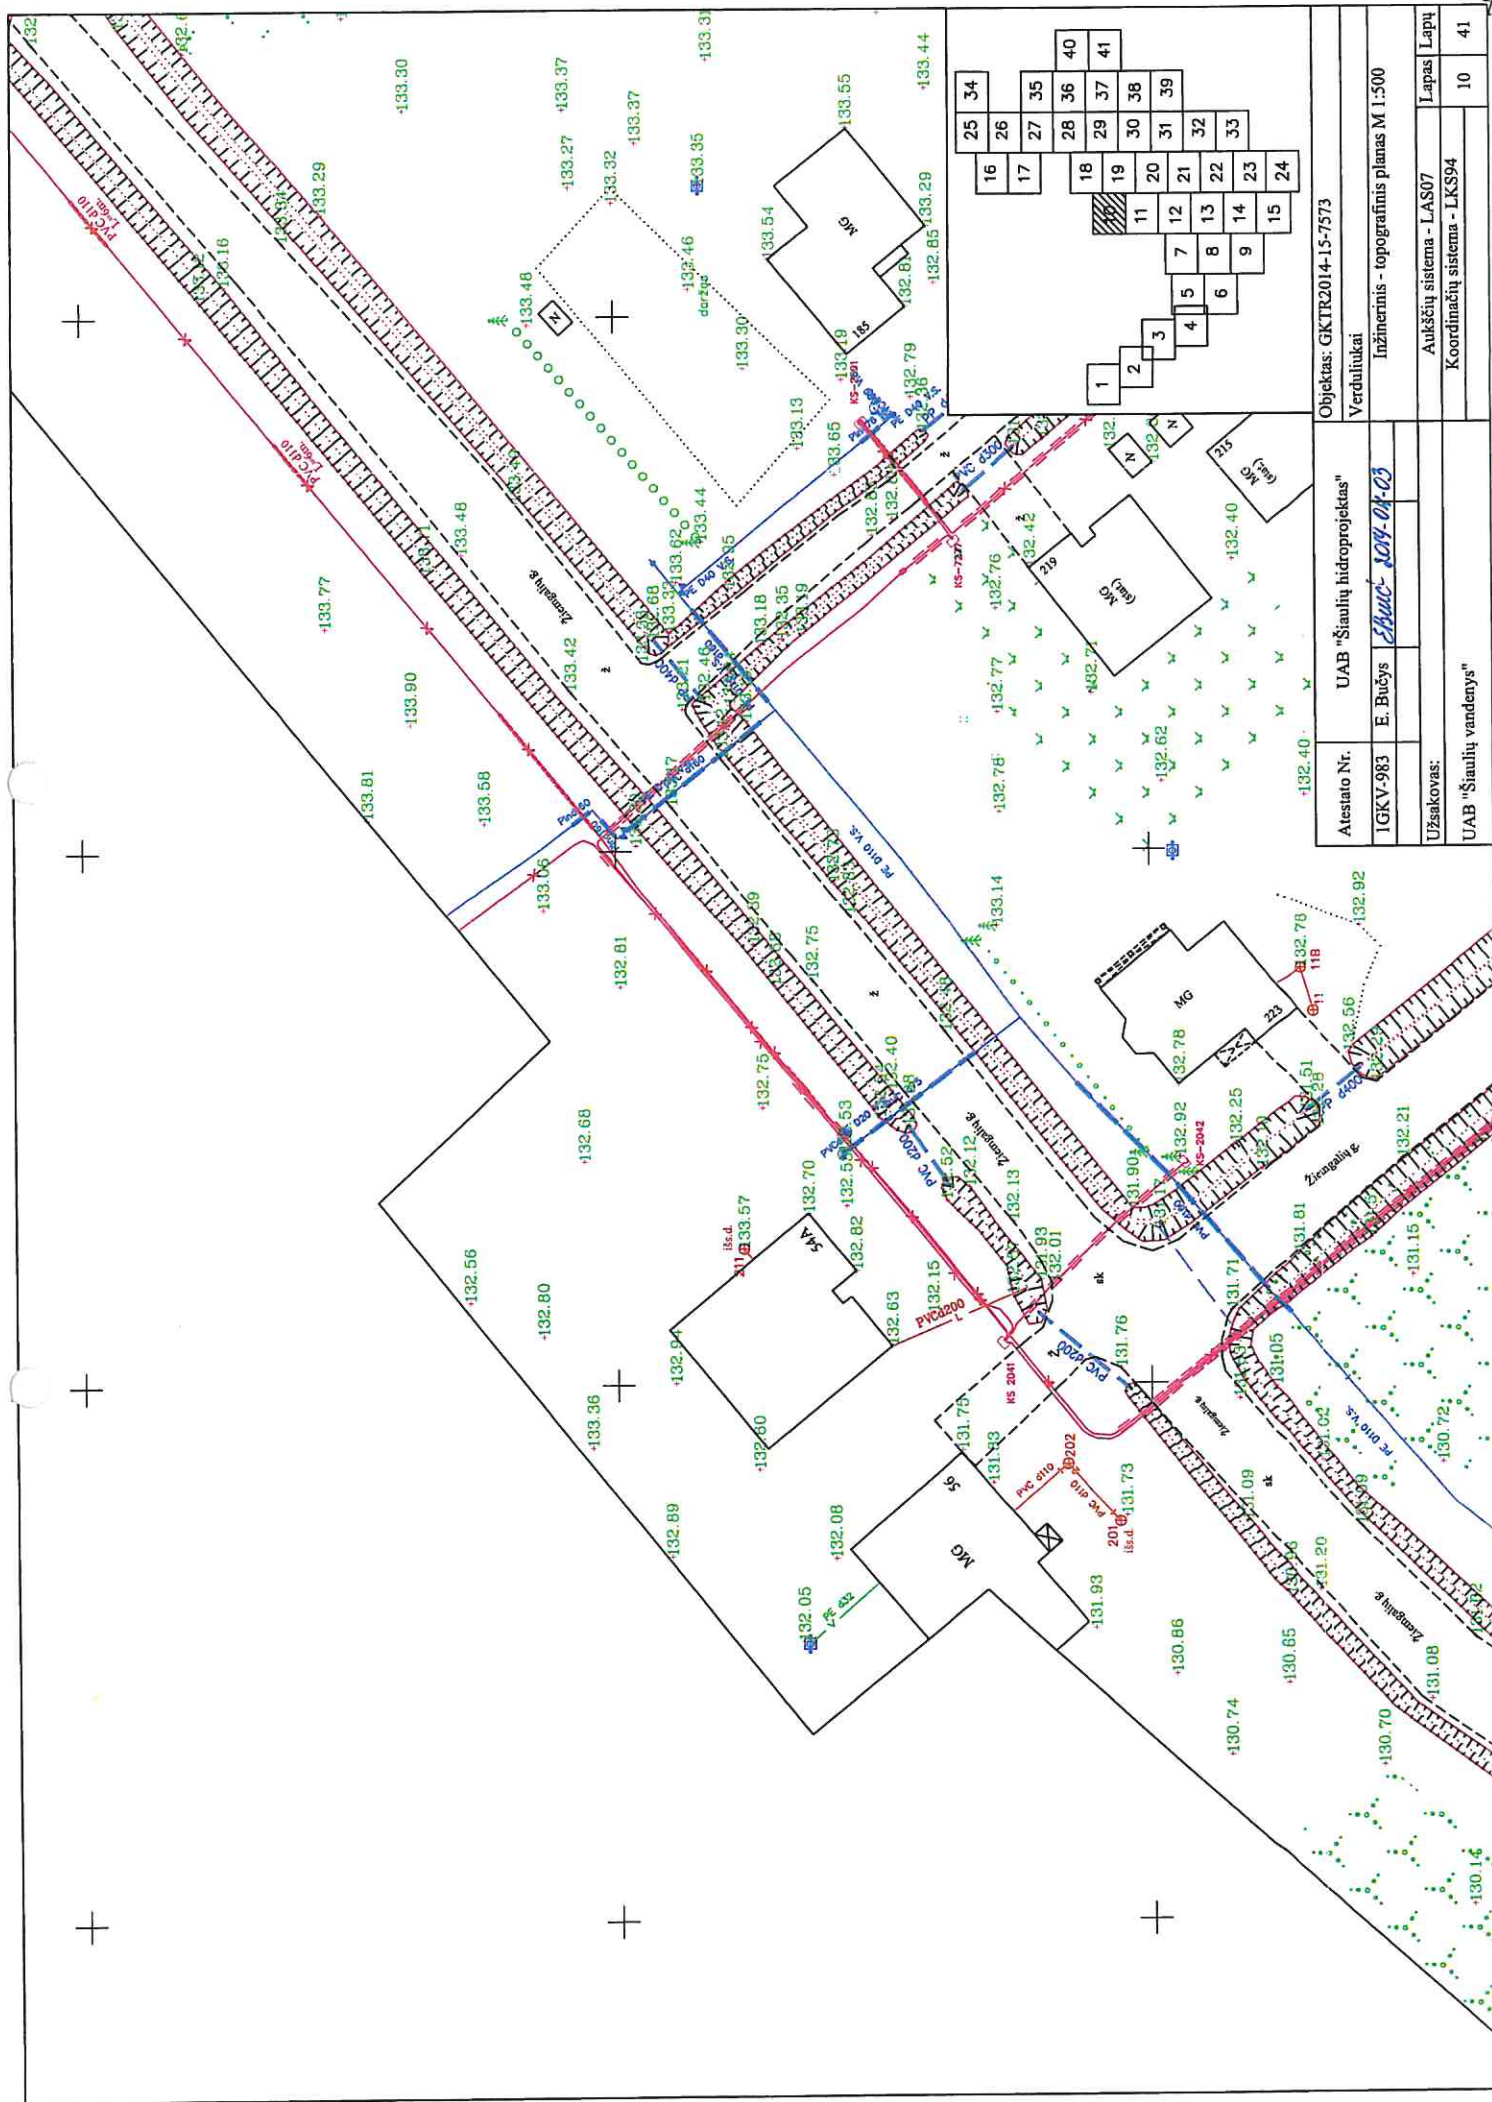

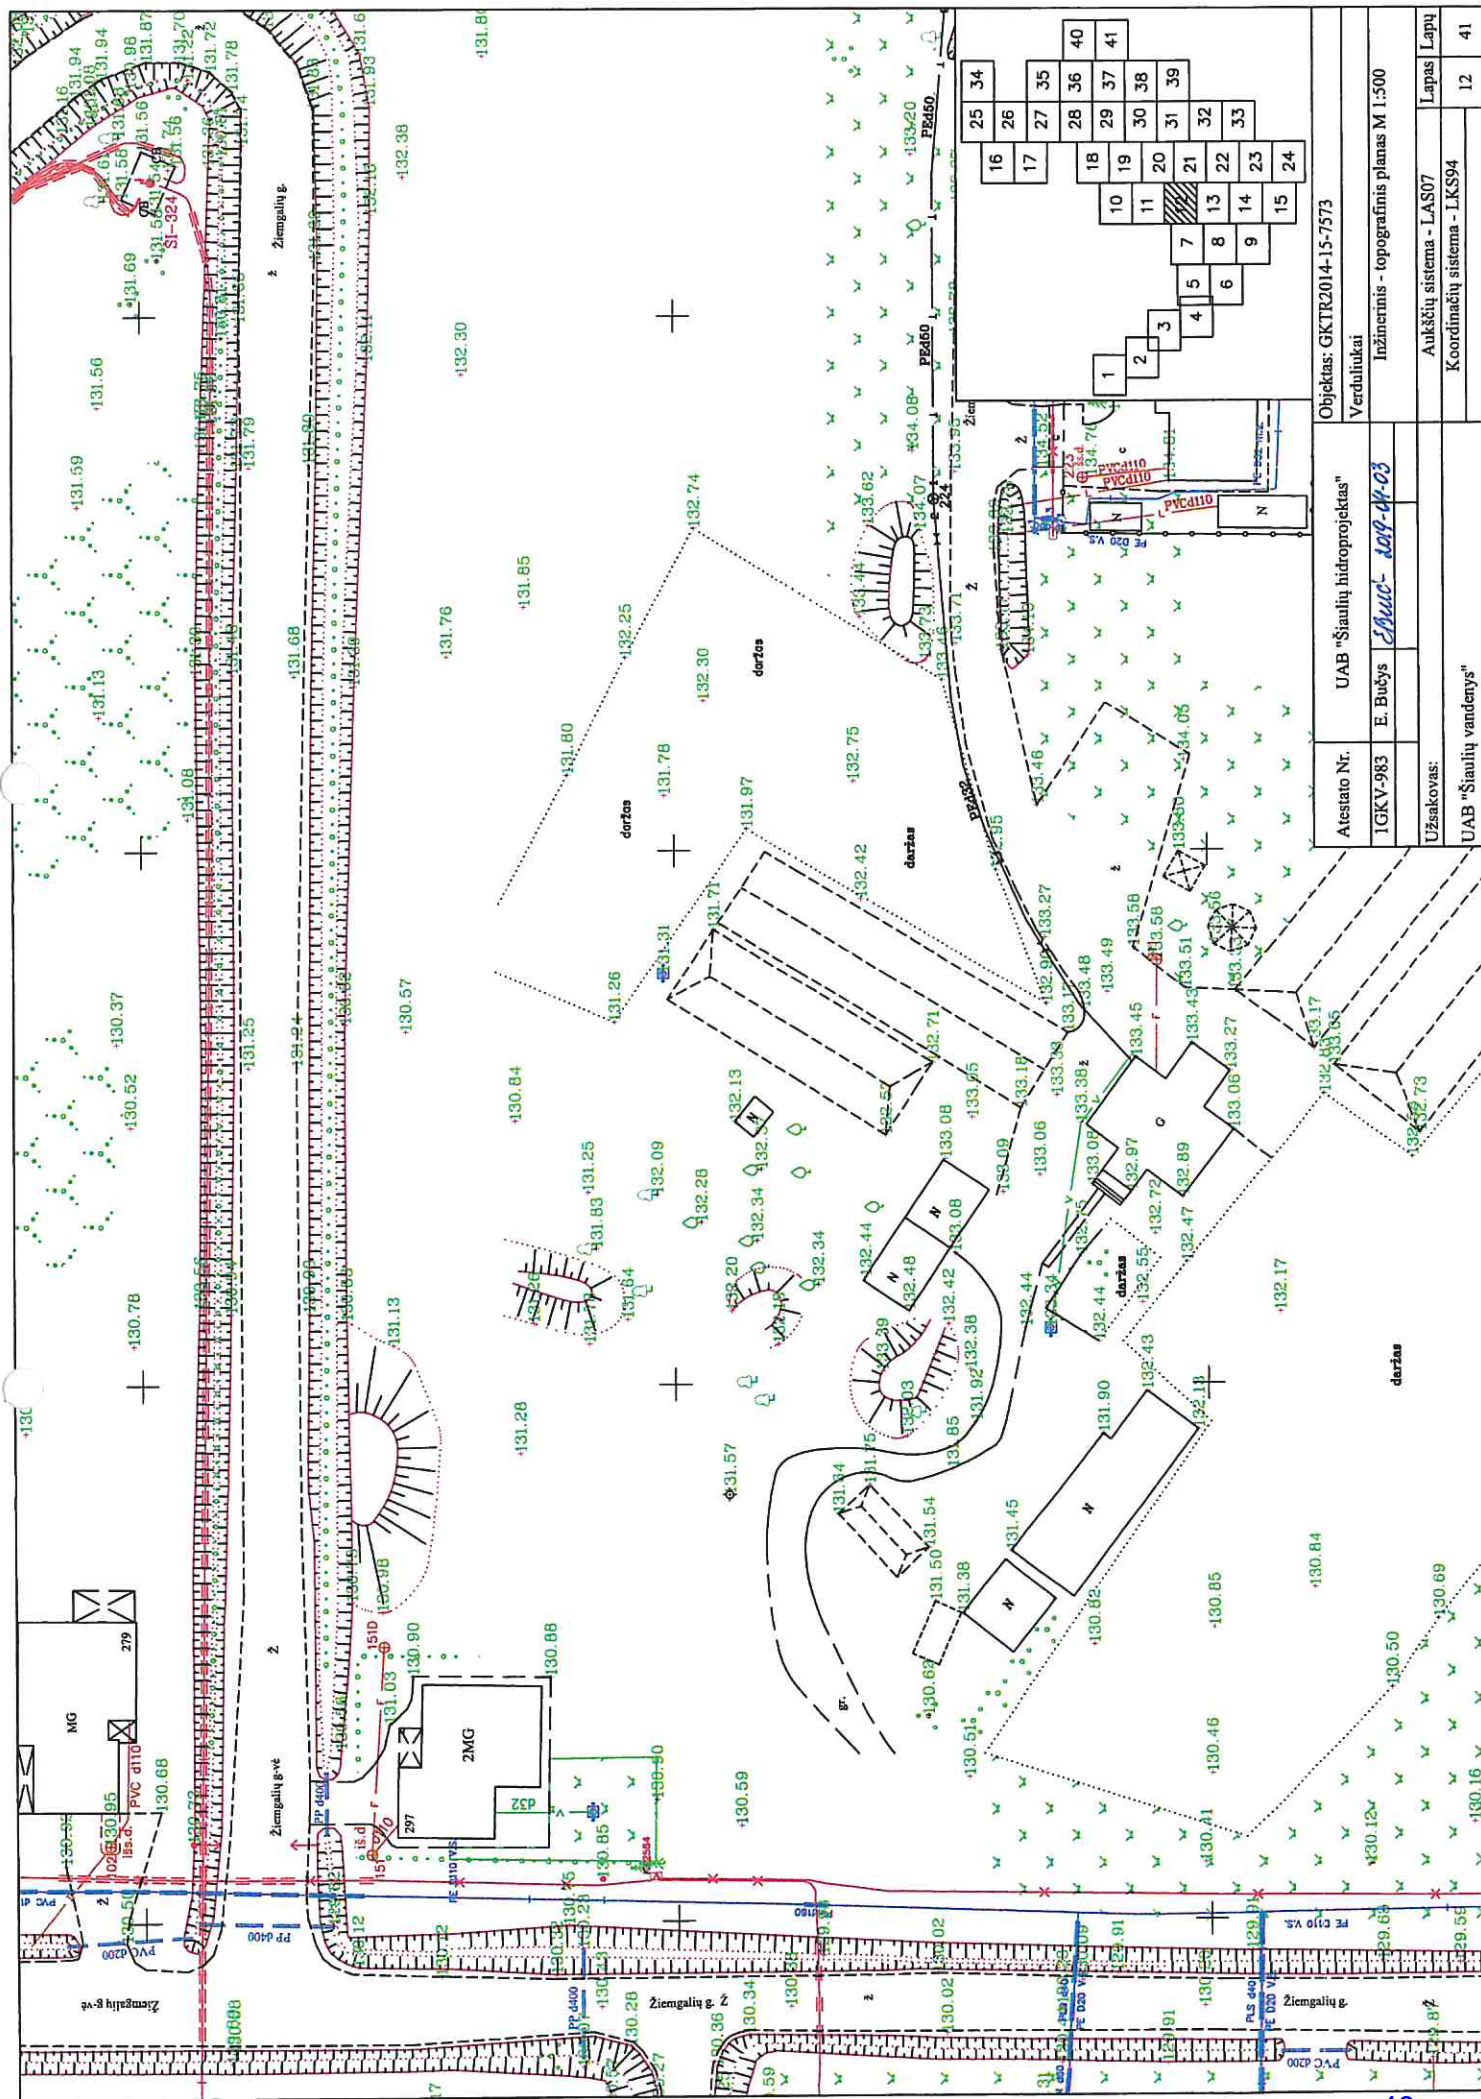


Atestato Nr.		UAB "Šiaulių hidroprojekta"		Objektas: GKTR2014-15-7573	
10KV-983		E. Bučys		Verdukiukai	
Užsakovas:		EABUC-2019-04-03		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
UAB "Šiaulių vandenys"		Aukščių sistema - LAS07		Lapas	
		Koordinatų sistema - LKS94		Lapų	
				12	
				41	

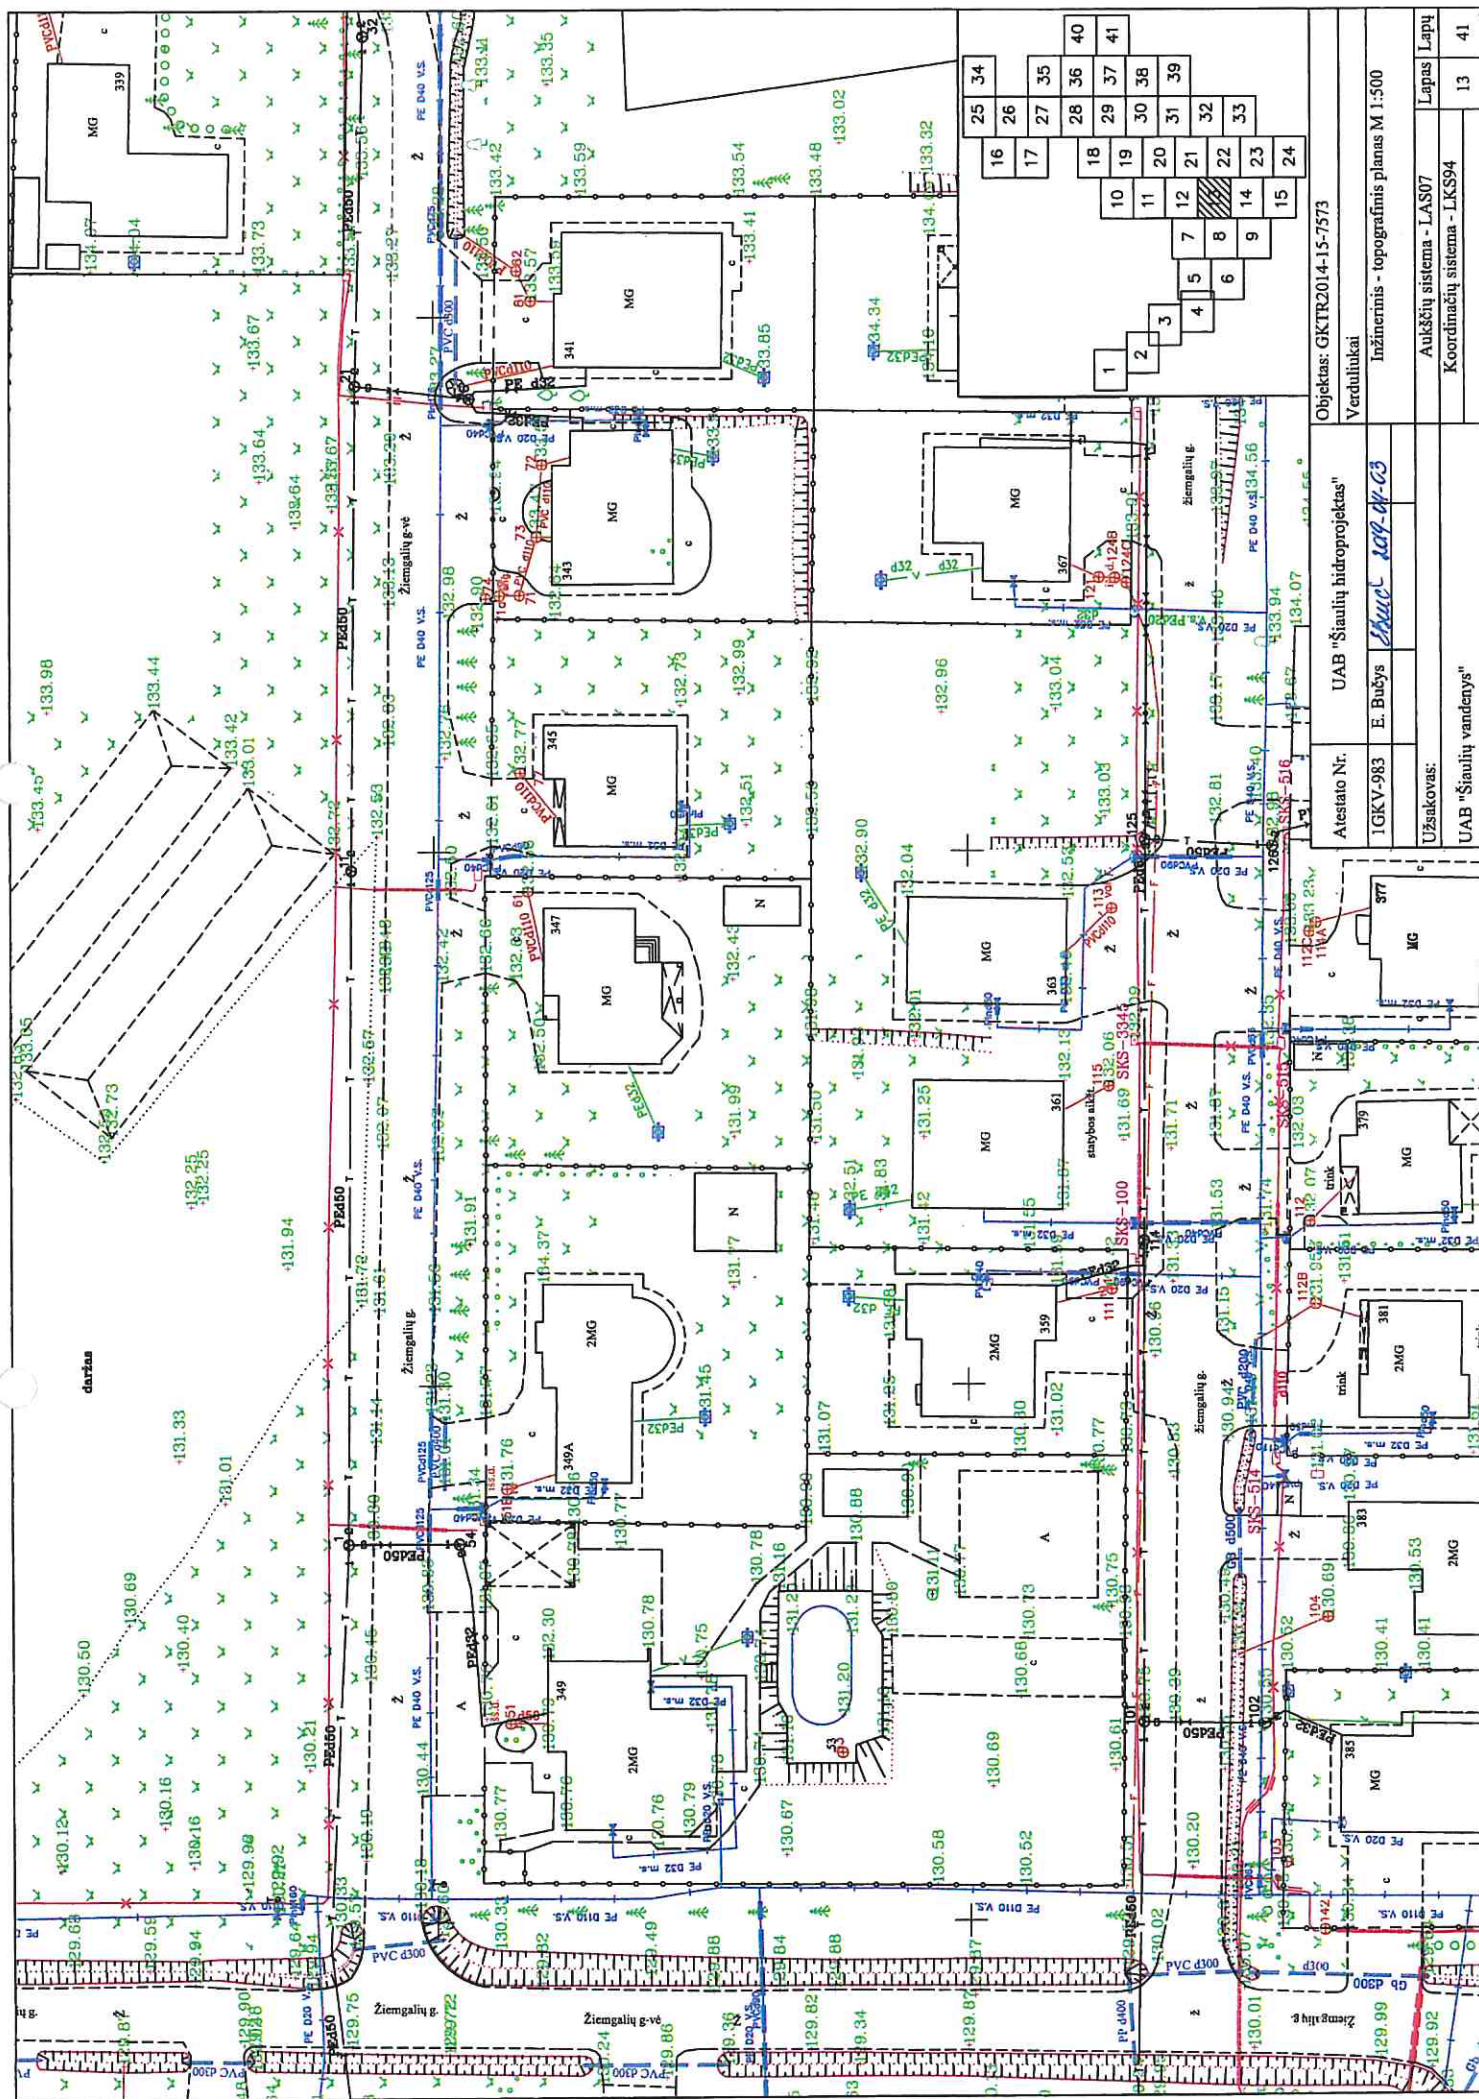


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Objektas: GKTR2014-15-7573	
Vertulukai	
Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojekta"
1GKV-983	E. Bučys <i>abu</i> 109-01-03
Užsakovas:	
UAB "Šiaulių vandenys"	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07	
Koordinatų sistema - LKS94	
Lapas	13
Lapų	41

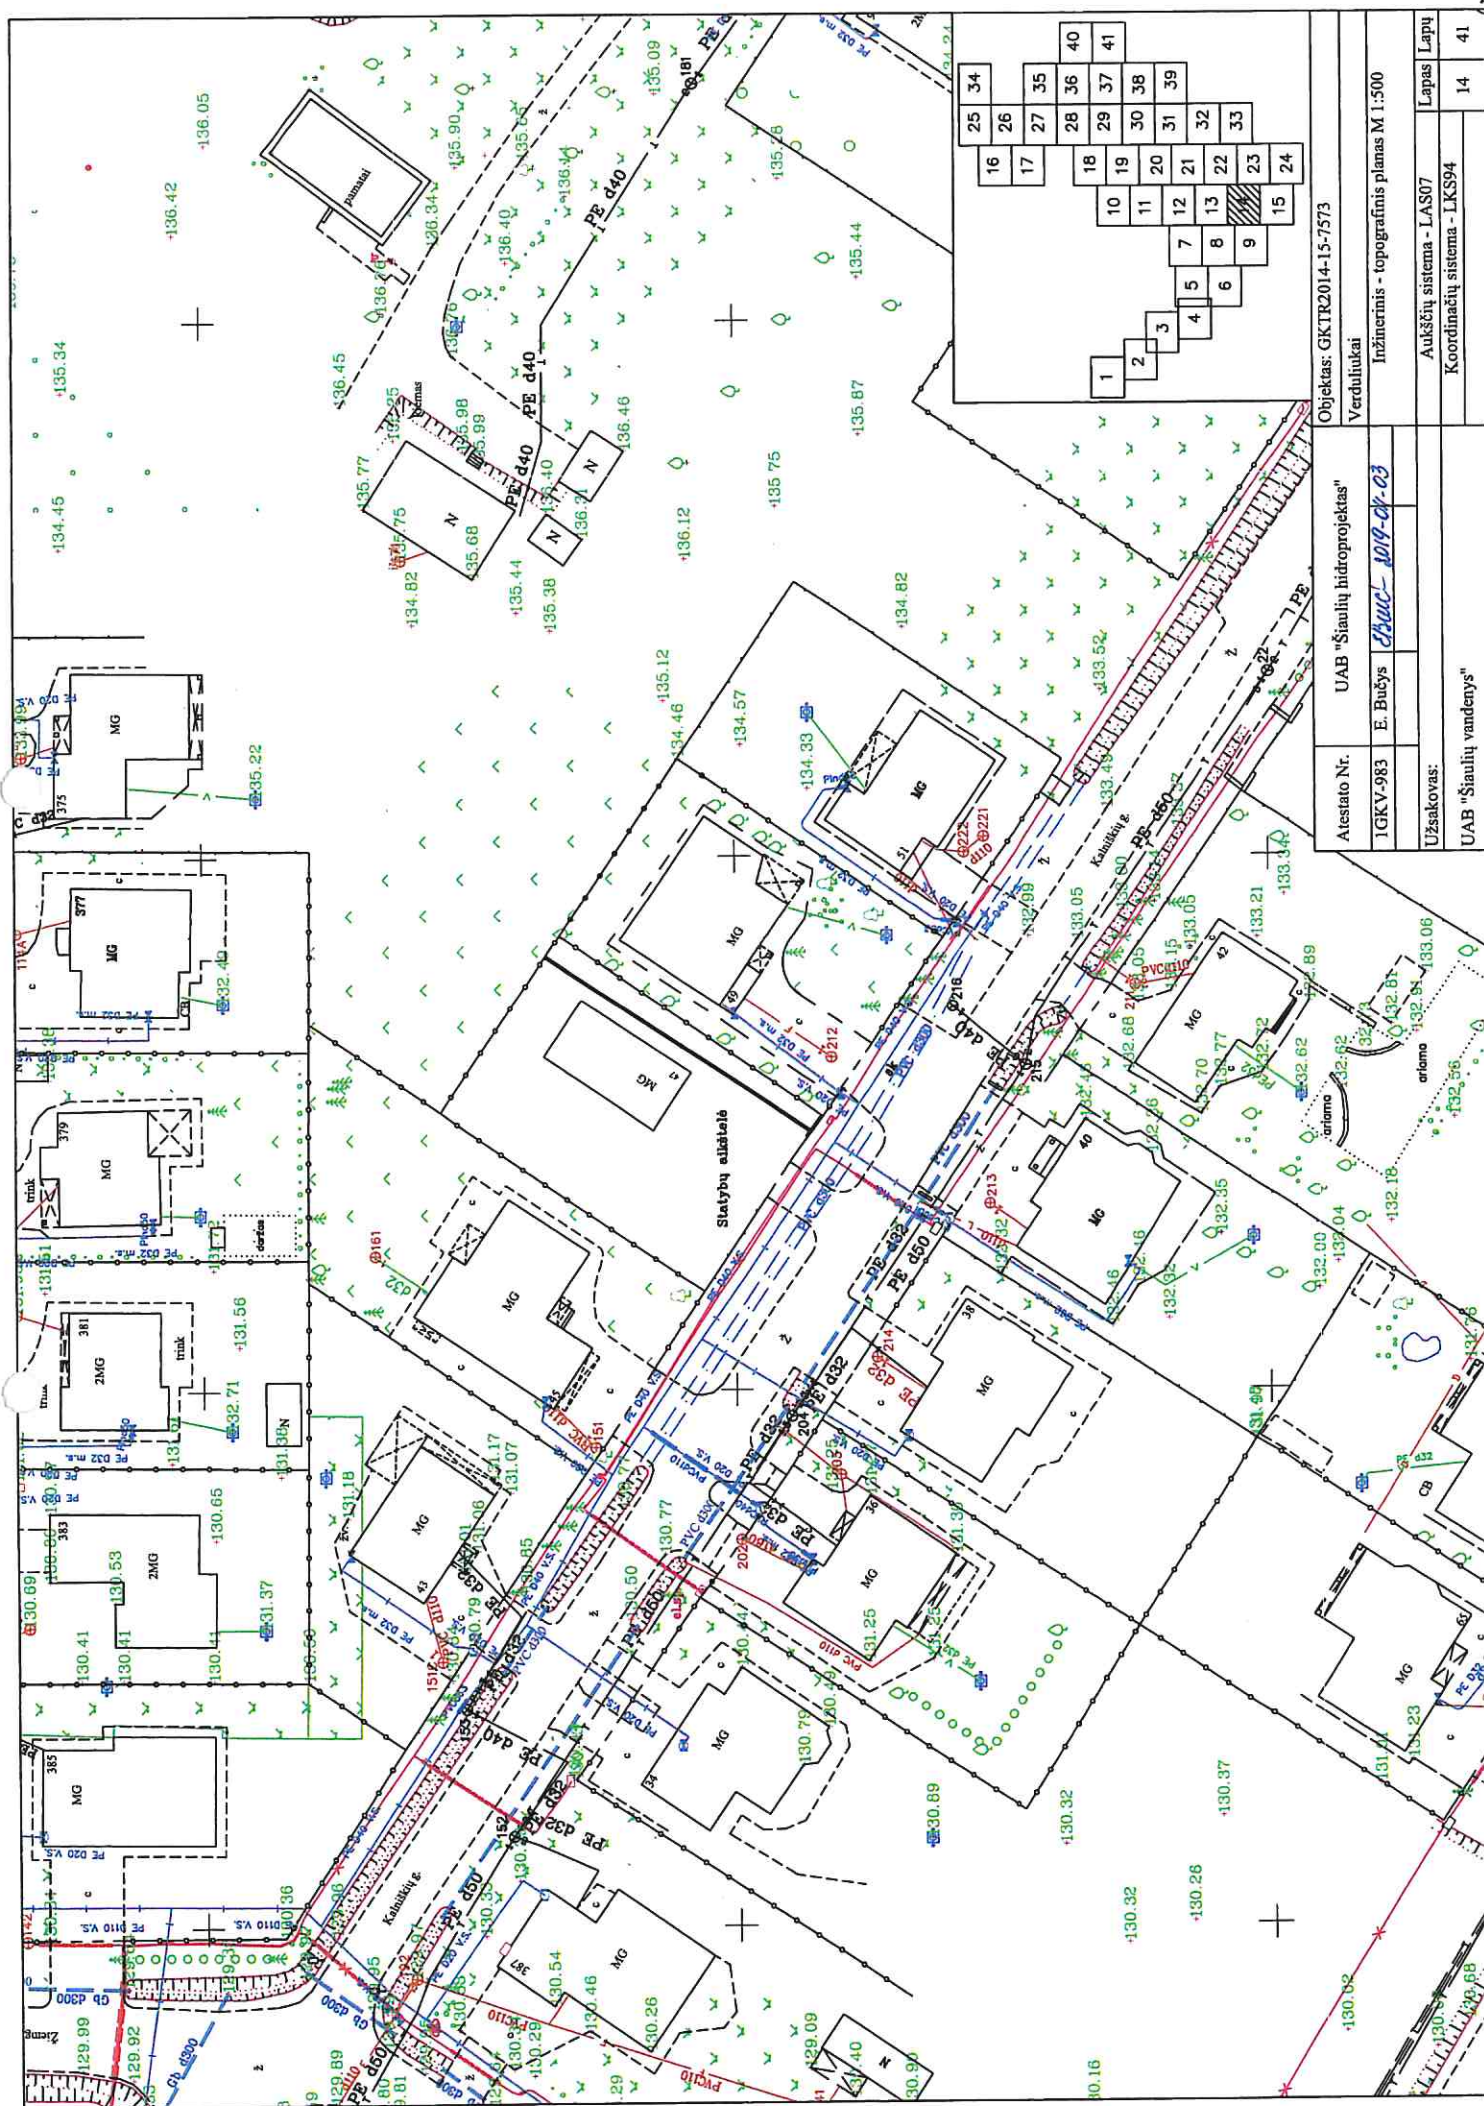


Atestato Nr.		Objektas: GKTR2014-15-7573	
1 GKV-983		Verdukliai	
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
UAB "Šiaulių vandenys"		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07		Lapas	
Koordinatų sistema - LKS94		Lapų	
		14	
		41	

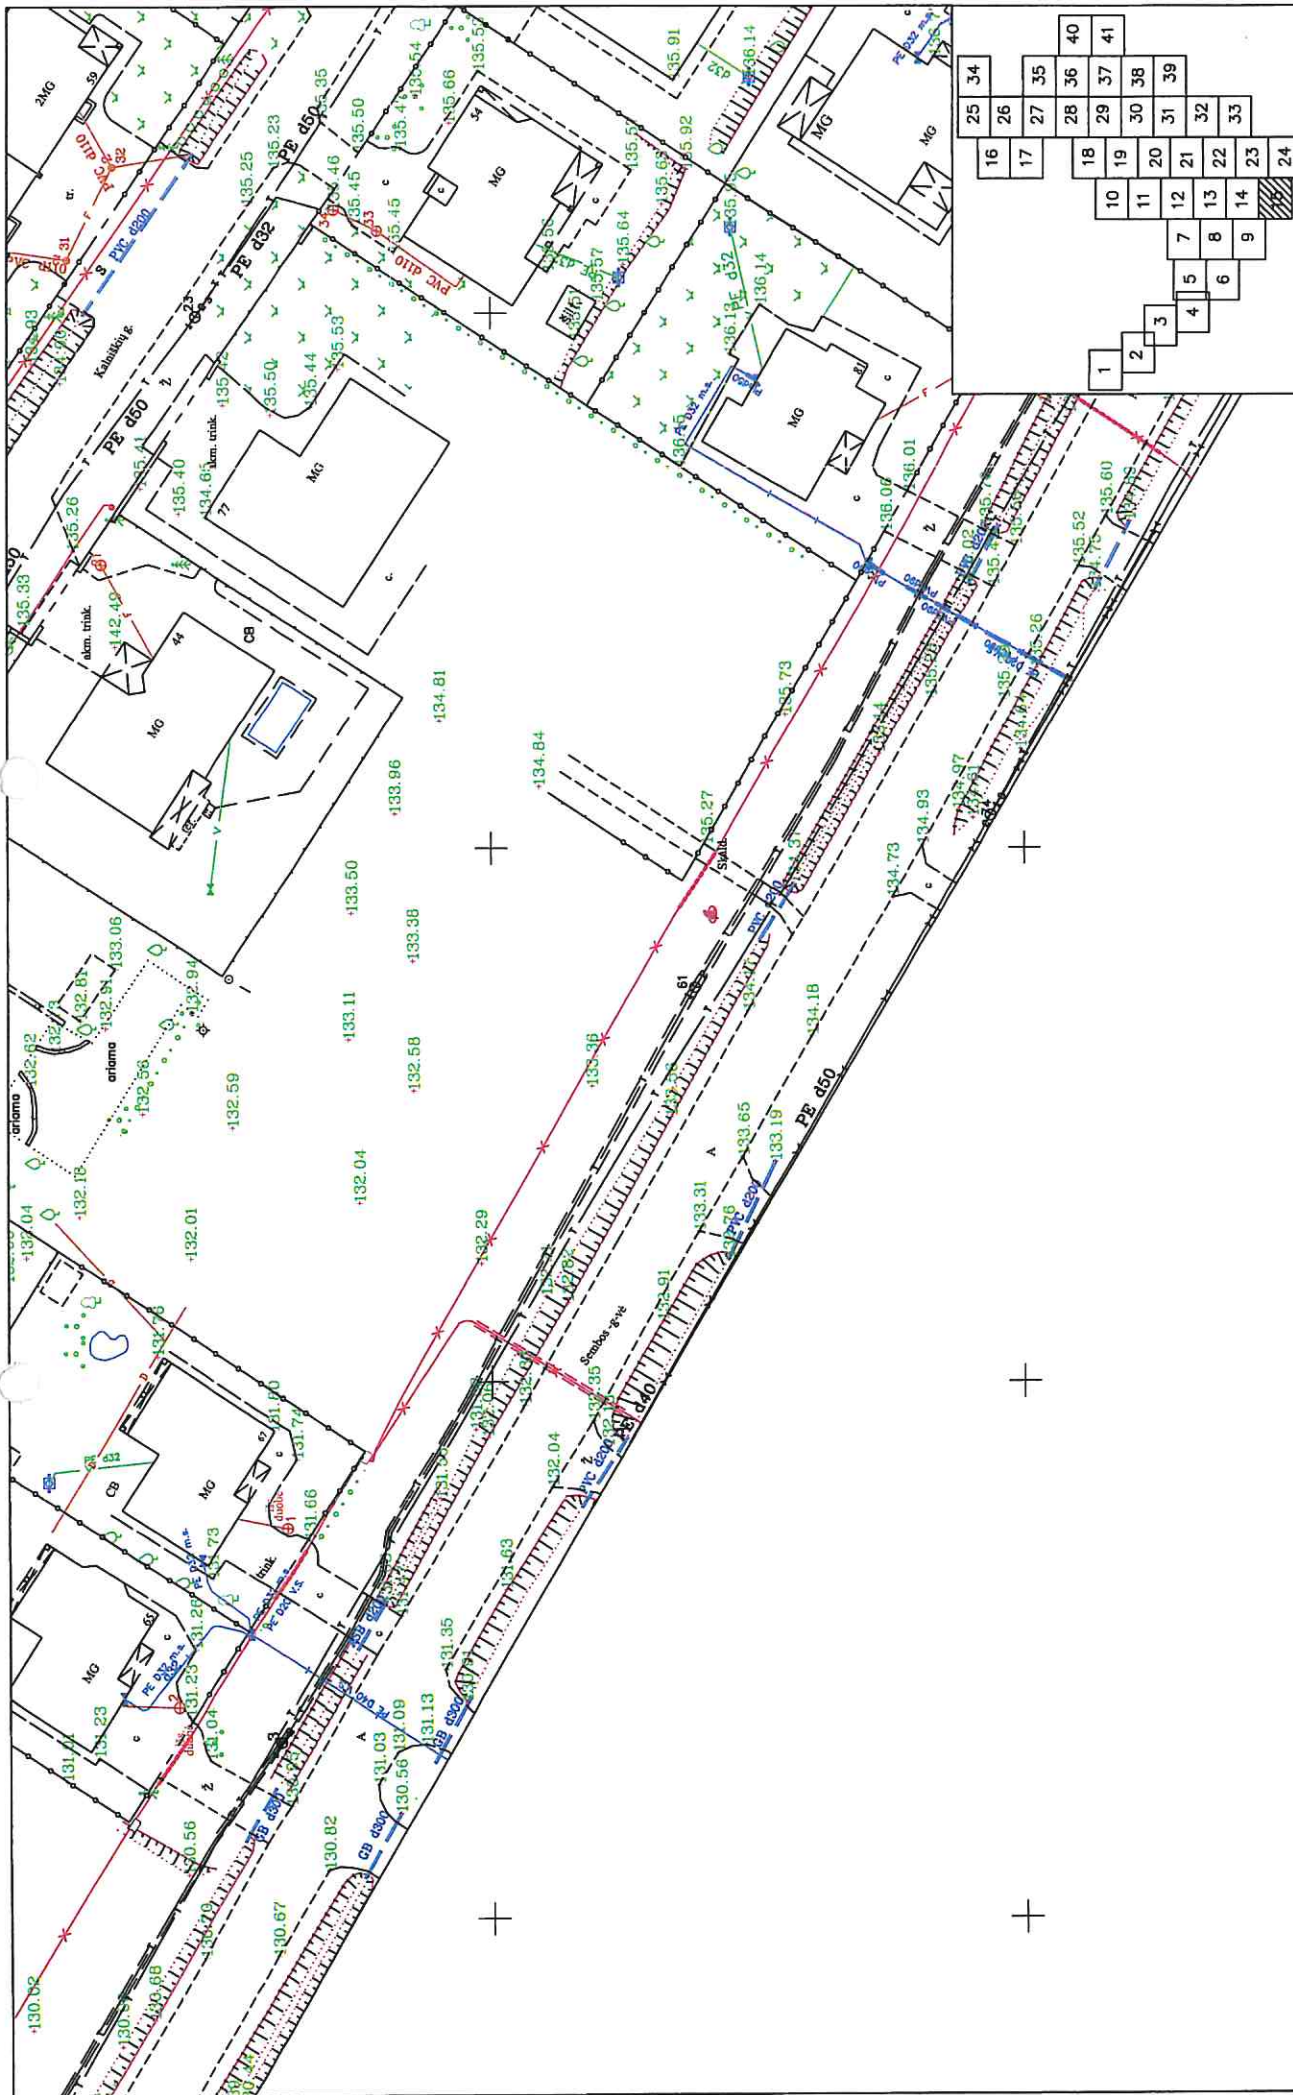


Atestato Nr.		Objektas: GKTR2014-15-7573	
UAB "Šiaulių hidroprojekta"		Verdukliai	
10KV-983	E. Bučys	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Užsakovas:		Aukštųjų sistema - LAS07	
UAB "Šiaulių vandenys"		Koordinatinių sistema - LKS94	
		Lapas	Lapų
		15	41

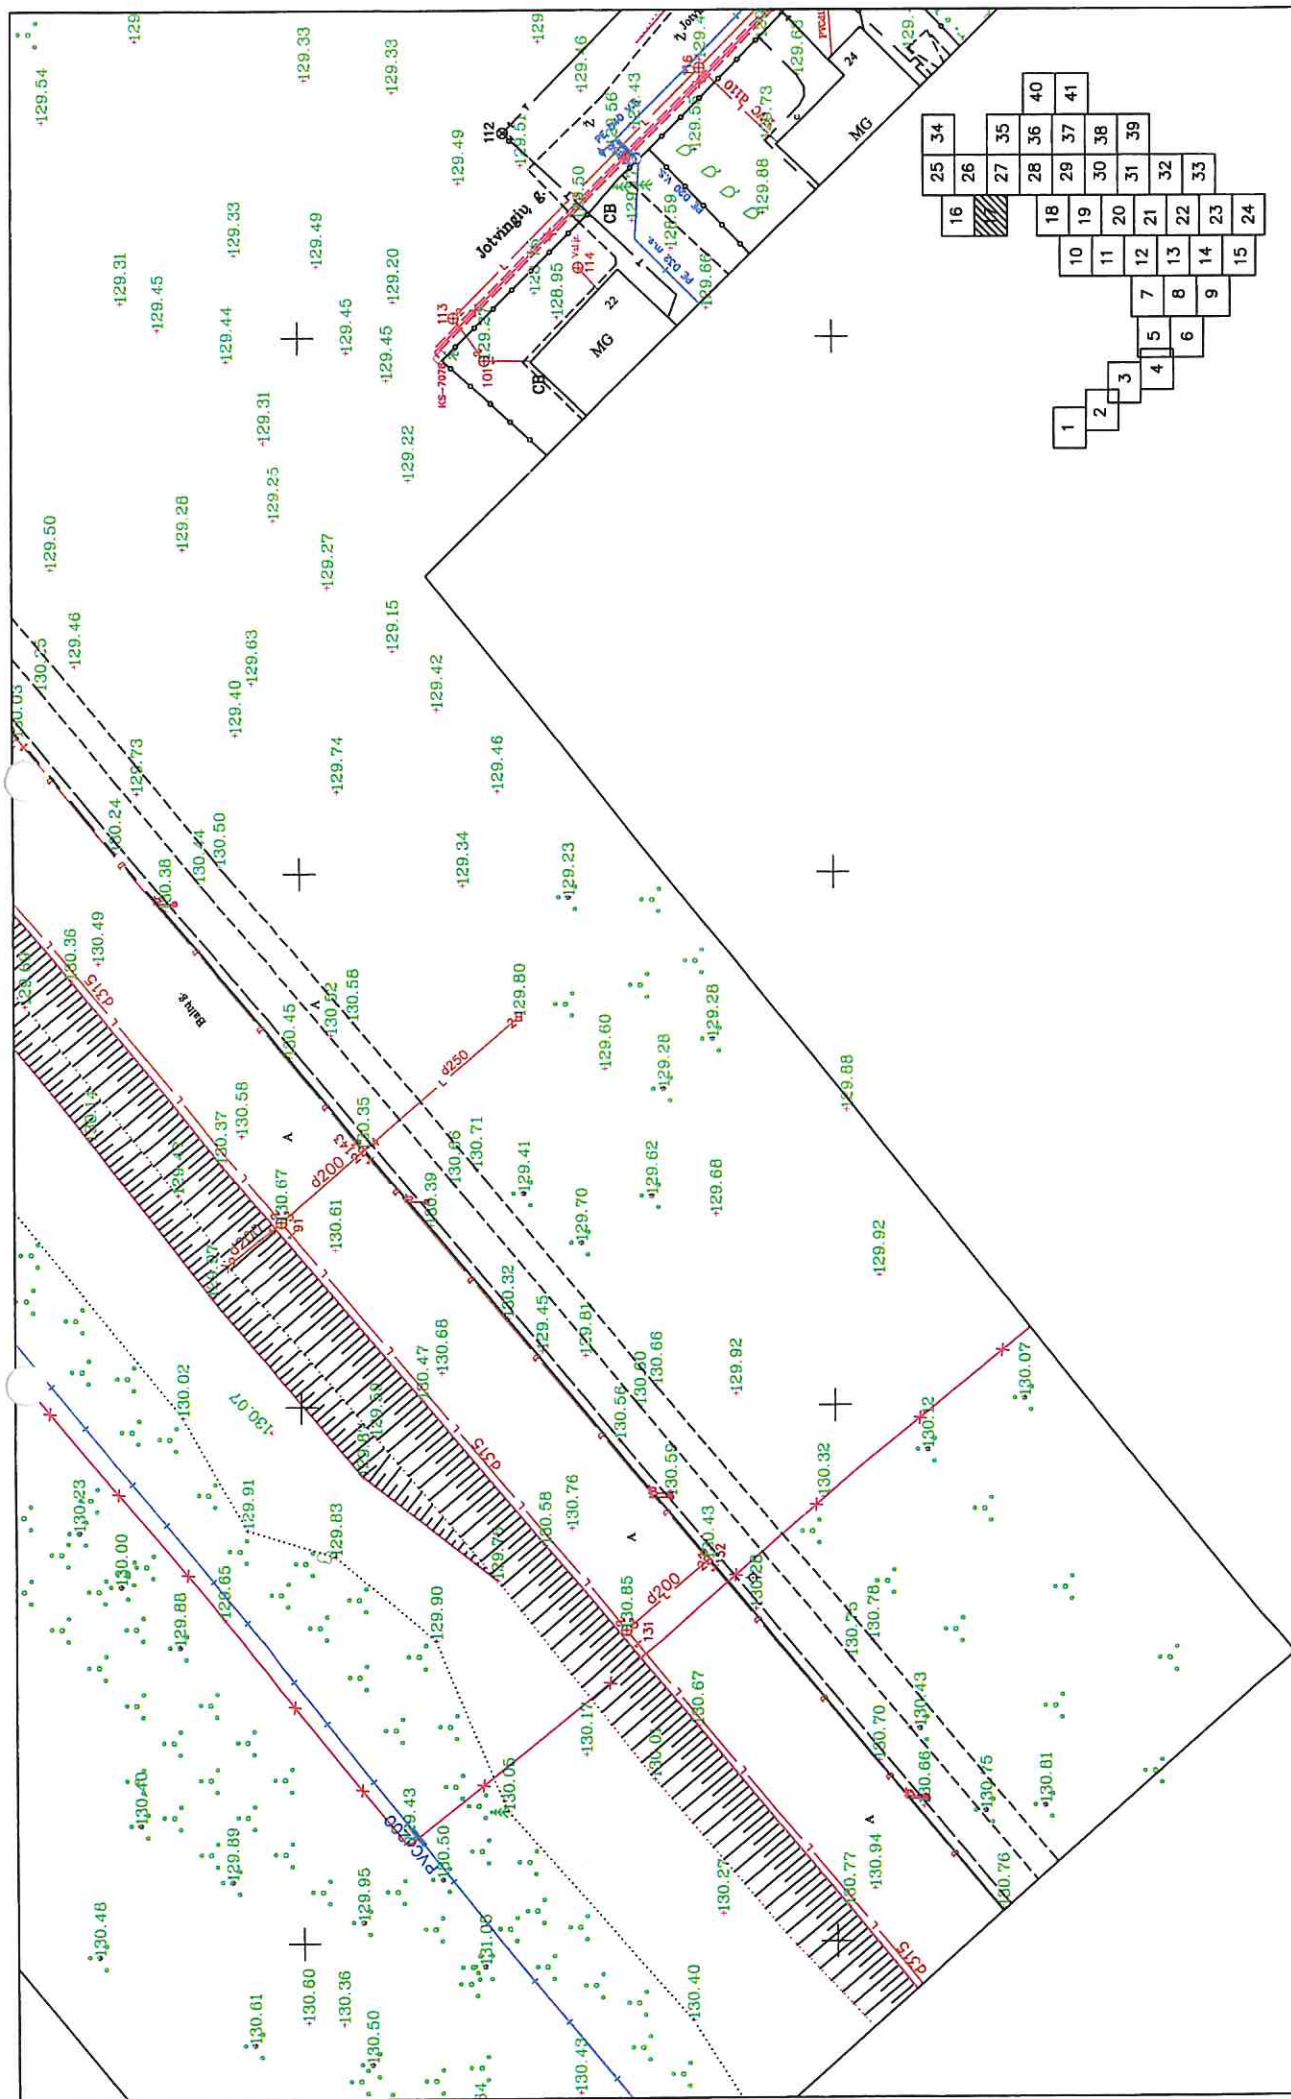


Atestato Nr.		UAB "Šiaulių hidroprojektas"		Objektas: GKTR2014-15-7573	
1GKV-983		E. Bučys		Verduoliai	
Užsakovas:		E. Bučys - 209-44-03		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
UAB "Šiaulių vandenys"				Aukščių sistema - LAS07	
				Koordinatų sistema - LKS94	
				Lapas	
				17	
				Lapų	
				41	

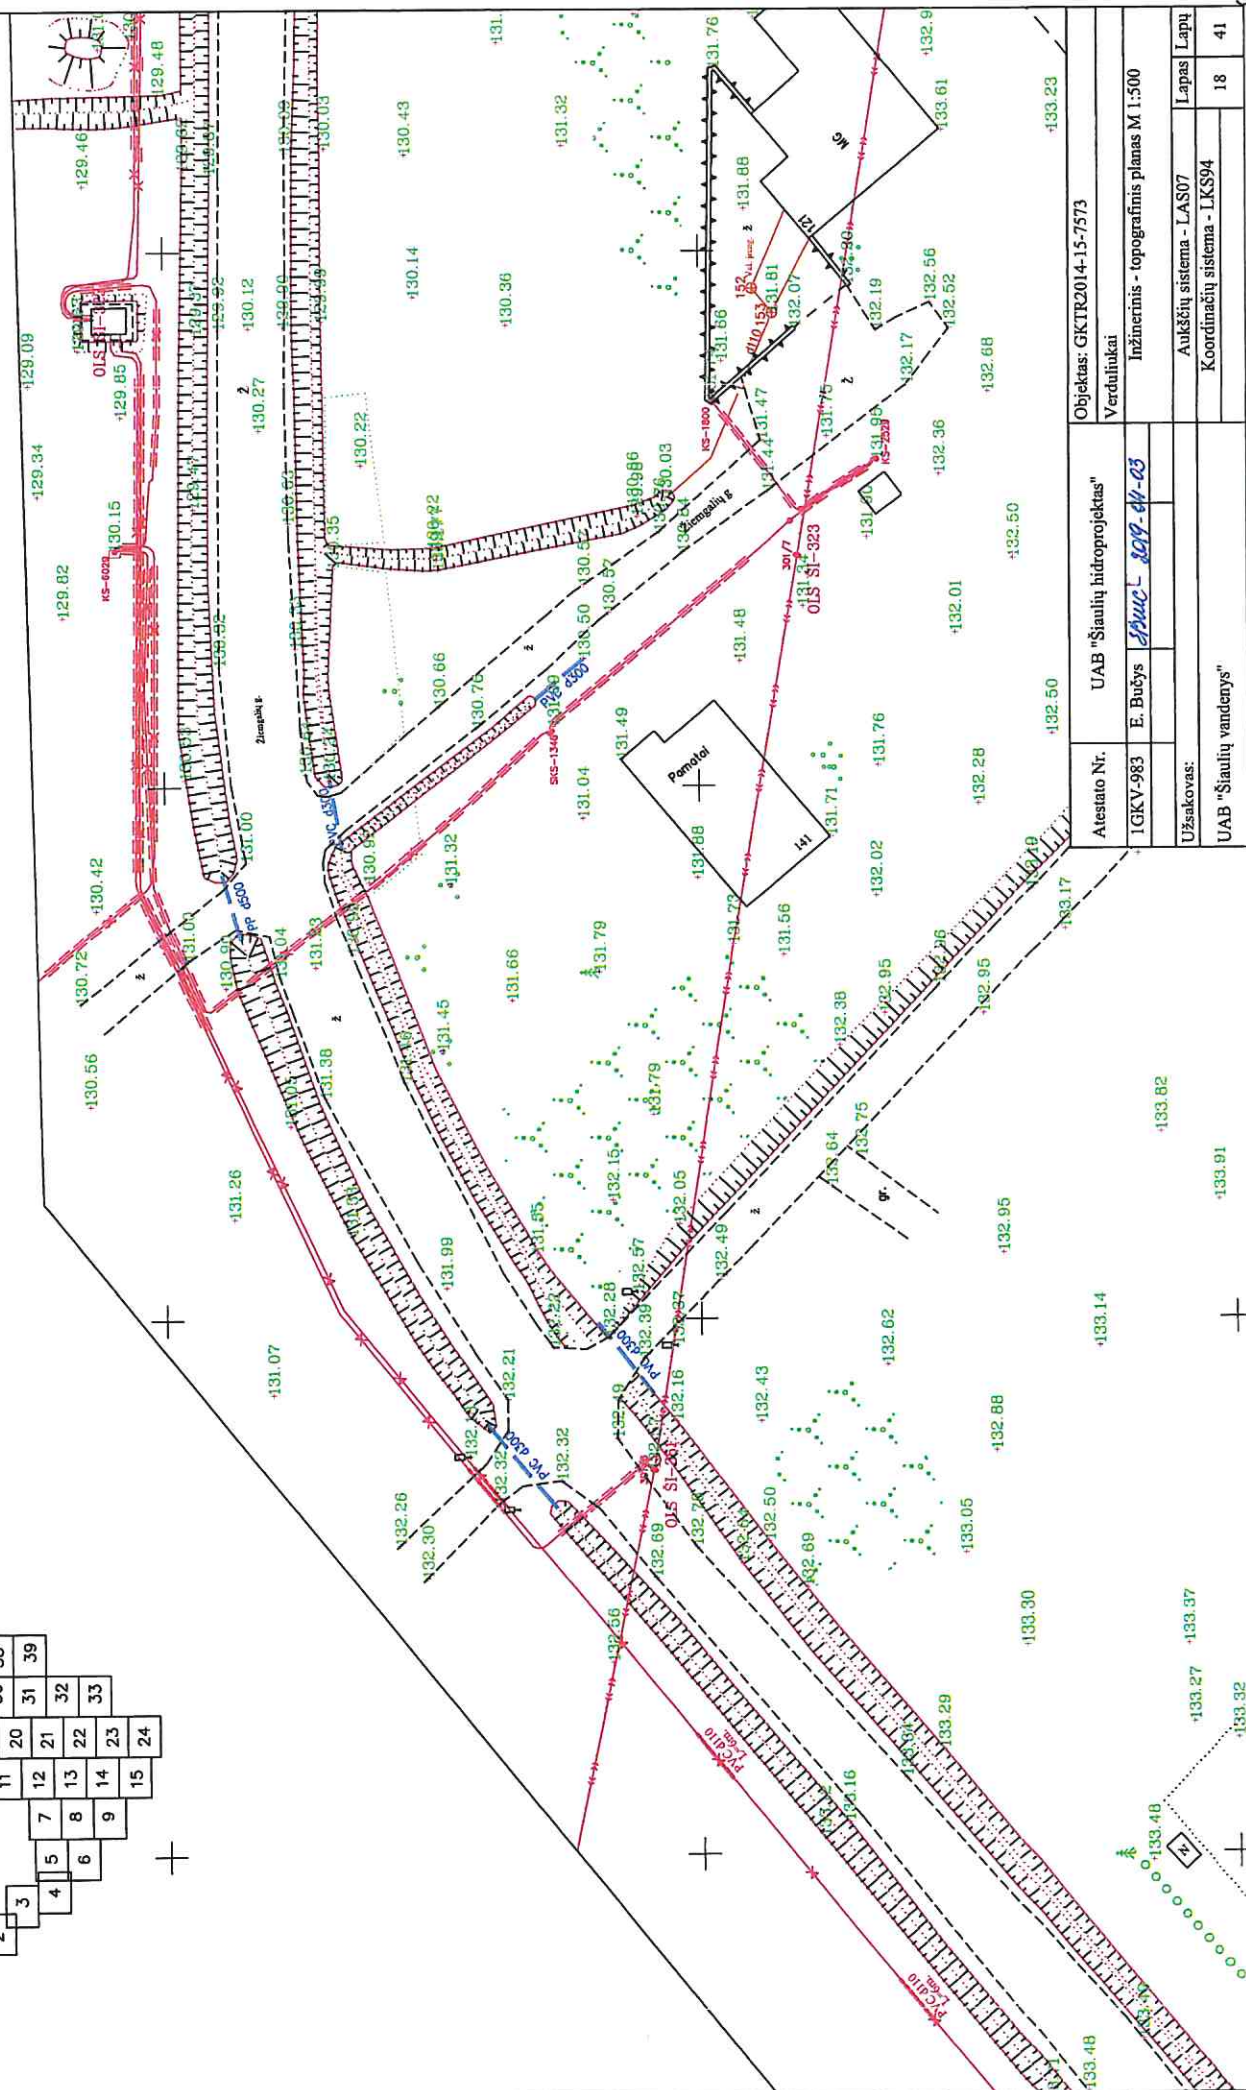


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"		Objektas: GKTR2014-15-7573
IGKV-983	E. Bučys	2019-04-03	Verduiukai
Užsakovas:			Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
UAB "Šiaulių vandenys"			Aukščių sistema - LAS07
			Koordinacių sistema - LKS94
			Lapas Lapų
			18 41

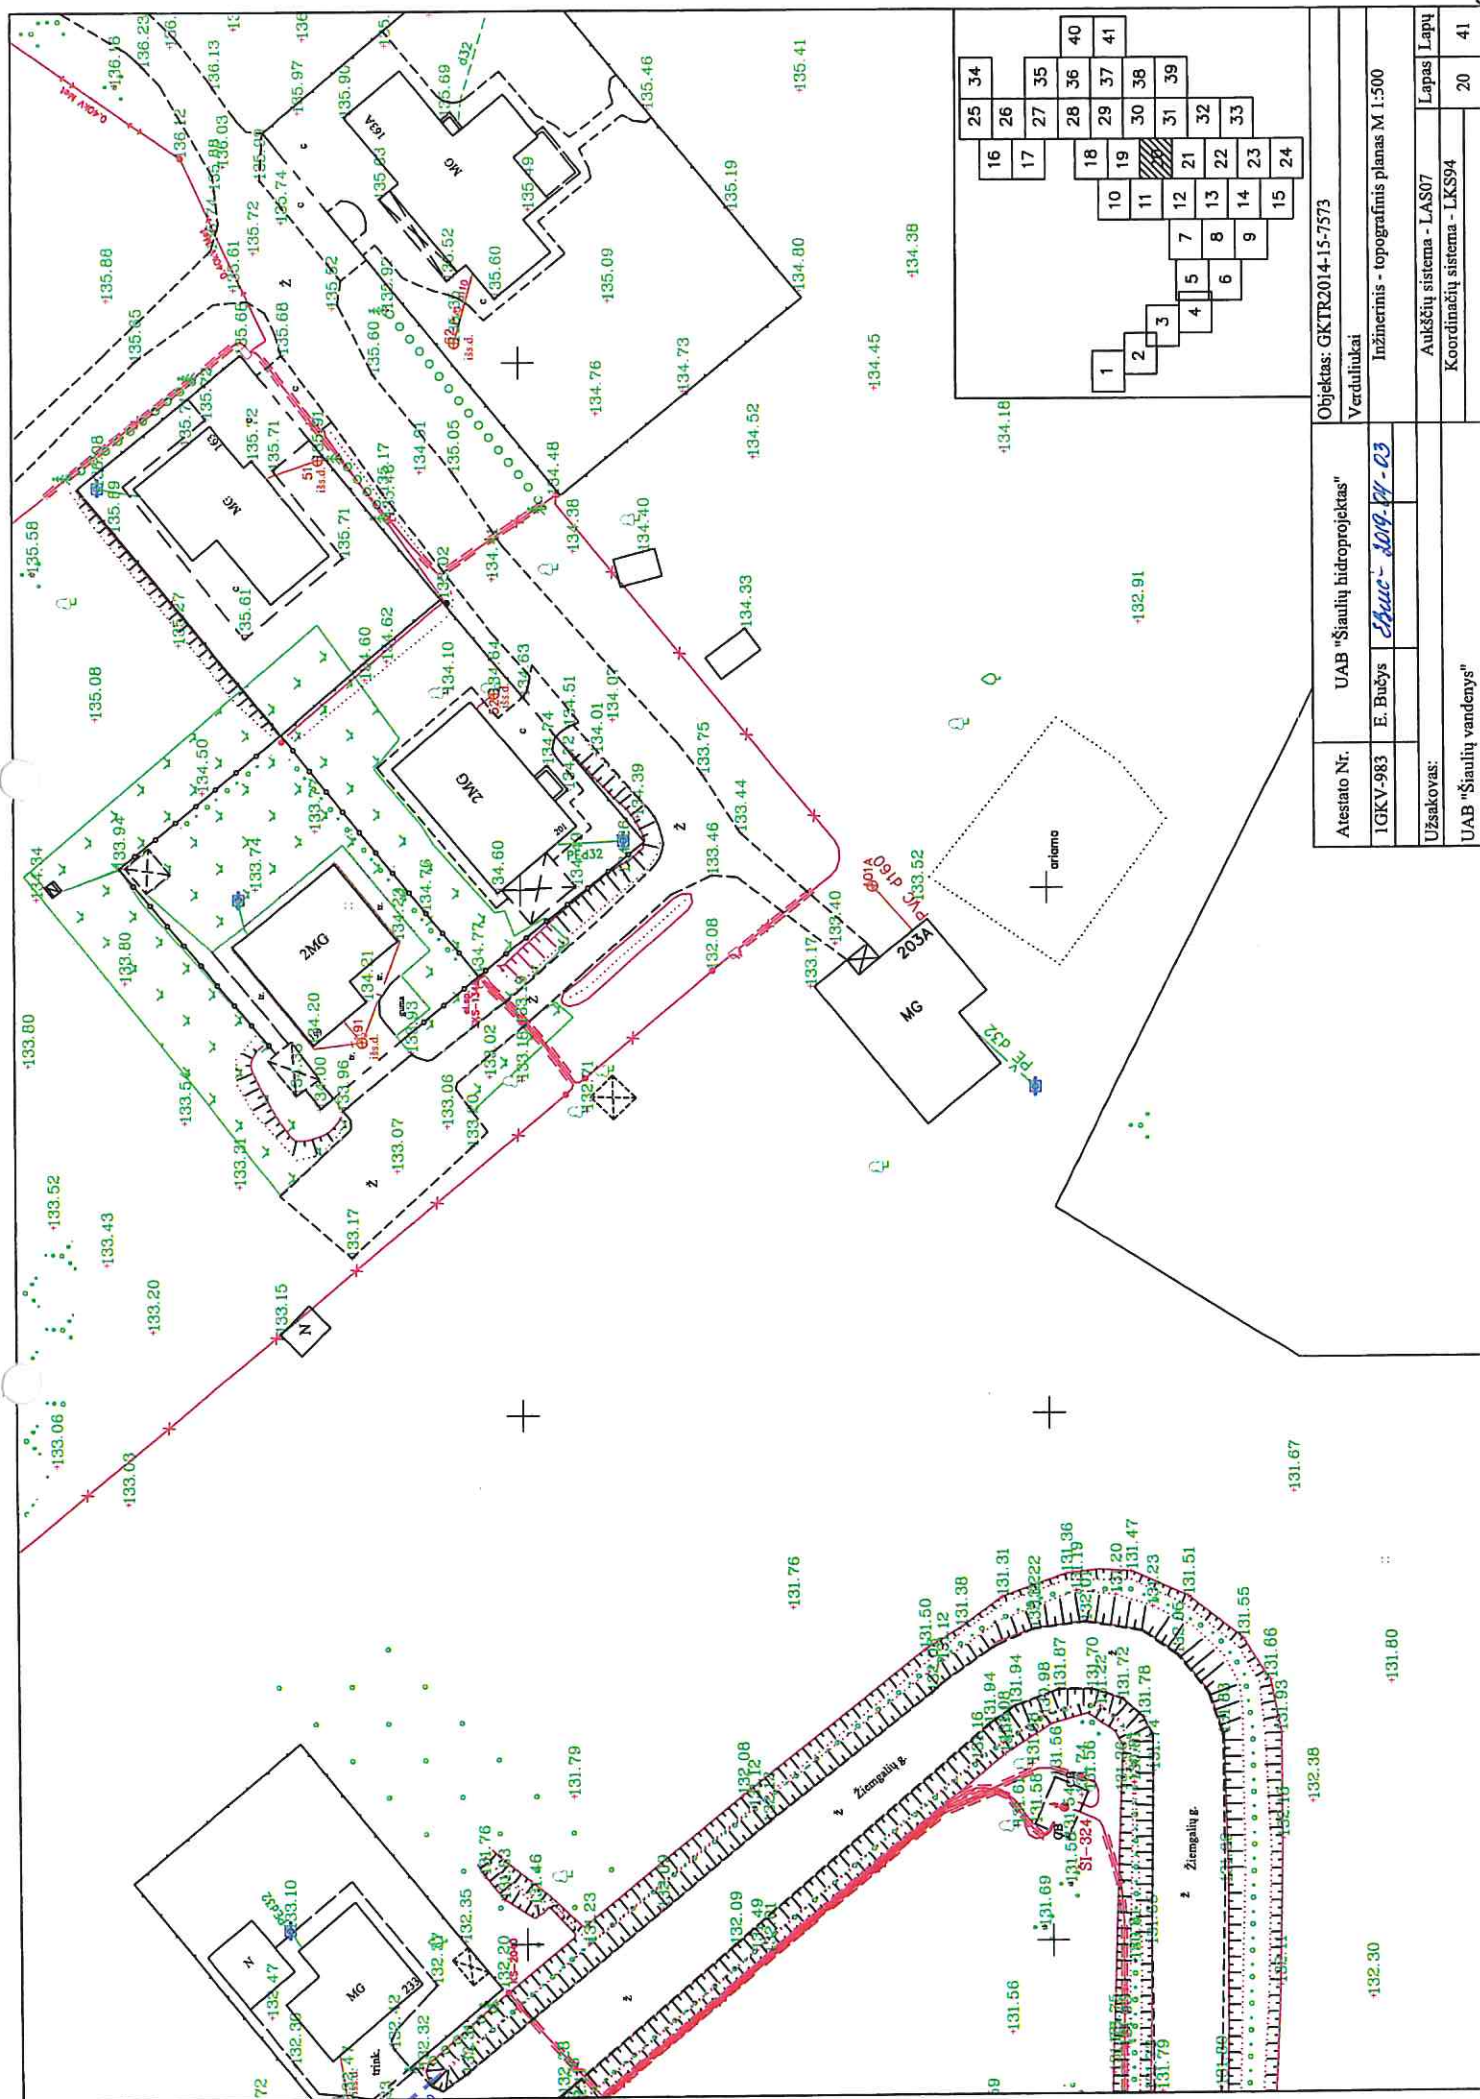

Atestato Nr.		UAB "Šiaulių hidroprojektas"		Objektas: GKTR2014-15-7573	
1GKV-983		E. Bučys		Verdučiai	
Užsakovas:		UAB "Šiaulių vandenys"		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07		Koordinatų sistema - LKS94		Lapas	
Lapų		20		41	

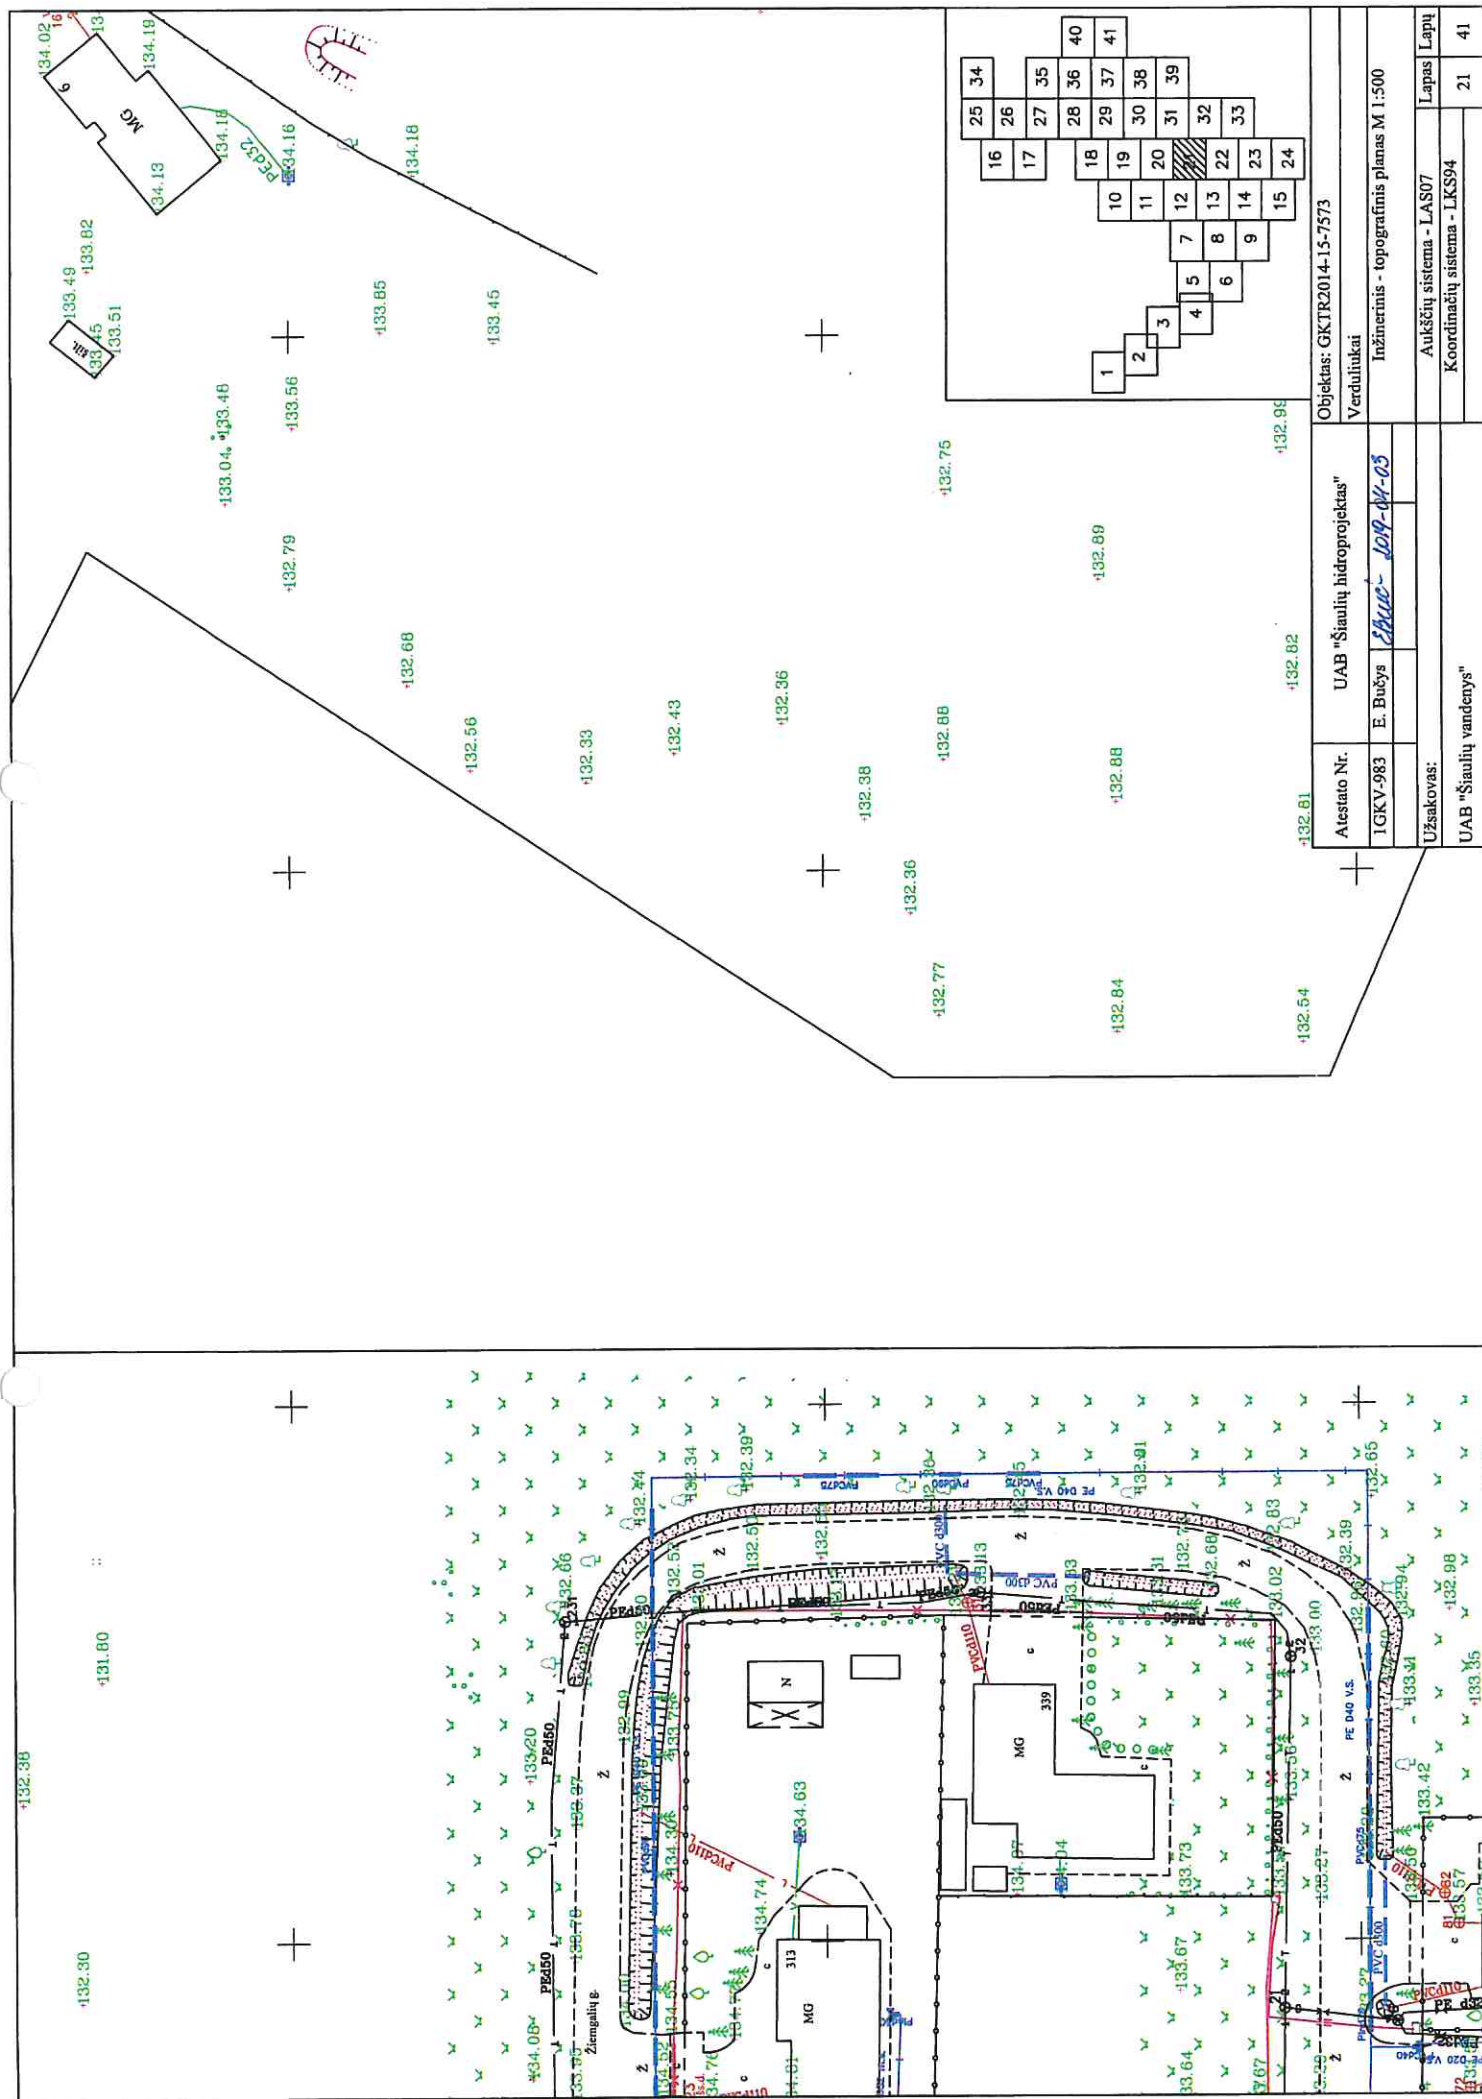


Objektas: GKTR2014-15-7573	
Verdukliai	
Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"
1 GKV-983	E. Bučys <i>ELUC-109-04-03</i>
Užsakovas:	
UAB "Šiaulių vandenys"	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07	
Koordinatų sistema - LKS94	
Lapas	21
Lapų	41

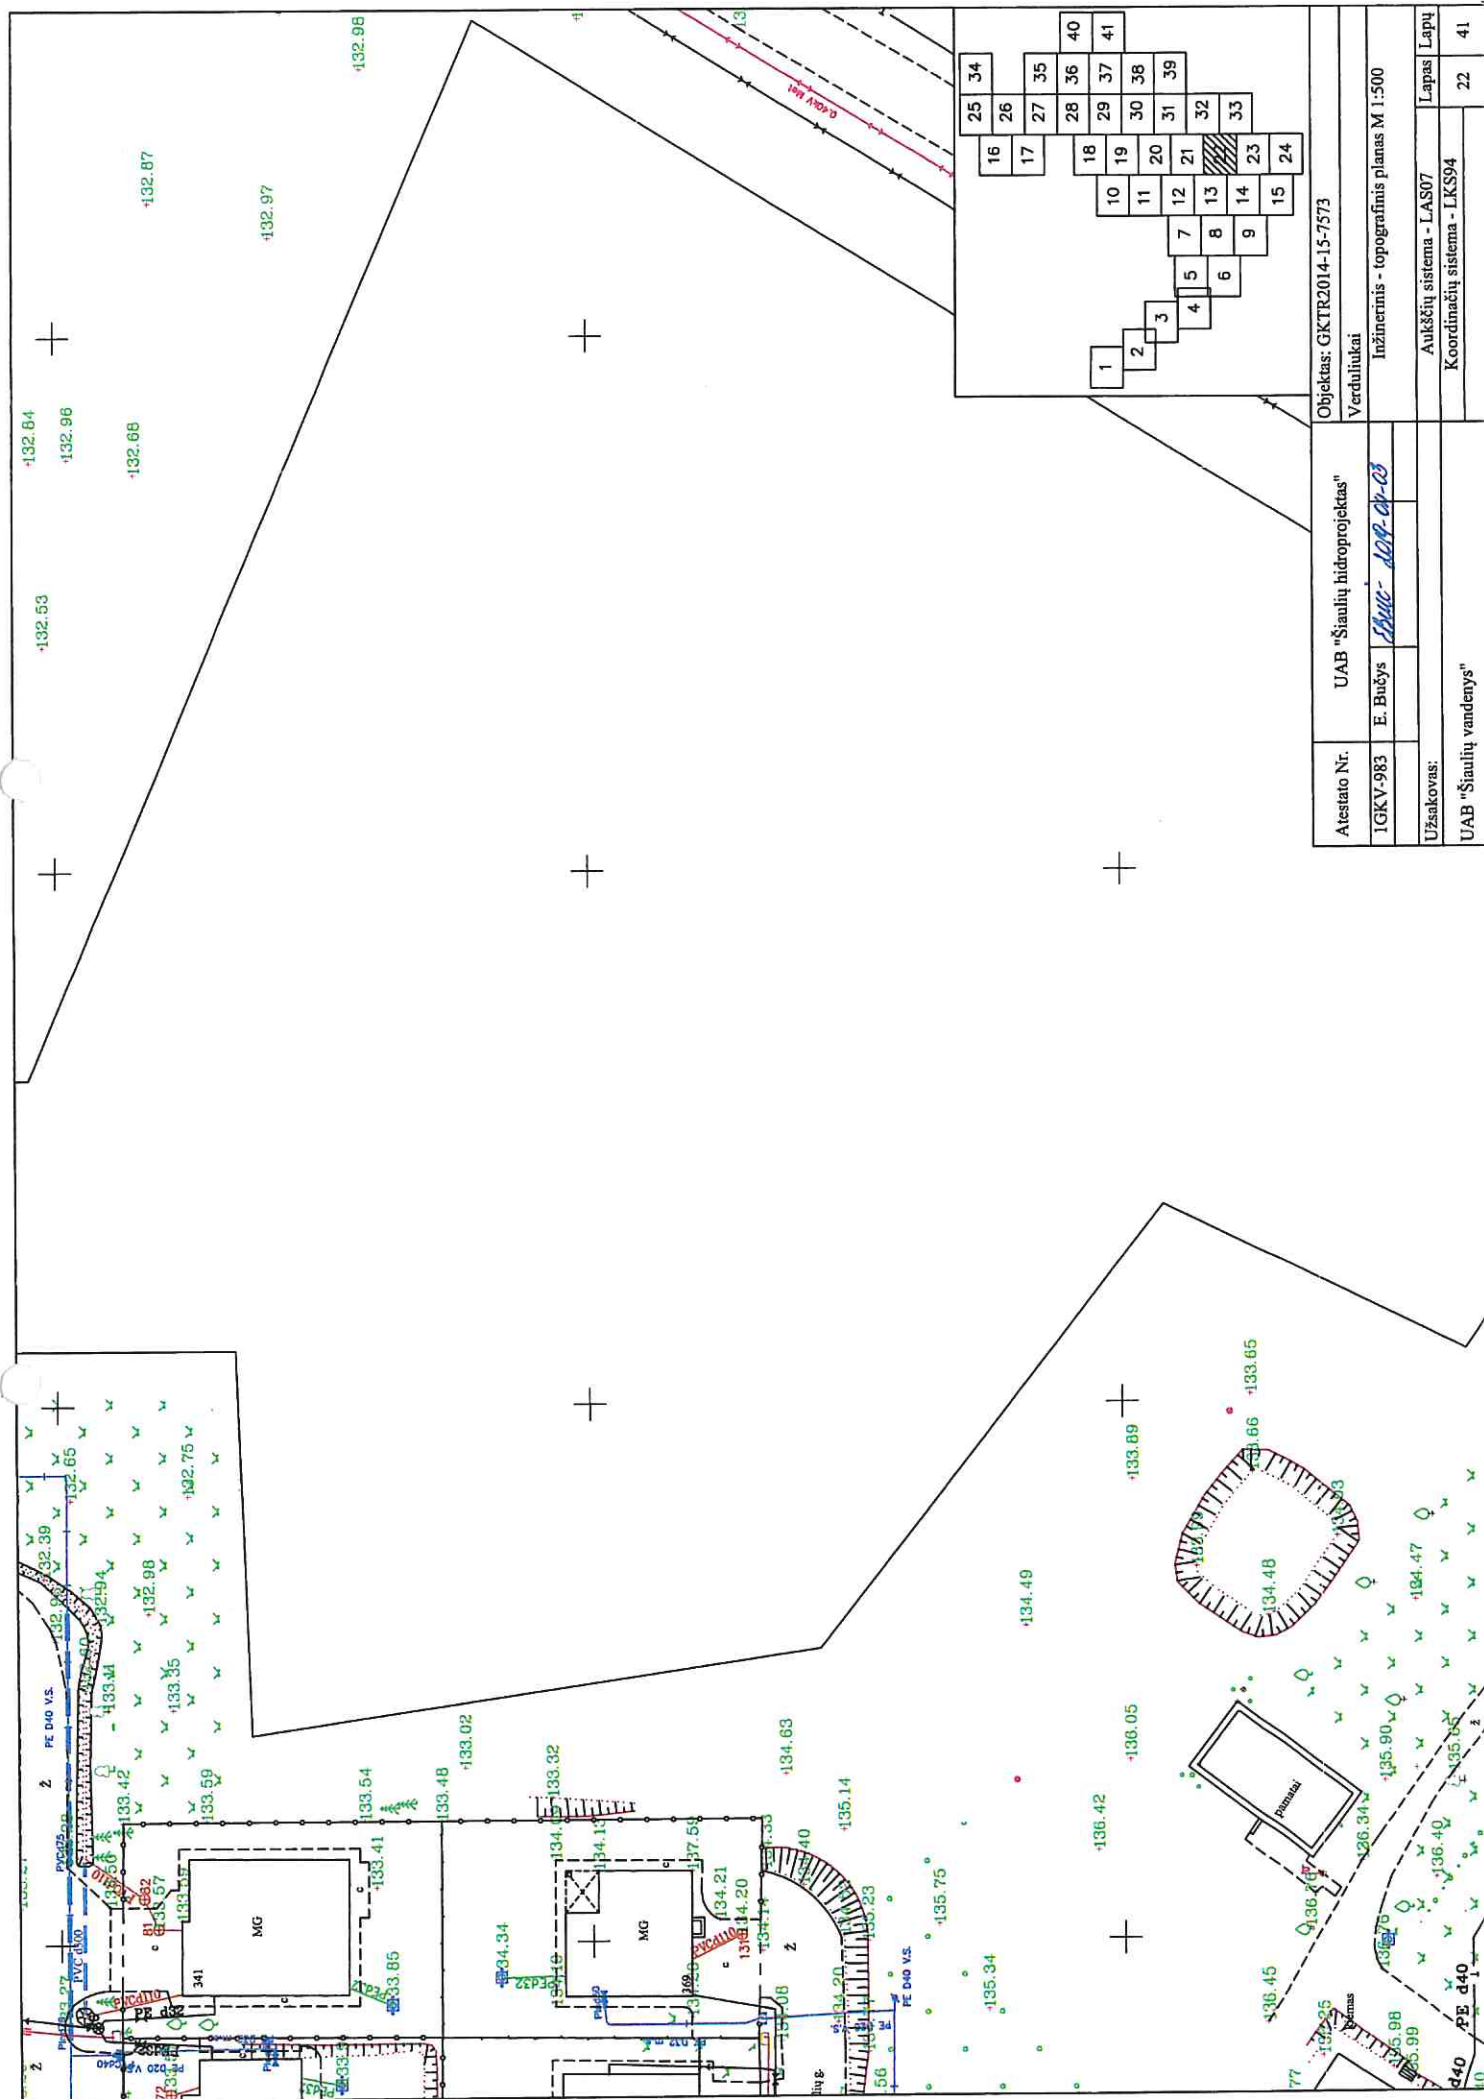


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdučiai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščųjų sistema - LAS07
		Koordinatinių sistema - LKS94
		Lapas
		22
		41

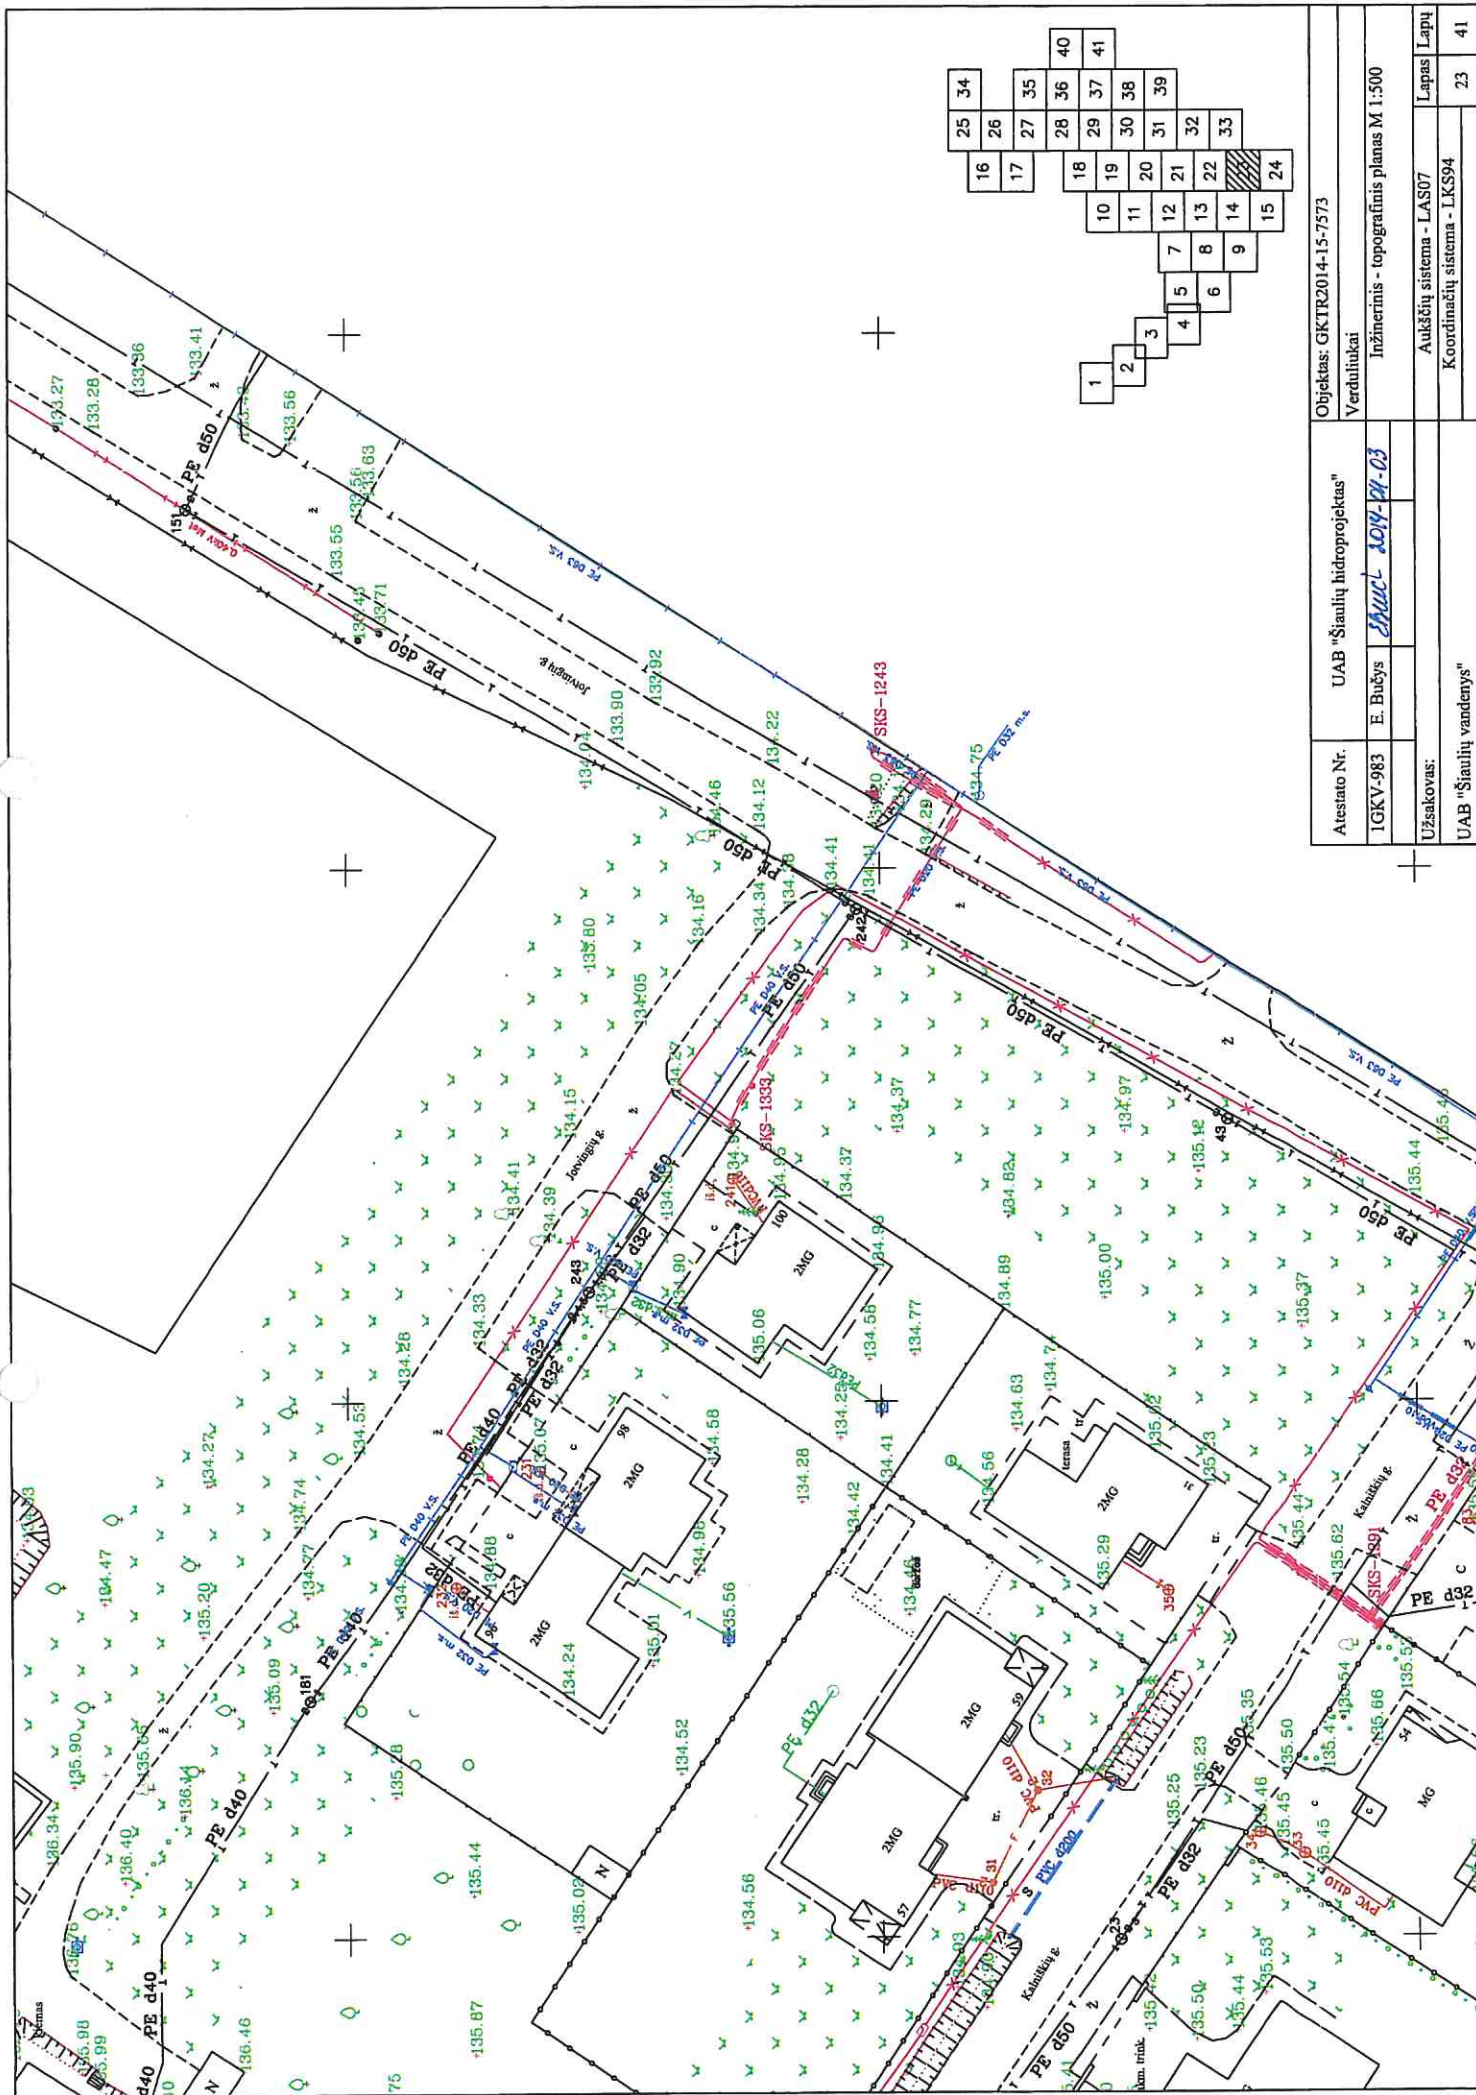


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojekta"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdučiai
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
UAB "Šiaulių vandenys"		Aukštųjų sistema - LAS07
		Koordinatinių sistema - LKS94
		Lapas
		23
		41

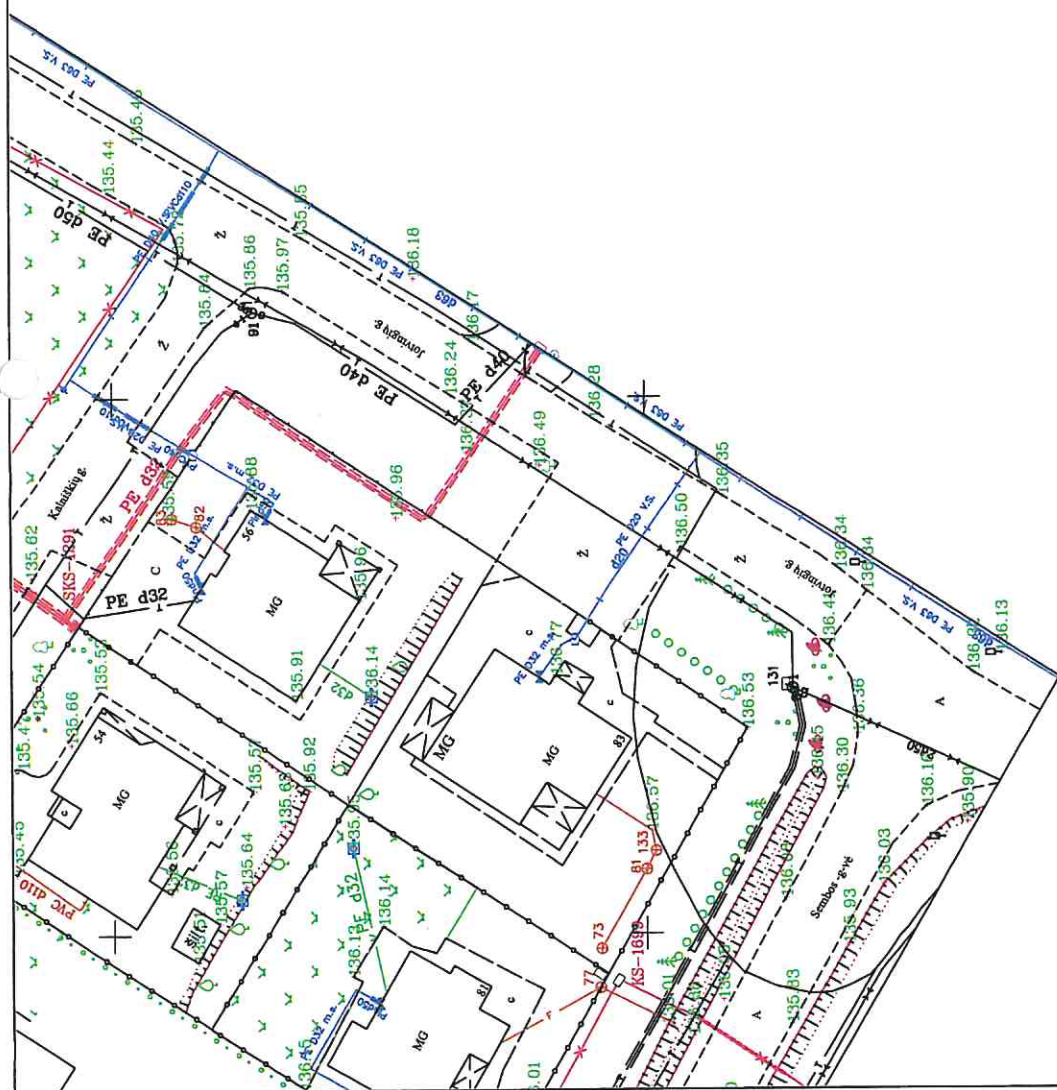


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdukliai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		24
		41

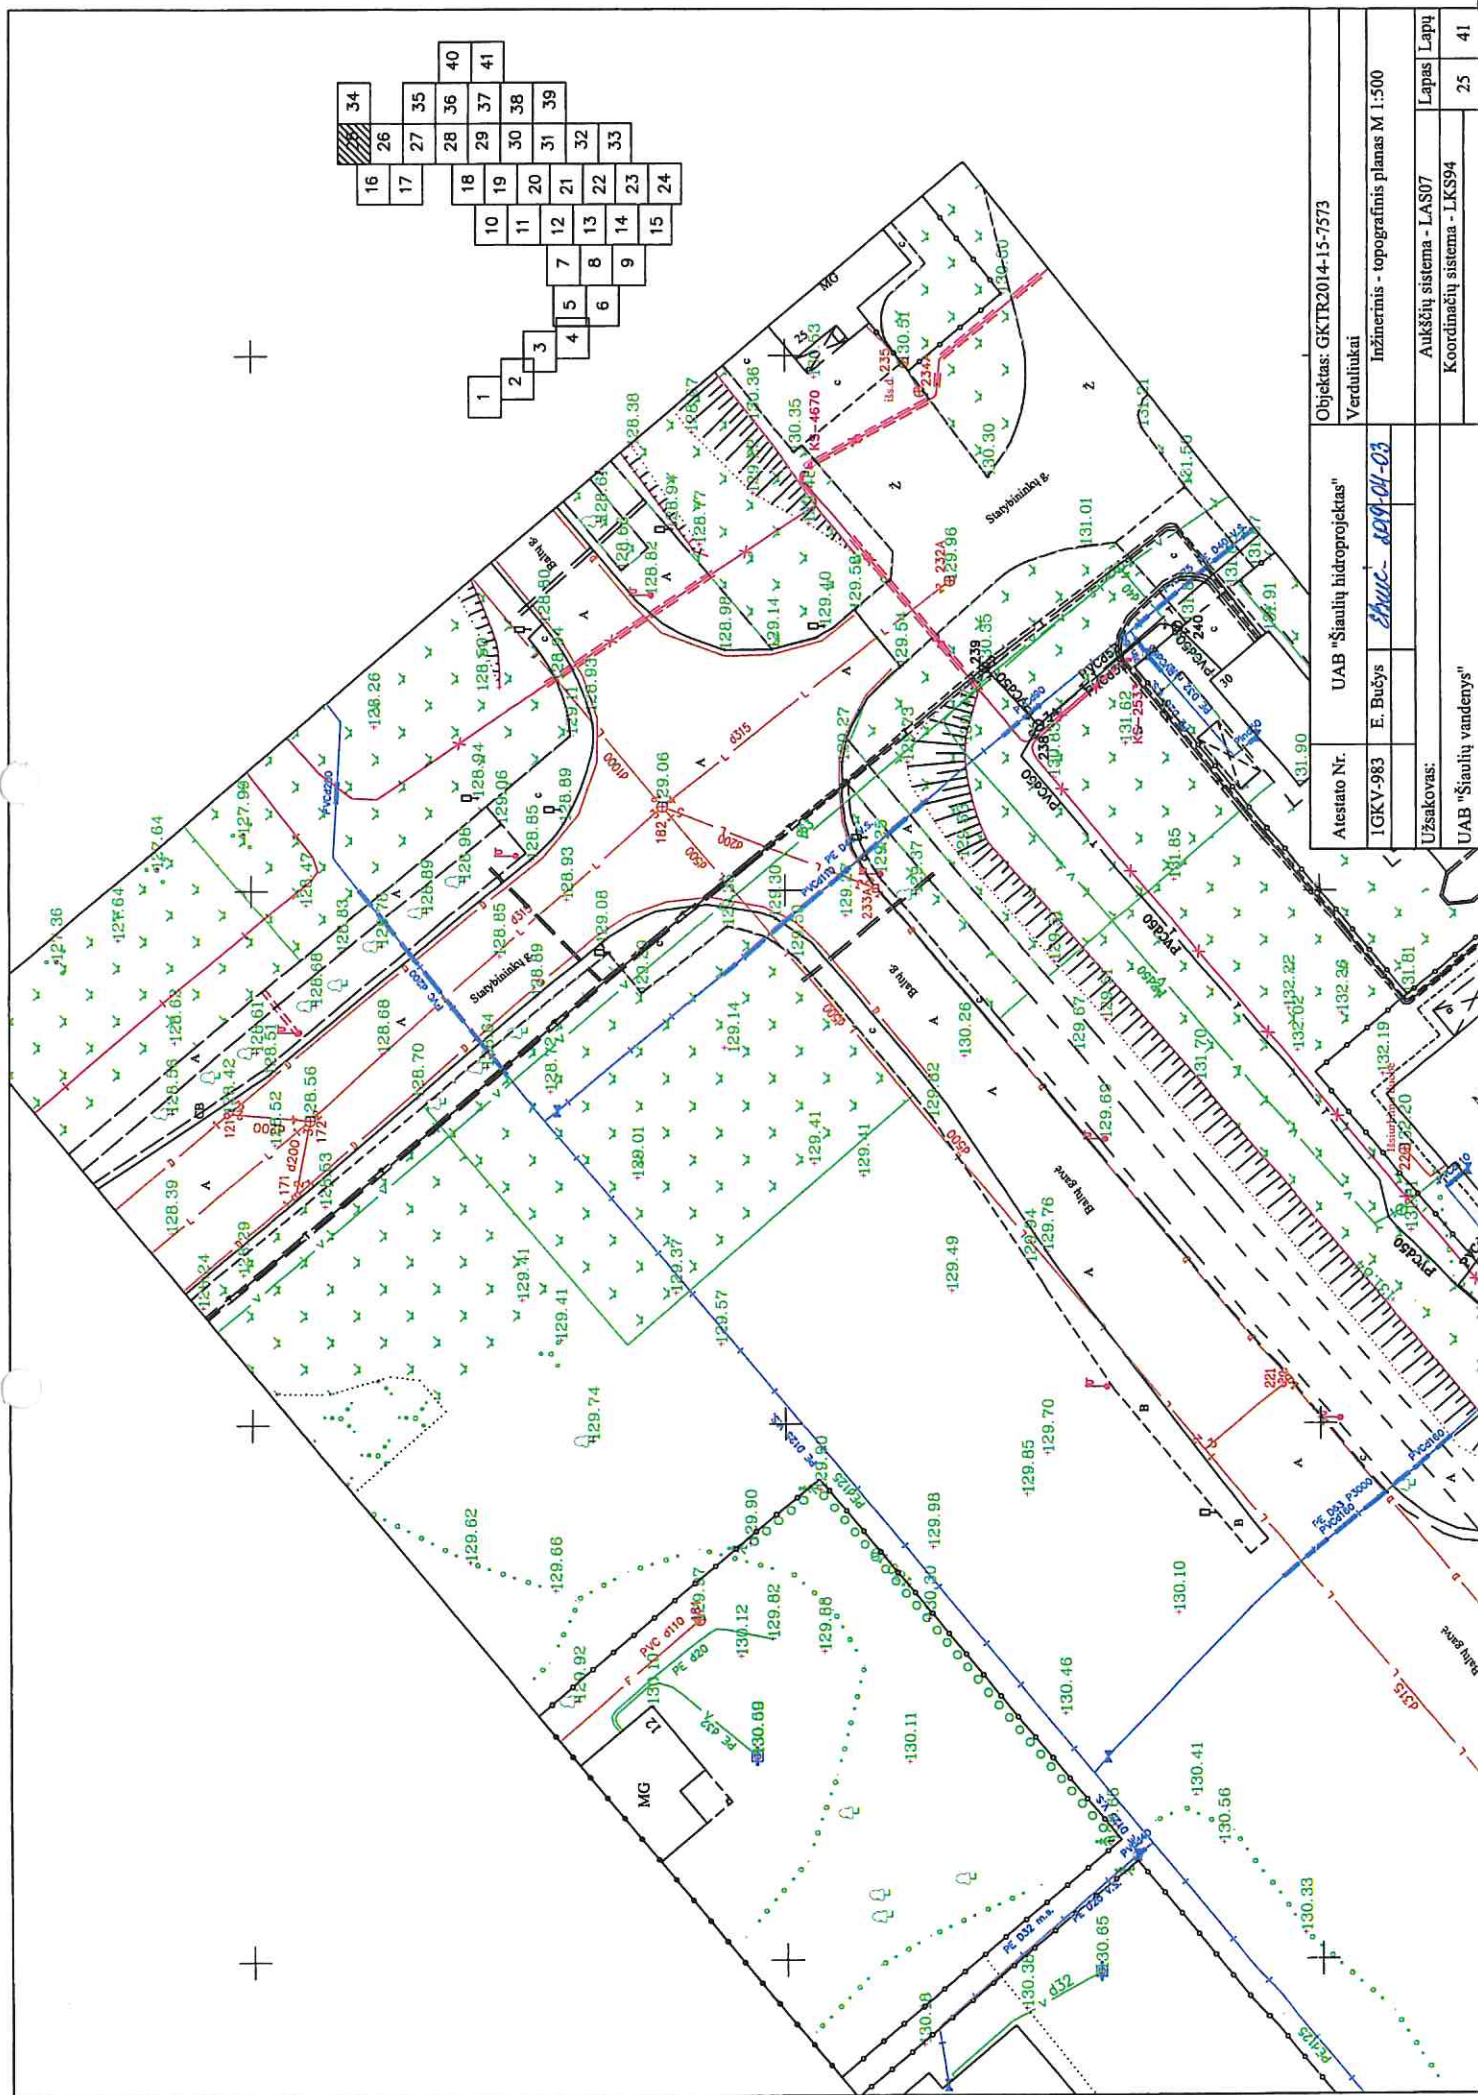

Objektas: GKTR2014-15-7573		UAB "Šiaulių hidroprojekta"	
Verdukiukai		Atestato Nr.	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500		1GKV-983	
Aukštųjų sistema - LAS07		E. Bučys	
Koordinatinių sistema - LKS94		Užsakovas:	
25		UAB "Šiaulių vandenys"	
41		Lapas	

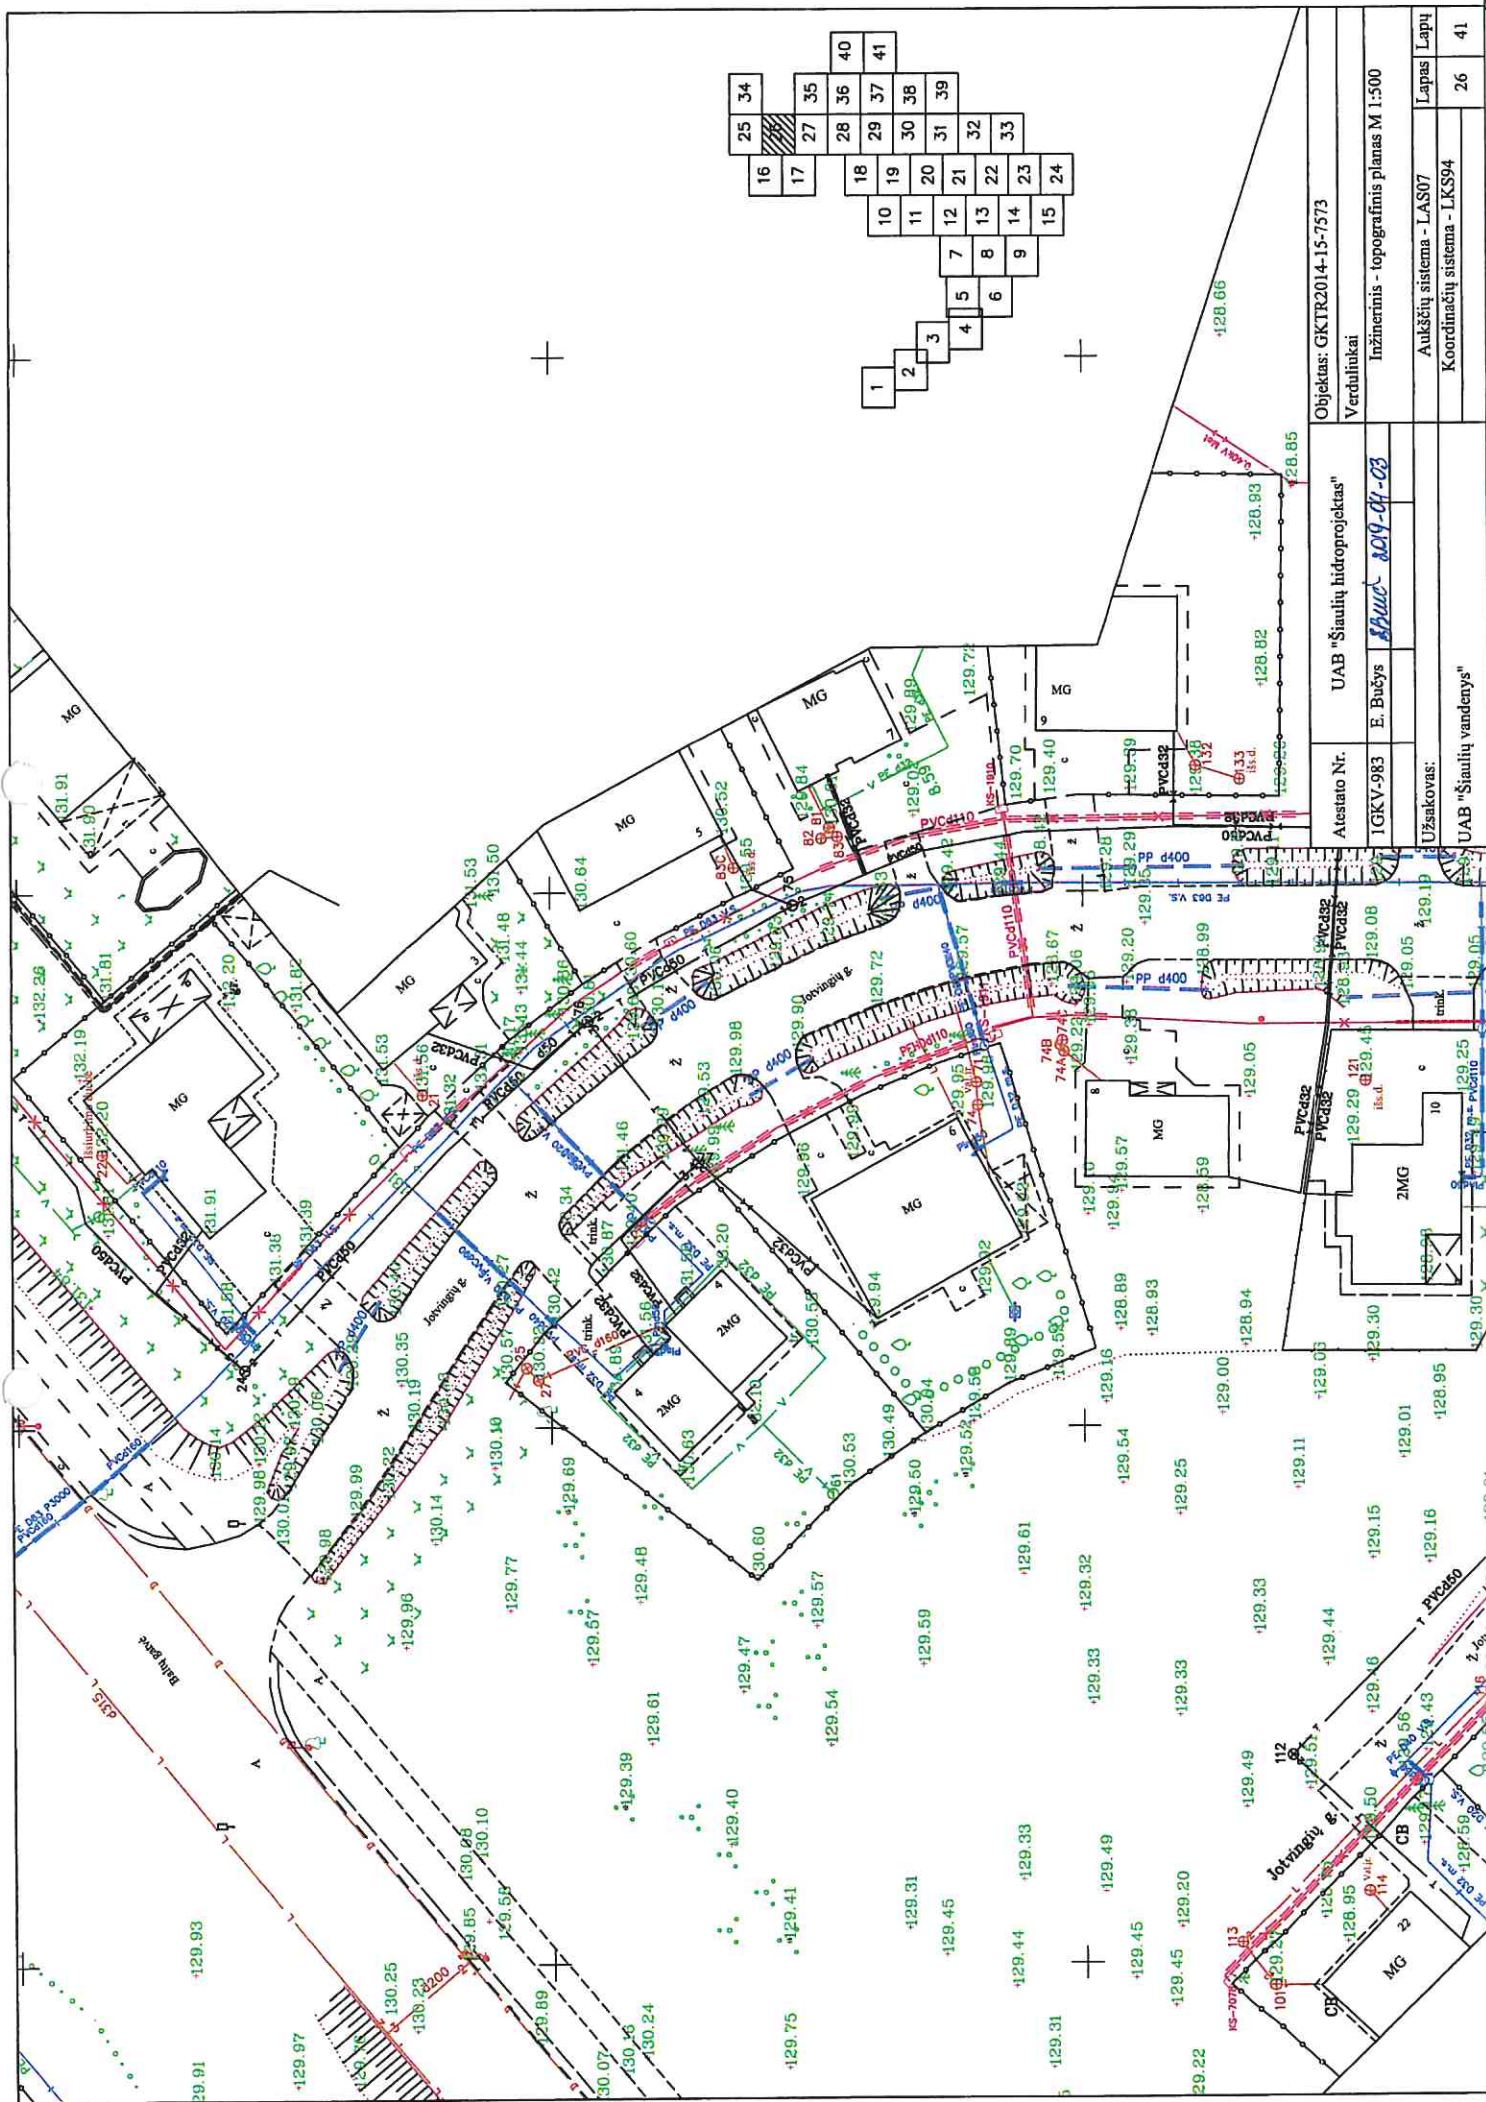

Objektas: GKTR2014-15-7573

Verduiukai

Atestato Nr. UAB "Šiaulių hidroprojekta"

1 GKV-983 E. Bučys *spaud 2019-04-03*

Užsakovas: Inžinerinis - topografinis planas M 1:500


UAB "Šiaulių vandenys"

Aukštųjų sistema - LAS07


Koordinacinių sistema - LKS94


Lapas 26

Lapų 41

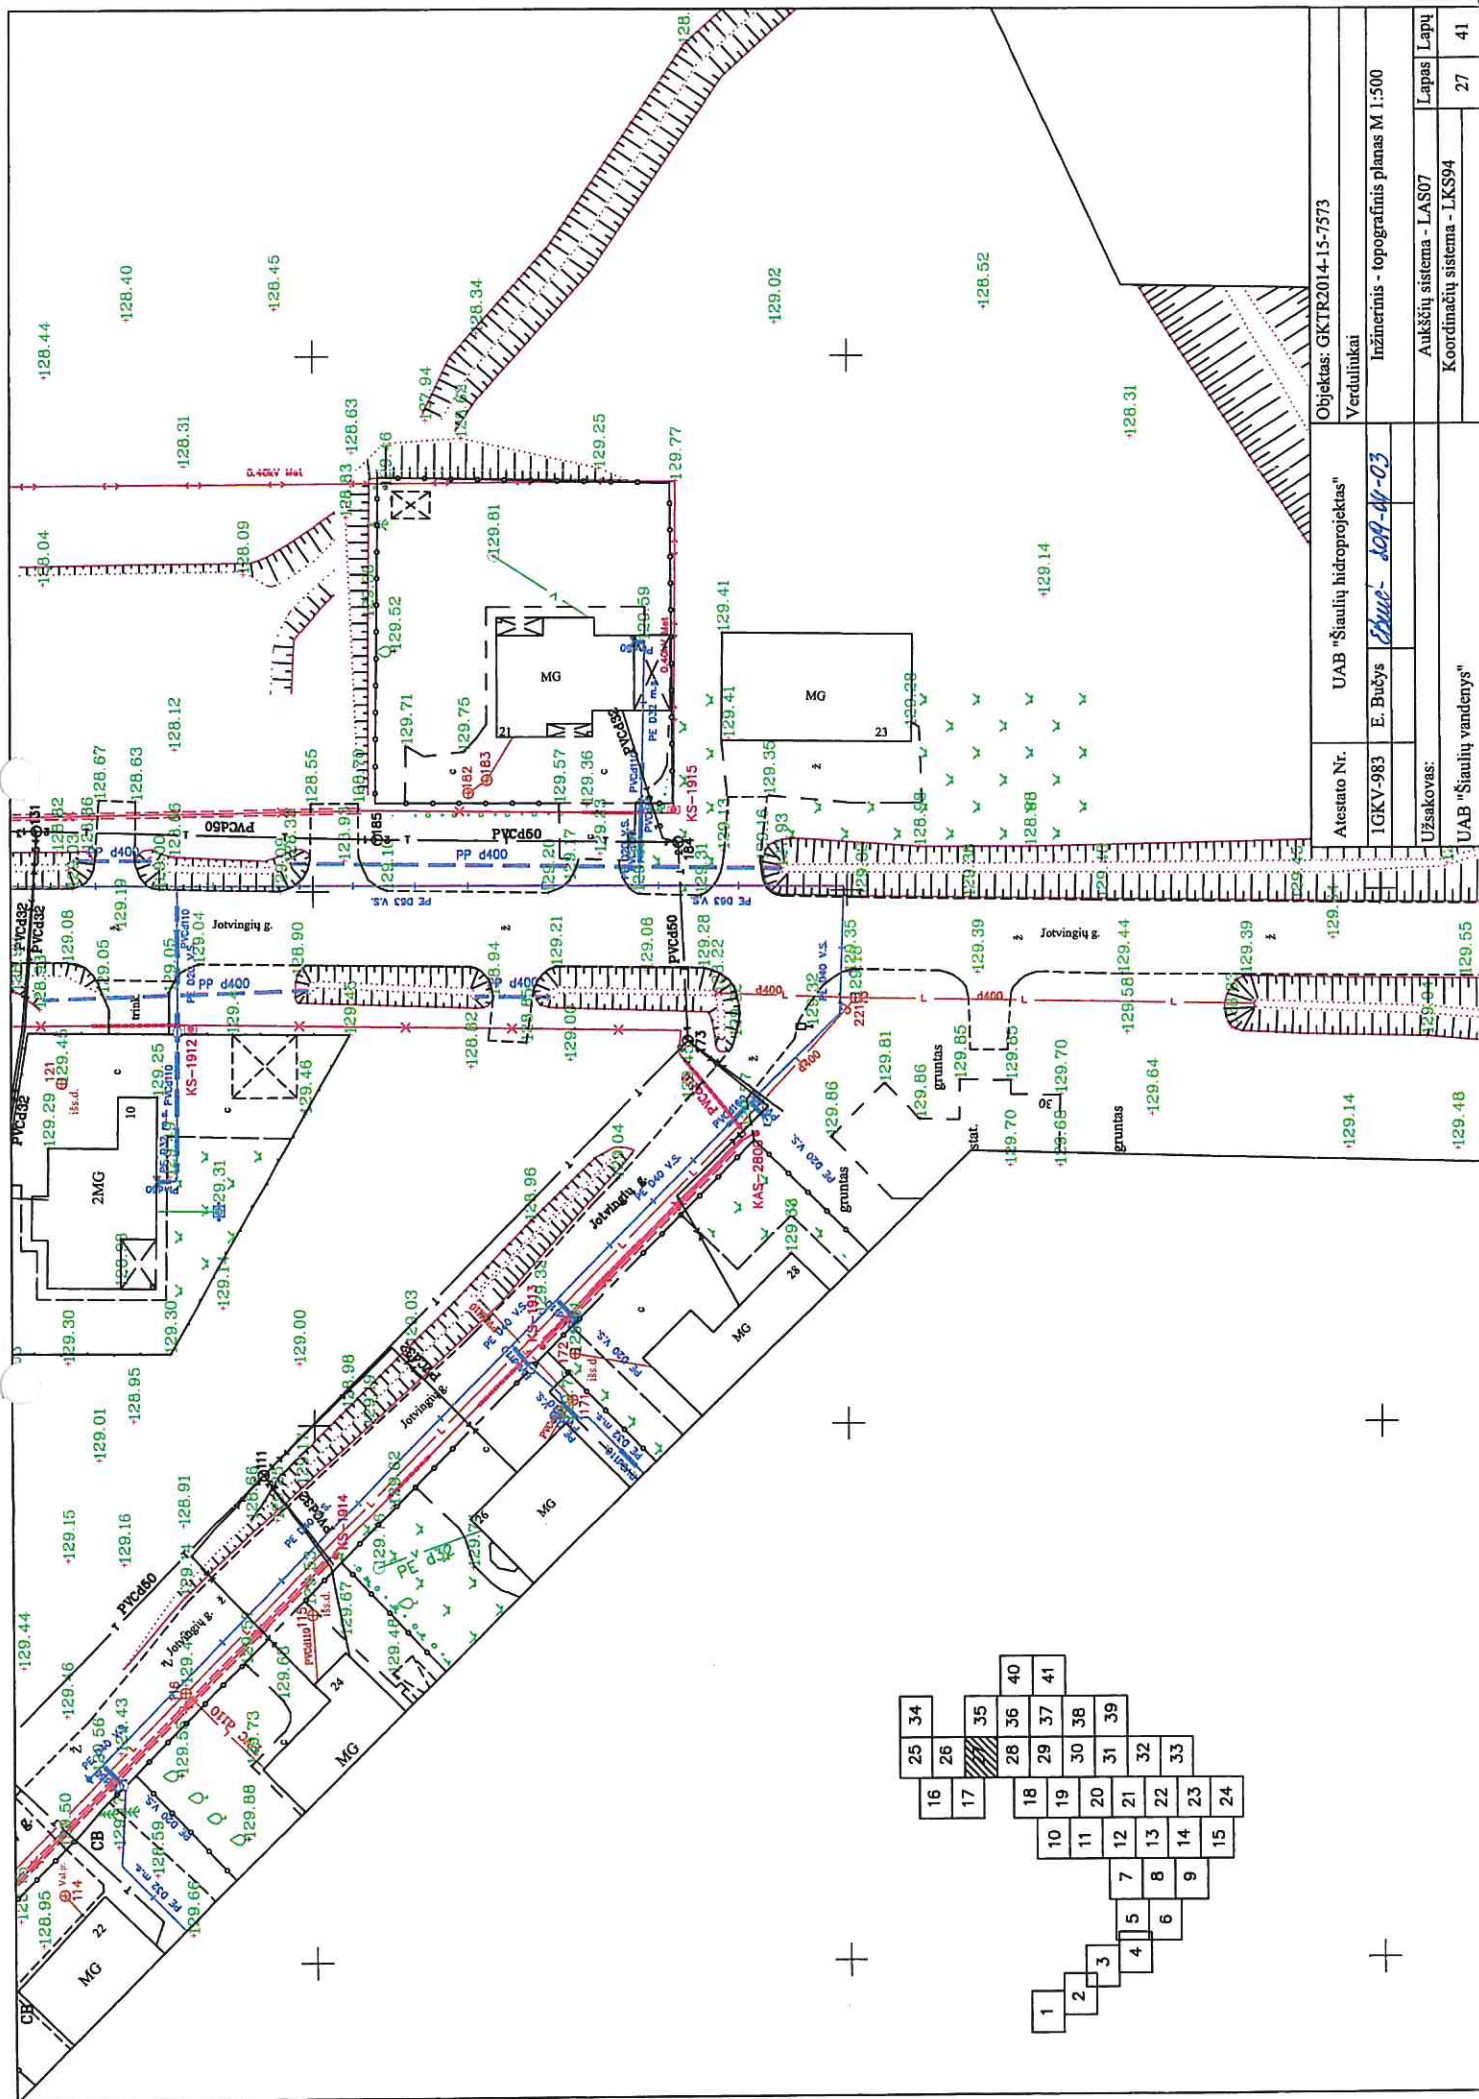


Objektas: GKTR2014-15-7573	UAB "Šiaulių hidroprojekta"	Atestato Nr.	UAB "Šiaulių vandenys"
Verdukliai	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	IGKV-983	E. Butys
		Užsakovas:	
		Aukščių sistema - LAS07	Lapas
		Koordinatų sistema - LKS94	27
			41

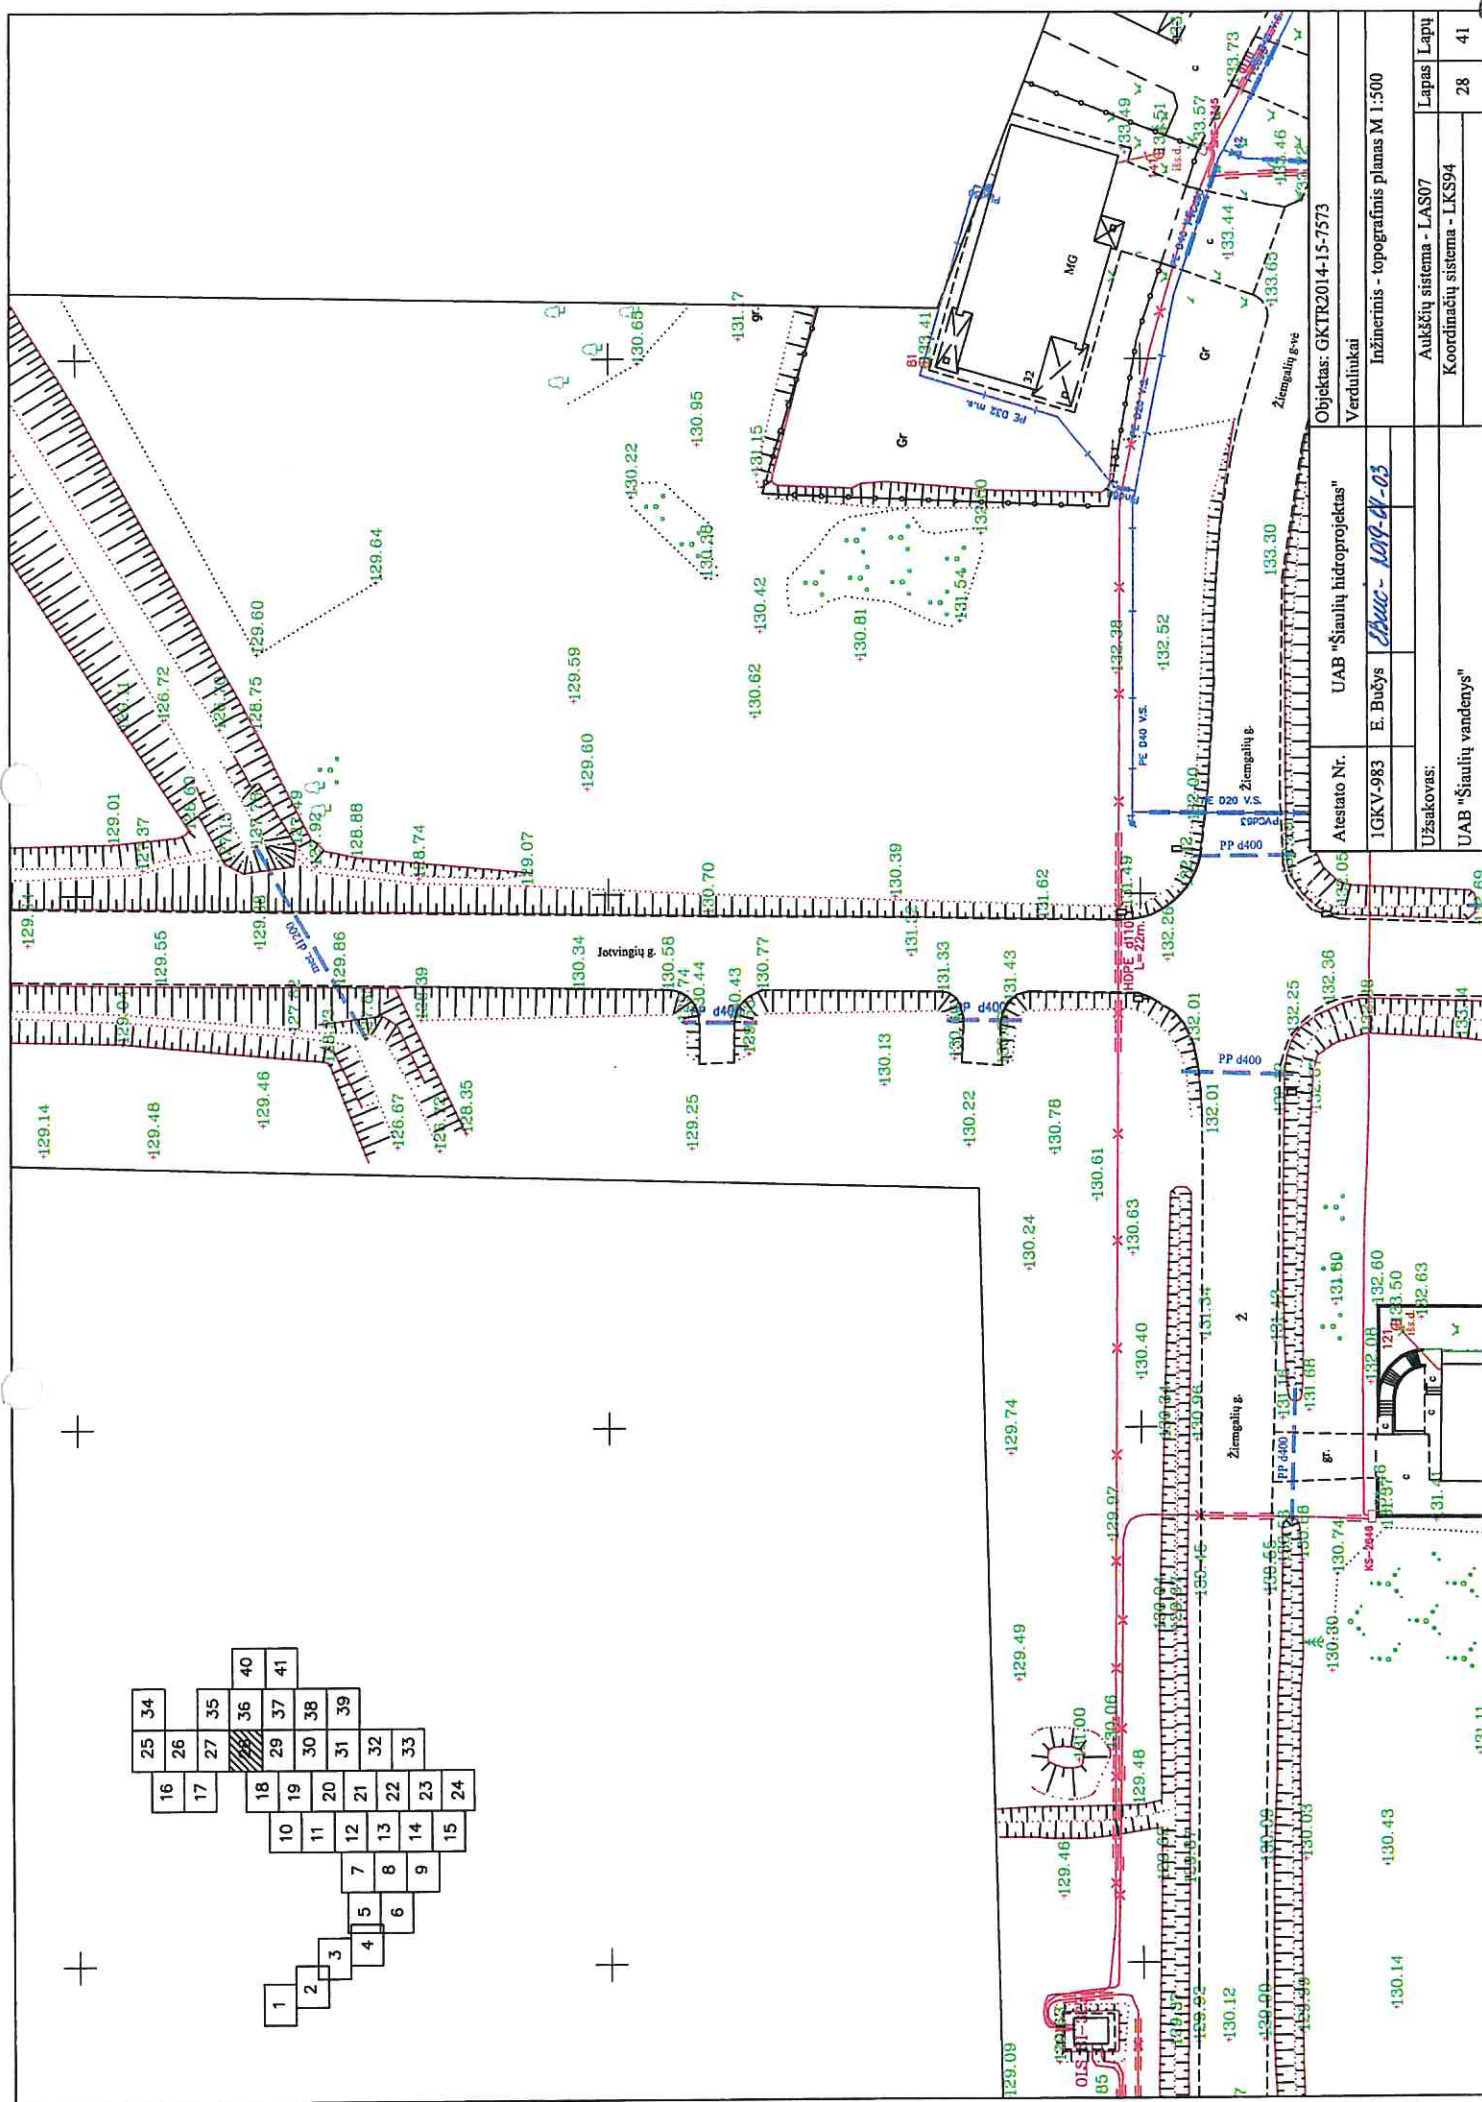



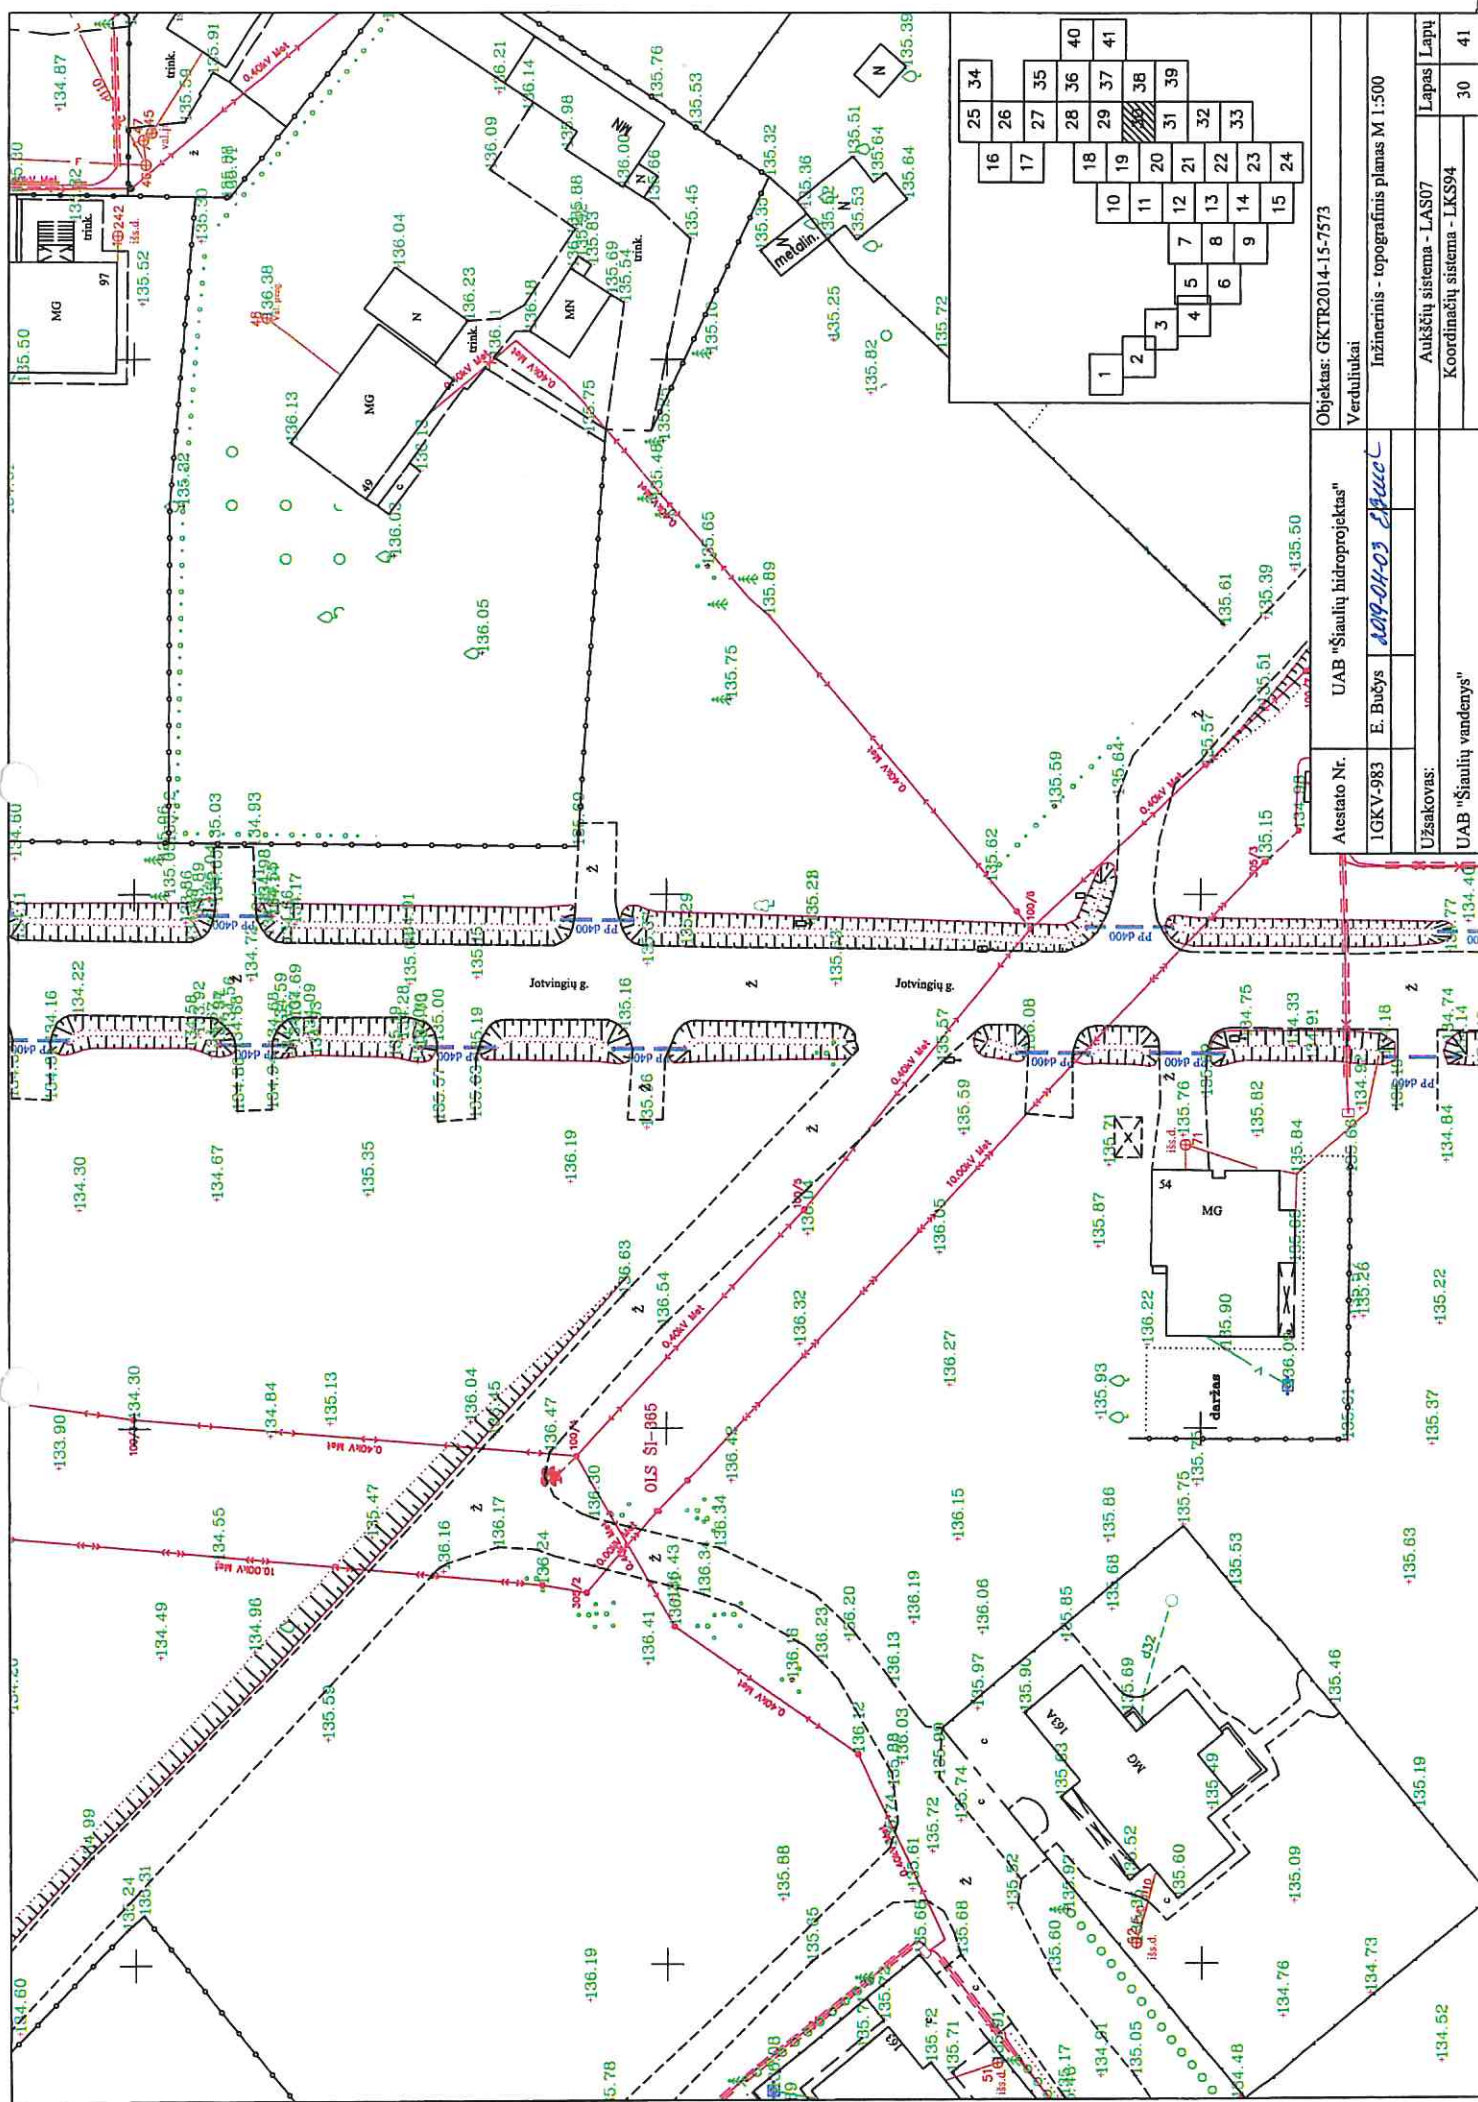


Objektas: GKTR2014-15-7573	
Verduliukai	
Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojekta"
1 GK V-983	E. Bučys
Užsakovai:	
UAB "Šiaulių vandenys"	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07	
Koordinatų sistema - LKS94	
Lapas	30
Lapy	41

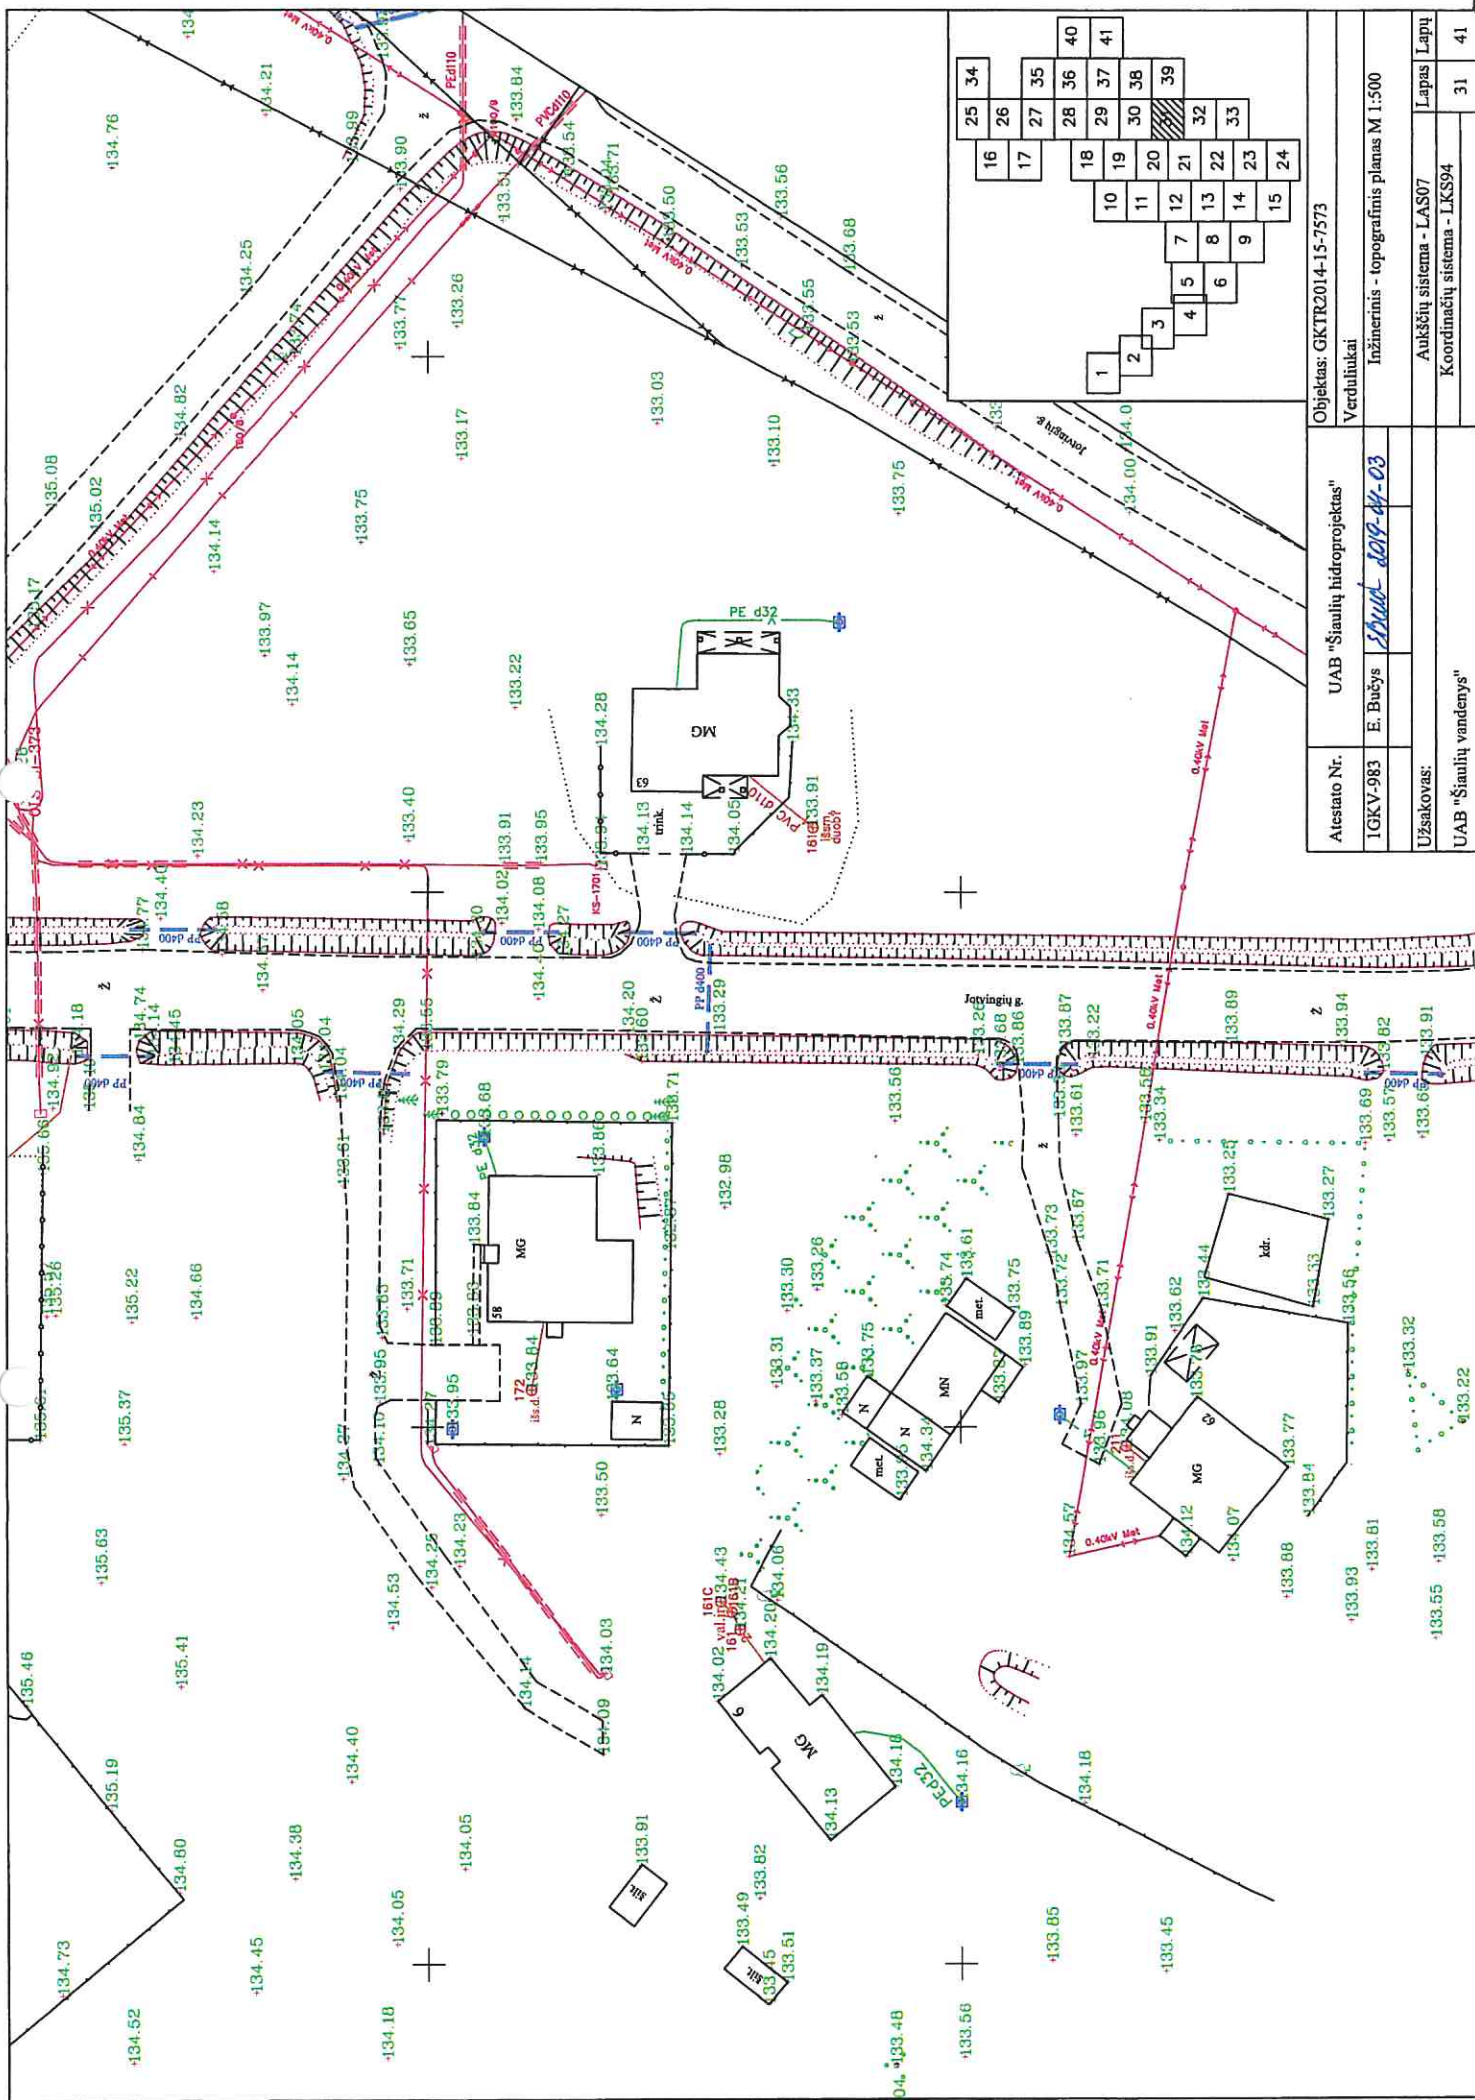


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojekta"	Objektas: GKTR2014-15-7573
IGKV-983	E. Bučys	Verdukliai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenis"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukštųjų sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		31
		41

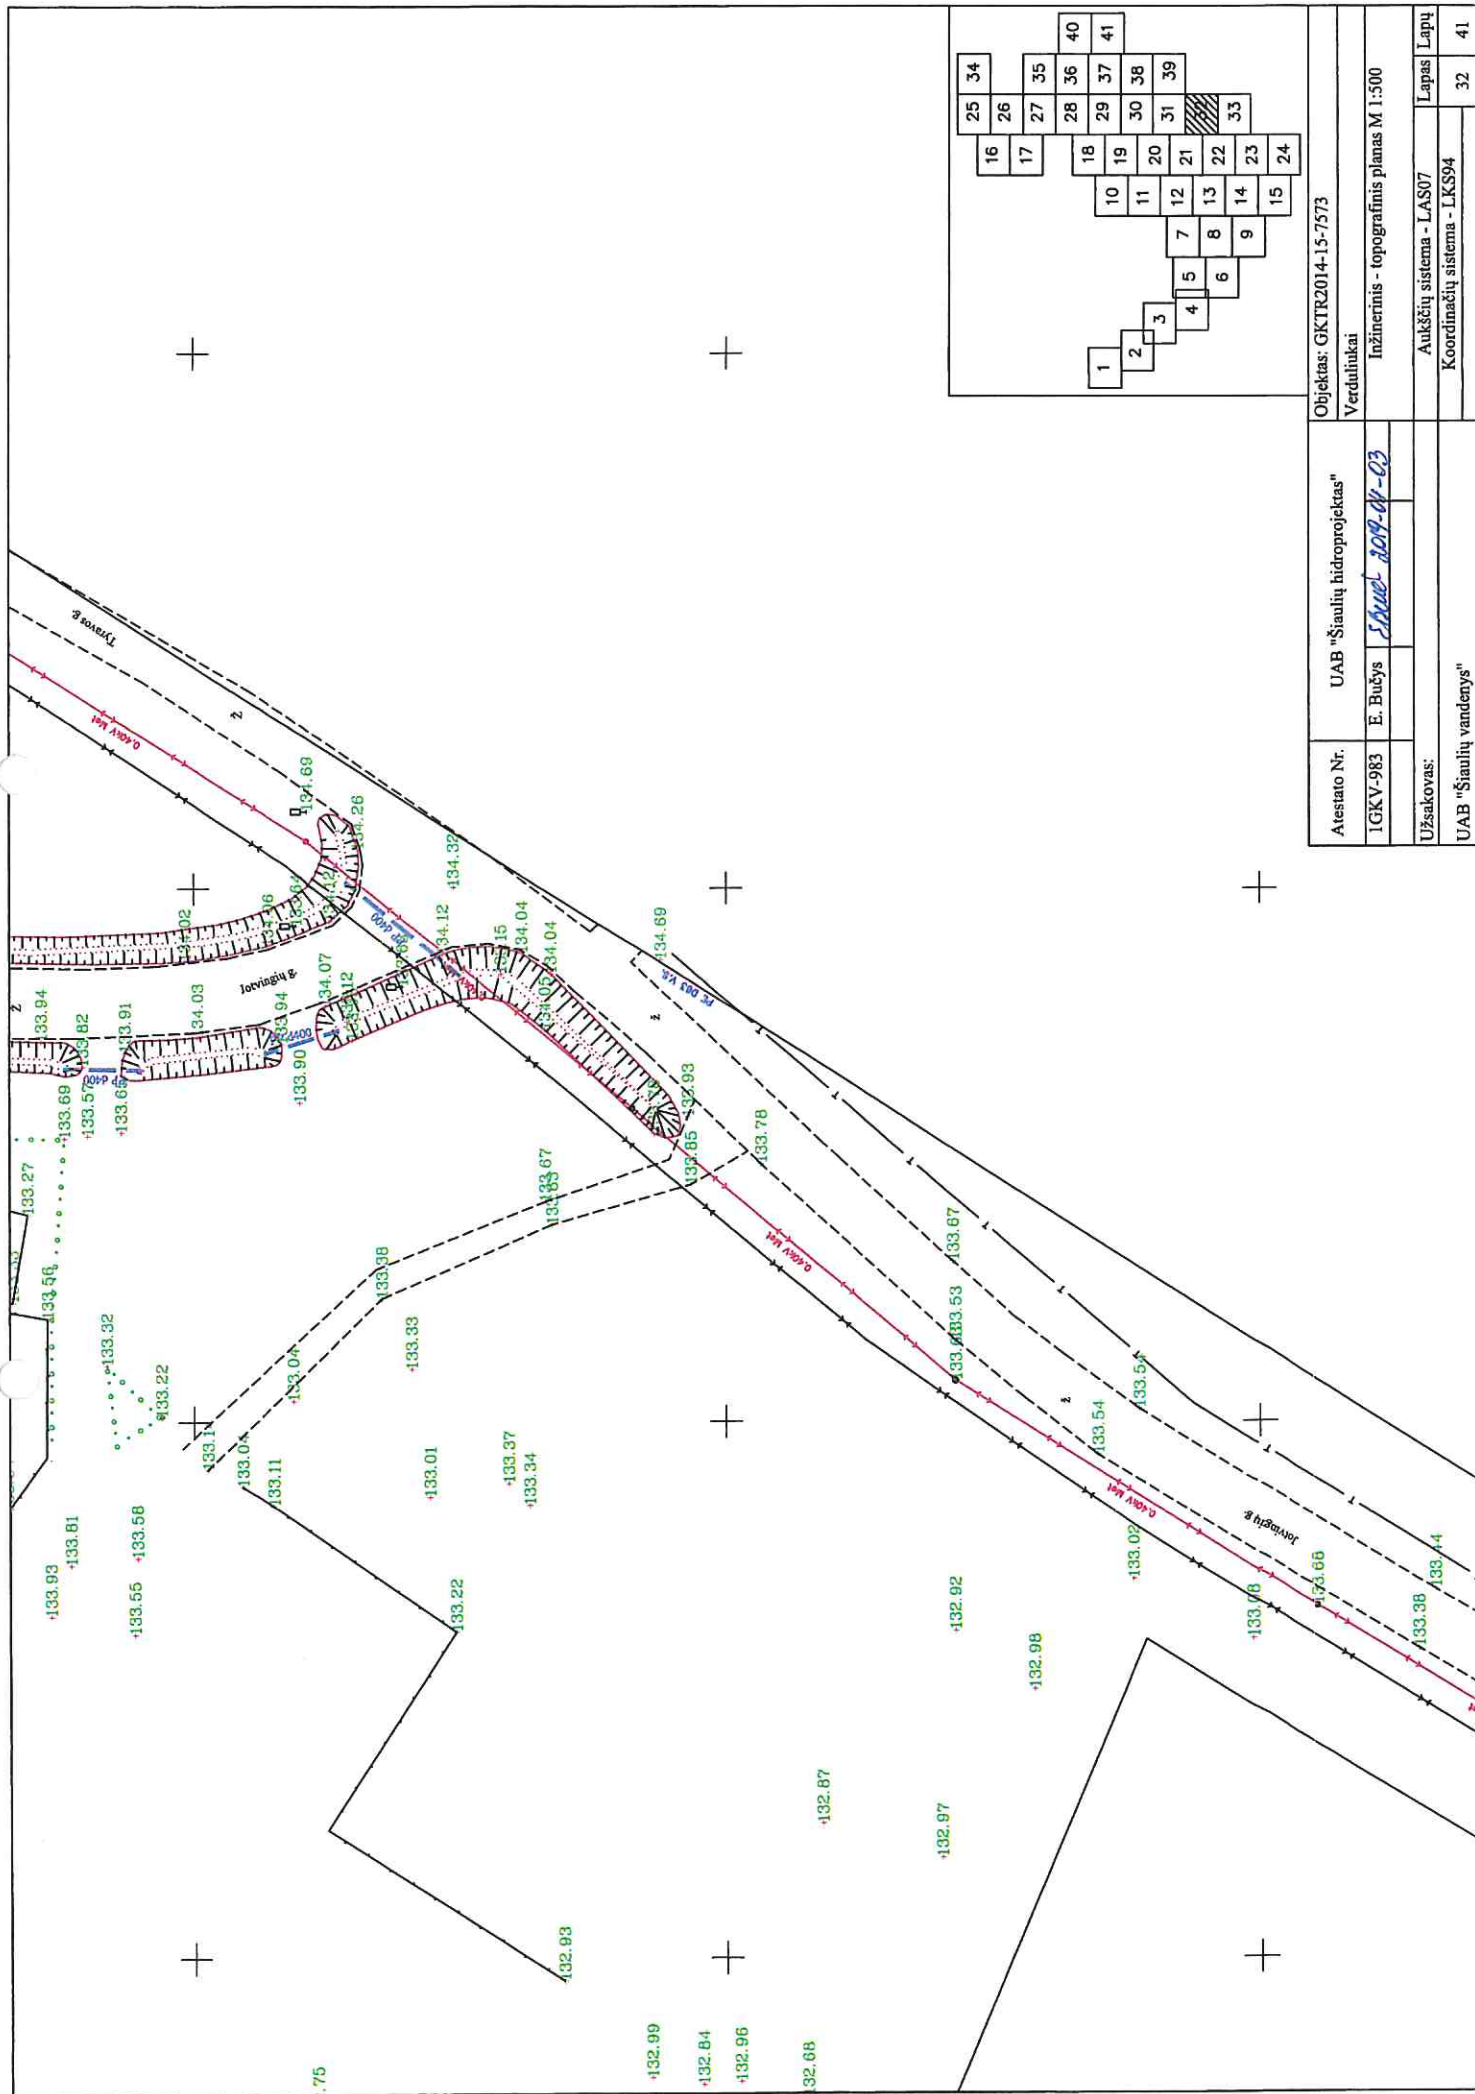


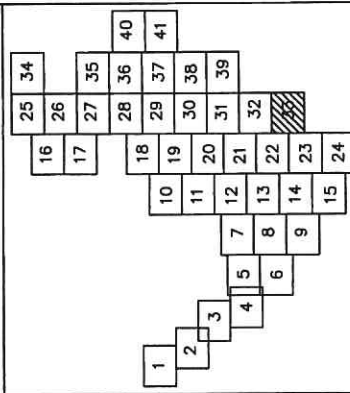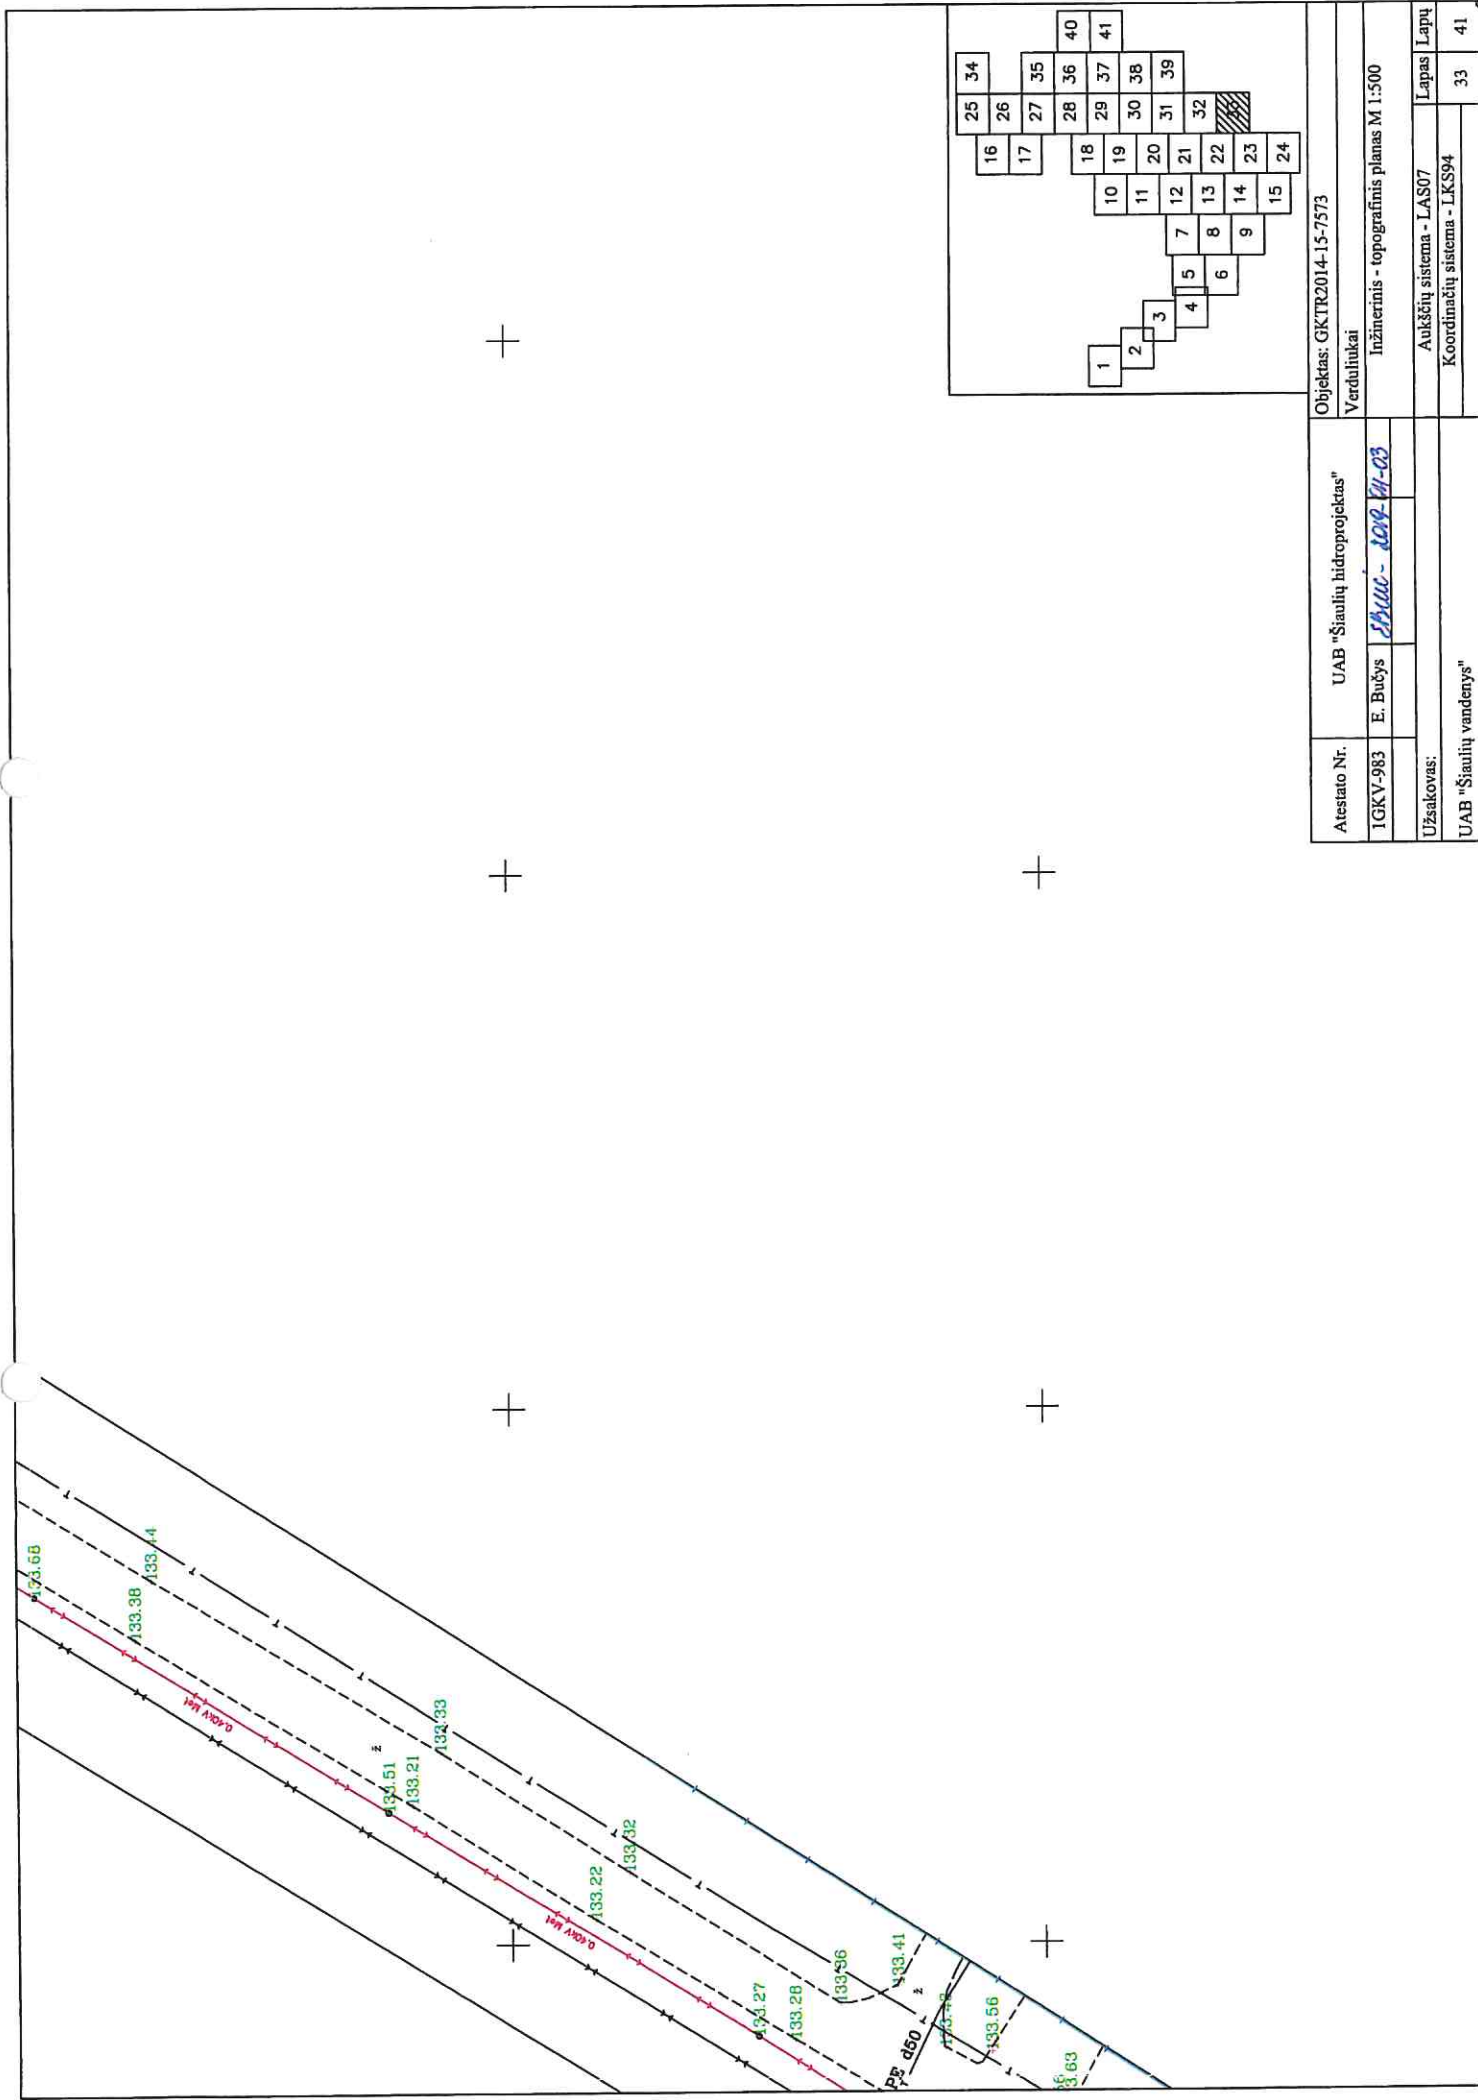


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
IGKV-983	E. Bučys	Verduliukai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		33
		Lapų
		41

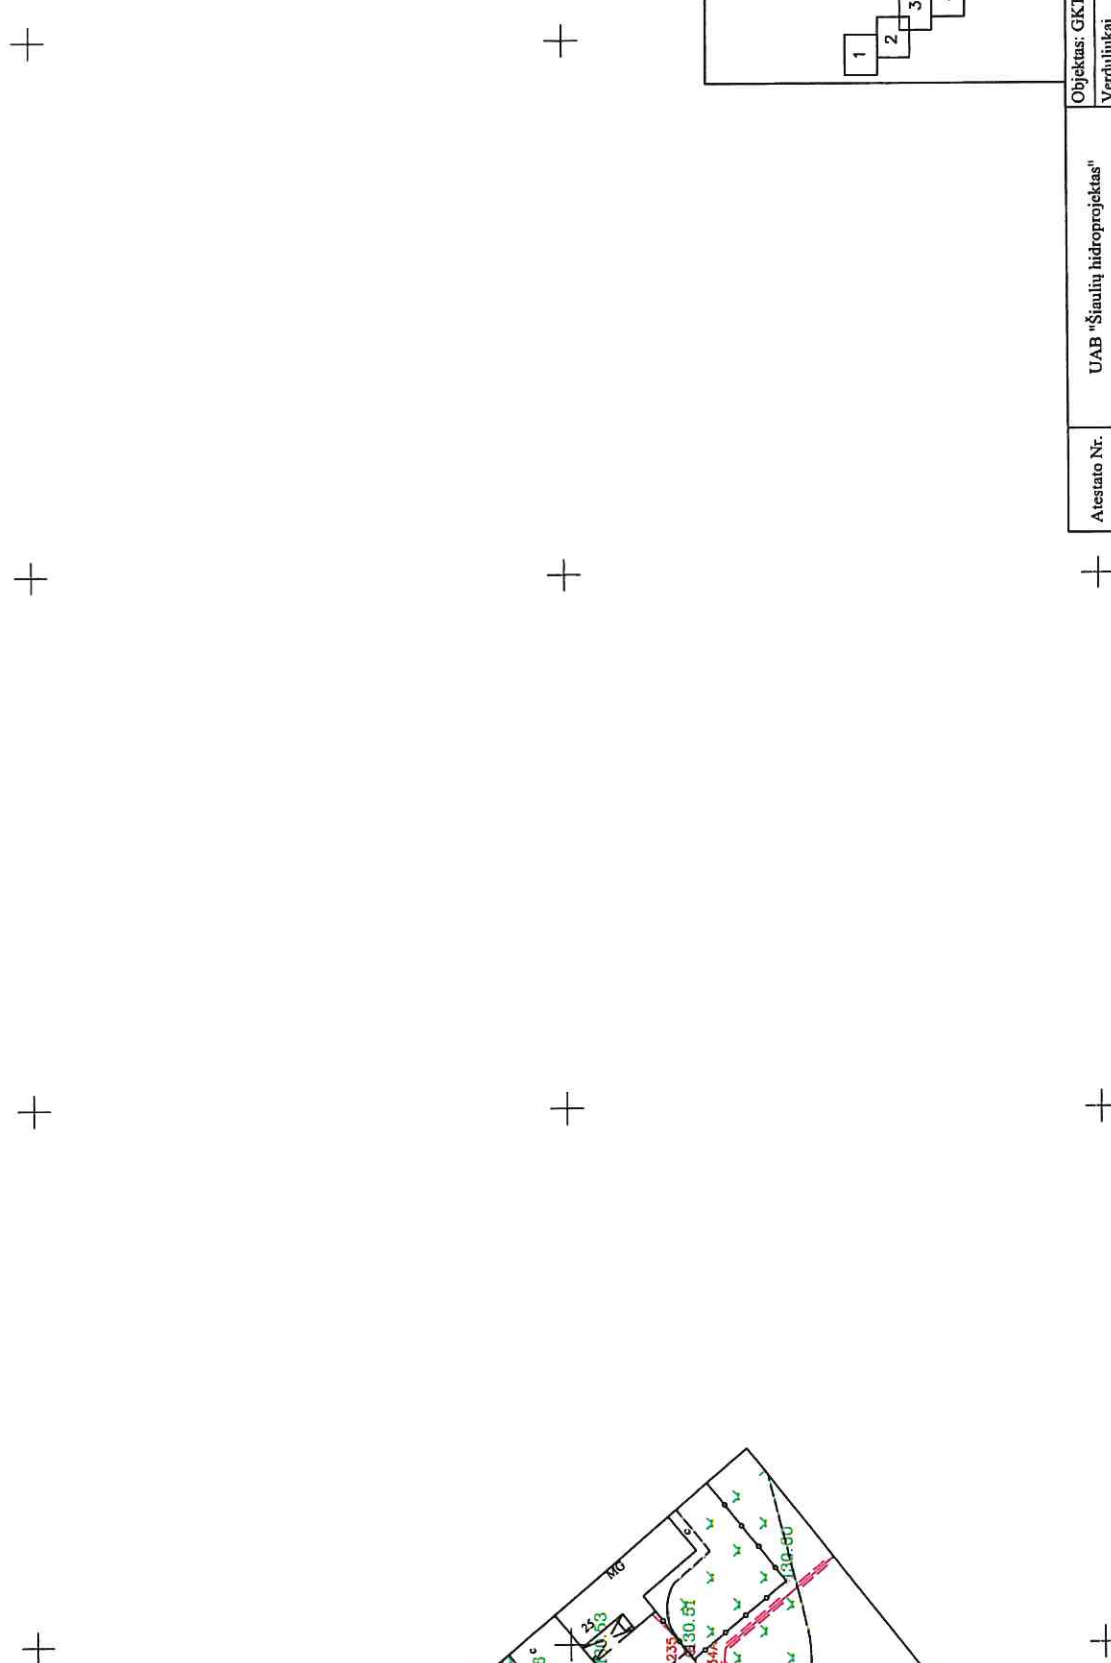

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
IGKV-983	E. Bučys	Verdujukai
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
UAB "Šiaulių vandenys"		
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		Lapų
		34
		41

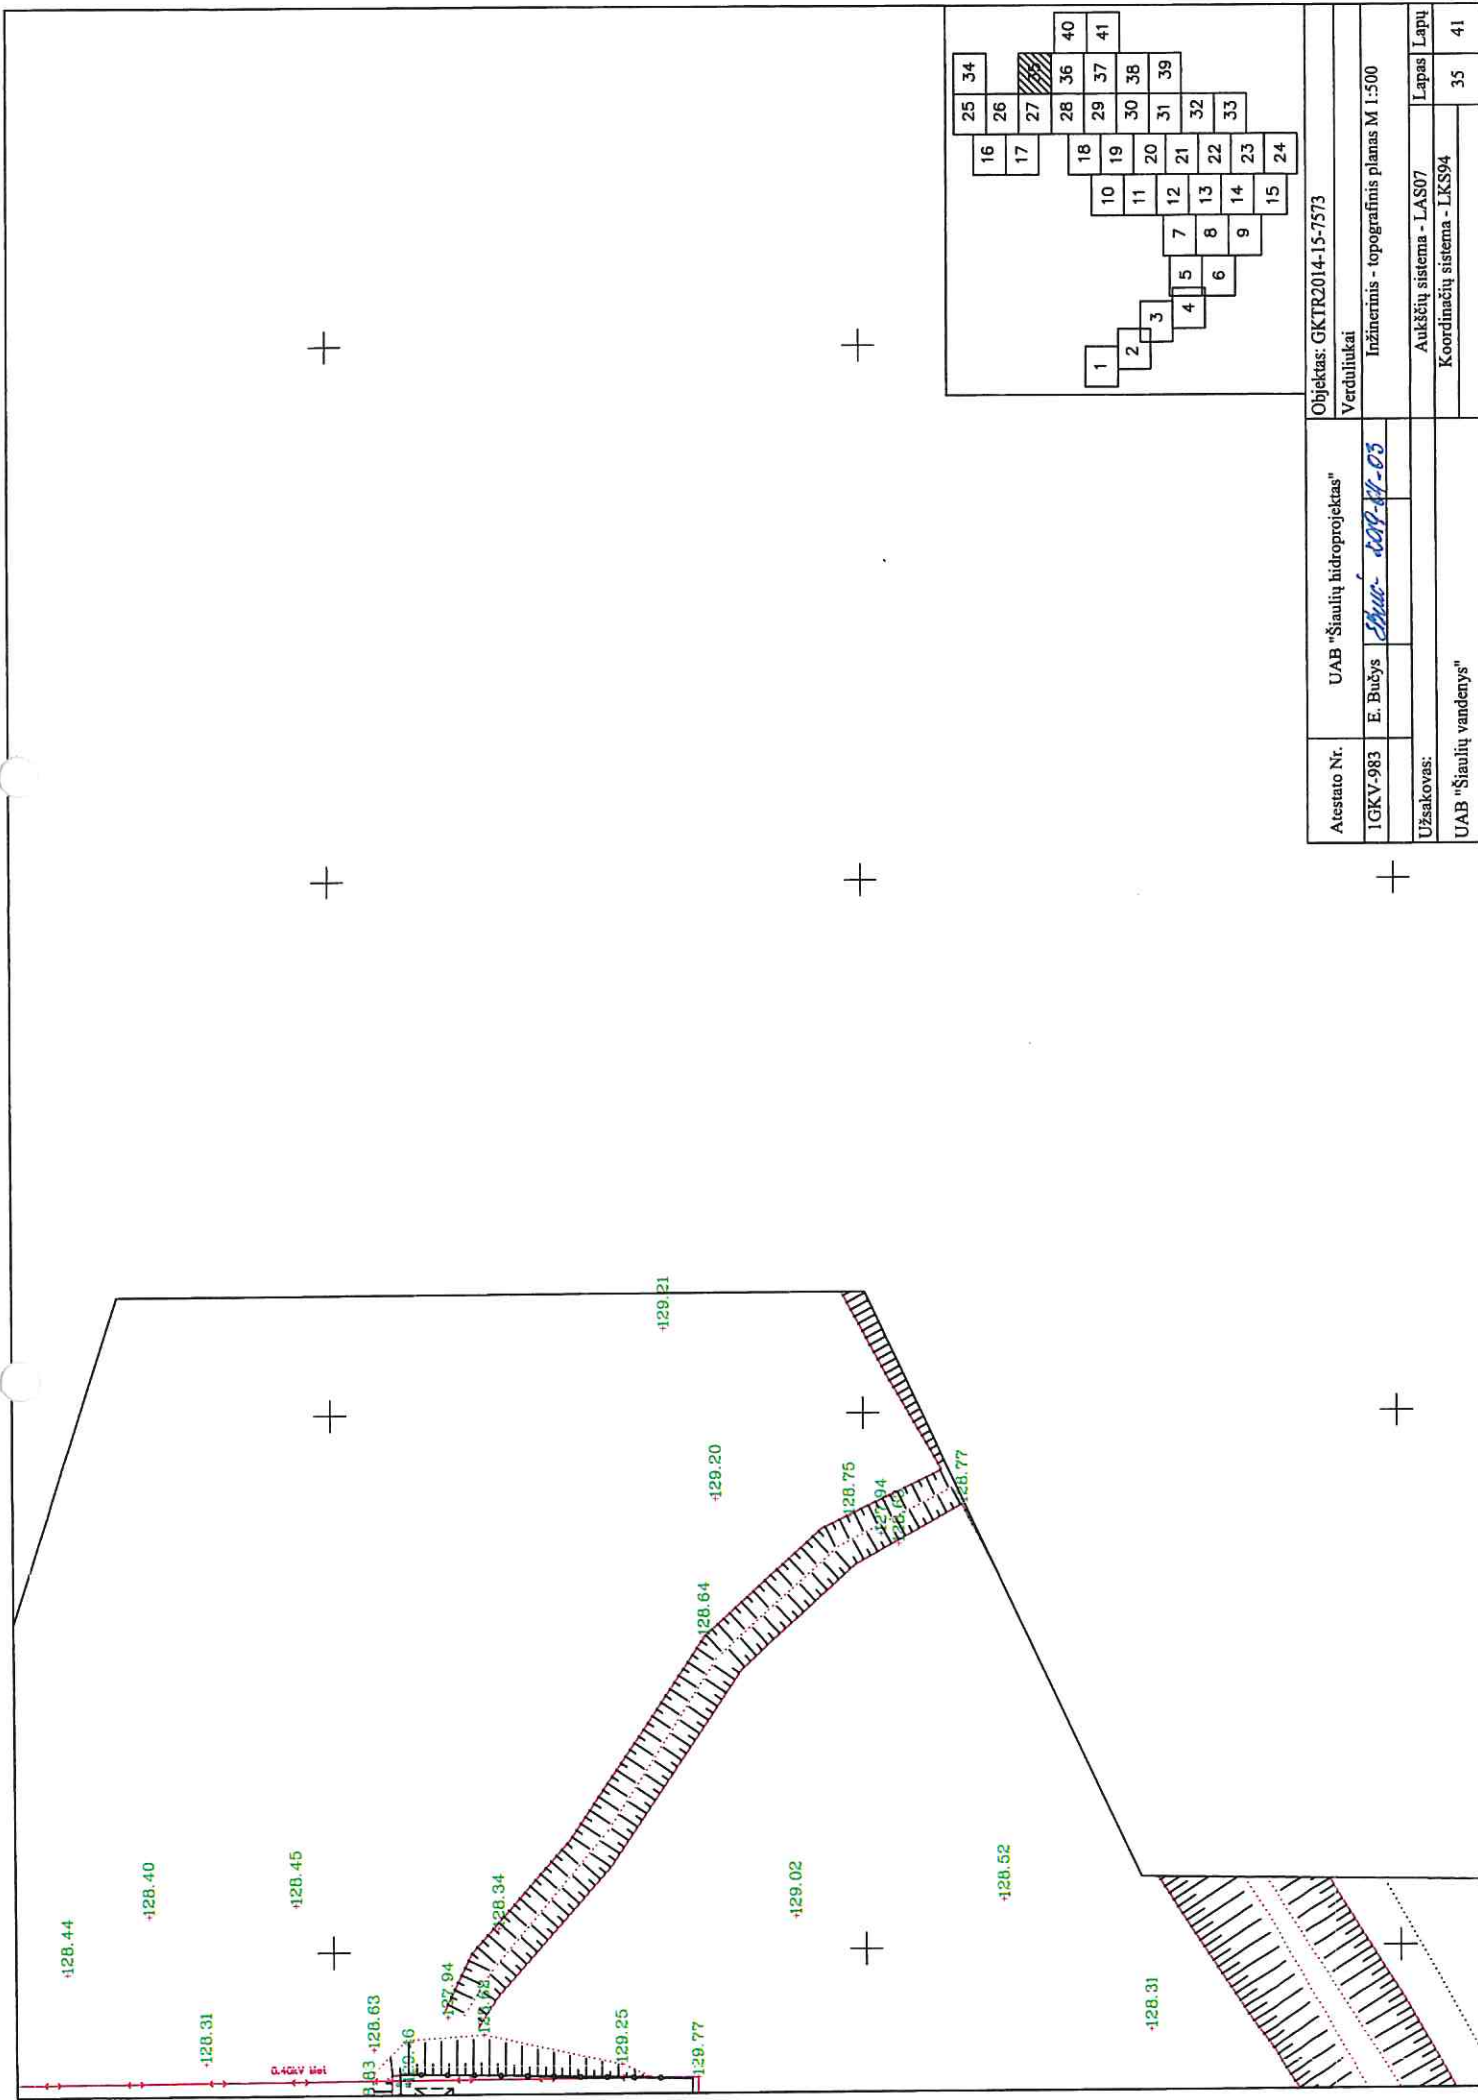


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdučiai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		35
		Lapų
		41

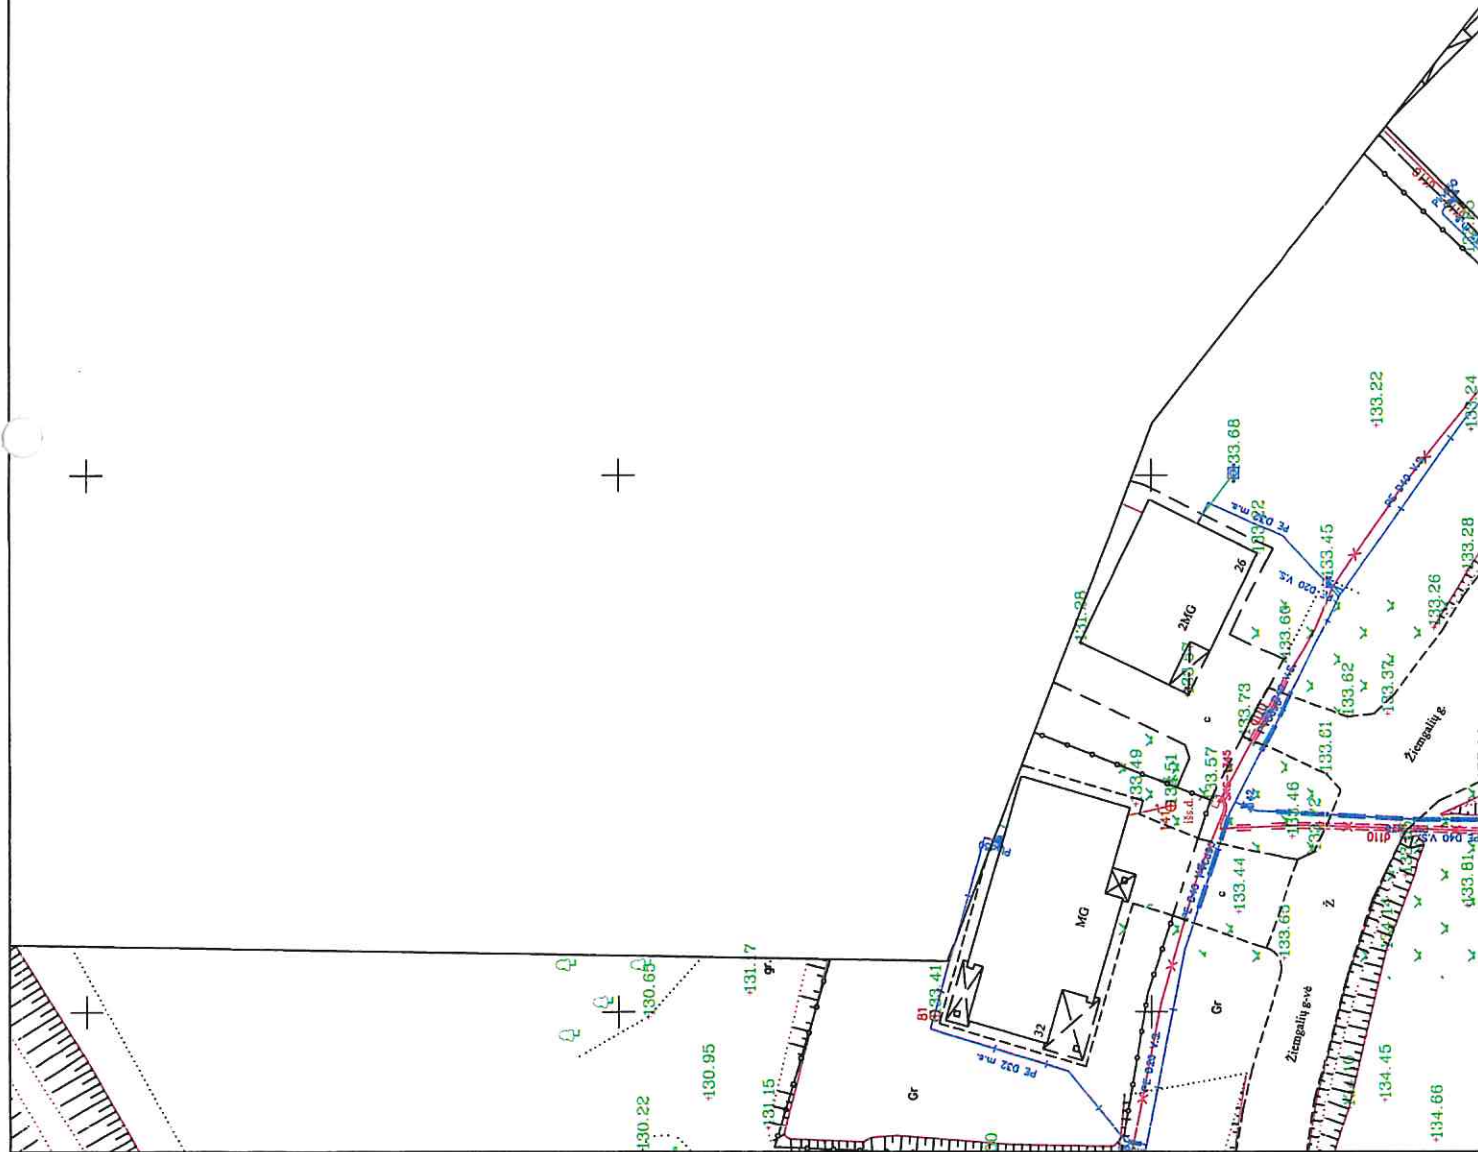


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdučiai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas
		Lapų
		36
		41

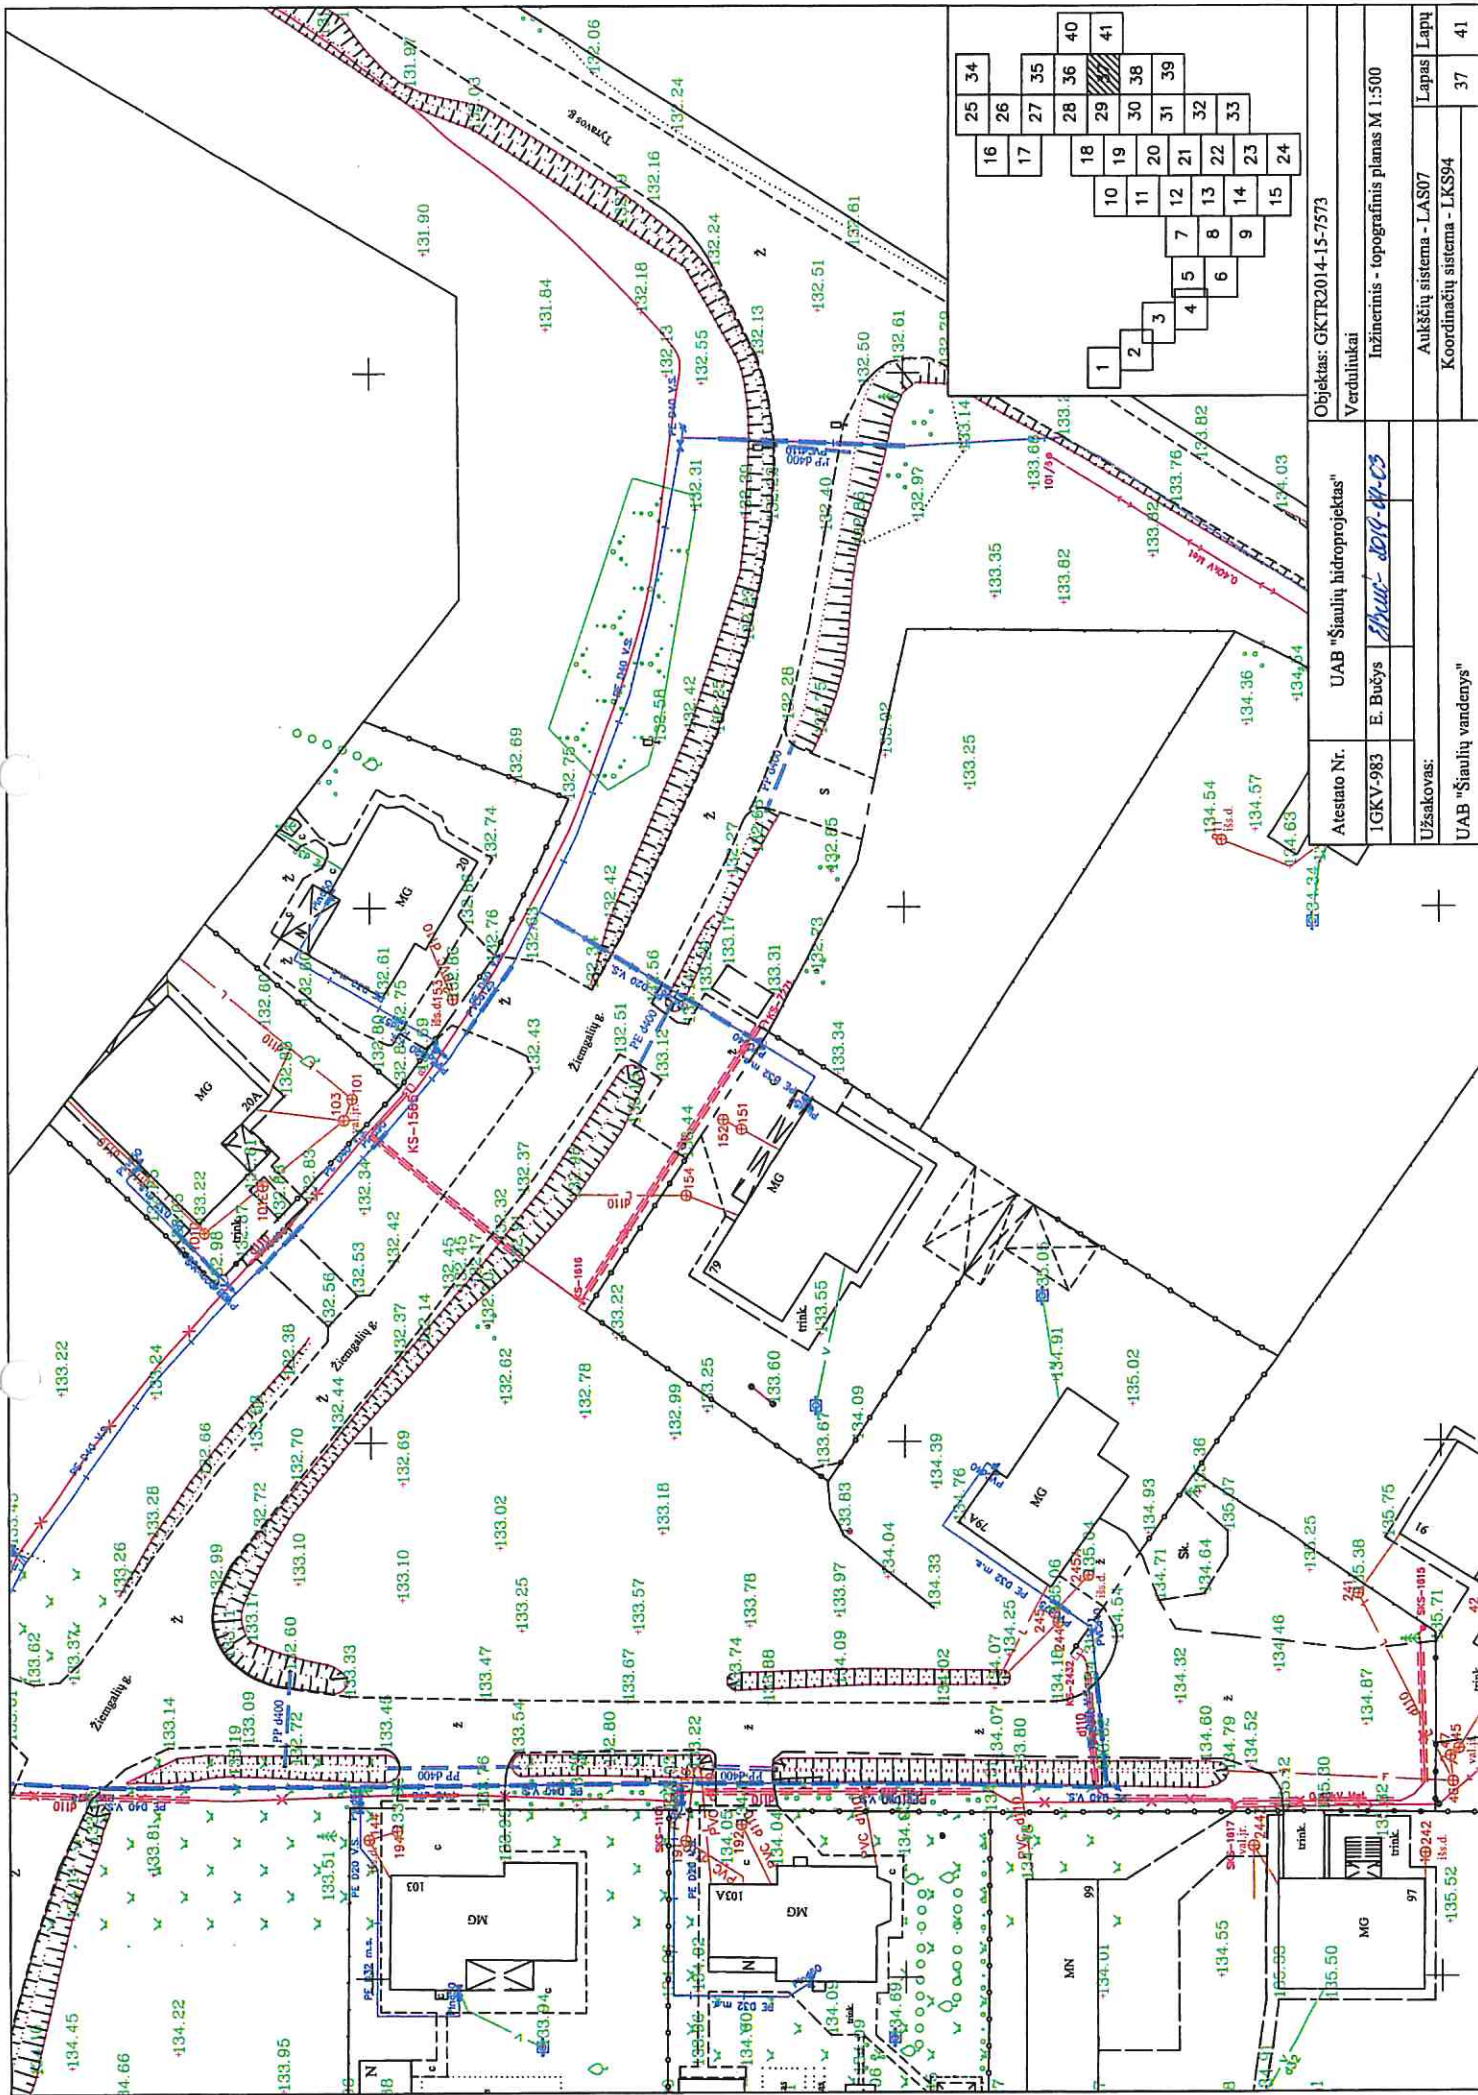


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Objektas: GKTR2014-15-7573	Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"
Verdukliai	IGKY-983	E. Butys
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	
Inžinerinis - topografinis planas M 1:500		
Aukštųjų sistema - LAS07		
Koordinatų sistema - LKS94		
Lapas	37	41

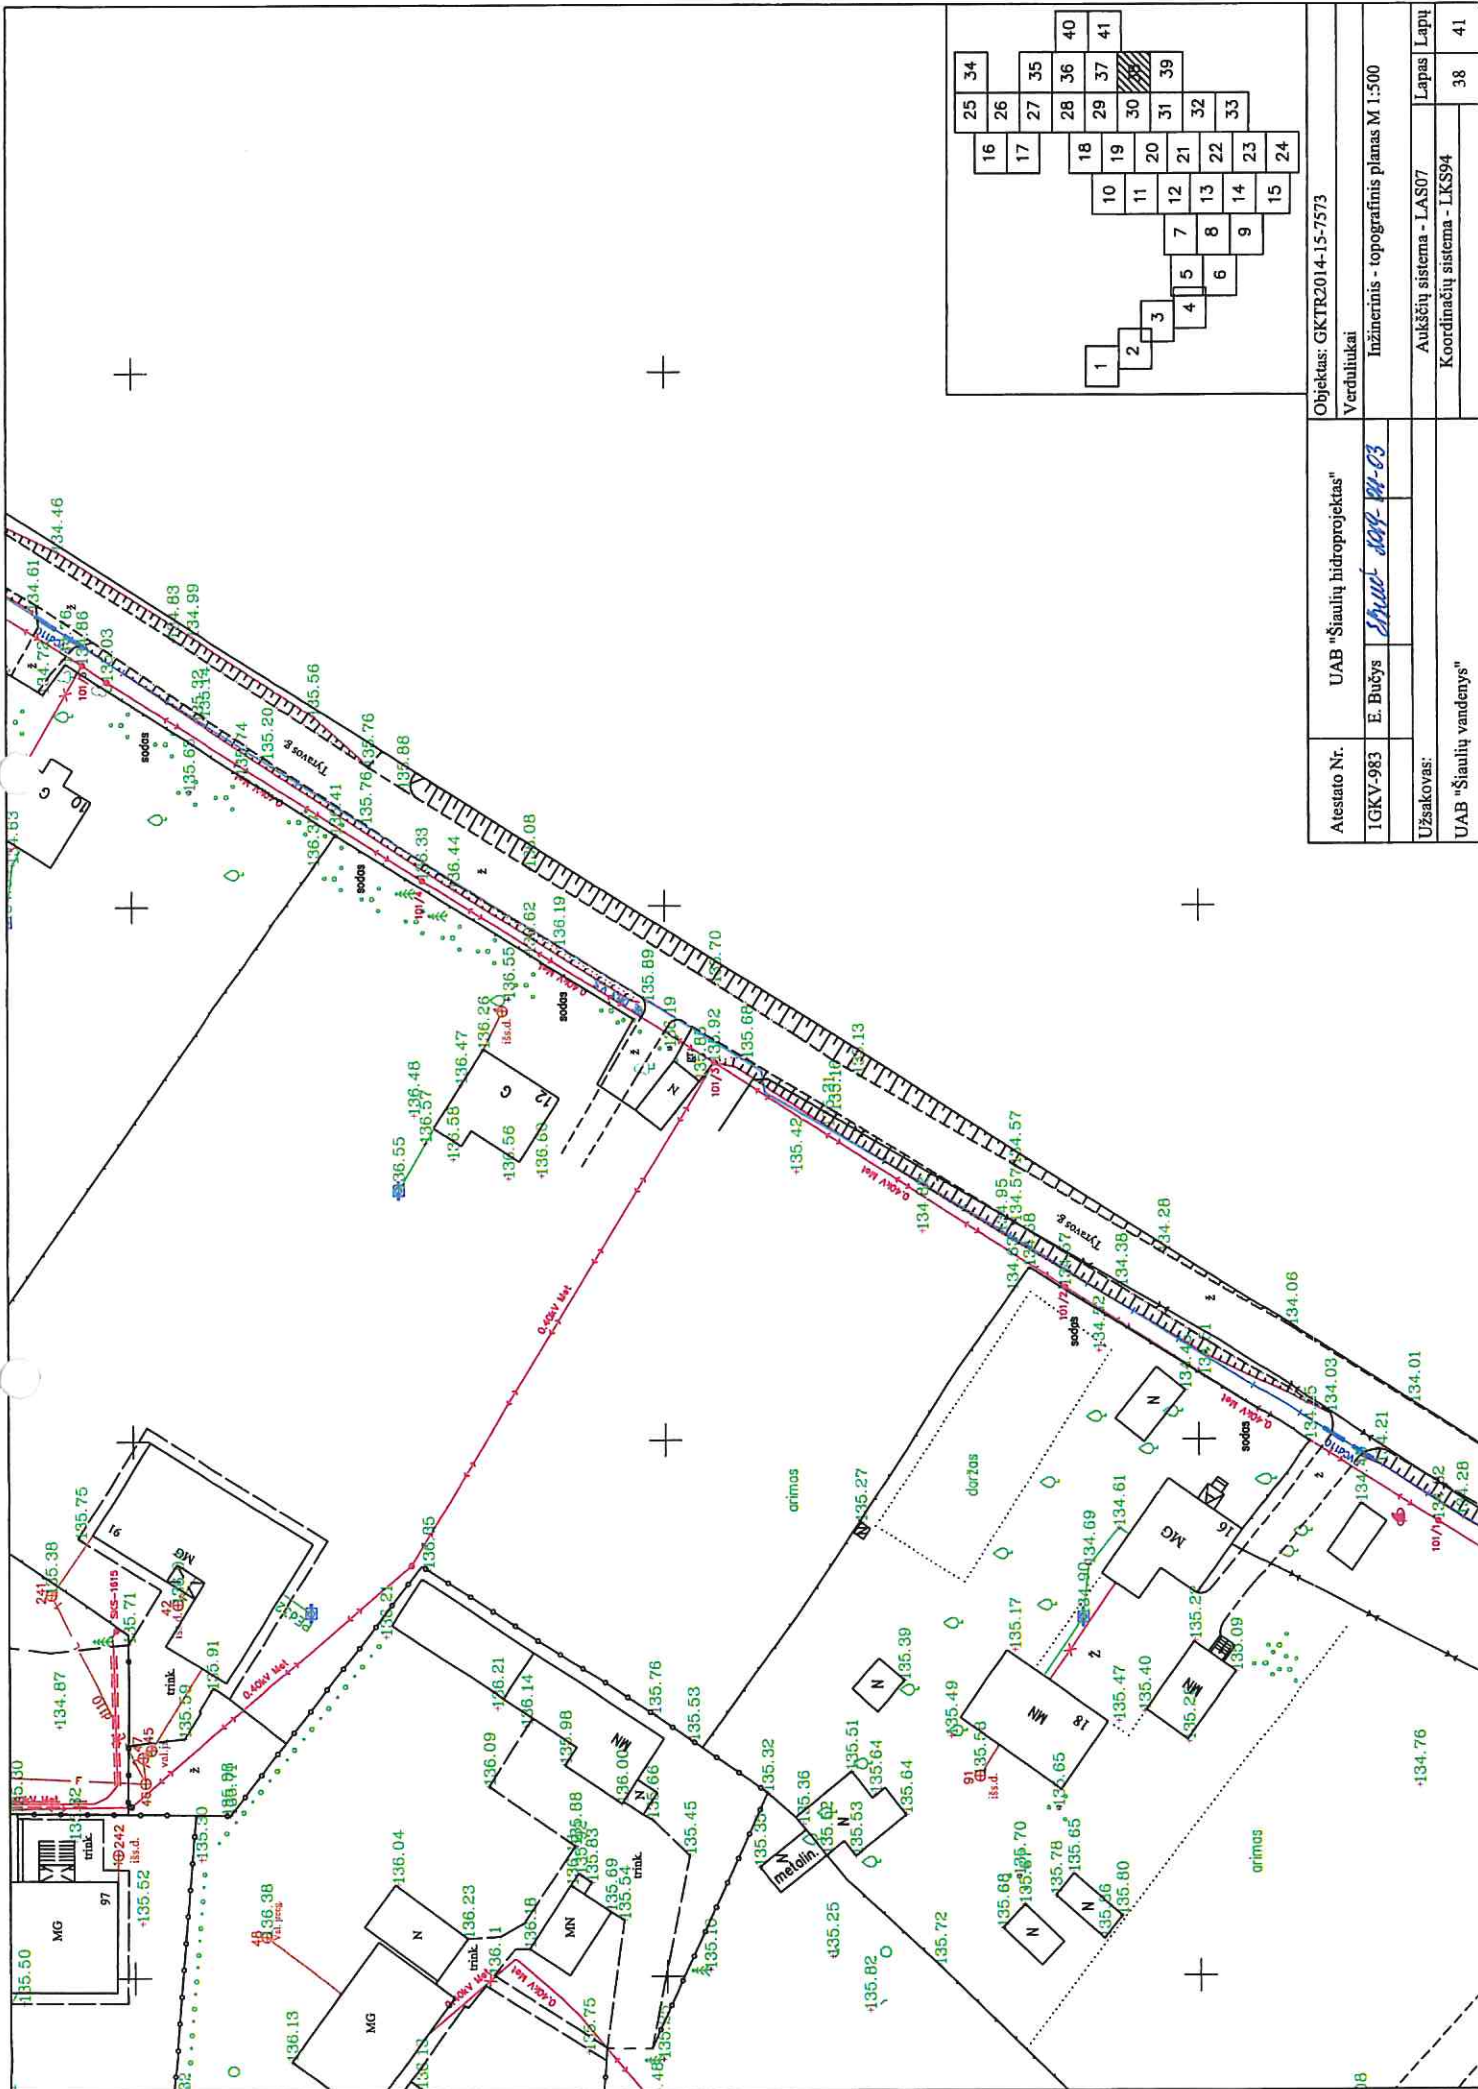


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
1GKV-983	E. Bučys	Verdukliai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapų
		38
		41

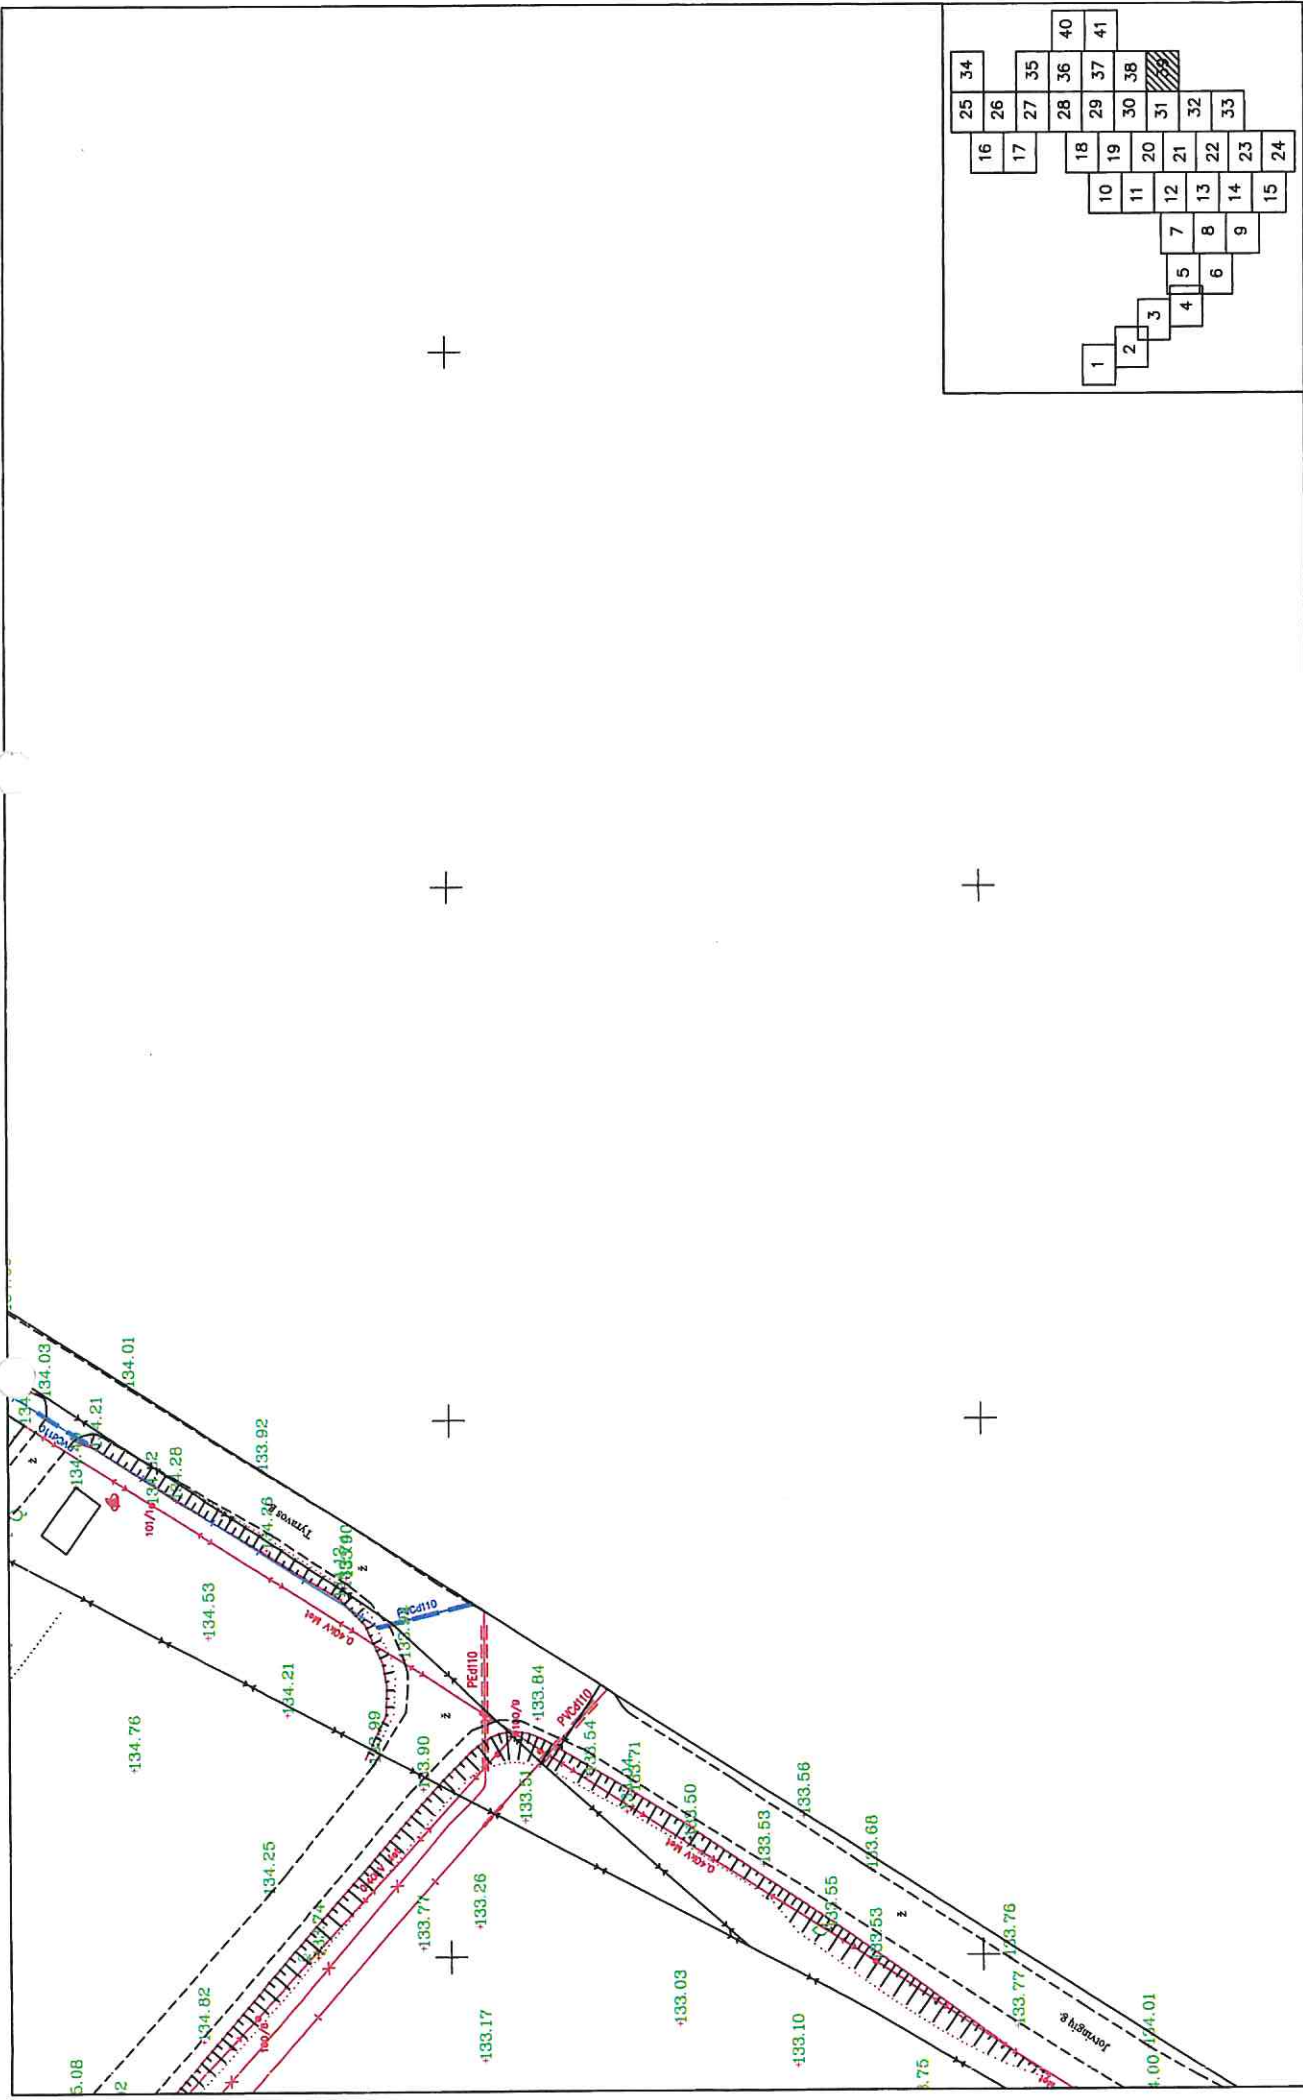


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
IGKV-983	E. Bučys	Verduliškai
Užsakovas:		Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
UAB "Šiaulių vandenys"		Aukščųjų sistema - LAS07
		Koordinacinių sistema - LKS94
		Lapas
		39
		41

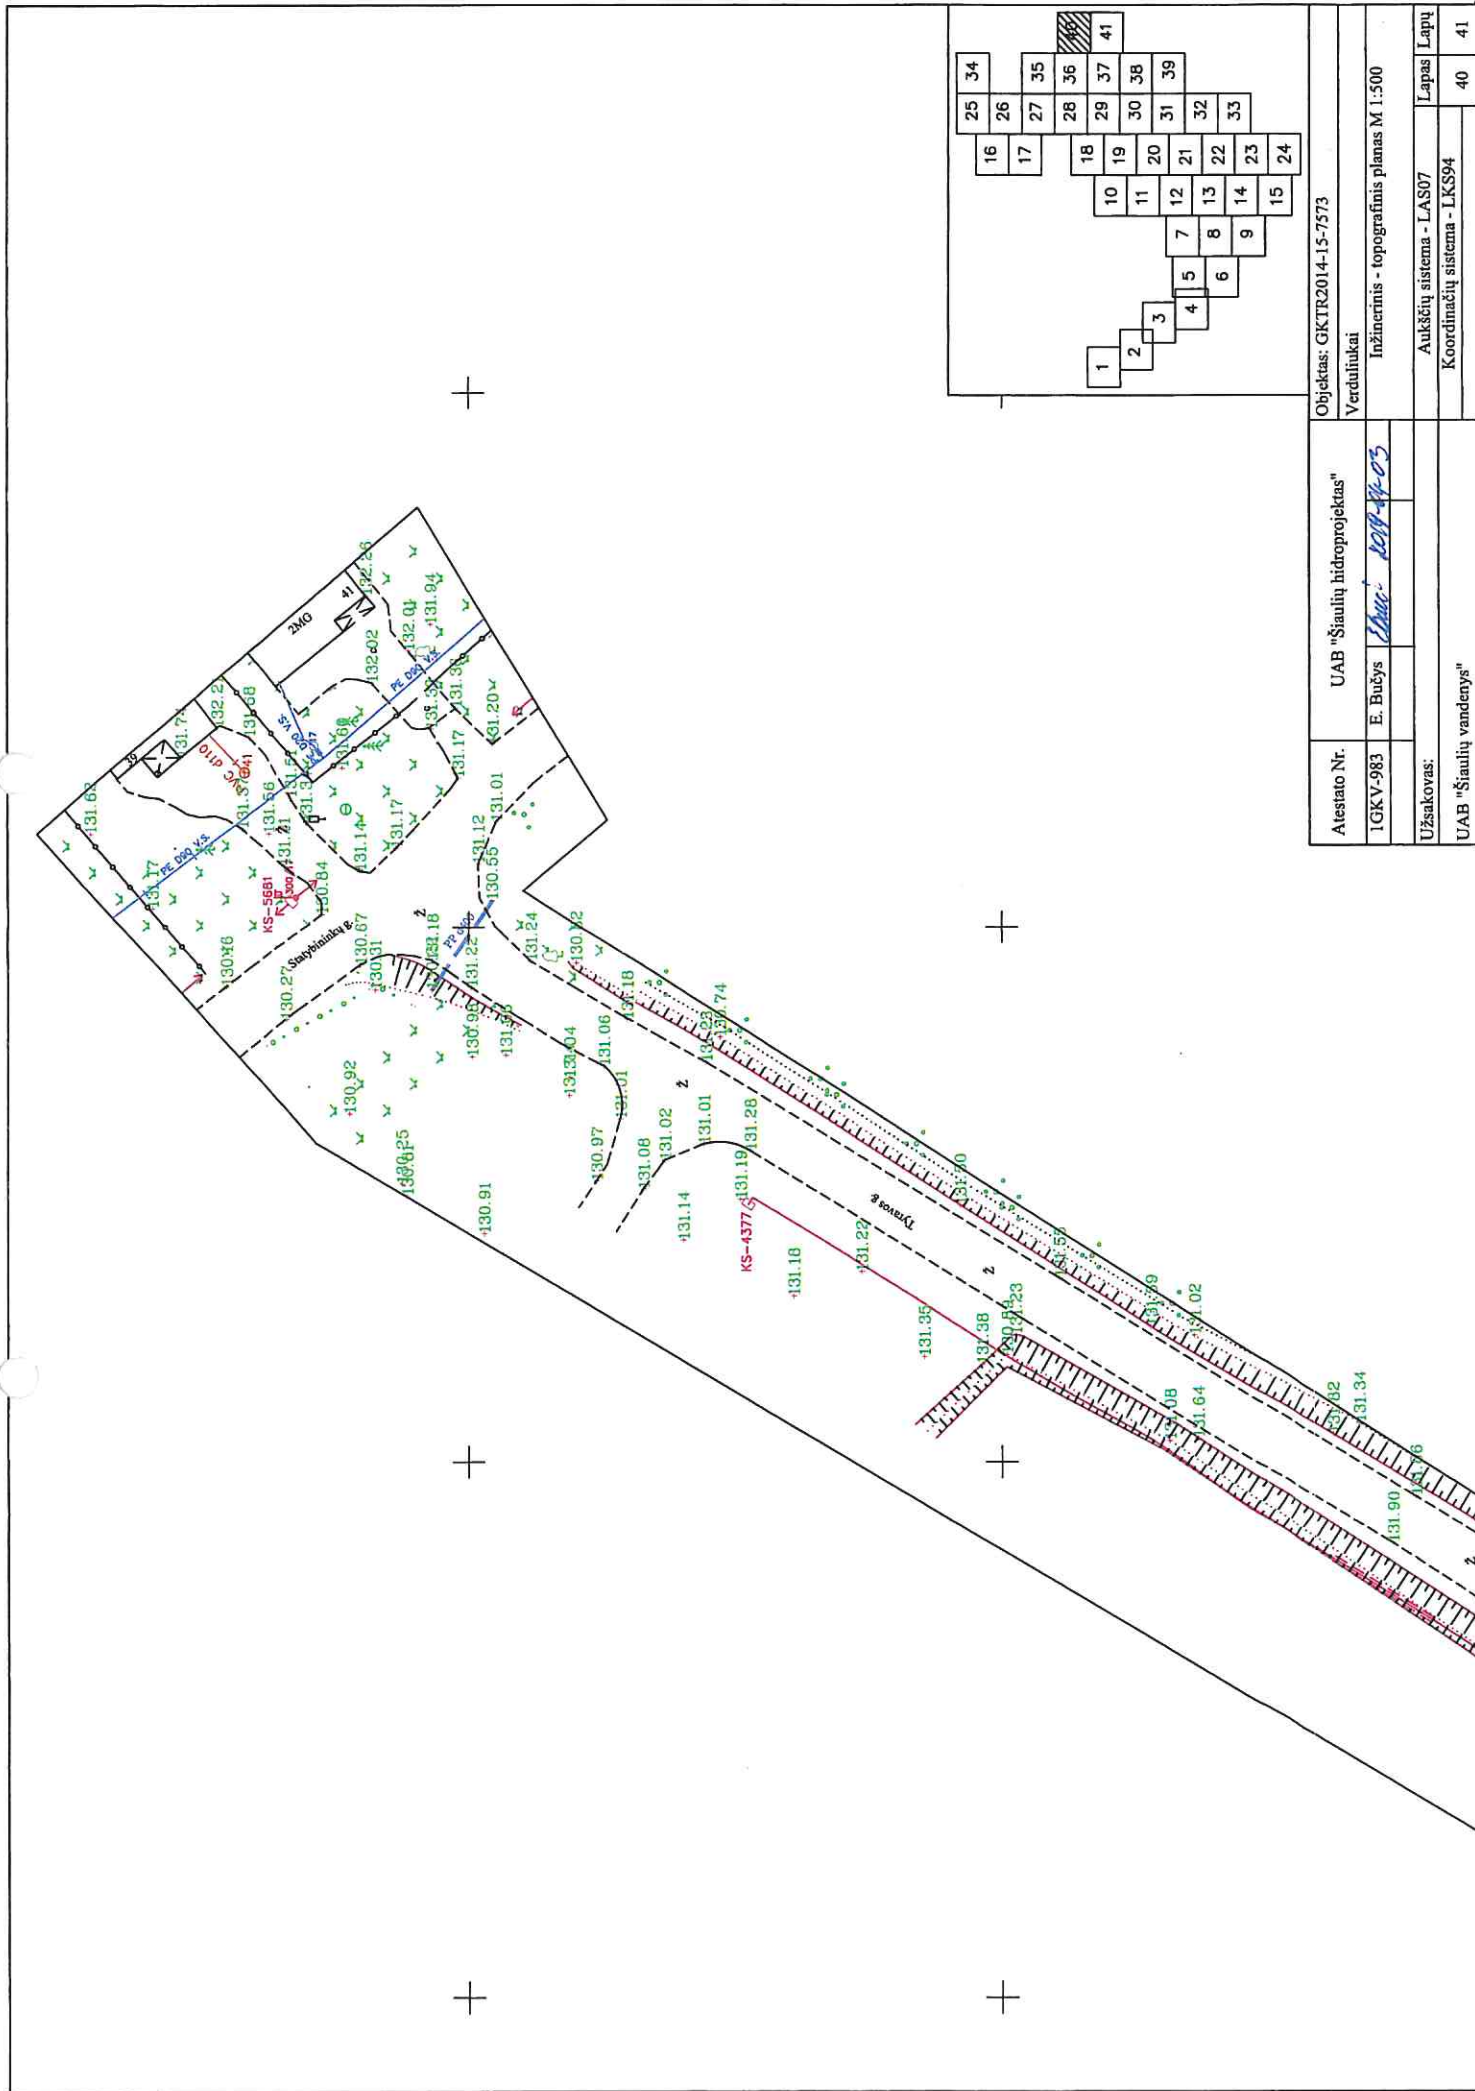

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573
IGK V-983	E. Bučys	Verduliškai
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščųjų sistema - LAS07
		Koordinatinių sistema - LKS94
		Lapas
		40
		41

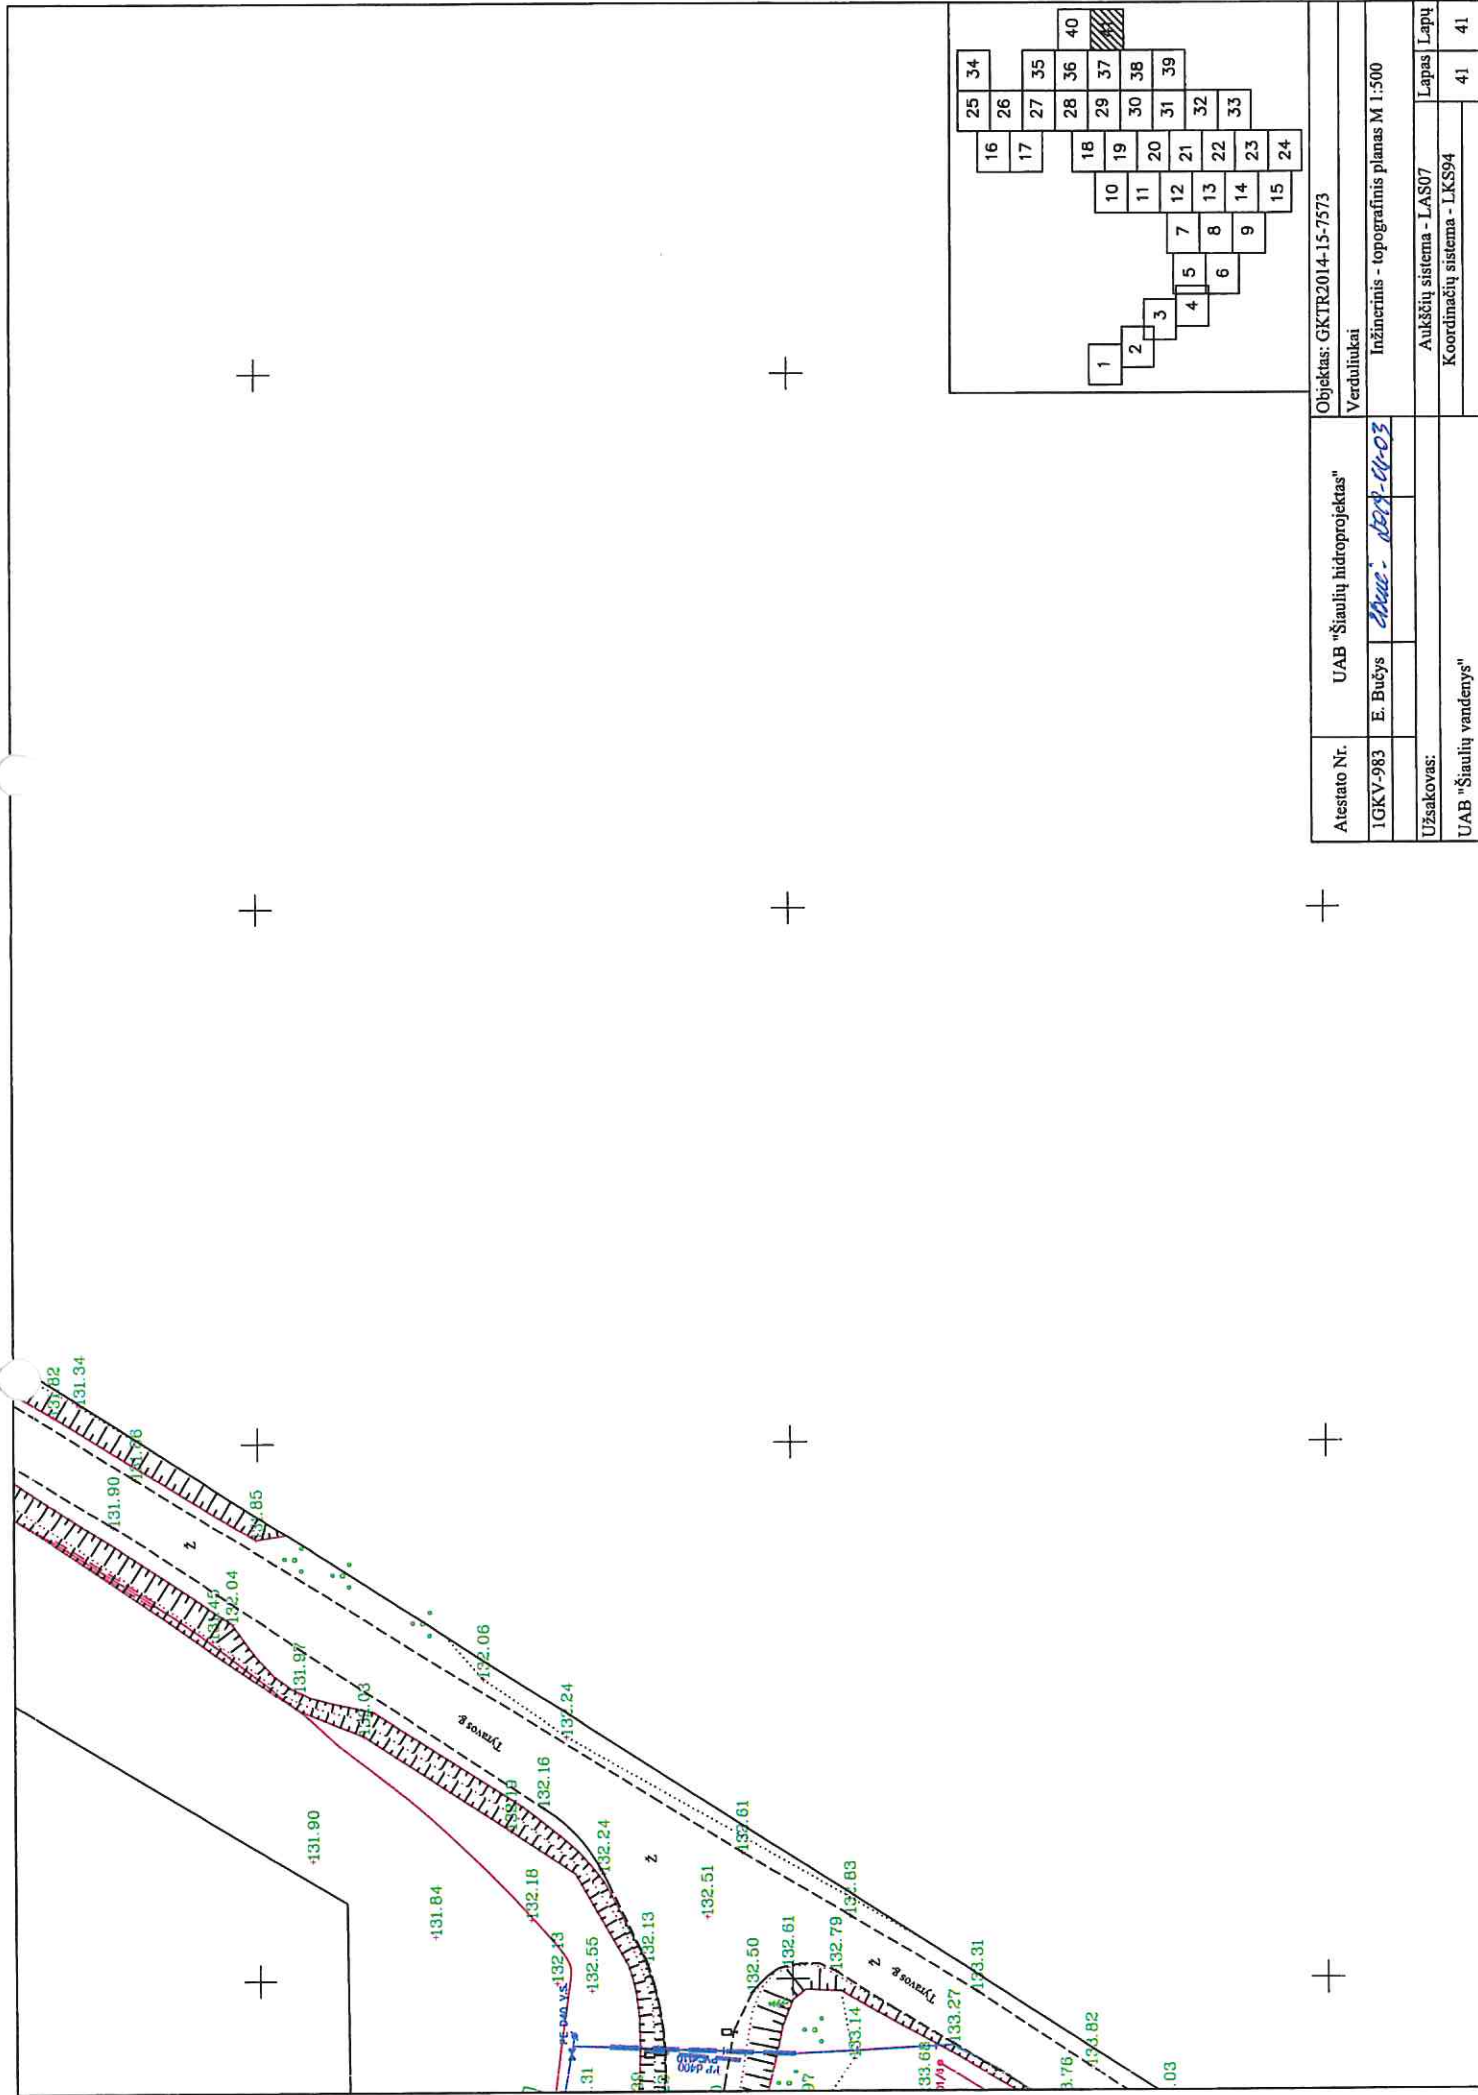

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-7573	
IGKV-983	E. Bučys	Verduliukai	
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500	
Aukščių sistema - LAS07		Lapas	
Koordinatų sistema - LKS94		Lapų	
		41	

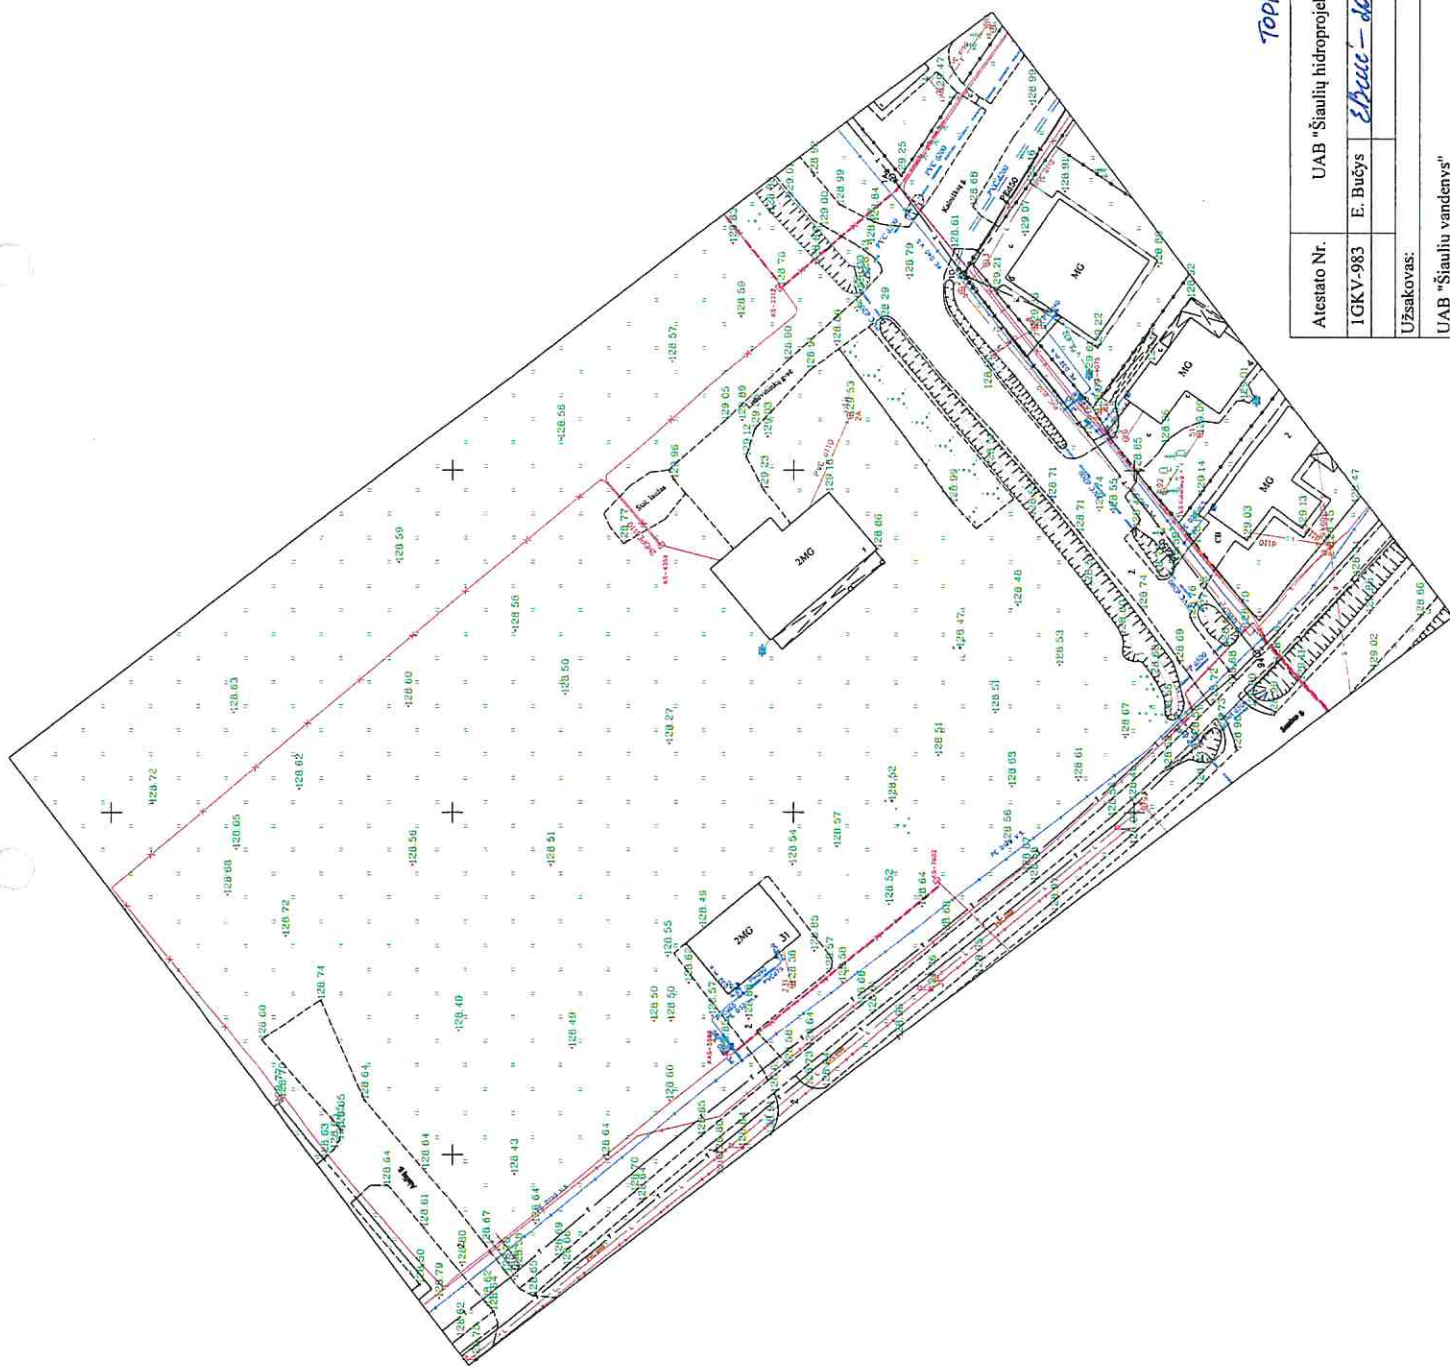

Topo uždavimas Nr. 29:49:414

Atestato Nr.	UAB "Šiaulių hidroprojektas"	Objektas: GKTR2014-15-8236
IGKV-983	E. Bučys	Verduliškai papildymas
Užsakovas:	UAB "Šiaulių vandenys"	Inžinerinis - topografinis planas M 1:500
		Aukščių sistema - LAS07
		Koordinatų sistema - LKS94
		Lapas 1
		Lapy 1
