

2017 m. rugpjūtis 29 d.

sutarties Nr.
2 priedas

y 9-2003

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Etapas Nr. 1

1 lentelė

Darbai		Trukmė (dienomis)	Pradžia	Pabaiga	Pratęsimo maksimalus terminas
Testinė sistema					
	El. bilieto infrastruktūra (sistema, kontrolierių įranga, transporto priemonės įranga ir 2 testavimo įrangos komplektai) diegimas ir testavimas.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Sistemos vartotojų, teisių, atsarginių kopijų konfigūravimas.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Kortelių inicializacijos priemonių kūrimas ir testavimas.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	El. bilietų pardavimų mažmenų integracija (3-čių šalių mažmena, KKT pardavimų kasos, internetinis pardavimų portalas ir kita).	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	El. terminuotų bilietų testavimas visoje sistemoje.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	El. piniginės testavimas visoje sistemoje.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	El. piniginės optimizacijos scenarijaus diegimas ir testavimas.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Priemiestinių bilietų testavimas visoje sistemoje (<i>angl. Check-in Check-out</i>).	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Mėnesio/dienos ataskaitos ir jų uždarymas. Duomenų apie el. bilietus apskaitos/ų suderinimas (<i>angl. balancing</i>).	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Maršrutų, tvarkaraščių sudarymo ir transporto priemonių stebėjimo posistemės integracija.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
	Keleivių informavimo posistemės integracija.	119	2017-10-01	2018-01-29	60
Migracija					
	Migracijos plano ruošimas.	210	2017-11-01	2018-05-29	90
	Esamų el. kortelių konvertavimo programinės įrangos testavimas (3-čių	210	2017-11-01	2018-05-29	90

	šalių mažmena, KKT pardavimų kasos ir internetinis pardavimų portalas).				
	Duomenų perkėlimas iš senos sistemos (WinAdo) į naują sistemą ir perkėlimo testavimas.	210	2017-11-01	2018-05-29	90
	Migracijos plano vykdymas.	210	2017-11-01	2018-05-29	90
Internetinės aplikacijos					
	Internetinė vartotojų savitarna (<i>ang. Desktop and mobile versions</i>) - kūrimas ir testavimas.	90	2017-12-30	2018-03-28	60
	Internetinės el. bilieto pildymo savitarnos (<i>ang. Desktop and mobile versions</i>) kūrimas ir testavimas.	90	2017-12-30	2017-03-28	60
Pilotinės/reali sistema					
	Testinės sistemos dublikavimas į pilotinę/realią aplinką išvalant transakcijas ir kitą kintamą informaciją.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	Pilotinės/realios sistemos konfigūravimas.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	Laikinių sąsajų su esama sistema sukūrimas.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	El. bilieto įrangos diegimas į 5 transporto priemones (M2 – 2 vnt.; M3 – 2 vnt.; M3 ilgas – 1 vnt.).	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	Sistemos bandomoji eksploatacija.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
Mokymai					
	Naudotojų darbo su sistema instrukcijų rengimas.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	Mokomosios medžiagos paruošimas.	60	2018-03-28	2018-05-29	60
	Galutinis naudotojų apmokymas.	60	2018-03-28	2018-05-29	60

Etapas Nr. 2


2 lentelė

Darbai		Trukmė (diena)	Pradžia	Pabaiga	Pratęsimo maksimalus terminas
	Visos el. bilieto įrangos skirtos tr. priemonėms pristatymas.	60	2018-05-29	2018-07-28	30
	Pilotinės aplinkos keitimas realia.	1	2018-11-14	2018-11-14	0
	Migracijos plano vykdymas (diena X).	1	2018-11-15	2018-11-15	0
	El. bilieto sistemos priežiūra ir aptarnavimas.	840	2018-05-29	2020-09-16	0

Pastaba. Visi terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. Pradžia ir pabaiga skaičiuojama kalendorinėmis dienomis nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

*Tiekėjas užpildo šį priedą, nurodydamas priede pateiktų darbų atlikimo maksimalius terminus. Tiekėjo nustatomi terminai negali viršyti žemiau pateikiamoje lentelėje bei pastabose nustatytų terminų. Užpildytas priedas pateikiamas kartu su **Techniniu pasiūlymu („Vokas I“)** (Konkurso sąlygų 5.8.1 punktas).*

3 lentelė

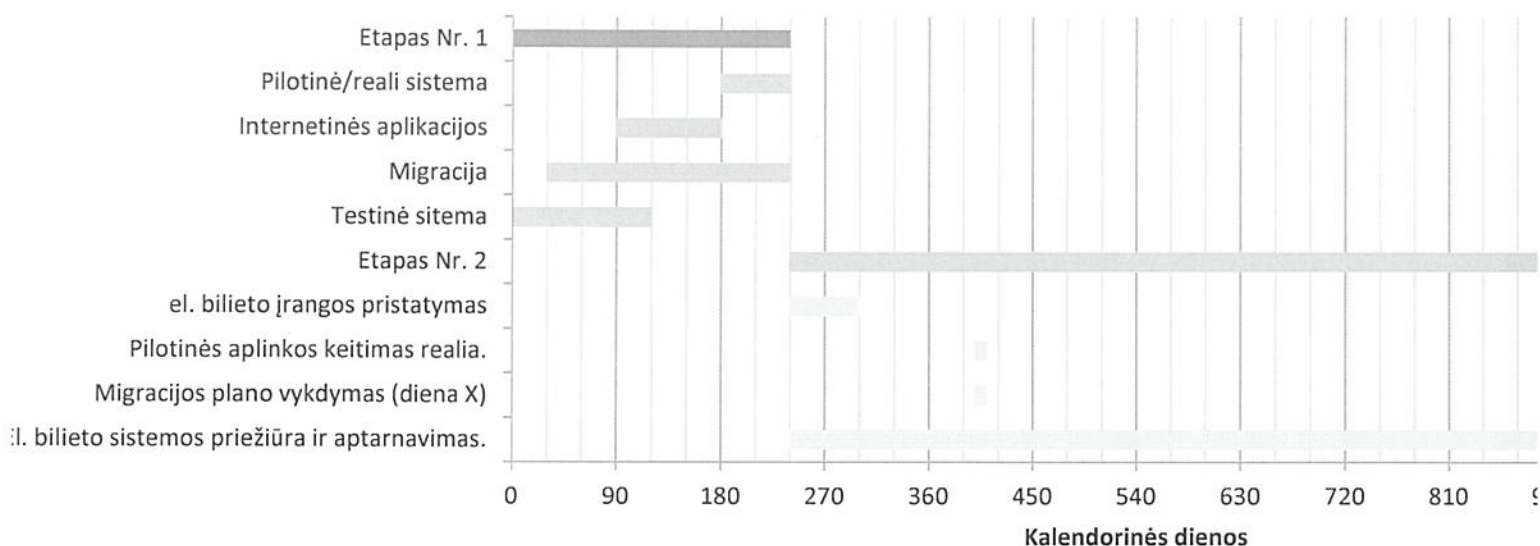

Pastabos

I. **Etapas Nr. 1** maksimalus įgyvendinimo terminas – 240 kalendorinių dienų. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nustatytas terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą iki 120 kalendorinių dienų. Pabaigus Etapo Nr. 1 įgyvendinimą per nustatytą terminą, jeigu nustatytos paslaugos atitinka Sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus, o transporto priemonėse sumontuota elektroninio bilieto įranga veikia tinkamai ir be trukdžių 30 kalendorinių dienų iš eilės, Užsakovas Nr. 2 su Tiekėju pasirašo **priėmimo – perdavimo aktą**. Užsakovas Nr. 2 už suteiktas paslaugas sumoka Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

II. **Etapas Nr. 2** įgyvendinimo terminas – iki 840 kalendorinių dienų. Terminas Etapo Nr. 2 įgyvendinimui pradedamas skaičiuoti nuo punkte Nr. I nurodyto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Etapo Nr. 2 įgyvendinimo terminas proporcingai trumpėja tokiam dienų skaičiui, kuriam yra pratęsiamas Etapo Nr. 1 nustatytas 240 kalendorinių dienų terminas. Užsakovas Nr. 2 už Etape Nr. 2 numatytas ir faktiškai suteikiamas paslaugas pradeda mokėti Tiekėjui nuo punkte Nr. I priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Tiekėjas visą elektroninio bilieto įrangą turi pristatyti **per 60 kalendorinių dienų** nuo punkte Nr. I nurodyto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu elektroninio bilieto įranga atitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, veikia tinkamai, Užsakovai su Tiekėju pasirašo **priėmimo – perdavimo aktus** bei sumoka Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

III. Jeigu tiekėjas nesilaiko šiame priede ir Sutartyje nustatytų Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo terminų, jam taikomos Sutartyje nustatytos sankcijos už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
