

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Pirkimo pavadinimas:

Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugų pirkimas

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties šalys

1.1. Pirkėjas:

- 1.1.1. Pavadinimas: **VĮ Ignalinos atominė elektrinė**
- 1.1.2. Juridinio asmens kodas: 255450080
- 1.1.3. Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.
- 1.1.4. PVM mokėtojo kodas: LT554500811
- 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita: LT10 7300 0100 0261 4996
- 1.1.6. Bankas, banko kodas: AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas: HABALT22XXX
- 1.1.7. Telefonas: +370 386 28985
- 1.1.8. El. paštas: iae@altra.lt
- 1.1.9. Šalies atstovas:
- 1.1.10. Atstovavimo pagrindas: 2025-01-16 VĮ IAE Generalinio direktoriaus įgaliojimas Nr. ĮmIg-6(1.204E)

Toliau – pirkėjas

ir

1.2. Tiekėjas:

Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš VUJE, a. s (atsakingas partneris) ir Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť.

- 1.2.1. Pavadinimas: VUJE, a. s
- 1.2.2. Juridinio asmens kodas: Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovak Republic
- 1.2.3. Adresas: 31 450 474
- 1.2.4. PVM mokėtojo kodas: SK2020392539
- 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita: SK51 1111 0000 0066 2250 5027
- 1.2.6. Bankas, banko kodas: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Užsienio banko filialas, adresas: Šancová 1/A , 813 33 Bratislava, Slovak Republic; swift code: UNCRSKBX
- 1.2.7. Telefonas: +421 33 599 1111
- 1.2.8. El. paštas: vuje@vuje.sk
- 1.2.9. Šalies atstovai:

Valdybos pirmininko pavaduotojas
bos narys.

- 1.2.10. Atstovavimo pagrindas: Pasirašantis bendrovės vardu pagal įstatų nuostatas

Ir

1.2.1. Pavadinimas: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. (abbreviated name: JAVYS, a. s.)

1.2.2. Juridinio asmens kodas: 35 946 024

1.2.3. Adresas: Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovak Republic

Toliau – tiekėjas

sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

2. straipsnis. Atsakingi asmenys

2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, sąskaitų per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS priėmimą: _____ mob. tel. _____, el. p. _____

2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: _____ Director of Radiation Safety, Nuclear Power Plants Decommissioning and RAW Management Division, VUJE, a. s. tel.: _____

3. straipsnis. Sutarties dalykas

3.1. Sutarties dalykas: Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis suteikti pirkėjui Sutarties specialiuųjų sąlygų 5 straipsnyje nurodytas paslaugas.. Išsamus sutarties dalyko aprašymas ir kiti reikalavimai nustatyti Sutarties priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje ir jos paaiškinimuose (toliau – Techninė specifikacija) bei Sutarties priede Nr. 2 pateiktame tiekėjo pasiūlyme ir jo paaiškinimuose.

3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris: Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugų pirkimas, Nr. 1476319.

3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą: Sutartis finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos Programos dotacijos paraiškos CCD.01 „Grant Application for the Nuclear Decommissioning Assistance Programme, Contaminated building demolition and waste management (Stage 1 – Optioneering)” lėšomis.

4. straipsnis. Pristatymo terminai ir perdavimo-priėmimo tvarka

4.1. Paslaugų suteikimo terminas: Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

Paslaugos turi būti teikiamos šiuo adresu: Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu. Tiekėjui rekomenduojama nusimatyti bent 3 keliones į VĮ IAE (Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.)(pvz. kick-off susitikimui, apsilankymui pagrindiniuose reaktoriaus pastatuose ir radioaktyvių atliekų tvarkymo kompleksuose su palyda, Užduoties 1(a) pristatymui, susitikimams pristatyti tarpinius ir/ar galutinius rezultatus, planuojant kiekvienam vizitui apie 3-4 darbo dienas).

4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas: Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, apie tai praneša pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiama tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 6 mėnesių laikotarpiui.

4.3. Užsakymų teikimo tvarka: netaikoma.

4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimtys: netaikoma.

4.5. Pateikiami dokumentai: nurodyti Techninės specifikacijos 46 punkte. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

4.6. Tiekėjui identifikavus duomenų trūkumą, kuris gali iš esmės paveikti numatomą griovimo ir/ar griovimo atliekų tvarkymo sudėtingumą ir kaštus, bei pateikus Užsakovui poreikį papildomiems matavimams kartu su matavimų detalio specifikacija ir jų reikalingumo pagrindimu, Užsakovas įvertina tokių papildomų matavimų poreikį ir galimybę atlikti papildomus matavimus Sutarties vykdymo laikotarpiu ir gali inicijuoti sutarties terminų pratęsimą iki 6 mėn. laikotarpiui.

4.7. Tiekėjas supranta, kad COVID-19 viruso sukelta pandemija nėra laikytina nenugalimos jėgos aplinkybė (force majeure) ir atitinkami pandemijos padariniai jam nesutrukdys įvykdyti sutartį tinkamai.

5. straipsnis. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos kainodara.

5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina:

		Valiuta: Eurai
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kaina be PVM
1	Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugos	797520,00
Bendra kaina be PVM:		797520,00
PVM (–) kaina¹:		–
Bendra kaina su PVM:		797520,00
Bendra kaina su PVM žodžiais:		
Septyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų		

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Šioje Sutartyje Pradinė Sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Pradinė Sutarties vertė vykdymo metu, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus negali būti keičiama.

5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles:

Sutarties kaina bus perskaičiuojama::

- dėl PVM tarifo pasikeitimo;
- dėl kainų lygio pokyčio.

5.3.1. Sutarties kainos peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo:

Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama, nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytiems įkainiams, Sutarties įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminami Susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).

5.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo: netaikoma.

5.3.3. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio:

5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu kainų pokytis, apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties sąlygose, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne dažniau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai(-ių).

5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra.

5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami).

5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalis vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

5.3.3.5. Šalis privalo Susitarime nurodyti šaltinio, kuriuo vadovaujamasi atliekama peržiūrą, reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.

5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$a_1 = a + \frac{k}{100} \times (a - a_i)$$

- a - Sutarties kaina be PVM (jei Sutarties kaina jau buvo perskaičiuota, imama kaina po paskutinio perskaičiavimo);
- a₁ - perskaičiuota (pakeista) Sutarties kaina be PVM;
- k - kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) procentais (teigiamas, kai yra kainos padidėjimas, ir neigiamas, kai yra kainos sumažėjimas) apskaičiuotas pagal indeksą: Paslaugų kainų indeksas, grupė M74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla..
- a_i - iki perskaičiavimo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų kaina be PVM.

"k" reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \left(\frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 \right) - 100$$

$\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas;
 $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ laikotarpio pradžios datos (mėnesio) indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės ($\text{Ind}_{\text{naujausias}}$, $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$) imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas kainų pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas, jį suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o perskaičiuota Sutarties kaina a_1 suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose Sutarties kaina yra išskaidyta į atskirus įkainius, perskaičiavus Sutarties kainą, proporcingai perskaičiuojami ir Sutartyje nurodyti įkainiai.

5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje Sutartyje.

5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti Sutartyje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.

5.3.4. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius: netaikoma.

5.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles: netaikoma.

5.5. Atsiskaitymo su tiekėju terminas ir tvarka:

5.5.1. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

5.5.2. Apmokėjimo sąlygos: Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita-faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus. Elektroninė sąskaita turi atitikti perdavimo-priėmimo aktą pagal turinį.

5.5.3. Tarpinių ir galutinio apmokėjimų dydžiai:

TARPINIS MOKĖJIMAS Nr. 1	
	Valiuta: Eurai

	Suma be PVM	PVM (<i>tarifas</i>) suma	Suma su PVM
Paslaugų vertė:	79 752,00	–	79 752,00
Mokėtina suma:	79 752,00	–	79 752,00
TARPINIS MOKĖJIMAS Nr. 2			
Valiuta:			Eurai
	Suma be PVM	PVM (<i>tarifas</i>) suma	Suma su PVM
Paslaugų vertė:	319 008,00	–	319 008,00
Mokėtina suma:	319 008,00	–	319 008,00
GALUTINIS MOKĖJIMAS			
Valiuta:			Eurai
	Suma be PVM	PVM (<i>tarifas</i>) suma	Suma su PVM
Paslaugų vertė:	398 760,00	–	398 760,00
Mokėtina suma:	398 760,00	–	398 760,00
Mokėtina suma iš viso:	797520,00	–	797520,00

5.5.4. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai tiekėjui atliekami tokia tvarka:

5.5.4.1. Pirmas tarpinis mokėjimas, lygus 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos, atliekamas

po to, kai tiekėjas tinkamai atliks Techninės specifikacijos 46 punkte pateiktos 4 lentelės 1 (pirmoje) eilutėje nurodytą užduotį;

5.5.4.2. Antras tarpinis mokėjimas, lygus 40 (keturiasdešimt) procentų Sutarties kainos, atliekamas po to, kai tiekėjas tinkamai atliks Techninės specifikacijos 46 punkte pateiktos 4 lentelės 2 (antroje) ir 3 (trečioje) eilutėse nurodytas užduotis;

5.5.4.3. Galutinis mokėjimas, lygus 50 (penkiasdešimt) procentų Sutarties kainos, atliekamas po to, kai tiekėjas tinkamai atliks Techninės specifikacijos 46 punkte pateiktos 4 lentelės 4 (ketvirtoje) ir 5 (penktoje) eilutėse nurodytas užduotis.

5.5.5. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, kaip nustatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

5.6. Avansas: netaikoma.

5.7. Avanso užtikrinimas: netaikoma.

6. Paslaugų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

6.1. Garantinis terminas: netaikoma.

6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti: netaikoma.

6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka: netaikoma.

7. straipsnis. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiektėjai ir (ar) specialistai

7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiektėjai ir (ar) specialistai: Sutarties vykdymui subtiektėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

8. straipsnis. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas

8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:

- netesybomis (delspinigiais, bauda); ir
- Pirmo pareikalavimo banko garantija arba Draudimo bendrovės laidavimo draudimu.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas: Tiekėjas kartu su pasirašyta Sutartimi turi pateikti pirkėju 5 procento nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus.

9. straipsnis. Šalių atsakomybė

9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą:

9.1.1. Jei pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai tiekėjo perduotas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja pirkėjui 0,04 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.2. Tiekėjui taikomos netesybos:

9.2.1. Jeigu tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos tiekėjui skaičiuoja 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM.

9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš tiekėjui mokėtinų sumų.

9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka:

9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos: netaikoma.

9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo: netaikoma.

9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo: netaikoma.

9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu: netaikoma.

9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo: netaikoma.

9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais nesilaikymo: netaikoma.

9.10. Kitos netesybos: netaikoma.

10. straipsnis. Esminės sutarties sąlygos

10.1. Esminės Sutarties sąlygos: netaikoma.

11. straipsnis. Sutarties galiojimas ir keitimas

11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas: Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, o pirkėjas išsiunčia pranešimą tiekėjui, kad pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas.

Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė).

11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas: netaikoma.

12. straipsnis. Sutarties nutraukimas

12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai: Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai:

12.2.1. jeigu tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;

12.2.2. jeigu tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

12.2.3. jeigu tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 120 kalendorinių dienų po Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos;

12.2.4. jeigu tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) procentų Pradinės sutarties vertės;

12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos;

12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms;

12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų, arba tiekėjas prarado teisę verstis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje, jei to buvo reikalaujama. ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia arba teisės praradimo dienos;

12.2.8. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

12.2.9. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekiejų ir (ar specialistų) / esamų subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo.

12.2.10. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą.

13. Aplinkosauginiai ir (ar) socialiniai kriterijai

13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai: netaikoma.

13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai: netaikoma.

14. straipsnis. Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai

14.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

14.1.1. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skirsnio „Tiekėjas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys“ 3.2. poskirsnio „Subtiekiejų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas“ 3.2.9. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekiejo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekiejo pašalinimo pagrindų ir subtiekiejo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose

valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekęjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekęją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.“

14.1.2. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skirsnio „Tiekėjas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys“ 3.2. poskirsnio „Subtiekęjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas“ 3.2.14. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekęją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.“

14.1.3. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skirsnio „Tiekėjas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys“ 3.3. poskirsnio „Jungtinės veiklos partnerių keitimas“ 3.3.4. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 15 (penkiolika) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.“

14.1.4. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 6 skirsnio „Paslaugų tiekimo pabaiga ir paslaugų rezultato priėmimas“ 6.2. poskirsnio „Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas–priėmimas“ 6.2.3.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.2.3.1. ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo faktinio Paslaugų suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba“

14.1.5. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 6 skirsnio „Paslaugų tiekimo pabaiga ir paslaugų rezultato priėmimas“ 6.2. poskirsnio „Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas–priėmimas“ 6.2.6. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.2.6. Jeigu Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas priėmė ir joms pretenzijų neturi.“

14.1.6. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 6 skirsnio „Paslaugų tiekimo pabaiga ir paslaugų rezultato priėmimas“ 6.3. poskirsnio „Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas“ 6.3.5.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.3.5.1. ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo faktinio Paslaugų etapo suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų etapo rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba“

14.1.7. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 6 skirsnio „Paslaugų tiekimo pabaiga ir paslaugų rezultato priėmimas“ 6.3. poskirsnio „Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas“ 6.3.8. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.3.8. Jeigu Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas konkrečiame etape priėmė ir joms pretenzijų neturi.“

14.1.8. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skirsnio „Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai“ 7.3. poskirsnio „Paslaugų trūkumų šalinimas“ 7.3.7. punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.3.7. Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų po Tiekėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.“

14.1.9. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 20 skirsnio „Sutarties pakeitimai“ 20.3. punktą ir išdėstyti jį taip:

„20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 15 (penkiolika) darbo dienų (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.“

14.1.10. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 21 skirsnio „Sutarties sustabdymas“ 21.5.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„21.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktis) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;“

14.1.11. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 22 skirsnio „Sutarties nutraukimas“ 22.1. poskirsnio „Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų“ 22.1.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą netaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytas terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.“

14.2. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti:

14.2.1. Papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skirsnio „Tiekėjas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys“ 3.1 poskirsnį „Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai“ 3.1.4. punktu ir išdėstyti jį taip:

„3.1.4. Pirkėjas, praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, turi teisę tarptautinių sankcijų ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių įgyvendinimo tikslu prašyti Tiekėją atnaujinti viešojo pirkimo procedūrų metu dėl šios Sutarties sudarymo pateiktą šio pobūdžio informaciją.“

14.2.2. Papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skirsnio „Tiekėjas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys“ 3.1 poskirsnį „Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu priimti įsipareigojimai“ 3.1.5. punktu ir išdėstyti jį taip:

"3.1.5. Tiekėjas privalo vengti bet kokių veiksmų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Interesų konfliktas laikomas kilusiu, kai įtakojamas bet kurio pirkimo sutartį įgyvendinančio asmens nešališkas ir objektyvus funkcijų vykdymas."

14.2.3. Papildyti Sutarties bendrųjų sąlygų 5 skirsnį "Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai" 5.4, 5.5 ir 5.6 punktais ir išdėstyti juos taip:

"5.4. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

5.5. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos Audito Rūmams ar jų atstovams, tikrinti dotacijos įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su dotacijos finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo.

5.6. Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, teikti jiems visą prašomą informaciją ir dokumentus, o taip pat priėti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu dotacijos valdymu, ir stengtis jiems padėti."

14.2.4. Papildyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skirsnį "Konfidenciali informacija" 13.6 ir 13.7 punktais ir išdėstyti juos taip:

"13.6. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis Ignalinos programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje adresu <https://cpva.lt/wp-content/uploads/2024/04/ip-viesinimo-gaires.pdf>.

13.7. Tiekėjas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis Sutarties bendrųjų sąlygų 13.6 punkte nurodytomis Ignalinos programos viešinimo gairėmis."

14.3. Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma.

14.4. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedais „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

15. straipsnis. Sutarties priedai

15.1. 1 priedas. Techninė specifikacija ir perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei susitikimo su tiekėjais protokolai:

15.1.1. 2025 m. kovo 24 d. techninė specifikacija „Radionuklidais užterštų statinių griovimo ir atliekų tvarkymo galimybių analizė“ Nr. Spc-12(13.67E);

15.1.2. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau –VĮ IAE) 2025-04-24 raštas „Dėl susitikimo metu pateiktų klausimų“ Nr. ĮS-1643(13.67E);

15.1.3. VĮ IAE 2025-05-02 raštas „Dėl atsakymų į klausimus ir pirkimo terminų pasikeitimo“ Nr. ĮS-1771(13.67E);

15.1.4. VĮ IAE 2025-05-19 raštas „Dėl atsakymų į klausimus“ Nr. ĮS-1972(13.67E).

15.2. 2 priedas. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios tiekėjų grupės, sudarytos iš VUJE a. s (atsakingas partneris) ir Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť 2025-05-23 pasiūlymo Nr. 5874/2025 su priedais kopija.

15.3. 3 priedas. Paslaugų perdavimo – priėmimo akto forma.

15.4. 4 priedas. Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

15.5. 5 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos.

16. straipsnis. Šalies atstovų parašai

Pirkėjas		Tiekėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.1.1.4. **Paslaugos** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos paslaugos. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima visas su Paslaugų teikimu susijusias veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą, jų rezultatų perdavimą, trūkumų šalinimą, prekių tiekimą bei su Paslaugomis susijusių dokumentų pateikimą (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai numatyta Sutartyje ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui;

1.1.1.5. **Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Paslaugas ir (ar) Paslaugų rezultatą ir kuriuo Šalys patvirtina, kad suteiktos Paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;

1.1.1.6. **Paslaugų trūkumai** – Paslaugų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar Paslaugų garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Paslaugų teikimo ar rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Paslaugų pirkęs, arba nebūtų už Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainos;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo tinkamai suteiktas bei Pirkėjo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Paslaugos ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPI leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. **Sutartis** – Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, teikiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.16. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui raštu (tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą ar kt.) teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Užsakymas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais ir kontaktais ir laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka;

1.1.1.17. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.18. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.3. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis, valandomis ir minutėmis.

1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Paslaugų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.7. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.

1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiais nurodyta reikšme.

1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Techninė specifikacija;

1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;

1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

1.3.1.5. Pasiūlymas;

1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistasias.

1.3.3. Jeigu Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka suteikti Pirkėjui Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Paslaugų teikimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už suteiktas Paslaugas gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMOUI PASITELKIAMASI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių, aplinkosaugos ir (arba) socialinių kriterijų (toliau – **kokybiniai kriterijai**) reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų

pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdančys subtiekejai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentuose nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. Subtiekejų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekejai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekejų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti Sutartyje nurodytus subtiekejus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.2.4. Naujas subtiekejas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekejai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekejus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekejus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekejo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekejo pašalinimo pagrindų ir subtiekejo atitikti nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekejo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Subtiekejai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

- 3.2.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 3.2.10.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
- 3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
- 3.2.11. Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdančys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
- 3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
- 3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;
- 3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
- 3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas, Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus.
- 3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:
- 3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;
- 3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.
- 3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

- 3.3.1. Tiekėjas, vykdančias Sutartį kaip tiekėjų grupę, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPI ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.
- 3.3.2. Tiekėjas, vykdančias Sutartį kaip tiekėjų grupę, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teisės ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPI ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtieķimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtieķėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Paslaugų rezultato priėmimą, Užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Paslaugų rezultato naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškos ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Paslaugų rezultato naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Paslaugų rezultato naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6. PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGŲ REZULTATO PRIĖMIMAS

6.1. Paslaugų teikimo pabaiga

6.1.1. Paslaugų teikimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas suteikė visas Paslaugas pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudotis Paslaugų rezultatu (jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4. buvo pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ar Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos;

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Paslaugų teikimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2. Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą (jei taikoma) Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos turi būti suteiktos Specialiosiose sąlygose nurodytu būdu ir terminais.

6.2.2. Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui suteikus Paslaugas, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Paslaugų rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų priėmimą pastebėtus Paslaugų ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Paslaugų rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Paslaugų ar jų dalies.

6.2.4. Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereikia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Paslaugų rezultatu pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Paslaugas su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.

6.2.6. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.7. Su Paslaugomis susijusių prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Paslaugų priėmimo momento.

6.2.8. Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų rezultatu (jei taikoma) tik po Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.9. Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

6.3. Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas

6.3.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui etapais, o Pirkėjas privalo konkrečiame etape kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos teikiamos etapais laikantis Specialiosiose sąlygose nurodytų etapų eiliškumo ir terminų.

6.3.2. Konkrečiame etape suteiktų Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais

egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.3.3. Pirkėjas pasirašo kiekvieną Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni etapai, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

6.3.4. Suteikus visuose etapuose numatytas Paslaugas, t. y. baigus teikti Paslaugas, pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.

6.3.5. Tiekėjui suteikus Paslaugas konkrečiame etape, Pirkėjas atlieka Paslaugų rezultato patikrinimą ir privalo:

6.3.5.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų etapo suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų etapo rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.3.5.2. priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų etapo patikrinimo metu sudarytą Defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų etapo priėmimą pastebėtus Paslaugų etapo ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.3.5.3. atsisakyti priimti Paslaugų etapo rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamai suteiktų šio etapo Paslaugų.

6.3.6. Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas konkrečiame etape ir pateikė visus reikiamus dokumentus (jei taikoma).

6.3.7. Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereikia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas gali priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.

6.3.8. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas konkrečiame etape priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.3.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų, teikiamų etapais, rezultatu tik po galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose.

6.3.10. Bet kurio vėlesnio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nėra automatiškai pratęsiamas, kai Pirkėjas nepasirašo ankstesniojo etapo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto dėl Tiekėjo kaltės.

6.3.11. Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo etapo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų etapo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Paslaugų rezultatui taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) Tiekėjo taikomas garantinis terminas, kuris nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Paslaugų trūkumų

negali naudoti tik apibrėžtos Paslaugų rezultato dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Paslaugų trūkumus, kurie atsirado dėl netinkamo Paslaugų rezultato naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Paslaugų trūkumų, Paslaugų rezultato netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Paslaugų trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus (jei taikoma) arba bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustatęs Paslaugų trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Paslaugų trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Paslaugų trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Paslaugų rezultatas neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.

7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Paslaugų trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3. Paslaugų trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Paslaugų rezultato trūkumus. Jeigu nustatomi su Paslaugomis susijusių prekių trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti jų trūkumus, sutaisydamas prekes ar jų dalį arba pakeisdamas prekę nauja preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Paslaugų trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumai šalinami prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaistytoje su Paslaugų teikimu susijusių prekių dalyje pakartotinai nustačius prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti prekes naujomis kokybiškomis prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Paslaugų rezultato trūkumus, garantinis terminas Paslaugų rezultatui (ar su Paslaugomis susijusioms sutaisytomis ar naujoms prekėms ar jų daliai) vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai suteiktų Paslaugų (ar su Paslaugomis susijusių prekių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Paslaugų dalies rezultato trūkumų šalinimas gali turėti įtakos kitoms Paslaugų dalims, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Paslaugų trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Paslaugų trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalausti Tiekėjo atlyginti Paslaugų ekspertizės bei Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Paslaugų trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3. atsisakyti Paslaugų ir nemokėti už tokias Paslaugas ar reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Paslaugų vertė Pirkėjui dėl netinkamo Paslaugų dalies rezultato ar su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumų, jeigu tokio Paslaugų dalies rezultato ir (ar) prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Paslaugų vertės. Į Paslaugų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Paslaugų dalies ir (ar) prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Paslaugų dalies ir (ar) prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 papunktį pareikštą piniginių reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Paslaugų trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

8.1. Paslaugų terminai ir teikimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – **Grafikas**).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai, o kurios gali būti teikiamos tik numatytu eiliškumu.

8.2. Netesybos už Paslaugų teikimo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų teikimo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Paslaugų ar jų etapo suteikimo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Paslaugų ar jų etapo suteikimo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Paslaugų ar jų etapo suteikimo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Paslaugas mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytais sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, arba suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Paslaugų teikimu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – **Avansas**).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnę kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigų pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui Avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto Avanso suma išskaitoma iš mokėtinios sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkis) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų yra suteikta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir Paslaugų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Paslaugų kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis.

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Paslaugos teikiamos etapais ar periodais aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Paslaugų teikimo etapui ar periodui, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalis sudaro trišalį susitarimą su subtiektėju dėl tiesioginio atsiskaitymo, Pirkėjas privalo pervesti subtiektėjui mokėtiną sumą į subtiektėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Paslaugas Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalis įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleidama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo

subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiuro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Paslaugų pobūdžio ar (ir) išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patentų, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekejai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad suteiktų Paslaugų rezultato disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamą Paslaugų rezultatą.

16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPI 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtiniais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPI nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo pavišinti VPI 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekejo ar

specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Paslaugų (jų dalies) teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Tiekėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali teikti Paslaugų (pavyzdžiui, Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti techninių galimybių Paslaugų teikimui), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, persikirstyto, negauto ir panašiai Pirkėjo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytais sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.4. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPI nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktis) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymui tik tuo

atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPI 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytas terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamose Paslaugos ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Paslaugų poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);

22.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama priiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties

nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja Tiekėją apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktos Paslaugos ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tais atvejais, kai kartu su Paslaugomis yra perkamos prekės, Tiekėjas turi teisę keisti prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs prekių pavyzdžius, pristatomos prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo prekių keitimo pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį. |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TVIRTINU

RADIONUKLIDAIŠ UŽTERŠTŲ STATINIŲ GRIOVIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

2025 m. kovo 24 d. Nr. Spc-12(13.67E)

Vilnius

I. SKYRIUS TIKSLAS

1. Tikslas – parengti galimybių analizę, kurioje būtų numatytas efektyvus ir saugus statinių užterštumo pašalinimas ir nugriovimas bei susidariusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konceptas, atsižvelgiant į gerąją užsienio praktiką.
2. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas. Reikalavimai saugai svarbių paslaugų pirkimui yra pateikti VI Skyriuje.

II. SKYRIUS APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

APK	–	Radioaktyviųjų atliekų priėmimo kriterijai (angl. <i>Waste acceptance criteria</i>);
BEO	–	Branduolinės energetikos objektas;
BSR	–	Branduolinės saugos reikalavimai;
LDG	–	Lygiavertės dozės galia (angl. <i>Equivalent dose rate</i>)
GENP	–	Galutinis eksploatacijos nutraukimo planas;
IAE	–	VĮ Ignalinos atominė elektrinė;
IAE aikštelė	–	branduolinio energetikos objekto teritorija, aptverta fizinio perimetro tvora, kuriai taikomi riboto pateikimo zonos reikalavimai;
Kontroliuojama zona	–	zona, kuriai taikomos specialios apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės arba radioaktyviojo užteršimo plitimo prevencijos taisyklės, į kurias kontroliuojama prieiga;
KRA	–	kietosios radioaktyviosios atliekos;
LMRA	–	Labai mažai radioaktyvios atliekos – trumpaamžės radioaktyviosios atliekos, kurių radiologinių savybių vertės viršija nekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, bet atitinka radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į LMRA atliekyną kriterijus;
LR	–	Lietuvos Respublika;
PAV	–	Poveikio aplinkai vertinimas;
RA	–	radioaktyviosios atliekos;

RBMK	–	rusiškas akronimas, reiškiantis „didelės galios kanalinio tipo reaktorių“;
RSC	–	Radiacinės saugos centras;
SAM	–	LR sveikatos apsaugos ministerija;
Saugoma zona	–	zona, kuri yra apribota fiziniais barjeriais aplink branduolinės energetikos objekto perimetrą, į kurią patekimas kontroliuojamas fizinės saugos tikslais
SNRL	–	sąlyginiai nebekontroliuojami radioaktyvumo lygiai;
TS	–	Techninė specifikacija;
VATESI	–	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

III. SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ

3. IAE sudaro du energijos blokai su RBMK-1500 reaktoriais. Pagrindinių pastatų išdėstymas IAE aikštelėje pateiktas 1 priede. Vykdamas Lietuvos Respublikos įsipareigojimą pagal Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Protokolo Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ nuostatas, IAE 1-asis blokas buvo galutinai sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., o 2-asis blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu IAE eksploatavimo nutraukimas vykdomas pagal nedelstino išmontavimo strategiją. Pagrindinių pastatų (101/1 ir 101/2 pastatai) griovimo pradžia daugiausia priklauso nuo reaktorių šerdžių ir A bloke likusios įrangos išmontavimo darbų ir kuro išlaikymo baseinų atlaisvinimo eigos (visas panaudotas branduolinis kuras jau pašalintas). Siektina IAE aikštelės būklė, užbaigus eksploatavimo nutraukimą pateikta techninės specifikacijos 2 priede.
4. RBMK kanalinio tipo reaktoriai veikė šilumnešio cirkuliavimo per šilumą išsiskiriančias rinkles vienu kontūro principu visoje jėgainėje. Aplinkybės lėmė, kad eksploatacijos metu buvo užteršta sąlyginai didelė dalis statybinių konstrukcijų. Buvo fiksuojami radioaktyvių skysčių pratekėjimo atvejai iš pagrindinio cirkuliacinio kontūro bei iš panaudoto kuro išlaikymo baseinų, užteršę betonines konstrukcijas. Kitos konstrukcijos kontroliuojamoje zonoje taip pat yra užterštos dėl jose vykdyto ar dar vis vykdomo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ar saugomos užterštos įrangos bei kt. priežasčių. Galiojančiame GENP yra numatyta, kad minėtuose objektuose visų pirma bus išmontuota technologinė įranga, vėliau išmontuotos statinių inžinerinės ir pagalbinės sistemos (likutinė įranga), sutvarkytos radioaktyviosios atliekos. Tik visiškai atlaisvinus minėtus objektus nuo įrangos bei RA, atliekami statinių radiologiniai tyrimai ir jų radiacinės kontrolės nutraukimo procedūra. Statinių konstrukcijų dezaktyvavimas, dalinis išmontavimas, išmontavimo RA tvarkymas vykdomi remiantis radiologinių tyrimų rezultatais.
5. RBMK reaktorių pastatų atlaisvinimas nuo radiacinės kontrolės ir griovimas bus vykdomas pirmą kartą. Šiuo metu daroma prielaida, kad pagrindinių reaktoriaus pastatų nebus įmanoma pilnai atlaisvinti nuo radiacinės kontrolės, todėl keliamas tikslas nustatyti svarbiausių užterštų IAE statinių dezaktyvavimo ir paruošimo griovimui, taip pat susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo galimybes. Analizė apims išsamų tarptautinių projektų geriausios praktikos įvertinimą, siekiant užtikrinti, kad pasirinkti metodai būtų veiksmingi, saugūs ir nekenksmingi aplinkai.
6. Pagal šią Sutartį vertinami šie pastatai ir statiniai (toliau – „pasirinkti pastatai“).
 - 6.1. Pagrindiniai IAE pastatai – 101/1, 101/2 pastatai (įskaitant A, B, V, D, G ir 119 blokus, toliau – Blokai);
 - 6.2. 150 pastato skystųjų atliekų tvarkymo kompleksas, kurį sudaro 150, 151, 153, 154, 154A, 154B statiniai (toliau – 150 pastato kompleksas);
 - 6.3. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos 157 ir 157/1 statiniai (toliau – 157 statinio saugyklos).
 150 pastato kompleksas yra tarpusavyje sujungtas funkcinis cementavimo kompleksas, įrengtas kartu su skystųjų atliekų surinkimo talpyklomis ir kitais pagalbiniais objektais. Pastatas suprojektuotas išgarinimo ir cementavimo būdais apdoroti skystąsias RA, susidarančioms iš energijos blokų, 130, 156 bei 159 pastatų.

157 statinio saugyklos skirtos laikinai saugoti kietąsias RA, susidarancias eksploatuojant IAE. Statinys yra suskirstytas į sekcijas, skirtas trumpaamžėms ir ilgaamžėms labai mažo aktyvumo, mažo ir vidutinio aktyvumo kietosioms RA saugoti.

Yra žinoma, kad šiuose statiniuose, nemaža dalis betono yra užteršta (3 priedas – IAE aikštelės statiniai) – kartu šie pastatai sudaro apie 90 % bendro užteršto betono kiekio.

Atlikta analizė ir pateiktos rekomendacijos prireikus galės būti pritaikytos kitiems užterštiems pastatams ir statiniams.

7. Suderinta galutinė ataskaita bus naudojama pagrindinių pastatų griovimo ir atskiros infrastruktūros sukūrimo (jei prireiks) strategijai parengti, taip pat bus naudojama kaip gairės parengti eksploatavimo nutraukimo technologinius projektus bei griovimo dokumentus pagal Statybos įstatymą.

IV. SKYRIUS PIRMINIAI DUOMENYS

8. Pastatų ir statinių, Blokų, 150 pastato komplekso, 157 statinio saugyklos aprašymai pateikti pridėtuose prieduose. Kadangi juose vis dar atliekami su eksploatavimo nutraukimu susiję darbai (įrangos išmontavimas, RA tvarkymas ir kt.), galutinė šių statinių būklė dar nepasiekta. Situacija šiuose statiniuose pasikeis iki jų nugriovimo.
9. Laikomasi prielaidos, kad pirmiausia visa pagrindinė ir likutinė įranga iš statinių bus pašalinta. Tačiau planuojant statinių griovimą gali būti likusios statinio inžinerinės sistemos (tokios kaip ventiliacija, apšvietimas, elektros instaliacija ir pan.). Taip pat požeminės kanalizacijos sistemos, latakai ir pan.
10. IAE pateiks informaciją apie įgytą patirtį susijusią su reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos pastato (117/1 past.), atlaisvinimu nuo tolimesnės radiacinės kontrolės, kuris yra paruoštas griauti (kartu su 117/2 past.). Atskirai pateiks išmoktas pamokas apie turbinų salės pamatų betoninių blokų išpjovimo dirbtuves, kai betonas buvo išpjaujamas į 10t sveriančius blokus, lokalus paviršinis užterštumas (jei aptiktas užterštumas) buvo pašalinamas mechaniniu būdu, taikant nuotoliniu būdu valdomas technologijas.
11. 2016-2017 metais buvo atlikti betoninių konstrukcijų užterštumo radiologiniai matavimai IAE kontroliuojamoje zonoje, daugiausia Blokuose.

Atliekant IAE kontroliuojamos zonos statinių betoninių konstrukcijų radiologinius tyrimus, siekiant preliminarai įvertinti užteršto betono kiekį, buvo atlikti paprasti (dozimetriniai) ir kompleksiniai radiologiniai matavimai.

Bendras 5949 dozimetrinių matavimų skaičius apima:

- 1323 gama spinduliuotės LDG matavimai mėginių ėmimo vietose (šerdyse) iš betoninių patalpų konstrukcijų;
- 1096 viso paviršiaus beta užterštumo matavimai mėginių ėmimo vietose (šerdyse) iš betoninių patalpų konstrukcijų;
- 3530 LDG gama spinduliuotės matavimų iš atskirų mėginių iš patalpų betoninių konstrukcijų.

Tyrimų metu buvo atlikti 3689 kompleksiniai matavimai. Į šį skaičių įeina:

- 83 betoninių grindų konstrukcijų gama spinduliuotės LDG kartogramos (2243 atskiros zonos);
- 76 gama spektrometriniai matavimai patalpose;
- 3530 mėginių, paimtų iš patalpų betoninių konstrukcijų, matavimų stacionariu gama spektrometru.

Detali eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita bus pateikta pasirašius Sutartį.

12. 2018 metais buvo atliktas gelžbetonio konstrukcijų inžinerinis inventorizavimas. Vertinimo metu remtasi inžineriniais architektūriniais ir statybiniais brėžiniais. Atlikus vertinimą nustatyta, kad bendras gelžbetonio tūris yra 732 257 m³. 101/1,2 pastatuose yra 611 142 m³ gelžbetonio arba 83,46% viso tūrio. Likę pastatai sudaro 121 115 m³ gelžbetonio arba 16,54 % viso IAE tūrio.

Apjungus inžinerinės inventorizacijos duomenis su radiologinių matavimų rezultatais patalpos buvo suklasifikuotos:

Lentelė 1 IAE užterštų patalpų klasifikacija

	Klasifikacija		Patalpų skaičius	Visų patalpų procentinė dalis	Gelžbetonis, m ³	Procentinė dalis nuo viso betono
	LDG	Užterštumas				
1 klasė	> 0.24 µSv/h	> 4.0 Bq/cm ²	2,724	38.05%	568,168.07	77.6%
2 klasė	0.21 - 0.24 µSv/h	0.41 - 4.0 Bq/cm ²	835	11.66%	46,163.42	6.3%
3 klasė	≤ 0.2 µSv/h	≤ 0.4 Bq/cm ²	3,600	50.29%	117,925.62	16.1%

Lentelė 2 IAE pastatų su užteršto betono konstrukcijomis pasiskirstymas

Eil. Nr.	Pastatas, statinys		Betono tūris 2018, m ³	Užteršto betono tūris, m ³	Paskirtis
1	Pastatas 101/1	Blokas A1	131,863	22,405	A1 Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu B1 Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas V1 Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas G1 Turbinų salės blokas D1 Deaeratoriaus blokas D0 Pagalbinio korpuso blokas
2		Blokas B1	16,607	1,656	
3		Blokas V1	12,432	349	
4		Blokas G1	86,271	3,678	
5		Blokas D1	51,242	2,754	
6		Blokas D0	7,401	180	
7	Pastatas 101/2	Blokas A2	131,888	19,083	A2 Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu B2 Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas V2 Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas G2 Turbinų salės blokas D2 Deaeratoriaus blokas
8		Blokas B2	16,665	1,6767	
9		Blokas V2	12,467	334	
10		Blokas G2	88,465	3,732	
11		Blokas D2	51,243	3,473	
12	Pastatas 119		4,595	59	Sujungtas su 101/1 pastatu, galimas nedidelis užterštumas, didžioji jo dalis medžiagų naudojama atlaisvinimo nuo tolimesnės radiacinės kontrolės, procedūrai suformuotų pakuočių matavimams
13	Pastatas 150		28,164	2,356	150 pastato kompleksas skirtas iš blokų (ir kitų įrenginių) technologinių sistemų susidarančioms skystosioms RA apdoroti garinimo ir cementavimo metodais. Kompleksą sudaro cementavimo įrenginys (150), skystųjų atliekų rezervuarai (151/154, 154A, B) ir ventiliacijos kaminas (153).
14	Statinys 151/154, 154A,B		18,137	3,249	
15	Statinys 153		627	26	Pastatų saugyklos naudojamos laikinai saugoti IAE eksploatavimo metu susidariusias kietąsias RA - trumpaamžes ir ilgaamžes labai mažo aktyvumo, mažo ir vidutinio aktyvumo kietąsias RA.
16	Statinys 157, 157/1		9,672	1,690	

Detali užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita (2019-02-08 Nr. PD-4(19.54) IAE užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita) bus pateikta pasirašius Sutartį.

Visas tekste minimas betonai yra armuoti, atitinkamai atskirai reikėtų vertinti cementines ir metalines medžiagas.

- IAE pastatų griovimo atliekų didelė dalis, patvirtinus atitikimą Branduolines saugos reikalavimuose BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ nustatytiems kriterijams, bus atlaisvinta nuo tolimesnės radiacinės kontrolės.

Dalis IAE pastatų griovimo atliekų tinkamos laidoti trumpaamžių labai mažai radioaktyviųjų atliekų atliekyne (LMRA atliekynas), kurių deklaruojamų radionuklidų aktyvumo vertės viršija toliau nekontroliuojamus lygius bei kurios atitinka Branduolines saugos reikalavimuose BSR-3.1.2-2017

„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ nustatytus A klasės radioaktyviųjų atliekų kriterijus.

Tačiau LMRA atliekyno talpa yra ribota iki 60 000 m³ ir didžiąją dalį šio kiekio sudarys A klasės atliekos, susidarysiančios eksploatacijos nutraukimo metu prieš blokų dezaktyvavimą ir griovimą.

RA priimamos į LMRA atliekyną atitinkančios jo APK (bus pateikta pasirašius Sutartį).

14. Nedidelė dalis betono (pvz. 157 pastato 1 ir 4 sekcijos, betono konstrukcijos po išlaikymo baseinų metaline danga) gali būti B ir C klasės. B ir C klasės atliekų tvarkymo instrukcijos bus pateiktos pasirašius Sutartį. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynas (*angl. Near Surface Repository, NSR*) bus naudojamos B ir C klasės atliekos. NSR yra skirtas galutiniam 100 000 m³ radioaktyviųjų atliekų galutinės pakuotės laidojimui (betoniniai konteineriai su cementuotomis radioaktyviosiomis atliekomis).
15. Bus pateikti techniniai brėžiniai su pastatų pjūviais. Atlikus betono tūrio įvertinimą kontroliuojamoje zonoje, buvo padaryta išvada, kad realioje situacijoje yra skirtumų, kurie neatsispindi techninių brėžinių dokumentuose. Inžinerinė inventorizacija apskaičiavo, kad vertinant gelžbetonio tūrį neapibrėžtis kai kuriais atvejais gali siekti iki 20%. Pagrindinio pastato A1 bloko 3D modelis. Modelis sukurtas darbų planavimui ir vizualizacijai (detalumas nėra tinkamas atlikti skaičiavimams ir modeliavimams). IAE svarsto galimybę parengti detalų pagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų 3D modelį. Minėta informacija bus pateikta pasirašius Sutartį.
16. IAE eksploatuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksus, tačiau šių įrenginių našumas skirtas tiksliai IAE istorinėms bei išmontavimo metu susidarančioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti ir iki šiol nebuvo įvertintas galimybių sutvarkyti griovimo metu susidarysiančias radioaktyvias atliekas atžvilgiu. Taip pat IAE radioaktyviųjų atliekų atliekynų talpa apribota.
 - 16.1. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas, informacija pateikta nuorodoje (<https://www.iae.lt/veikla/eksploatavimo-nutraukimo-projektai/b19-projektas.-trumpaamziu-labai-mazo-aktyvumo-atlieku-atliekynas/358>).
 - 16.2. Mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno projektas pradėtas, vyksta paruošiamieji darbai, detalesnė informacija nuorodoje (<https://www.iae.lt/b25-projektas.-mazai-ir-vidutiniskai-radioaktyviu-trumpaamziu-atlieku-pavirsinis-atliekynas/181>). Detalesnė ir aktuali informacija apie šiuos atliekynus bus pateikta pasirašius Sutartį.
17. 4-ame priede taip pat pateikta trumpa informacija apie radiologinio apibūdinimo taikytą metodiką.

V. SKYRIUS PASLAUGŲ APIMTIS IR APRAŠYMAS

18. Tiekėjas, remdamasis tarptautine patirtimi, turi įvertinti galimus pasirinktų statinių dezaktyvavimo ir paruošimo griauti variantus. Analizę taip pat turi apimti susidarančių atliekų sutvarkymas, įskaitant galimas atliekų apdorojimo ir atliekų sutvarkymo alternatyvas.
19. Prieš atlikdamas Užduotis pagal Sutartį, Tiekėjas privalo parengti Kokybės valdymo planą ir Projekto įgyvendinimo planą bei gauti Pirkėjo patvirtinimą, kaip nurodyta VI skyriuje. Įvadinis susitikimas (*angl. kick-off meeting*) bus suorganizuotas pateikus pirminį Kokybės valdymo plano ir Projekto įgyvendinimo plano variantą, kur bus aptarta komunikacija, projekto įgyvendinimo planas ir kaip bus pasiekti keliama tikslai.
Pagrindinės užduotys, kurias turi atlikti Tiekėjas:
20. **Užduotis Nr. 1 – statuso ir trūkumų analizė:**
Šios užduoties metu Tiekėjas turi nustatyti ir atlikti analizei pasirinktų statinių pagrįstą užterštumo masto įvertinimą. Tai turi apimti šias pagrindines veiklas:
 - a) Išsami esamų duomenų apžvalga:
 - 20.1. Tiekėjas turi išanalizuoti Pirkėjo turimus matavimus ir skaičiavimus, įvertinant mėginių ėmimo apimtį, metodiką ir modelius; įvertinti mėginių ir metodų analizę, prielaidas, naudojamos ekstrapoliuojant ir interpoliuojant užteršto betono tūrio skaičiavimus.
 - 20.2. Tiekėjas turi pristatyti savo analizę, pagrįsti ir rekomenduoti patobulinimus siekiant sumažinti dabartinį neapibrėžtumą, pvz. papildomus matavimus arba pažangesnius statistinio modeliavimo metodus.

b) Radioaktyviųjų medžiagų kiekybinė analizė.

20.3. Remiantis atlikta išsamia esamų duomenų apžvalga, ir taikant kur įmanoma rekomenduotinus patobulinimus, Tiekėjas turi įvertinti radioaktyviųjų medžiagų kiekius pagal tipą ir klasę pasirinktų statinių užterštose konstrukcijose, nustatant neapibrėžtumo lygį, susijusį su galimu geriausiu įvertinimu.

c) Trūkumų analizė ir ateities vertinimo planas.

20.4. Laikantis prielaidos ir supratimo, kad dabartiniame etape tam tikrose lokacijose šiuo metu negalima imti mėginių (pvz. po panaudoto kuro baseiniais blokuose), ir yra vietų, kuriose eksploatacijos nutraukimo metu galimas papildomas užterštumas (pvz. išmontuotos įrangos buferinė saugykla), Tiekėjas turi parengti trūkumų analizę, kurioje būtų aprašytas reikalingas papildomų mėginių ėmimas arba modeliavimas, kuris bus reikalingas pasiekus galutinę statinių būseną.

20.5. Jei Tiekėjas identifikuotų duomenų trūkumą, kuris gali iš esmės paveikti numatomą griovimo ir/ar griovimo atliekų tvarkymo sudėtingumą ir kaštus, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui poreikį papildomiems matavimams kartu su matavimų detalio specifikacija ir jų reikalingumo pagrindimu.

20.5.1. Tiekėjas, atlikęs 1(a) užduotį, išvadas turi pristatyti papildomame susitikime (susitikimo rezultatai bus protokoluojami).

20.5.2. Pirkėjas įvertina tokių papildomų matavimų poreikį ir galimybę įvykdyti Sutarties vykdymo laikotarpiu. Jei Pirkėjas nustato, kad papildomi matavimai Sutarties vykdymo laikotarpiu yra negalimi, apie tai informuojamas Tiekėjas, o Tiekėjas analizės ir trūkumų analizės ataskaitoje turi nurodyti duomenų trūkumo poveikį atliekamam vertinimui ir numatyti kaip turėtų būti interpretuojami naujų matavimų rezultatai.

20.5.3. Jei papildomi matavimai bus laikomi kritiniais projekto rezultatams pasiekti ir negalės būti atlikti per nustatytus terminus, gali būti inicijuotas sutarties terminų pratęsimas, remiantis sutartyje nurodytomis sąlygomis.

20.5.4. Jei papildomi matavimai bus atliekami, už jų atlikimą ir išlaidas atsako Pirkėjas.

20.6. Užduoties Nr. 1 rezultate, Tiekėjas turi parengti statuso ir trūkumų analizės ataskaitą, kurioje pristatomi gauti rezultatai ir pagrįstos išvados, rekomenduojami patobulinimai ir nustatyti trūkumai. Ataskaitos projektas turi būti pateiktas IAE personalo peržiūrai ir tvirtinimui, siekiant užtikrinti, kad visi trūkumai būtų ištaisyti prieš galutinį pateikimą. Ši ataskaita bus 2 užduoties pasirengimo pagrindas. Siūlomas ataskaitos šablonas pateiktas 6 priede, galimus variantus tiekėjas gali pasiūlyti prieš pateikdamas ataskaitos projektą.

21. **Užduotis Nr. 2 – projekto sprendinio variantų parinkimas:**

Šioje užduotyje Tiekėjas turi įvertinti pasirinktų statinių dezaktyvavimo ir paruošimo griauti galimybių įvertinimą, remiantis geriausia tarptautine praktika ir statuso ir trūkumų analizės rezultatais iš Užduoties Nr. 1.

a) Tarptautinė patirtis:

21.1. Tiekėjas turi įvertinti galimus sprendinius dėl pasirinktų statinių dezaktyvavimo ir paruošimo griovimui, remiantis tarptautine turima praktika ir vertinant šiuo atveju:

- **A atvejis:** metodai, kurie leis statinius (ar jų dalis) pilnai atlaisvinti nuo radiologinės kontrolės ir paruošti statinius įprastiniam griovimui.
- **B atvejis:** metodai, kurie leis pasiekti mažesnio užterštumo statinių būseną ir paruošti griovimui, taikant SNRL¹.
- **C atvejis:** sprendinys, kai užterštumas lieka (be papildomo pašalinimo), vertinant, jei siekiant pilnai pašalinti, būtų pažeistos laikančiosios konstrukcijos. Šiuo atveju išsamiai aprašomos reglamentavimo sąlygos (teisinė bazė) ir reikalingos papildomos priemonės.

¹ Sąlyginių lygių verčių nustatymas aprašytas Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.9.2-2018 (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F15C0609863/asr>)

- 21.1.1. Aktualia tarptautinė praktika yra laikoma statinių tvarkymas su skirtingos užterštumo lygiais ir gyliu (ypač jei užterštos laikančios konstrukcijos) bei optimaliais atliekų tvarkymo (užteršto betono) pavyzdžiais.
- 21.1.2. Tiekėjas turi pristatyti ir pagrįsti siūlomus tarptautinės praktikos pavyzdžius.
- 21.1.3. Svarstant SNRL taikymo atvejį: pateikti gerosios praktikos analizę (tarptautinę taikymo patirtį, norminę ir teisinę bazę), įvertinti, kokiomis sąlygomis būtų reikalingas hidrogeologinis modelis (ar ir kiti modeliai).
- 21.1.4. Kiekvienam atvejui, Tiekėjas turi įvertinti kiekvieną technologiją ar techniką pagal:
- Įrodytą efektyvumą panašiose situacijose, išryškinant bet kokius apribojimus ar trūkumus.
 - Aprašant personalo poreikį ir reikalingas apsaugos priemones arba nuotolinio valdymo galimybes.
 - Susidarysiančių atliekų srautus ir jų tvarkymą.
- 21.2. Tiekėjas turi pateikti mokslinių tyrimų ir literatūros apžvalgą, įvertindamas naujus metodus, technikas ar technologijas, kurios galėtų būti pritaikytos šiais atvejais.
- b) sprendinio variantų parinkimas pasirinktiems statiniams:
- 21.3. Remiantis Užduoties Nr. 1 rezultatais ir tarptautinės patirties vertinimu iš Užduoties Nr. 2(a), Tiekėjas turi įvertinti A, B ir (arba) C atvejus ir jų taikymą pasirinktiems statiniams ar jų dalims. Tiekėjas šiam tikslui su pateiktu pagrindimu gali:
- Sugrupuoti pasirinktus statinius ar teritorijas pagal užterštumo charakteristikas arba struktūrinius panašumus.
 - Panaudoti suderinamumo matricą vertinant galimus sprendinių bendrumus bei vertinant persidengiančius elementus, pvz. bendrus atliekų apdorojimo metodus.
- 21.4. Tiekėjas turi įvertinti potencialiai užterštų pasirinktų statinių požeminių konstrukcijų, esančių giliau nei 0,5 m po žeme, dezaktyvavimo ir atlaisvinimo nuo radiacinės kontrolės galimybes (pagal statybos techninį reglamentą pastatas laikomas nugriautu, jei išardomos visos jo konstrukcijos, išskyrus likusias giliau nei 0,5 m žemiau žemės paviršiaus). Tokiu atveju giliau nei 0,5 m žemiau žemės paviršiaus neturi būti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų konstrukcijų. Arba likutinio užterštumo lygis neturi viršyti nustatytą SNRL (jei svarstoma ir taikoma).
- 21.5. Vertinant atitinkamų dezaktyvavimo ir griovimo bei RA sutvarkymo metodus ir technologijas Tiekėjas turi atsižvelgti į:
- 21.5.1. Vertinant dezaktyvavimo galimybes, atkreipti dėmesį į paviršinių ir gilių užterštų zonų dezaktyvavimą, parinkti tinkamas priemones ir įrankius. Dezaktyvavimas nesusilpninant pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų/išlaikant stabilumą.
- 21.5.2. Įvertinti susidariusių atliekų pakartotinį panaudojimą likusių požeminių konstrukcijų užpildymui (ar kitą sprendinį) taikant SNRL, įskaitant galimą poveikį požeminiam vandeniui.
- 21.5.3. Parengti lokalizavimo sprendimų analizę (siekiant užtikrinti emisijų apribojimą ir kontrolę), neapsiribojant esama sistema, remiantis geros praktikos analize.
- 21.5.4. Įvertinti esamų vėdinimo sistemų poreikį ir naudojimą bei galimybes jas optimizuoti.
- 21.5.5. Apšvitos rizikos kontrolės sudėtingumas, galimas radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į aplinką. Kitos Tiekėjo numatytos galimos saugos užtikrinimo problemos.
- 21.5.6. Įvertinti poreikį ir sprendimą dėl laikino saugojimo. Vertinant susidarančių atliekų kiekio prognozę, galutinio atliekų sutvarkymo variantą ir kitas galimas alternatyvas.
- 21.5.7. Įvertinti atliekų apdorojimo galimybes (betono atskyrimas nuo plieno, betono smulkinimas, betono pjaustymas į blokus, susmulkinto betono frakcijų atskyrimas ir kt.), parinkti reikalingus matavimus, rūšiavimo/apibūdinimo priemones ir būdus.
- 21.5.8. Įvertinti atliekų sutvarkymo optimizavimą, siekiant maksimaliai atlaisvinti susidariusias RA (dabartiniu IAE vertinimu 95% betono atliekų galėtų būti atlaisvinta).
- 21.5.9. Įvertinti naujų apdorojimo įrenginių (in-situ/greta kitų atliekų tvarkymo kompleksų/kombinuoto sprendimo) poreikį, jų įrengimo ir eksploatavimo kaštų vertinimo gaires (tiesiogines atliekų apdorojimo valandas/m³, bendrą atliekų apdorojimo kiekį/srautus) iš panašių projektų, atsižvelgiant į galimus atliekų srautus ir atliekų susidarymo vietas.

21.5.10. Vertinant galimus sprendinius turi būti užtikrinamas proceso integralumas, optimalus esamos ar naujos infrastruktūros išnaudojimas, išvengiant potencialių „butelio kakliukų“ procese.

c) Sprendinių palyginimas ir reitingavimas:

21.6. Tiekėjas turi įvertinti kiekvieną sprendinio variantą naudojant kriterijų rinkinį, kuris apima:

- Įgyvendinimo laikas palyginus su kitais sprendiniais.
- Kaina, palyginti su kitais sprendiniais.
- Prognozuojama personalo dozė palyginus su kitais sprendiniais.
- Palyginamas numatomas atliekų susidarymas pagal rūšį ir klasę (įskaitant siūlomas pakuotes).
- Palyginama technologijos branda panašiuose sprendiniuose.
- Bet kokie kiti konsultanto rekomenduojami ir pateikti IAE komentarams papildomi kriterijai.

21.7. Kriterijų svorių parinkimas turi būti atliktas Tiekėjo ir pateiktas IAE komentarams.

21.8. Reitingavimas turi būti atliekamas Tiekėjo atstovų ir pateiktas IAE komentarams. Pagal poreikį bus organizuojamas atskiras susitikimas/dirbtuvės dėl šio klausimo.

21.9. Tiekėjas turi pritaikyti sutartus svorius kiekvienam kriterijui ir sureitinguoti sprendinius:

21.9.1. Paaškinant visas taikytas prielaidas ir pateikiant motyvus. B atvejo variantų atveju turi būti pateiktos ir paaškintos gilesnio dezaktyvavimo nutraukimo sąlygos.

21.9.2. Nustatytos kiekvienos įvertintos galimybės pagrindinės rizikos ir prielaidos (pateikiant rizikos aprašymą, poveikio vertinimą, tikimybių vertinimą ir rizikos mažinimo priemones). Sprendimo priėmimo aprašyme nurodyti šiuos veiksnius ir kaip jie lemia optimalų dezaktyvavimo, griovimo ir atliekų tvarkymo strategijos pasirinkimą. Įtraukti švelninimo priemonės prielaidoms, kurios gali reikšmingai paveikti sprendimo taikymą.

21.9.3. Vertinant įgyvendinimo laiką ir kaštus, pateikti palyginamuosius finansinius ir laiko efektyvumo rodiklius kaip bendri dezaktyvavimo kaštai (Eur) / dezaktyvuoto ploto vienetui (m^2), bendras laikas skirtas dezaktyvavimui (h) / dezaktyvuoto ploto vienetui (m^2), radioaktyvumo lygiai prieš ir po dezaktyvavimo (radioaktyvumo lygio sumažinimas), griovimo kaštai (Eur) / griovimo metu susidariusių atliekų vienetui (m^3), bendras griovimo metu susidariusių atliekų kiekis (m^3) / bendras griovimo laikas (h), RA tvarkymo kaštai (Eur) / sutvarkytų RA vienetui (m^3) įskaitant atliekyno kaštus, rekultivacijos kaštai (Eur) / griovimo aikštelės ploto vienetui (m^2).

22. Rekomenduotino sprendimo parinkimas:

22.1. Sureitinguoti ir rekomenduoti sprendimą kiekvienam statiniui kaip visumai, aiškiai nurodant sprendimo priėmimo procesą.

22.2. Pasirinktose A ir B atvejo parinktyse apibendrinti apskaičiuotas vertes (laiko skalę, kainą, personalo dozę, atliekų susidarymą), siekiant pasiekti numatytą dezaktyvavimą.

22.3. Pasirinkus C atvejo parinktį, įvertinti papildomą laiką, sąnaudas ir personalo dozės poveikį po standartinio griovimo ir nurodyti būtinus teisinės bazės pakeitimus.

23. Tiekėjas IAE peržiūrai turi pateikti projekto sprendinių variantų ataskaitos projektą, kuriame turi būti sprendinių vertinimai, rekomenduojamo sprendimo aprašymas bei jo pagrindimas.

24. Vertinant darbų planavimą ir eksploatavimo nutraukimo grafiką, Tiekėjas turi atsižvelgti į:

24.1. pagrindinių reaktoriaus pastatų griovimo pradžia priklauso nuo reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo ir antrojo etapo įrangos pašalinimo A1 ir A2 blokuose eigos ir rezultatų. 150 pastato kompleksas ir 157 statinio saugyklos ir kiti 1 priede nurodyti statiniai gali būti nugriauti anksčiau, todėl nėra kritiniame IAE eksploatavimo nutraukimo kelyje.

24.2. Pasirengimo dezaktyvavimui, griovimui ir atliekų tvarkymui, įskaitant būtiną infrastruktūros sukūrimą, terminas yra iki pagrindinio reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo darbų pabaigos.

25. Nagrinėdamas taikomus sprendinius, Tiekėjas turi įvertinti:

25.1. Branduolinę, radiacinę saugą, pagal numatytus BSR reikalavimus ir IAEA saugos standartų rekomendacijas;

25.2. Minimaliausią, racionaliausią sprendinį (pvz. giluminiame atliekyne laidoti poveikis būtų minimaliausias, bet neracionalus), t. y. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir

netiesioginį parinktų technologijų sukeltų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai ir personalui, tiesioginį ir netiesioginį galimą poveikį aplinkos elementams (vandeniui, orui) ir šių aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai²;

- 25.3. Pagal atlikto suminio PAV rezultatus nustatčius optimaliausią ir racionaliausią poveikį aplinkai, visuomenei ir personalui keliantį technologinį sprendinį, Tiekėjas turi numatyti priemones, kurių turi būti imamasi, siekiant išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės bei personalo sveikatai, jį sumažinti, ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti.
- 25.4. Siūlomo sprendinio grafiko įgyvendinamumą, kitų susijusių IAE projektų patiriamą ir jų daromą poveikį (aktuali informacija apie susijusius projektus, jų statusą ir progresą bus pateikta po Sutarties pasirašymo) bei suderinamumą su IAE galutiniu eksploatavimo nutraukimo planu.
26. Netaikoma šios Sutarties apimtyje:
 - 26.1. Kitų IAE dokumentų modifikacijos (tokių kaip GENP, saugumo analizės, techninio projekto dokumentacija).
 - 26.2. Techninių sprendinių dokumentacijos rengimas ar statinių konstrukcinio vientisumo skaičiavimas, tai bus atliekama vėlesniuose etapuose rengiant techninį griovimo projektą.
 - 26.3. Hidrogeologinio modelio parengimas, sąlyginių nebekontroliuojamų lygių apskaičiavimas.
 - 26.4. Tiekėjui įvertinus papildomų matavimų poreikį, matavimų atlikti nereikės.
 - 26.5. 101/1 ir 101/2 kaminų griovimas – tai bus organizuojamas kaip atskiras projektas.

VI. SKYRIUS BENDRIEJI PASLAUGŲ REIKALAVIMAI

27. Reikalavimai saugai svarbių paslaugų pirkimui:
 - 27.1. Sutarties vykdymui Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal IAE nustatytus reikalavimus. Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Tiekėjas privalo pateikti IAE ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Užsakovas, įvertinęs Tiekėjo pateiktą Kokybės užtikrinimo planą, pritaria jam arba pateikia pastabas per 10 kalendorinių dienų. Visais atvejais turi būti užtikrinta, kad Kokybės užtikrinimo plano suderinimo terminas neviršytų 60 kalendorinių dienų. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>.
 - 27.2. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus Tiekėjo (visų lygių subtiekių) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Tiekėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t. y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus. Saugai svarbaus produkto tiekėjo patikrinimai (kokybės vadybos auditai) planuojami sudarius sutartį ir atliekami kartą per 3 metus. Pagal esamą praktiką patikrinimas ilgiausiai gali užtrukti 3 dienas, tipiška tikrintojų skaičius iki 3 asmenų (įskaitant VATESI atstovą, kuris gali dalyvauti pasirinktinai).
 - 27.3. Kokybės užtikrinimo plane turi būti pateiktas projekto įgyvendinimo planas. Tai turi apimti aiškiai apibrėžtas gaires su suplanuotomis užduočių datomis, atsakingais asmenimis ir rezultatais. Kartu su tvarkaraščiu įgyvendinimo planą turi būti įtraukti siūlomi analizės ir sprendimų parinkimo metodai ir principai.
28. Perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28

² Kadangi Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso suminio PAV apimtyje atlikto radionuklidais užterštų pastatų dezaktyvavimo, griovimo bei susidariusių atliekų sutvarkymo PAV rezultatai bus tik preliminarūs, jeigu bus atitinkamai parengti iki atliekant šios TS apimtyje numatytas paslaugas, atlikto PAV rezultatai gali būti naudojami palyginimo tikslais.

įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3 punktas), todėl papildomi aplinkosauginiai reikalavimai perkamam objektui nėra nustatomi.

29. Tiekėjas turi aprašyti taikytus metodus vykdant Sutartį. Įskaitant, jei taikoma projekto įgyvendinime: statistinius (ar kitus) duomenų rinkimo, analizės ir neapibrėžtumų vertinimo metodus; organizacines ir procesų vertinimo metodikas aktualias šiam projektui; dezaktyvavimo, griovimo, atliekų tvarkymo technologijų įvertinimą palyginimo gairėmis, jei tokios yra prieinamos (angl. *benchmark*); poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimo metodikos, įskaitant poveikio mažinimo priemones; kaštų įvertinimų ir ilgalaikio finansinio poveikio ekonominę ir finansinę analizę (naudojant ISDC vertinimo struktūrą kur pritaikoma); kokybinės ir kiekybinės priemonės, padedančios priimti sprendimus; tvarumo bei inovacijų sprendimai/metodai ir kt.
30. Tiekėjo parengta dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.
31. Tiekėjas turi identifikuoti tą informaciją, kuri nebuvo pateikta Pirkėjo vykdant pirkimo konkursą ar pateikta prieš pasirašant Sutartį, tačiau yra ar bus reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Vadovaudamasis Sutartyje numatytais sąlygomis Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui prašymus suteikti tokią informaciją pateikdamas pagrindimą, kodėl tokia informacija yra reikalinga.
32. Remdamasis pagrįstais prašymais, Pirkėjas turi pateikti reikiamą informaciją per 10 darbo dienų (tik tuo atveju, kai jis tokią informaciją turi ir ji jam yra prieinama). Informacija (dokumentai, brėžiniai ir kt.) bus teikiama elektroninėmis (neredaguojamomis) bylomis jų originalo forma ir kalba (daugiausiai lietuvių ar rusų kalba). Jei prašoma informacija nėra lengvai prieinama, jos pateikimo terminai kiekvienu atveju turės būti suderinti tarp šalių.
33. Jei prašoma informacija Pirkėjui yra neprieinama, Tiekėjas bus informuotas ir turės priimti ir pagrįsti prielaidas, kurios bus naudojamos siekiant kompensuoti informacijos trūkumą.
34. Tiekėjo darbuotojai, einantys/išeinantys į/iš IAE saugomos zonos, privalo laikytis galiojančių VĮ Ignalinos AE taisyklių ir procedūrų. Apsilankymai IAE saugomoje zonoje turi būti planuojami iš anksto, pateikiant reikalingus dokumentus apsilankymui bent prieš 10 darbo dienų, tam kad IAE suorganizuotų reikalingus leidimus.
35. Paslaugų teikėjai ar lankytojai BEO kontroliuojamoje zonoje, privalo vadovautis šių dokumentų aktualiomis redakcijomis:
 - 35.1. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“;
 - 35.2. IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSEd-0512-2 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);
 - 35.3. Radiacinės saugos užtikrinimo, dirbant kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSEd-0512-7 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);
36. Paslaugų teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) nevykdys veiklos jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.
37. Radioaktyviai užteršta įranga ir įrankiai paslaugų teikėjui negrąžinami ir už juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginama.
38. Tiekėjo teikiamų dokumentų elektroninės bylos turi būti pateiktos neredaguojamu formatu (pvz. *.pdf) ir redaguojama forma (Word, Excel ir kt.). Suderinti ir patvirtinti dokumentai pateikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
39. Pirkėjas neatsako už Tiekėjo darbuotojų apgyvendinimo ir kelionių organizavimą bei susijusias išlaidas.
40. Tiekėjui rekomenduojama nusimatyti bent 3 keliones į IAE (pvz. kick-off susitikimui, apsilankymui pagrindiniuose reaktoriaus pastatuose ir radioaktyvių atliekų tvarkymo kompleksuose su palyda, Užduoties 1(a) pristatymui, susitikimams pristatyti tarpinius ir/ar galutinius rezultatus, planuojant kiekvienam vizitui apie 3-4 darbo dienas).

VII. SKYRIUS

STANDARTAI IR REGULIACINIAI REIKALAVIMAI

41. Teikdamas paslaugas Paslaugų tiekėjas turi atkreipti dėmesį į šiuos standartus (taisykles, teisės aktus). Vertinant ir siūlant galimus sprendimus, turi būti atsižvelgta į galiojančius teisės aktų ribojimus ir reikalavimus, specifiniams pasiūlymams teisės aktų pakeitimai gali būti pasiūlyti kaip sprendimo rezultatas (pvz. kaip vertinant C atvejį).

Lentelė 3 Taikomi įstatymai, taisyklės, standartai

Nr.	Normatyvinio teisės akto pavadinimas
	Lietuvos Respublikos įstatymai
1.	Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
2.	Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
3.	Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas
4.	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
5.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
6.	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
7.	Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
8.	Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
9.	Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas
	Tarptautinės sutartys
10.	Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija, 1997, įsigaliojo 2004-06-14, Ratifikuota.
	Branduolinės saugos reikalavimai
11.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti VATESI viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 22.3-132.
12.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, patvirtinti 2016-11-30 VATESI viršininko įsakymu Nr. 22.3-188.
13.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti VATESI viršininko 2011-10-06 įsakymu Nr. 22.3-95.)
14.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarantioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“
15.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“
16.	Branduolinės saugos taisyklės BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“
17.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“
18.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“
19.	Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“
	Kiti teisės aktai ir normatyviniai dokumentai
20.	HN 73:2018 Pagrindinės radiacinės saugos normos
21.	ISO 9001:2015 – kokybės valdymo sistemos standartas arba jam lygiavertis (angl. <i>Quality management systems</i>)
	Tarptautiniai rekomendaciniai dokumentai

Nr.	Normatyvinio teisės akto pavadinimas
22.	IAEA Safety standards series, Nr. RS-G-1.7. Application of the concepts of exclusion, exemption and clearance
23.	IAEA Safety standards series, Nr. GSG-18. Application of the concepts of clearance
24.	The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste. Specific Safety Guide No. SSG-23. IAEA, Vienna, 2012
25.	Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. Guide No. SSG-29. IAEA, Vienna, 2014
26.	Disposal of Radioactive Waste. Specific Safety Requirements No. SSR-5, IAEA, Vienna, 2011
27.	IAEA Safety Report Series, Nr. 44. Derivation of activity concentration values for exclusion, exemption and clearance
28.	The Safety Case and Safety Assessment for the Predisposal Management of Radioactive Waste. General Safety Guide No. GSG-3. IAEA, Vienna, 2013
29.	Fundamental Safety Principles. Safety Fundamentals No. SF-1 IAEA, Vienna, 2006
30.	Predisposal Management of Radioactive Waste. General Safety Requirements No. GSR Part 5. IAEA, Vienna, 2009
31.	IAEA GSR Part 3 "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards", 2014
32.	IAEA GSR Part 6 "Decommissioning of Facilities", 2014
33.	IAEA Safety Report 67 "Monitoring for Compliance with Exemption and Clearance Levels", 2012
34.	IAEA Technical Report "Dismantling of Contaminated Stacks at Nuclear Facilities", 2005
35.	Decontamination Methodologies and Approaches, No. NW-T-1.38, IAEA, Vienna, 2023
36.	Decontamination and Dismantling of Radioactive Concrete Structures, OECD/NEA, 2011
37.	EU Waste Management Protocol version 2024 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d63d5a8f-64e8-11ef-a8ba-01aa75ed71a1
IAE dokumentai	
38.	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekių vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103)
39.	VĮ Ignalinos atominės elektrinės galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (patvirtinta LR energetikos ministro 2020 08 11 įsakymu Nr.1-248)
40.	IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-21 (171 puslapis).
41.	IAE užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 puslapiai).
42.	IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSeD-0512-2 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103)
43.	Radiacinės saugos užtikrinimo, dirbant kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSeD-0512-7 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103)
	Dauguma teisės aktų prieinami čia: https://vatesi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/

VIII. SKYRIUS SUTARTIES VALDYMAS

42. Sutarties vykdymo ir statuso aptarimai dažniausiai bus vykdomi ne rečiau kaip kas 2 savaites (naudojantis telekonferencijų priemonėmis, pvz Microsoft Teams platforma. Kiekvieno susitikimo rezultatai bus protokoluojami). Aptarimų dažnumas gali būti koreguojamas (atskiriems etapams ar konkrečių susitikimų laikas), apie tai iš anksto informavus Pirkėjas ir gavus pritarimą el. paštu kontaktinio asmens nurodyto Sutartyje arba kitaip sutarus raštu su IAE.
43. Tiekėjas kas mėnesį turi pateikti progreso ataskaitą, parengtą pagal projekto įgyvendinimo planą, pateikiant esamas rizikas ir iššūkius.

IX. SKYRIUS PASLAUGŲ GRAFIKAS

44. Paslaugų suteikimo trukmė – 18 mėnesių.
45. Paslaugų suteikimas bus skirstomas į šiuos pagrindinius etapus:
 - 45.1. Parengtas Kokybės užtikrinimo planas ir Projekto įgyvendinimo planas;
 - 45.2. Užduotis Nr. 1: Statuso ir Trūkumų Analizė dėl turimų duomenų apie statinių užterštumą, naudojamų metodų, poreikio atlikti papildomą modeliavimą ir kt. (angl. *status and gap analysis*)
 - 45.3. Užduotis Nr. 2: Projekto sprendinių vertinimo analizė su parinktu rekomenduotinu sprendiniu, pagal numatytus techninės specifikacijos reikalavimus (angl. *optioneering analysis*).
46. Užduočių terminai ir numatomi rezultatai pateikti lentelėje žemiau:

Lentelė 4 Paslaugų suteikimo etapai

Nr.	Užduotis	Terminas	Rezultatas
1.	Parengtas kokybės užtikrinimo planas (KUP) ir Projekto įgyvendinimo planas (kaip dalis KUP). Projekto įgyvendinimo planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į atskirų etapų rezultatus (ar identifikavus papildomų matavimų poreikį) ir rekomendacijas, suderinus su IAE.	60 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos	Parengtas ir suderintas KUP
2.	Statuso ir trūkumų analizės projektas	5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos	Parengtas ataskaitos projektas, atliktas pristatymas.
3.	Statuso ir trūkumų analizės galutinis variantas	9 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos	Parengta ataskaita, pristatymas, paslaugų priėmimo aktas.
4.	Projekto sprendinių vertinimo analizės projektas	14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos	Parengta ataskaita, pristatymas.
5.	Projekto sprendinių vertinimo analizės galutinis variantas	18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos	Parengta ataskaita, pristatymas, paslaugų priėmimo aktas.

Siūlomi ataskaitų turinio pavyzdžiai pateikti 6 priede.

Projekto įgyvendinimo planas gali būti koreguojamas, apie tai iš anksto informavus IAE ir gavus pritarimą, atsižvelgiant į atskirų etapų rezultatus (ar jeigu būtų identifikuotas papildomų matavimų poreikis) ir rekomendacijas.

PRIEDAI

- Priedas 1. IAE aikštelės statiniai
- Priedas 2. Prognozuojama IAE aikštelės būklė, užbaigus eksploatavimo nutraukimą
- Priedas 3. IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
- Priedas 4. Informacija dėl atliktų radiologinių tyrimų statiniuose
- Priedas 5. Radionuklidų vektoriaus pavyzdžiai
- Priedas 6. Ataskaitų turinio pavyzdžiai

Atskirai pateikiami dokumentai:

Objektų aprašymas – Blokai

Objektų aprašymas – 150 pastato kompleksas

Objektų aprašymas – 157 statinio saugyklos



- 150 pastato kompleksas – skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas (150 statinys sujungtas su 151/154 statiniais (nuotekų ir vandens talpyklos). Šalia 150 pastato pastatytas ventiliacijos vamzdis (statinys 153), kurį su pastatu jungia ventiliacijos tunelis).
- 157 statinio saugyklos - 157 ir 157/1 yra kietųjų atliekų saugykla su išėmimo moduliais IM-3 ir IM-2.


Statinio pavadinimas	Žymėjimas plane	Komentarai
Pagrindinio korpuso pastatas, kurį sudaro:	101/1	
– Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu	A1	Ypač užterštas statinys
– Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas	B1	
– Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas	V1	
– Turbinų salės blokas	G1	
– Deaeratoriaus blokas	D1	
– Pagalbinio korpuso blokas	D0	
– Termofikacijos įrenginio blokas	119	
Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos talpų pastatas	117/1	Atliekami galutiniai tyrimai, bus griauamas
Techninio vandens tiekimo siurblinė	120/1	Atliekami galutiniai tyrimai
Dujų išlaikymo kamera (požeminis statinys)	135/1	
Mažo druskingumo vandens kaupimo talpos	152/1a 152/1b	
Pagrindinio korpuso pastatas, kurį sudaro:	101/2	
– Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu	A2	Ypač užterštas statinys
– Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas	B2	
– Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas	V2	
– Turbinų salės blokas	G2	
– Deaeratoriaus blokas	D2	
Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos talpų pastatas	117/2	Atlaisvintas, parengtas griovimui
Galerija nuo 101/2 past. iki 117/2 past.	173/2	Atlaisvintas, parengtas griovimui
Techninio vandens tiekimo siurblinė	120/2	Atliekami galutiniai tyrimai
Dujų išlaikymo kamera (požeminis statinys)	135/2	
Mažo druskingumo vandens kaupimo talpos	152/2a 152/2b	
Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo korpusas	150	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
150 past. ventiliacijos kaminas	153	
Komunikacijų estakada tarp 101/1 past. ir 150 past.	175	

Nuotekų (drenažų) kaupimo talpos	151	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
Nuotekų kaupimo ir išvalyto vandens talpos	154 154 a,b	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
Mažo aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla	155 155/1	
Trumpaamžių ir ilgaamžių labai mažo aktyvumo, mažo ir vidutinio aktyvumo kietųjų atliekų saugykla su išėmimo modulių (IM-3)	157	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
Trumpaamžių ir ilgaamžių labai mažo aktyvumo, mažo ir vidutinio aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos vent. kamera	157a	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
Trumpaamžių ir ilgaamžių labai mažo aktyvumo, mažo ir vidutinio aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla su išėmimo modulių (IM-2)	157/1	Daroma prielaida, kad šiame statinyje yra didelis užterštumas
B2-1 projekto apimtyje įrengti įrenginiai (išėmimo modulis, rūšiavimo modulis, pagalbinė įranga, teritorija)	B2	
Specialusis mašinų garažas ir plovykla	159	
Pramoninių atliekų tvarkymo kompleksas	159b	
Pramoninių atliekų atliekynas („poligonas“)	155/2, 3, 4	
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginys	B10	
Rezervinė dyzelinė elektrinė	111	
Dyzelinio kuro rezervuarai	112	Atlaisvintas, parengtas griovimui
Remonto dirbtuvės	130/2	
Sanitarinės švarklos	140/1 140/2a	
Galerijos	174, 173/1, 174a	
Specialioji skalbykla	156	
Šviežio branduolinio kuro sandėlis (tik 01 patalpa)	165	
Administracinis pastatas	185	
IAE apsaugos pastatas	185a	
Autokontrolinės saugomoje teritorijoje	187/1a 187/2	
Kontrolinė saugomoje teritorijoje	187/3	

Prognozuojama IAE aikštelės būklė, užbaigus Eksploatavimo nutraukimą

GENP nustatyta prognozuojama IAE aikštelės būklė. Schemoje pažymėti objektai, kurie lieka BEO. Schema yra preliminarini ir gali keistis.

Prognozuojama IAE aikštelės būklė, užbaigus eksploatavimo nutraukimą.

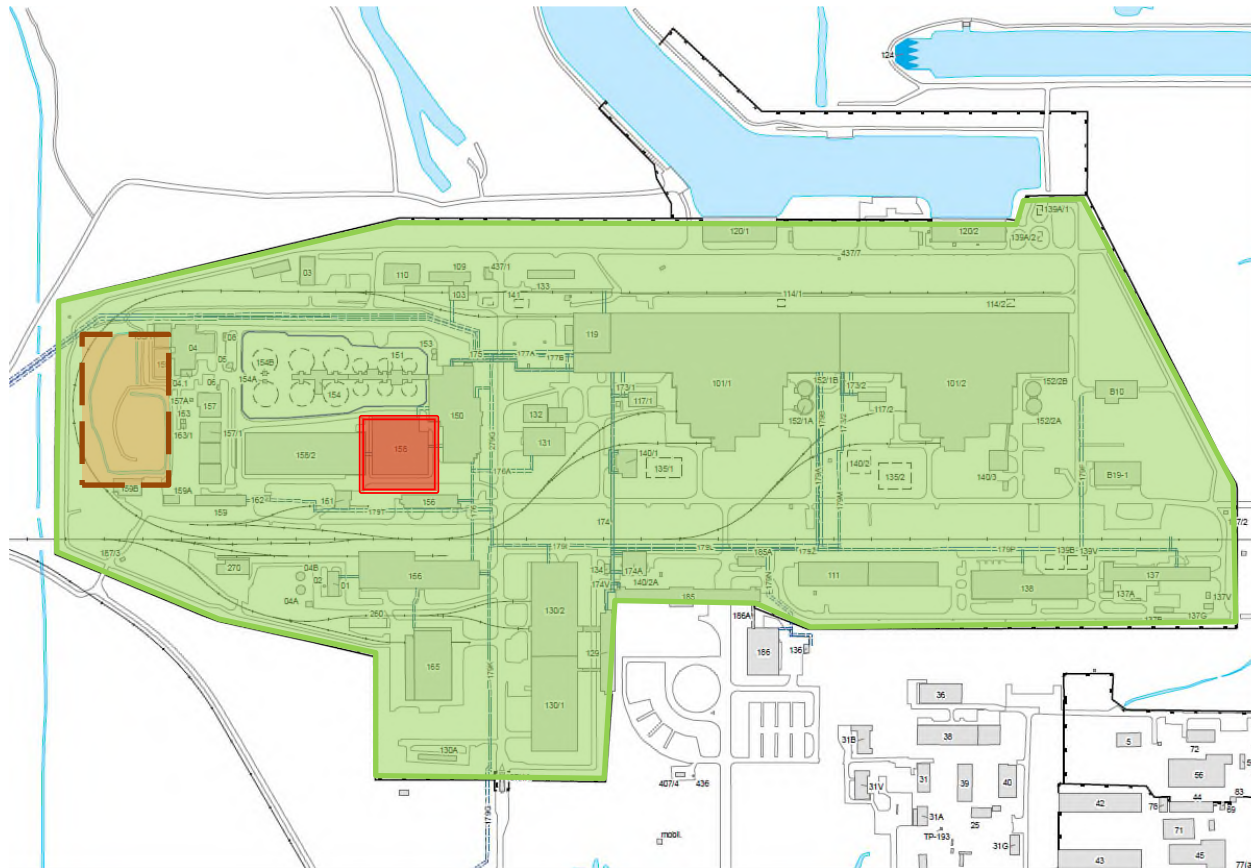


Nebekontroliuojami
lygiai

Pritaikyti SNRL

Liekantys BEO -
Bitumuotų RA
laikinoji saugykla.

Prognozuojama IAE aikštelės būklė, jei blokų teritorijoje bus taikomi SNRL.

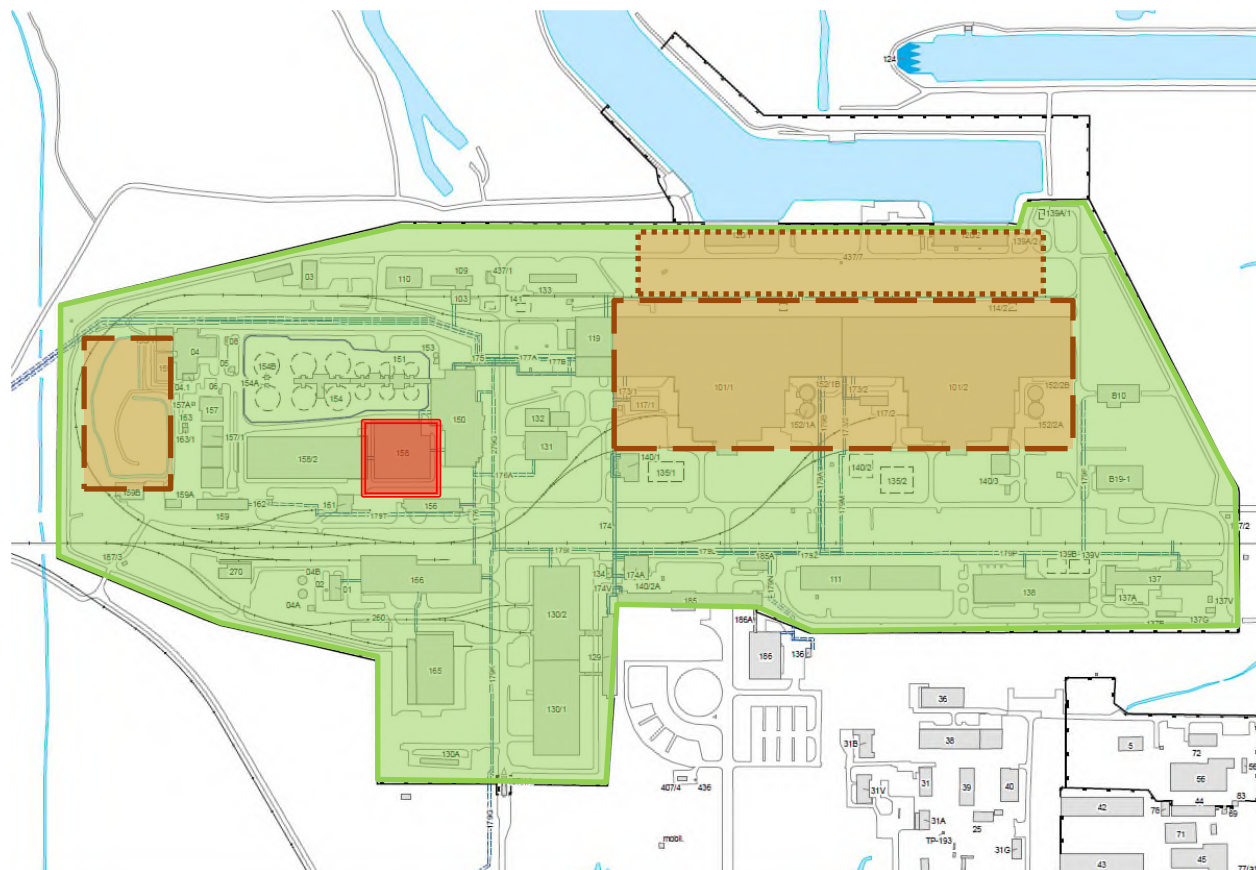

Nebekontroliuojami
lygiai


Pritaikyti SNRL

Pritaikyti SNRL:
cirkuliaciniai
vamzdynai

Liekantys BEO -
Bitumuotų RA
laikinoji saugykla.

IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

- Smuļķiņu radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų paėmimas ir pradinis apdorojimas
- Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių paėmimas ir pradinis apdorojimas
- Radioaktyviųjų šaltinių transportavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje

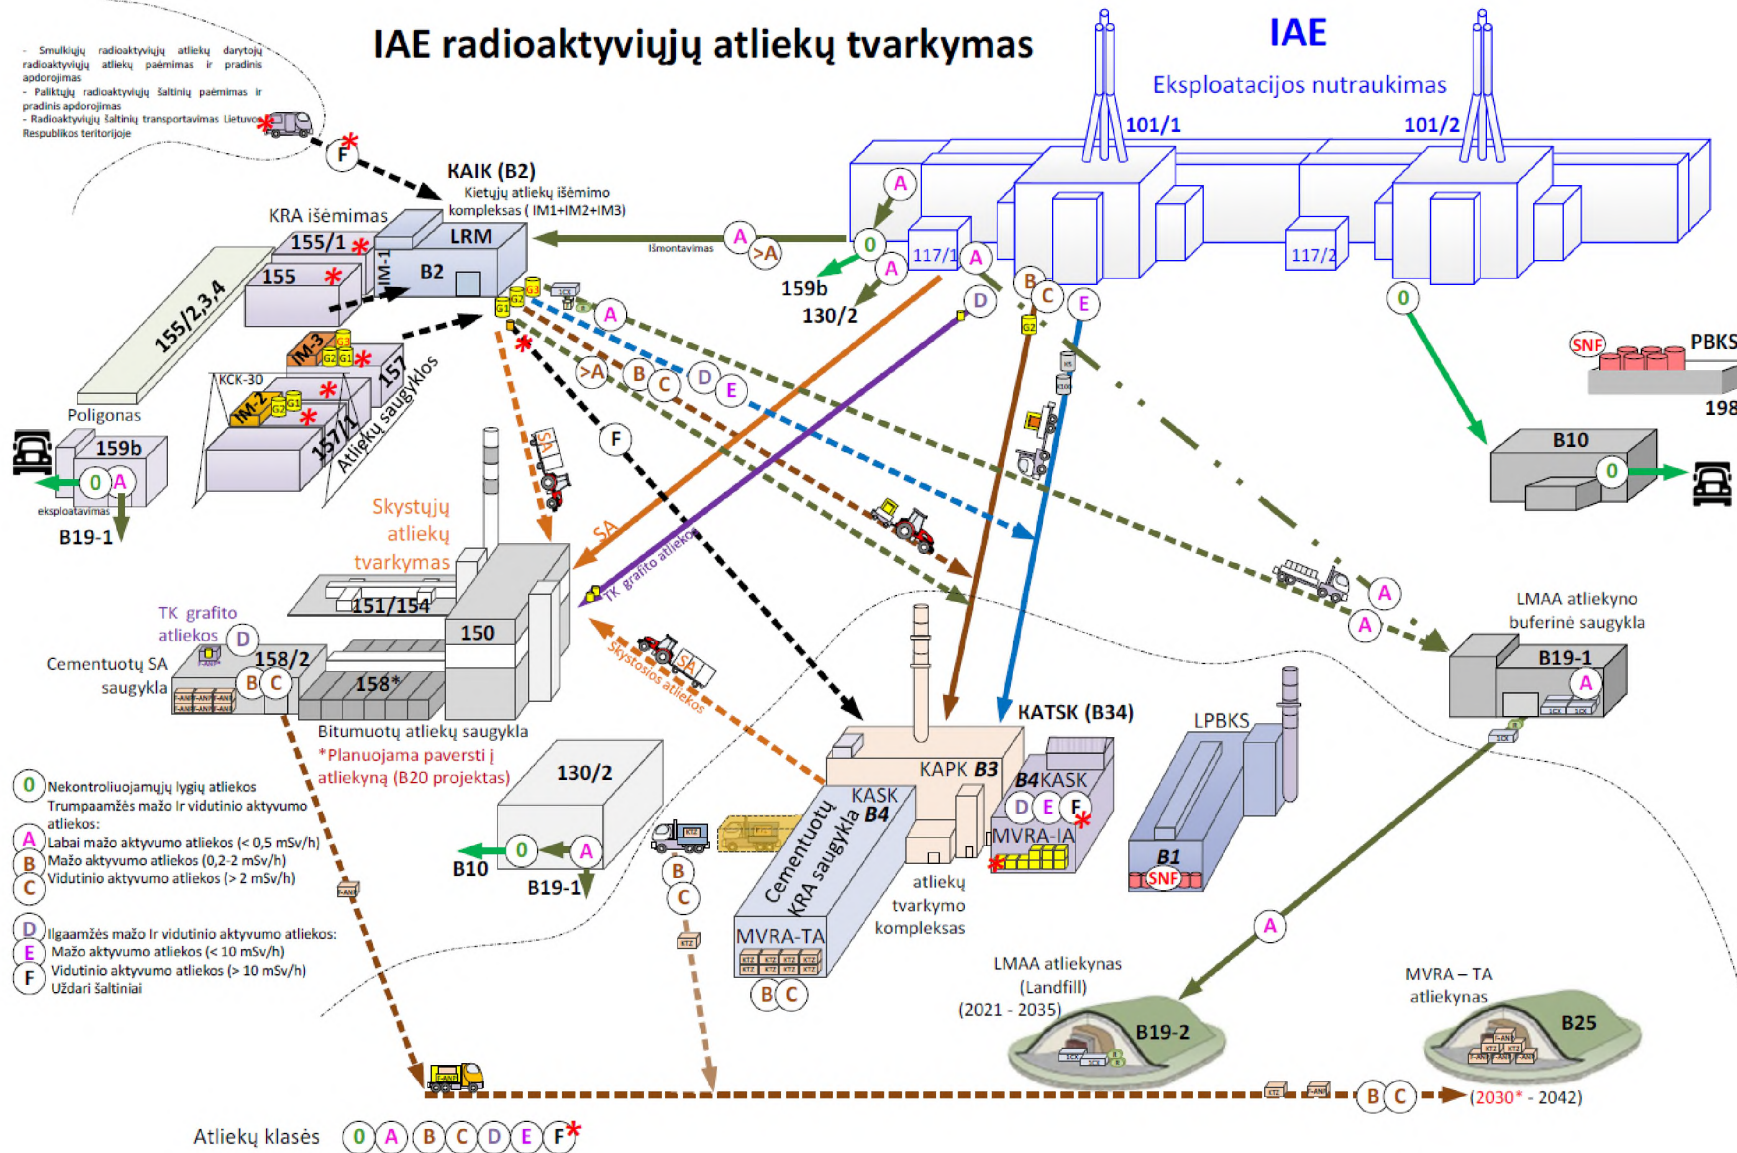

Nuo 2006 m. IAE buvo vykdomi radiologinio apibūdinimo ir inžinerinės inventORIZacijos procesai. Siekiant įvertinti užteršto betono kiekį, 2015 m. buvo sudarytos visų IAE kontroliuojamos zonos patalpų duomenų bazė. Pagal užteršto betono mėginių radiologinius tyrimus buvo atliktas patalpų sugrupavimas. Neturint duomenų apie patalpos radiologinius parametrus (gama spinduliuotės LDG ir paviršių užterštumą), buvo remiamasi istoriniu vertinimu.

3 klasė: gama spinduliuotės LDG patalpoje neviršija $0,2 \mu\text{Sv/h}$, o užterštumas – $0,4 \text{ Bq/cm}^2$.

2 klasė: gama spinduliuotės LDG patalpoje ribose $0,21 \div 0,24 \mu\text{Sv/h}$, o užterštumas – $0,41 \div 4,0 \text{ Bq/cm}^2$.

1 klasė: gama spinduliuotės LDG patalpoje viršija $0,24 \mu\text{Sv/h}$, o užterštumas – $4,0 \text{ Bq/cm}^2$.

Visos patalpos buvo sugrupuotos į 3 grupes pagal betono užterštumo tipą, remiantis keliais kriterijais: patalpos klasė pagal taršos tikimybę, pagal patalpoje sumontuotą radionuklidais užterštą įrangą arba sistemas, eksploatavimo istoriją, įskaitant neįprastus įvykius šiose patalpose (neįprastų įvykių duomenų bazės analizė).

Patalpos, kuriose yra maža taršos tikimybė (3 klasė ir 0 grupė), atitinka šias sąlygas: eksploatuojant IAE jos priskirtos 3 kategorijai pagal radiacinės saugos reikalavimus, pagal atliktus įrangos radiologinius tyrimus jie atitinka 3 taršos klasei. Po įrangos išmontavimo, patalpos funkcija nepasikeitė, avarinių ar neįprastų įvykių, susijusių su radioaktyvios taršos susidarymu nebuvo.

Patalpos, kuriose yra didelė taršos tikimybė, priskiriamos 1-2 klasei pagal įrangos radiologinius tyrimus. Jos skirstomi į 2 grupes:

2 grupė – tai patalpos, kuriose vyrauja antrinis betoninių konstrukcijų užterštumas. Jos skirstomos į patalpas, kuriose buvo atliekami įrangos išmontavimo darbai (2-1), o likusi dalis (2-2);

1 grupė – tai patalpos, kuriose vyrauja pirminis užterštumas, jos suskirstytos į 4 pogrupius:

- užterštos gamybinės veiklos metu, kuriose buvo atliekami įrangos išmontavimo darbai (1-1);
- užterštos vykdant gamybinius procesus (1-2);
- kurių paviršiai padengti metalo plokštėmis, ir atlieka betoninių konstrukcijų apsaugines funkcijas (1-3);
- užterštos neįprastų įvykių metu (1-4).

Pagal parengtą IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinių radiologinių tyrimų programą, tyrimai buvo vykdomi 1,5 metų (nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2017 m. liepos mėn.). Iširtos 83 visų grupių ir pogrupių IAE kontroliuojamos zonos patalpos. Buvo atlikti 5949 dozimetriniai matavimai, taip pat 3689 pagrindiniai tyrimų matavimai, susidedančių iš 83 gama spinduliuotės LDG kartogramų parengimo, 76 viso gama spektro matavimus patalpoje ir 3530 matavimų, atliktų stacionariu gama spektrometru iš betono konstrukcijų paimtų mėginių. Tyrimams atlikti buvo taikoma tokia matavimo ir mėginių ėmimo metodika:

- Patalpose, kuriose taršos tikimybė yra maža, buvo imti mėginiai (kernai), siekiant patvirtinti, kad užterštumo nėra. Vienoje patalpoje buvo imta ne mažiau kaip 2 mėginiai, o mėginių ėmimo gylis buvo ne mažiau kaip 50 mm. Nustačius, kad gama nuklidų aktyvumas kerno mėginyje viršija normatyviniuose dokumentuose nurodytus lygius (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės), tolesni tyrimai atliekami pagal patalpų, kuriose vyrauja antrinis užterštumas, algoritmą.

Be to, šio tipo patalpoms taikomas bendro gama spektro paėmimo patalpoje metodas. Gama spektrometras įrengiamas patalpos (arba jos dalies) centre. Vėliau gautas spektras analizuojamas (lyginamas su etaloniniu spektru);

- Patalpose, kuriose vyrauja antrinis užterštumas (2 grupė), matavimai ir mėginių ėmimas atliekami pagal šį algoritmą:
- Betoninės konstrukcijos tikrinamos ar nėra pirminio užterštumo, matuojant gama spinduliuotės LDG. Jei gama spinduliuotės LDG pasiskirstymas tolygus (nėra karštų taškų), kernai imami po 1 mėginį iš 10 m^2 grindų plote ir po 1 mėginį 20 m^2 sienų plote, o mėginių ėmimo gylis yra ne mažesnis kaip 50 mm. Nustačius, kad gama nuklidų aktyvumas kerno mėginyje viršija normatyviniuose dokumentuose nurodytus lygius (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės), didinamas mėginio ėmimo gylis;

- jeigu konstrukcijos yra su padidinta gama spinduliuotės LDG (daugiau kaip 5 kartus viršija foną), tolesni tyrimai šioje patalpoje atliekami pagal algoritmą, priskirtą stipriai užterštoms patalpoms;
- jei patalpoje esančių betoninių konstrukcijų gama spinduliuotės LDG neviršija $0,5 \mu\text{Sv/val.}$ vertės, gama spinduliuotės spektras nustatomas nešiojamuoju spektrometru. Atliekant matavimus prietaisas pastatomas patalpos centre (arba, jei reikia, jos dalyje);
- jei patalpoje esančių betoninių konstrukcijų gama spinduliuotės LDG neviršija $8 \mu\text{Sv/h}$, atliekami tiesioginiai beta taršos matavimai, kurie vykdomi dedant detektorių arti betono paviršiaus.

Labiausiai užterštų patalpų (1 grupė) matavimai ir kernų mėginių ėmimas atliekami pagal algoritmą:

- nustatomos vietos, kuriose yra padidėjęs gama spinduliuotės LDG nuo patalpoje esančių betoninių konstrukcijų. Šiose vietose kernai paimami maksimaliame gylyje (priklausomai nuo grindų storio ir betono sluoksnio). Sąlyga, leidžianti sumažinti mėginių ėmimo gylį, yra ta, kad jau paimtuose betono mėginiuose nustatomas gama spinduliuotę skleidžiančių nuklidų aktyvumas mažesnis už normatyviniuose dokumentuose nurodytus lygius (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės);
- sekantys mėginių ėmimo taškai nustatomi pagal spindulį (didžiausias žingsnis – 500 mm). Šiuose taškuose matuojamas gama spinduliuotės LDG. Remiantis jau paimtų kernų gama spektrometrinių matavimų rezultatais, nustatomas reikiamas mėginių ėmimo gylis;
- jei gama spinduliuotės LDG iš betoninių konstrukcijų ženkliai mažesnis (nutolus nuo užterštumo židinių), paimami kernai nustatyti antrinio užterštumo lygiui konstrukcijose. Kernai imami po 1 mėginį iš 10 m^2 plote, o mėginių ėmimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Jei mėginio kerne aptinkamas gama spinduliuojančių nuklidų aktyvumas, viršijantis normatyviniuose dokumentuose nurodytus lygius (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės), mėginio paėmimo gylis padidinamas.
- jei patalpos grindyse įrengta specialioji kanalizacija, latakai ar praėjimai, kernai imami arčiausiai jo, maksimaliame gylyje (priklausomai nuo perdangos storio). Sąlyga, leidžianti sumažinti mėginių ėmimo gylį, yra ta, kad jau paimtuose betono mėginiuose nustatomas mažesnis gama spinduliuotės nuklidų aktyvumas nei normatyviniuose dokumentuose nurodyti lygiai (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės);
- kernai taip pat imami iš vertikalių konstrukcijų, siekiant nustatyti antrinio užterštumo lygį jose. Kernai imti po 1 mėginį iš 20 m^2 plote, o mėginių ėmimo gylis – ne mažesnis kaip 50 mm. Jei paimtame kerne aptinkamas gama spinduliuojančių nuklidų aktyvumas viršija normatyviniuose dokumentuose nurodytus lygius (atlaisvinimo nuo tolimesnės kontrolės), mėginių ėmimo gylis didinamas.

Labiausiai užterštos buvo patalpos, kuriose buvo pirminis užterštumas, ir patalpos, kurios buvo paveiktos neįprastų įvykių padariniais. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, vidutinė betono dalis, kurią reikia pašalinti:

- patalpos su maža taršos tikimybe (0 grupė) – 1,29%;
- patalpos su antrine radioaktyviaja betono konstrukcijų tarša (2 grupė) – 3,39 proc.;
- patalpos su pirmine betoninių konstrukcijų radiologine tarša (1 grupė). Papildomai išskaidyta į pogrupius:

1-1 pogrupis. Gamybinės veiklos metu užterštos patalpos, kuriose buvo sumontuota pagrindinė G, V, D blokų ir pagalbinė A ir B blokų įranga. Vidutinė užteršto betono dalis – 5,42 %;

1-2 pogrupis. Gamybinės veiklos proceso metu užterštos patalpos, kuriose buvo sumontuota pagrindinė A, B blokų technologinė ar vandens valymo įranga, 150 pastato ir kt. Vidutinė užteršto betono dalis – 23,3 %;

1-3 pogrupis. Gamybinės veiklos proceso metu užterštos patalpos, kuriose buvo sumontuota pagrindinė A, B blokų, 150 pastato ir kt. pastatų pagrindinė technologinė įranga. Patalpų paviršius padengtas metalinėmis plokštėmis, atliekančiomis betono konstrukcijų apsaugines funkcijas. Vidutinė užteršto betono dalis – 17,7 %;

1-4 pogrupis. Patalpos, užterštos radionuklidais, neįprastų įvykių metu, susijusių su RA taršos išplitimu. Vidutinė užteršto betono dalis – 28,8 %.

2017 m. buvo baigtas visų IAE kontroliuojamos zonos patalpų gelžbetoninių konstrukcijų inžinerinis inventorizavimas. Vertinimo metu buvo remtasi inžineriniais architektūriniais ir statybiniais brėžiniais.

Kadangi patalpų sienos, grindys ir lubos priklauso kelioms gretimoms patalpoms, nustatant gelžbetoninių konstrukcijų kiekį, buvo daroma prielaida, kad pusė gelžbetoninių konstrukcijų tūrio priklauso tam tikrai patalpai. Grindys arba lubos yra išorinė patalpos siena, visas gelžbetoninių konstrukcijų tūris priklauso šiai patalpai. Duomenys pateikti lentelėje stulpelyje „Betono tūris, m³“. Remiantis gautais duomenimis, apskaičiuotas užteršto betono kiekis.

Eil. Nr.	Pastatas, statinys	Betono tūris, m ³ , 2018 m.	Užteršto betono tūris, m ³	Užteršto betono dalis statinyje, %	Betono dalis nuo bendro betono tūrio, %
1	Blokas A1	131863,130	22405,444	16,991	31,238
2	Blokas B1	16607,400	1655,661	9,969	2,308
3	Blokas B1	12432,356	348,728	2,805	0,486
4	Blokas G1	86271,048	3678,115	4,263	5,128
5	Blokas D1	51242,416	2753,830	5,374	3,839
6	Blokas D0	7401,300	180,196	2,435	0,251
7	Blokas A2	131888,480	19082,631	14,469	26,606
8	Blokas B2	16665,200	1676,678	10,061	2,338
9	Blokas B2	12467,300	333,752	2,677	0,465
10	Blokas G2	88465,398	3731,854	4,218	5,203
11	Blokas D2	51243,000	3472,709	6,777	4,842
12	119 pastatas	4595,300	59,279	1,290	0,083
13	117/1 pastatas	2807,000	69,263	2,468	0,097
14	117/2 pastatas	1807,300	51,922	2,873	0,072
15	129 pastatas (nugriautas)	1104,600	1,120	0,101	0,002
16	130/2 pastatas	15991,100	1092,941	6,835	1,524
17	135/1,2 pastatas	3136,600	730,828	23,300	1,019
18	140/1 pastatas	1295,800	24,708	1,907	0,034
19	140/2A pastatas	2442,900	40,794	1,670	0,057
20	150 pastatas	28163,789	2356,042	8,366	3,285
21	151/154, 154A,B statinys	18137,400	3248,809	17,912	4,530
22	152/1A,B, 152/2A,B statinys	2466,000	355,201	14,404	0,495
23	153 statinys	627,000	26,426	4,215	0,037
24	155/1, 155/1 statinys	1290,100	222,509	17,247	0,310
25	156 statinys	3306,200	84,609	2,559	0,118
26	157, 157/1 statinys	9671,900	1689,590	17,469	2,356
27	158 statinys	9556,800	1496,225	15,656	2,086
28	158/2 pastatas	15203,800	729,874	4,801	1,018
29	159, 159B pastatai	1248,300	34,175	2,738	0,048
30	165 pastatas	977,800	33,147	3,390	0,046
31	173/1,2, 174, 174A,B,C statinys	924,000	11,920	1,290	0,017
32	175 statinys	956,400	44,992	4,704	0,063
Viso:		732257,117	71723,971	9,795	100,000

Kodavimas	NV-G1-3		NV-A1-1
Nustatymo data	2007-05-31		2018-01-01
Nuklidas/ atraminis nuklidas	Co-60	Cs-137	Co-60
¹⁴ C	8,77E-04	-	9,80E-03
³⁶ Cl	-	-	1,00E-03
⁵⁴ Mn	1,70E-01	-	1,80E-04
⁵⁵ Fe	4,20E+00	-	5,50E+00
⁵⁹ Ni	2,25E-03	-	3,10E-03
⁶⁰ Co	1,00	-	1,00
⁶³ Ni	2,70E-01	-	3,60E-01
⁶⁵ Zn	1,56E-04	-	5,70E-09
⁹⁰ Sr	1,70E-03	-	3,50E-02
⁹³ Zr	3,60E-05	-	2,60E-02
^{93m} Nb	2,95E-01	-	6,40E-01
⁹⁴ Nb	2,30E-02	-	2,50E-02
⁹⁹ Tc	1,97E-05	-	8,00E-05
^{110m} Ag	1,00E-03	-	1,10E-08
¹²⁹ I	-	4,73E-07	1,20E-06
¹³⁴ Cs	-	9,00E-02	1,90E-03
¹³⁵ Cs	-	-	1,90E-06
¹³⁷ Cs	-	1,00	4,30E-01
²³⁴ U	4,38E-07	-	5,60E-07
²³⁵ U	8,73E-09	-	1,40E-08
²³⁸ U	1,37E-07	-	1,60E-07
²³⁷ Np	2,78E-08	-	2,50E-08
²³⁸ Pu	1,45E-04	-	1,10E-04
²³⁹ Pu	6,96E-05	-	7,10E-05
²⁴⁰ Pu	1,18E-04	-	9,10E-05
²⁴¹ Pu	8,56E-03	-	8,30E-03
²⁴¹ Am	1,97E-04	-	5,10E-04
²⁴⁴ Cm	9,82E-05	-	1,40E-04
¹⁵² Eu	-	-	2,70E-02
¹⁵⁴ Eu	-	-	1,90E-02

Statuso ir Trūkumų analizė ataskaita

(siūlomas ataskaitos turinys)

1. Santrauka

- Trūkumų analizės tikslų apžvalga.
- Pagrindinės išvados.
- Identifikuotų trūkumų svarba įgyvendinant projektą.

2. Įvadas

- Trūkumų analizės apimtis ir tikslas.
- IAE užterštų konstrukcijų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo apžvalga.
- Trūkumų analizės ryšys su galimybių analize ir bendru IAE eksploatavimo nutraukimo planu.

3. Esamos situacijos apžvalga

3.1. IAE užterštos konstrukcijos ir užteršto betono vertinimas

3.2. Aktualus eksploatavimo nutraukimo planas

4. Statuso ir trūkumų analizė

4.1. Išsami esamų duomenų apžvalga:

4.2. Radioaktyviųjų medžiagų kiekybinė analizė.

4.3. Trūkumų analizė ir ateities vertinimo planas

5. Identifikuotų trūkumų poveikis projekto tikslams

6. Papildomų matavimų poreikis

7. Trūkumų šalinimo rekomendacijos

7.1. Trūkumų apibendrinimas

7.2. Rekomendacijos patobulinimams

8. Išvados

- Pagrindiniai trūkumai.
- Trūkumų šalinimas ir poveikio mažinimas su tikslu pasiekti projekto tikslus ir atitikti reguliacinius reikalavimus.
- Sekantys žingsniai, atliekant sprendinių vertinimą.

Projekto sprendinių vertinimo ataskaita

(siūlomas ataskaitos turinys)

1. Santrauka
2. Įvadas
3. Alternatyvų vertinimo aprašymas, prielaidos
4. Geroji užsienio praktika
5. Išsamus galimų variantų aprašymas, galimų ir tinkamų alternatyvų parinkimas
 - 5.1. Betono dezaktyvavimas
 - 5.2. Griovimas
 - 5.3. Atliekų apdorojimas/atskyrimas
 - 5.4. Atliekų sutvarkymas
6. Netinkamų sprendinių atrinkimas
7. Atitikties matrica
8. Sprendinių reitingavimas
9. Sprendimo priėmimo modelis ir parinkimo procesas
10. Siūlomas rekomenduotinas sprendimas
 - 10.1. Planavimas
 - 10.2. Biudžeto vertinimas
 - 10.3. Rizikos ir neapibrėžtumai
 - 10.4. Saugos užtikrinimas
11. Išvados ir rekomendacijos

Priedai – naudoti modeliavimai, skaičiavimai ir atliktos analizės

Statinių aprašymai:

101/1 pastato (pagrindinio korpuso pastatas, įskaitant 119) aprašymas


101/1 pastatas yra už 400 m nuo Drūkšių ežero kranto. IAE aikštelė, kurioje yra pastatas, yra pietinėje ežero pakrantėje, už 6 km nuo Visagino miesto (1 pav.).




1 pav. Statinių išdėstymo schema

IAE 1-ojo energijos bloko pagrindinio korpuso pastatą sudaro:

A1 bloko pastatas yra pagrindinio korpuso centrinėje dalyje, ašyse 18/19-33/34, tarp D-ŠČ (Д-Щ) eilių. A1 blokas – stačiakampio formos daugiaaukštis pastatas su rūsiu altitudėse -12,00 m ir -7,20 m, ašyse 18/19-33/34, tarp eilių D-X, matmenys 90x84 m, su 24x18 m išsikišusia dalimi ašyse 24-28, tarp eilių X-ŠČ (X-Щ) ir mūriniu priestatu (priestato matmenys 6x10 m) ašyse 23-24, tarp eilių X-Š.

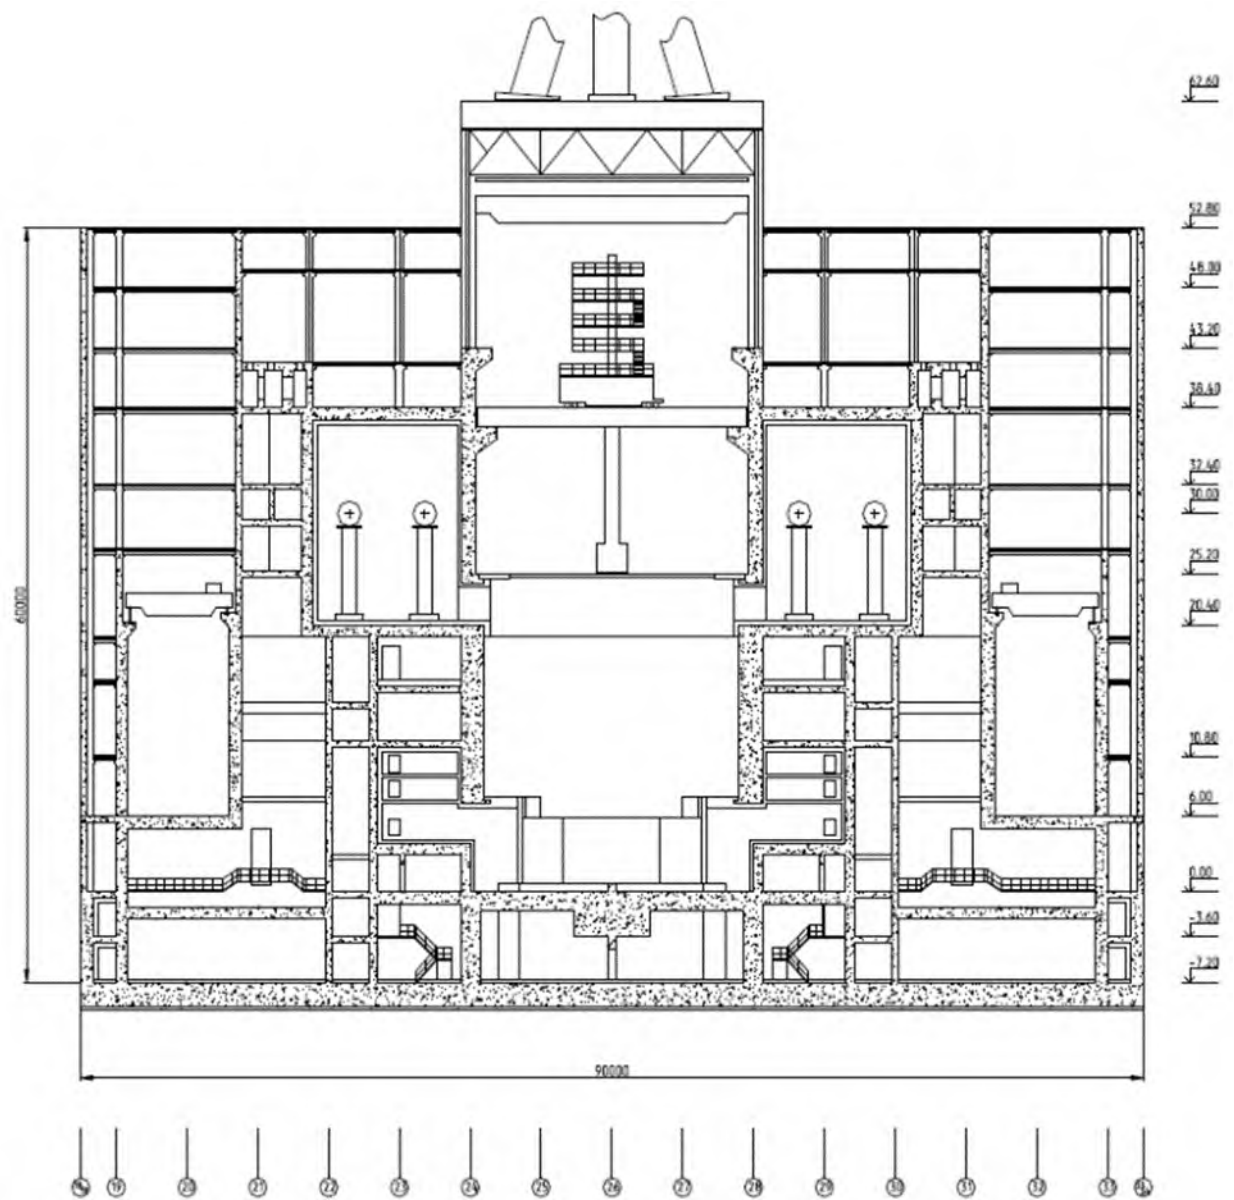

2 pav. A1 bloko A-A pjūvis

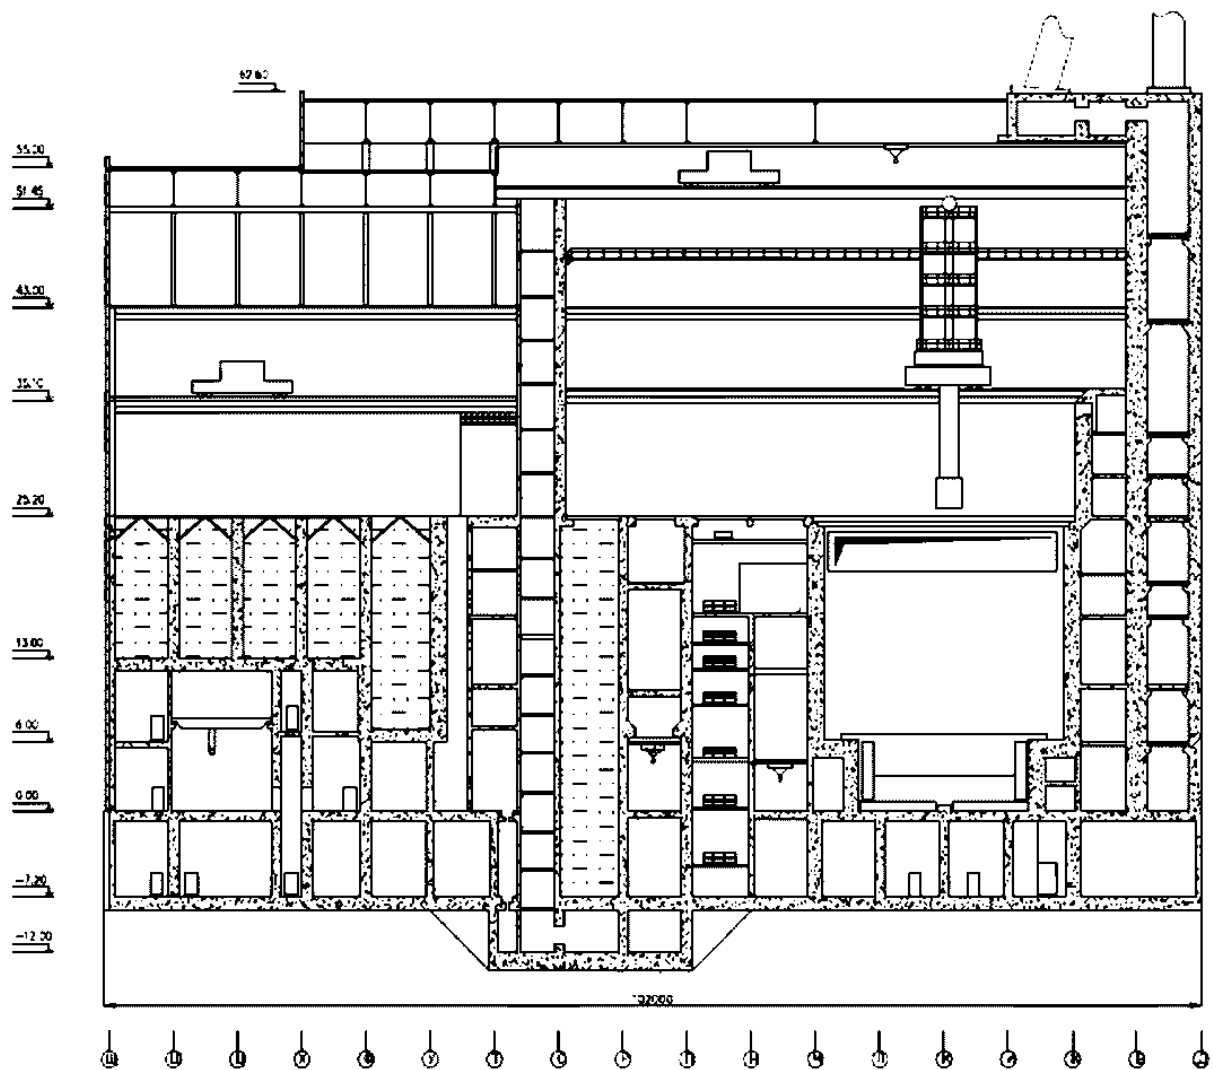

3 pav. A1 bloko B-B pjūvis


Pastato santykinis aukštis yra +62,6 m. (Pav. 2,3) Pastato konstrukcijos – monolitinės ir surenkamos. Pamatai – 1500 mm storio monolitinio gelžbetonio plokštė. Plokštės medžiaga – sunkusis hidrotechninis M300 stiprumo klasės betonas. Plokštė yra 9,00 m gylyje, o ašyse 24-28, tarp P-T eilių -13,80 m gylyje. Hidroizoliacija po plokšte – armuota stiklo audiniu bitumo ir gumos mastika. Požeminės dalies konstrukcijos yra monolitinės. Antžeminės dalies kolonos yra monolitinės ir surenkamos: gelžbetoninės ir metalinės. Laikančiosios sienos – monolitinės. Perdangos – monolitinės, surenkamosios monolitinės ir surenkamosios. Pertvaros – gelžbetoninės ir mūrinės (plytų mūro). Išorinės sienos – iš keramzitbetonio plokščių ir plytų. Danga – surenkama gelžbetonio ant rygelių ir metalinių santvarų, monolitinė. Ventiliacijos vamzdį ant stogo sudaro 3 dujų ventiliacijos vamzdžiai $\varnothing 4,8$ m su pagrindu altitudėje +62,60 m. Vienas vamzdis yra vertikalus iki altitudės +159,00 m, kiti du – pasvirę iki altitudės +122,00 m ir iki altitudės +152,40 m vertikalūs. Stogas yra plokščias su vidiniu vandens nuvedimu, įrengtas iš ruberoido, uždengtas mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis su papildomu ritininės plėvelės dangos sluoksniu iš „Wolfen“ medžiagos.

B1 bloko pastatas yra pagrindinio korpuso dešinėje pusėje, 33/34-39/40 ašyse, tarp D-T eilių. B1 blokas – daugiaaukštis stačiakampio formos pastatas su rūsiu -7,20 m altitudėje, su išsikišusia dalimi (30x66 m) ašyse 33/34-38/39, tarp eilių D-T, ašyse 38/39-39/40, tarp eilių D-I įrengta plytų mūro laiptinė ir lifto šachta, matmenys 6x18 m. Pastato viršaus santykinis aukštis yra +35,00 m. Pastato karkasas – surenkamas monolitinis. Pastato statybinių konstrukcijų ir stogo panašios į A1 bloko, tik jame nėra metalinių kolonų, santvarų ir monolitinės dangos.

V1 bloko pastatas yra pagrindinio korpuso kairėje pusėje, 14/15-18/19 ašyse, tarp D-T eilių.

V1 blokas – stačiakampio formos daugiaaukštis pastatas su rūsiu -7,20 m altitudėje, su išsikišusia dalimi (18x66 m) ašyse 15/16-18/19, tarp D-T eilių, ašyse 14/15-15/16, tarp eilių D-I įrengta laiptinė su lifto šachta, matmenys 6x18 m. Pastato viršaus santykinis aukštis yra +35,00 m. Kitais atžvilgiais pastato aprašymas panašus į B1 bloko.

G1 bloko pastatas yra 101/1 pastato šiaurinėje pusėje, 1-51 ašyse; tarp A-B eilių. G1 blokas – stačiakampio formos vieno tarpatramio skirtingų aukštų pastatas su rūsiu -6,40 m altitudėje, kurio matmenys 300x51 m, A eilės aukštis +32,80 m, B eilės aukštis +34,0 m (Pav. 4).

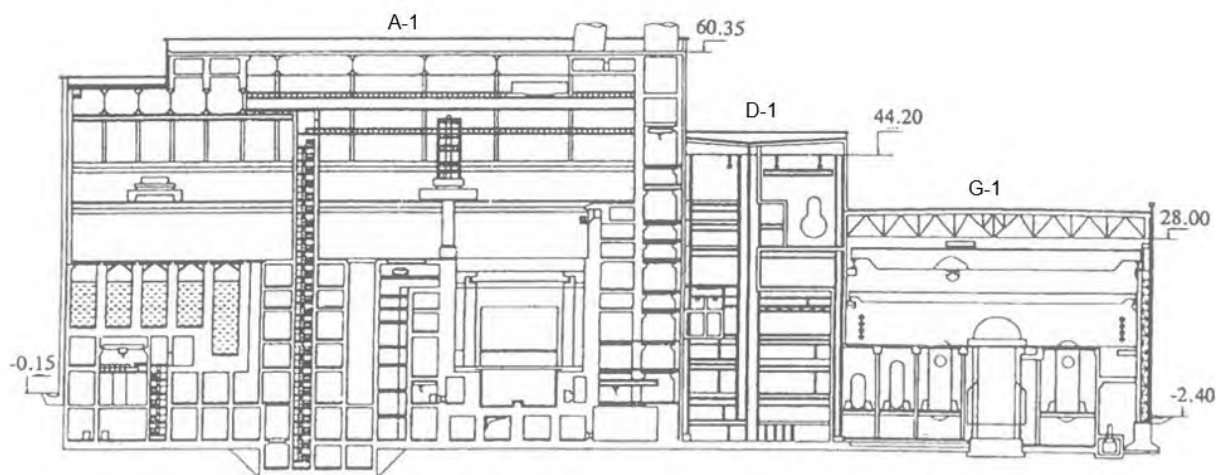

4 pav. 1 Bloko įrenginių B-B pjūvis

Pamatai – monolitinė gelžbetoninė plokštė su gelžbetoninėmis kolonų atramomis ir surenkamomis monolitinėmis turbogeneratorių atramomis. Laikančiosios sienos ir perdangos – monolitinės ir surenkamosios monolitinės. Karkasas – metalinis L formos rėmas su metaliniais ryšiais, kurį sudaro A eilėje esančios kolonos ir santvaros, besiremiančios į kolonas ir B eilėje į D1 bloko konstrukcijas. Priežiūros platformos yra metalinės. Pertvaros – gelžbetonio ir iš plytų. Išorinės sienos – iš keramzitbetonio plokščių. Danga – iš profiliuoto plieno. Stogas – vienslaitis su vidiniu vandens nuvedimu, dengtas ritinine plėvelės danga iš ALKORPLAN-35276 medžiagos ant izoliacijos iš akmens vatos plokščių „PAROC“.

D1 bloko pastatas yra tarp G1 bloko B eilėje ir A1, B1 ir V1 blokų G eilėje. D1 blokas yra stačiakampio formos daugiaaukštis, dviejų tarpatramių pastatas su rūsiu 7,20 m altitudėje, ašyse 1-51, tarp B-G eilių. Matmenys 300x25,5 m, aukštis – 46,4 m (Pav.4). Pamatai – monolitinė plokštė. Požeminės dalies gelžbetoninės konstrukcijos yra monolitinės. Karkasas – metalinės kolonos, sijos ir rygeliai. Deaeratorių patalpų sienos ir perdangos – monolitinės. Perdangos tarp aukštų – surenkamos monolitinės ir surenkamos. Pertvaros – gelžbetoninės ir plytų. Išorinės sienos iš keramzitbetonio plokščių. Danga – iš cinkuoto profiliuoto plieno. Stogas pagal konstrukciją panašus į A1 bloko stogą.

D0 bloko pastatas yra 101/1 pastato vakarinėje pusėje, ašyse 1-9; tarp B-G eilių. D0 blokas yra stačiakampio formos daugiaaukštis, dviejų tarpatramių pastatas su rūsiu -7,20 m altitudėje. Pastato matmenys 48x25,5 m, aukštis 34,6 m. Kitais atžvilgiais pastato aprašymas panašus į D1 bloko aprašymą.

119 pastatas yra iš 101/1 pastato vakarų pusės, ašyse 1-9; tarp A-B eilių, šliejasi prie bloko G-1 ašyje 1, prie bloko D-0 eilėje B. 119 pastatas – tai vieno aukšto, be rūsių, vieno tarpatramio pastatas. Tarpatramis tarp A-B eilių yra 51 m, bendras ilgis tarp ašių 1-9 – 48 m. Grindų altitudė -2,40 m. Stogo altitudė eilėje A +32,80 m, eilėje B +34,0 m. Monolitinės gelžbetonio plokštės ir karkaso atraminių metalinių kolonų monolitinių pamatų atramos žyma -9,50 m. Pastato plokštė ir kolonų pamatų atraminiai elementai polių lauke pagaminti iš hidrotechninio M300 markės betono. Patikimumą nuo gruntinio vandens slėgio sukeliama plūduriavimo užtikrina gelžbetoninė plokštė ir smėlio bei granito skaldos sluoksnis nuo altitudės -8,50 m iki altitudės -2,70 m. Kolonų pamatai A eilėje ir ašyje 9; atsižvelgiant į 12 m tarpą/žingsnį, yra pagaminti iš atskirų atramų. Pastato karkasas yra metalinis. Tarpai tarp kolonų ir santvarų yra 18 m. Tarp kolonų įrengti vertikalūs ryšiai. Išorinės sienos iš 12 m ilgio ir 300 mm storio keramzitbetonio plokščių. Danga yra iš cinkuoto profiliuoto plieno,

besiremiančio į metalines santvaras. Stogas yra sudėtingas: apšiltinimas/izoliacija iš pusiau standžių 50 mm storio mineralinės vatos plokščių, apsauginis 50-80 mm storio cemento smėlio išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacinė kiliminė danga iš 4 sluoksnių ruberoido ant bituminės mastikos. Eksploatacijos metu ant ruberoido dangos papildomai buvo padaryta vieno sluoksnio plėvelės ritininė danga iš „Wolfen“ medžiagos.

Bendrieji duomenys	A1 blokas	B1 blokas	V1 blokas	G1 blokas	D1 blokas	D0 blokas	119 pastatas	101/1 pastatas
Užstatytas plotas (m ²)								38875
Bendras plotas (m ²)	53596	12027	7132	31594	66174	7244	4865	182734
Tūris (m ³)	749810	66888	41815	555348	324577	40689	86522	1865649
Iš jų:								
Požeminės dalies (m ³)								292888
Antžeminės dalies (m ³)								1572761

101/2 pastato (pagrindinio korpuso pastatas) aprašymas

101/1 ir 101/2 pastatų konstrukcinėje dalyje esminių skirtumų nėra.

Bendrieji duomenys	A2 blokas	B2 blokas	V2 blokas	G2 blokas	D2 blokas	101/2 pastatas
Užstatytas plotas (m ²)						35087
Bendras plotas (m ²)	51126	11820	7116	32228	63616	116732
Tūris (m ³)	749810	66888	41815	555878	324047	1738438
Iš jų:						
Požeminės dalies (m ³)						275836
Antžeminės dalies (m ³)						1462602

Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas

150 pastato skystųjų atliekų tvarkymo kompleksas, kurį sudaro 150, 151, 153, 154, 154A, 154B statiniai. IAE skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui buvo įrengti tarpusavyje susiję bitumavimo ir cementavimo funkciniai kompleksai, kurie su atliekų talpyklomis ir kitais pagalbiniais objektais sudaro skystųjų RA tvarkymo infrastruktūros kompleksą.


150 pastatas. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo korpusas

150 pastatas „Skystųjų atliekų perdirbimo pastatas“ yra įrengtas IAE aikštelės saugomoje zonoje, jonizuojančios spinduliuotės zonos ribose. Pastatas yra skirtas perdirbti skystąsias radioaktyvias atliekas iš 101/1, 101/2, 130, 156 ir 159 pastatų, taikant išgarinimo ir cementavimo metodus. Pastato matmenys plane tarp 1÷22 ašių ir A÷H eilių yra 126,0mx66,5 m. Pastato aukštis skirtingas: tarp 3÷13 ašių ir A÷B eilių $H = 12$ m, tarp 1÷10 ašių ir B÷M eilių bei tarp 8÷21 ašių ir M÷H eilių $H=16,8$ m, tarp 10÷22 ašių ir B÷M eilių $H=36$ m. Pastatas ašyse 3÷13/A÷B – vieno aukšto, ašyse 1÷10/B÷M, 8÷20/M÷H – trijų aukštų, ašyse 10÷22/B÷M – septynių aukštų. Po pastatu yra rūšiai: ašyse 1÷3/B÷M ties žyma -3,00, ašyse 11÷19/M÷H ties žyma -4,80, ašyse 3÷4/B÷K ties žyma -6,00.

Pastato pamatų plokštė yra iš monolitinio gelžbetonio, o po išorinėmis pastato sienomis – surenkamos gelžbetoninės pamatų sijos. Pastato kolonos, perdangos ir stogo sijos, sijos ir perdangos plokštės pagamintos iš surenkamojo gelžbetonio. Ašyse 10÷22/B÷M yra 600 mm storio monolitinė gelžbetoninė plokštė iš M300 vandeniui atsparaus betono. Ašyse 11÷20/M÷N yra 700 mm storio monolitinė gelžbetoninė plokštė iš M200 vandeniui atsparaus betono. Ašyse 1÷4/B÷M yra 500 mm storio monolitinė gelžbetoninė plokštė M200 iš vandeniui atsparaus betono. Rūsio sienos yra 500 ir 600 mm storio iš M200 vandeniui atsparaus betono.

Visu pastato perimetru aplink išorines sienas įrengta 3% nuolydžio betoninė nuogrinda. Pastato išorinės sienos įrengtos iš 300 mm storio keramzitbetonio plokščių, kurių matmenys 1,2mx6,0m, pritvirtintų prie surenkamojo gelžbetoninio karkaso. Pastato karkasas pagamintas iš surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų. Kolonų tinklas yra toks: ašyse 1÷22/B÷H – 3×6, 6×6, 6×9, ašyse 8÷19/M÷H – 6×9, ašyse 4÷13/A÷B – 6×18. Rėmo tvirtumą ir stabilumą išilgine kryptimi užtikrina vertikalūs metaliniai ryšiai, sumontuoti išilgai kolonų tarp ašių 6÷7 ir 16÷17, o skersine kryptimi – rėmais suformuotos kolonomis ir skersiniais, sujungtais su monolitiniiais sienų masyvais. Kolonų pamatai yra iš monolitinio gelžbetonio M200 atsparaus vandeniui betono.

Iki altitudės +10.80 vidinės sienos iš monolitinio betono 600 mm storio, lubos iš monolitinio gelžbetonio 700 mm storio pagamintos iš sunkaus M200 markės betono ir sunkaus hidrotechninio betono $\gamma=2,4 \text{ t/m}^3$ M300 markės vandeniui atsparaus B6 markės betono. Monolitinės konstrukcijos armuotos armatūriniais tinklais ir atskirais strypais. Panaudotos armatūros klasė AI, AII ir AIII, skersmuo nuo 8 iki 40 mm. Virš +10,80 altitudės surenkamos gelžbetoninės pertvaros ir briaunuotos perdangos plokštės. Lubos iš surenkamų briaunotų gelžbetoninių plokščių. Laiptinių sienos iš plytų mūro 250mm storio.

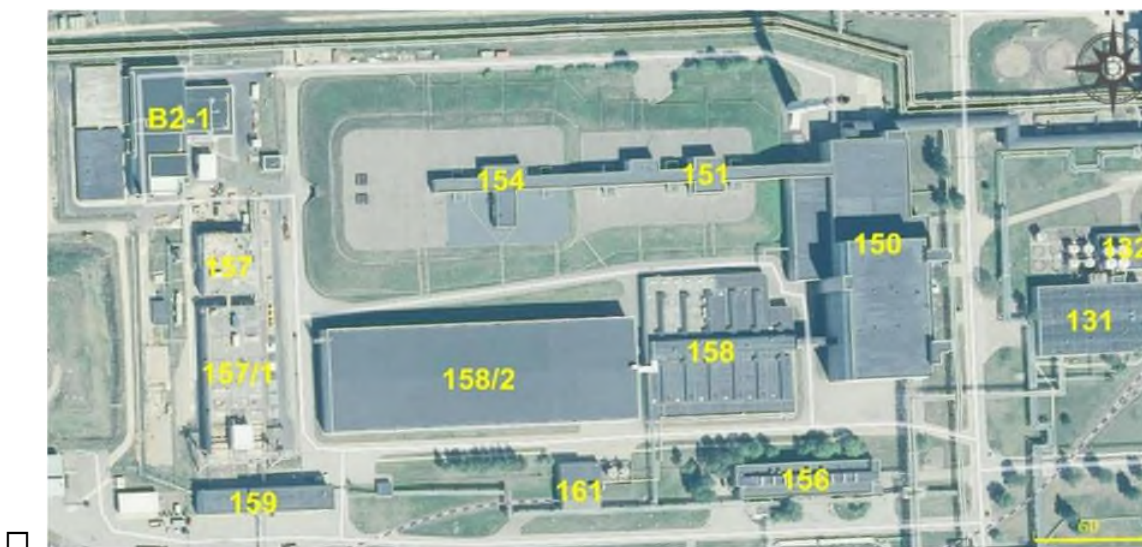

1 pav. 150 pastato vieta IAE aikštelėje


Šiaurinėje pusėje 150 statinys (1 pav.) ribojasi su technologine galerija, jungiančia 150 statinį komunikacijų estakada su 101/1 pastatu. Vakarinėje pusėje 150 ir 158 statiniai yra sujungti technologine galerija 150 statinys sujungtas su 151/154 statiniais (nuotekų ir vandens talpyklos). Šalia 150 pastato pastatytas ventiliacijos kaminas (statinys 153), kurį su pastatu jungia ventiliacijos tunelis. Nuo 150 pastato iki 101/1 pastato įrengta technologinė galerija (statinys 175).



2 pav. Bendras 150 statinio vaizdas

150 statinys (2 pav.) yra stačiakampis daugiaaukštis pastatas, kurio matmenys: ilgis – 126 m; plotis – 66,5 m, aukštis nuo -6,0 m iki +40,0 m. Bendras statinio plotas – 23209,09 m², tūris – 168365 m³. Antžeminėje pastato dalyje patalpos yra ±0,00, +6,00, +10,80, +15,60, +20,40, +25,20, +30,00 lygiuose. Pastato viršaus santykinis aukštis yra +40,00.

150 statinyje yra įrengta pagrindinė įranga (3 pav.), kuri skirta skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimui: du išgarinimo įrenginiai, du kondensato valymo įrenginiai, dvi bitumavimo linijos (neeksploatuojama nuo 2015 metų), cementavimo įrenginys ir kt. Technologinė įranga išdėstyta sandariose patalpose, vamzdynai – vamzdynų koridoriuose. Hermetiškų patalpų ir vamzdžių koridorių grindys išklotos korozijai atspariu plieniu.

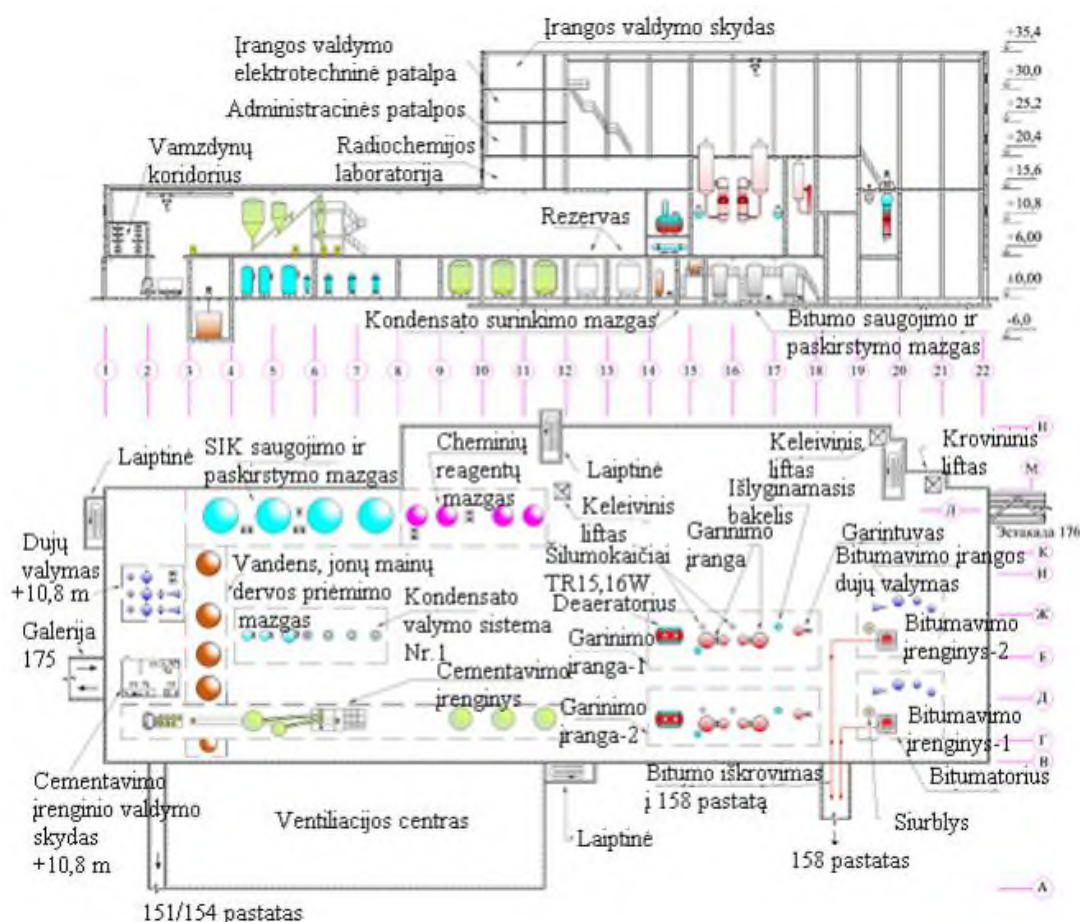

3 pav. 150 pastato pagrindinės įrangos išdėstymas


Cementavimo įrenginys yra 150 statinio ašyse A-E/1-6 šiose patalpose: Nr. 104, 105, 125, 126, 127 ties 0,00 žyma, Nr. 231 ties +6.00 žyma ir Nr. 324 ties +10,64 žyma.

153 statinys. 150 past. ventiliacijos kaminas

Monolitinio gelžbetoninio ventiliacijos kamino statybai naudotas M300 markės betonas armuotas A-III klasės Ø12-Ø16 mm armatūra. Gelžbetonio kamino sienų storis kintamas nuo 300 mm apačioje iki 160 mm alt.+70.00 m su išplatėjimu viršūnėje iki 250 mm. Vamzdžio vidaus skersmuo alt.0.00 m – 6,75 m, alt.+75.00 m – 4,18 m. Gelžbetoniniame vamzdyje alt.-0.02 m įrengta anga 2,40x3,75 m dujotakiui. Kamino vidinis paviršius cheminio poveikio apsaugai nuo alt.0.00 m iki alt.+55.00 m padengtas 45-330 mikronų storio epoksidine akmens anglies danga su emaliniais dažais.

151/154 (154 A,B) statiniai. Nuotekų ir vandens talpyklos

Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje vanduo, išleistas iš įvairių technologinių terpių ir vamzdynų, vandens nuotekos (patalpų drenažai, sanitarinių švarekų ir spec. skalbyklos nuotekos, t.t.), yra surenkamas į tam tikslui įrengtas talpas, esančias 151/154 pastate.

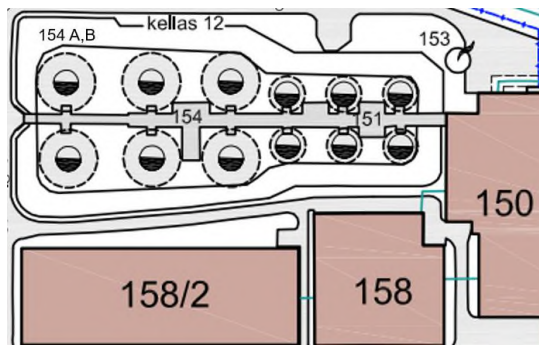

4 pav. 151/154 bei 153 statinių vieta IAE aikštelėje

151/154 statinys – tai talpos (4 talpos po 5000 m³ ir 6 talpos po 1500 m³), tarpusavyje sujungtos jungiamuoju koridoriumi. Vakarinėje pusėje 151/154 statinys yra sujungtas su dvejomis talpomis po 5000 m³ (154A, B statinys). Sudėtingos konfigūracijos statinių 151/154 ir 154A, B kompleksas, turintis bendrą pylimą, kurio matmenys 180x80 m (pylimo kontūro). Statinys 151/154 iš rytų pusės ribojasi su 150 pastatu. Jungiamasis koridorius yra 4 aukštų pastatas su patalpomis, esančiomis -1,20; +1,80; +5,40; +9,60 atžymose. Statinio dalis iki +9,60 atžymos yra požeminė (įrengta perdangoje), virš +9,60 atžymos – antžeminė.

Jungiamojo koridoriaus pamatai – monolitinė gelžbetoninė 1000 ir 600 mm storio M200 betono plokštė ant 100 mm storio hidrotechninio M150 B4 betono. Po pamatais įrengtas 200 mm storio drenažas iš smėlio ir žvyro mišinio. Pamatai po kolonomis yra monolitinio gelžbetonio iš M200 betono. Jungiamojo koridoriaus konstrukcijos karkasą sudaro surenkamos 400x400 mm skerspjūvio gelžbetoninės kolonos, pagamintos iš M300 betono. Kolonų tinkelis yra 6x6 m ir 6x9.

Jungiamojo koridoriaus ir laiptinių sienos nuo atžymos -1,20 iki atžymos +9,60 yra iš monolitinio gelžbetonio M200, kurio storis 400, 500 ir 600 mm, nuo atžymos +9,60 – keramzitbetonio plokštės, kurių storis 300 mm. Sienų, besiliečiančių su gruntu, hidroizoliacija iki atžymos -0,50 atlikta gumos bitumo mastika, nuo atžymos -0,50 iki atžymos +9,60 – padengta bitumu. Pertvaros yra surinktos iš monolitinio gelžbetoninio 140 ir 100 mm storio M300 betono ir 120 mm storio paprastų molinių plytų M75 ant M50 cementinio skiedinio su armatūra. Statinio stogas yra plokščias kombinuotas, nevėdinamas, su vidiniu vandens surinkimu, išskyrus patalpas (Nr. 301, 302, 307, 308, 314÷317), virš kurių yra išorinis vandens surinkimas. Stogo hidroizoliacinę dangą sudaro 4 sluoksniai iš bituminės mastikos ir žvyro.

5000 m³ (statinys 154) Ø31,6 m cilindrinės monolitinės gelžbetoninės 4 talpos įrengtos iš hidrotechninio betono su 4 mm storio nerūdijančio plieno vidine danga. Viduje yra Ø2000 mm centrinė atraminė kolona. Po talpomis suformuotas 200 mm storio smėlio ir žvyro mišinio drenažas, ant kurio paklota sausa dviejų sluoksnių hidroizoliacija ir įrengtas 100 mm storio monolitinio gelžbetonio šulins. Drenažo vandeniui nutekėti įrengti perforuoti nerūdijančio plieno vamzdžiai Ø159x6 mm. Pagrindas po talpomis yra hidroizoliuotas dviem sluoksniais iš guminės-bituminės mastikos ant šalto bituminio grunto su apsauginiu 20 mm storio cementinio skiedinio M50 sluoksniu. Talpų dugnas yra 200 mm storio, betoninės sienelės yra 400 mm storio.

1500 m³ (statinys 151) Ø19,3 m ilgio cilindrinės monolitinės gelžbetoninės 6 talpos, pagamintos iš hidrotechninio betono su 4 mm storio nerūdijančio plieno (sienos ir grindys) ir 3 mm storio (lubos) vidine danga, su centrine Ø1000 mm atramine kolona. Po talpomis suformuotas 200 mm storio smėlio ir žvyro mišinio drenažas, ant kurio paklota dviejų sluoksnių hidroizoliacija, ir įrengtas 100 mm storio monolitinio gelžbetonio šulins. Drenažo vandeniui nutekėti įrengti perforuoti nerūdijančio plieno vamzdžiai Ø76x4,5mm. Šulins hidroizoliuotas dviem sluoksniais iš guminės bituminės mastikos ant šalto bituminio grunto su apsauginiu 20 mm storio cementinio skiedinio M50 sluoksniu. Talpų dugnas ir sienelės yra 400 mm storio.

Visos talpos yra užpildytos gruntu, ant kurio horizontaliose atkarpose įrengtas betono išlyginamasis sluoksnis su asfalto danga. Šlaitų pagrindo atraminės sienelės įrengtos iš surenkamų gelžbetonio blokų 300 mm storio M300 betono.

Radioaktyviųjų atliekų saugyklos 157, 157/1 pastatai

Pastatai 157, 157/1 yra šiaurės vakarų IAE aikštelės pusėje, 500-600m į vakarus nuo pirmojo reaktoriaus. Drūkšių ežeras yra apie 750 m į šiaurę nuo saugyklų.

Kietosios radioaktyviosios atliekos, kurios susidarė Ignalinos AE eksploatavimo metu, buvo dedamos į tuo tikslu pastatytas laikinas saugyklas (157, 157/1 pastatai), esančias Ignalinos AE aikštelėje (1 Pav.). Į tas pačias saugyklas buvo dedami ir panaudoti uždarieji šaltiniai.




1 pav. 157, 157/1 pastatų vieta IAE pramoninėje aikštelėje

157 statinys

157 pastatas yra vieno aukšto monolitinio gelžbetonio antžeminis statinys. 157 pastato sienos surenkamos gelžbetoninės, susideda iš dviejų sluoksnių – išorinis sluoksnis iš gelžbetoninių vertikalių 900×120×30cm plokščių, vidinis sluoksnis iš gelžbetoninių 600×220×30cm blokų. Pastatas yra padalintas į 15 sekcijų, jame saugomos įvairaus radioaktyvumo lygio kietos radioaktyvios atliekos.

157 pastato pamatų plokštė iš M200 tipo monolitinio gelžbetonio (2 Pav.), įrengto ant M100 tipo betono, padengto bitumo-gumos hidroizoliacijos sluoksniu bei apsauginiu M100 betono sluoksniu.

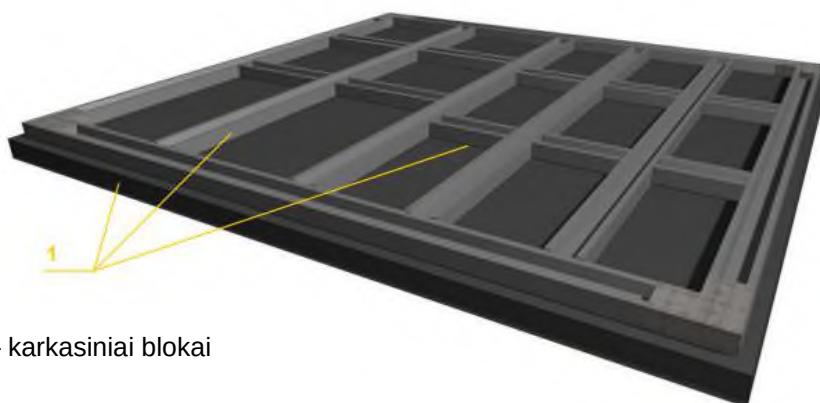

1 – karkasiniai blokai

2 Pav. 157 pastato grindinys


Žemutinis grindinio sustiprinimo sluoksnis suformuotas iš skersai išdėstytų anglinio plieno Ø32AIII ir Ø16AIII strypų, išsidėsčiusių 200mm žingsniu. Grindinys centrinėje pastato dalyje papildomai armuotas 5000mm ilgio Ø25AIII strypais. Viršutinis grindinio sustiprinimo sluoksnis suformuotas iš skersai išdėstytų anglinio plieno Ø25AIII ir Ø16AIII strypų eilių, išsidėsčiusių 200mm žingsniu. Žemutinis

bei viršutinį grindinio sustiprinimo sluoksnius apjungia sustiprinimo blokai, susidedantys iš anglinio plieno $\varnothing 12AII$ strypų bei vieno $\varnothing 16AII$ strypo. Karkasiniai blokai sustiprinti anglinio plieno $\varnothing 25AIII$, $\varnothing 16AIII$ ir $\varnothing 10AIII$ strypais. Statyboje buvo naudojami trys karkasinių blokų tipai – AK-1, AK-2 ir AK-3. Šie blokai skiriasi tik savu ilgiu: $L=3550\text{mm}$ AK-1 (buvo panaudota 124 vienetai), $L=2350$ AK-2 (20 vienetai) ir $L=750\text{mm}$ AK-3 (6 vienetai). Karkasiniai blokai skirti pastato sienų plokščių sutvirtinimui.

Pastatą sudaro išorinės sienos ir vidinės pertvaros. Išorinės sienos (laikančioji konstrukcija) pagamintos iš M200 gelžbetonio plokščių, daugiausia iš SP-1 tipo, plotis – 1180mm, storis – 300mm, aukštis – 8950mm. Taip pat buvo naudojamos ir kito tipo plokštės, SP-1, SP-1-1, SP-1-3 ir kitos. Jie skiriasi tik pločiu. Tarpai tarp plokščių užpildyti betono ir smėlio mišiniu. SP-1 plokščių sustiprinimas suformuotas iš dviejų C-1 strypų karkaso, padengto 50mm betono sluoksniu. C-1 strypelių karkaso matmenys yra $1160 \times 8930\text{mm}$. Šiems C-1 karkaso strypeliams sutvirtinti tarpusavyje panaudoti keli $\varnothing 8AII$ strypai. C-1 strypų karkasas (vertikaliai) suformuotas iš tarpusavyje išdėstytų 200mm žingsniu $\varnothing 20AIII$ ($L=8930\text{mm}$) strypų. C-1 karkaso apatinėje dalyje papildomai 100mm žingsniu išdėstyti $\varnothing 20AIII$ ($L=2700\text{mm}$) strypai. Vertikalūs C-1 karkaso strypai sutvirtinti horizontaliai 200mm žingsniu išdėstytais $\varnothing 8AII$ strypais. Horizontalus vertikalių strypų sutvirtinimas C-1 karkaso viršutinėje ir apatinėje dalyje suformuotas iš $\varnothing 12AIII$ strypų.

Išorinės sienos iš vidinės pusės padengtos skirtingo storio dviejų tipų M100 tipo betoniniais blokais: $\delta=300\text{mm}$ (FS-3) ir $\delta=400\text{mm}$ (FS-4, panaudoti sekcijose, kur saugomos didelio aktyvumo kietosios radioaktyvios atliekos). Šie blokai skirti tik biologinei apsaugai padidinti. Blokų išmatavimai FS-3 $2400 \times 600\text{mm}$, FS-4 - $1200 \times 300\text{mm}$.

Greta didelio aktyvumo lygio atliekų saugojimo sekcijų (sekcijos Nr. 1 ir Nr. 4) išorinių sienų papildomai buvo sumontuotos SP-1 tipo gelžbetonio plokštės. Tokiu būdu, bendras pastato sienos storis sudaro 600mm arba 1000mm (didelio aktyvumo atliekų saugojimo sekcijose). Pastato skiriamosios sienelės sukonstruotos iš SP-1 tipo gelžbetoninių plokščių. Kai kurios skiriamosios sienelės uždengtos FS-3 bei FS-4 tipo blokais. Susiformavusios tuštumos tarp pastato sienų ir sekcijų atskyrimų užpildytos skirtingų dydžių betoniniais blokais.

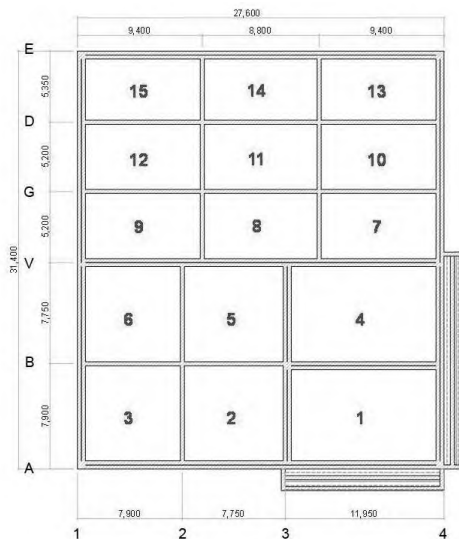


3 Pav. 157 pastato schema
(Raudonai pažymėti sekcijų numeriai)

500 mm storio monolitinė stogo plokštė suformuota iš sustiprinto M200 tipo betono. Didelio aktyvumo atliekų saugojimo sekcijų stogo monolitinės stogo plokštės storis yra 1200mm. Stogo plokštė armuota anglinio plieno $\varnothing 12AIII$ ir $\varnothing 16AIII$ strypais, išdėstytais 200mm žingsniu bei $\varnothing 8\text{mm}$ strypais išdėstytais skersine kryptimi. Bitumo-gumos hidroizoliacija panaudota tarpui tarp stogo plokštės ir sienų užpildyti.

Mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų rūšio stogo plokštėje suformuotos $4 \times 5,5\text{m}$ dydžio angos (4 Pav.). Angos uždarnos keturiais sustiprintais M200 betono tipo P-1 ir/arba P-2 markės blokais. Betoninių blokų dydžiai: P-1 $4480 \times 1730\text{mm}$, o P-2 $4480 \times 1500\text{mm}$ (įskaitant vieną 250mm žingsnį į plotį). Betoninio bloko storis 500mm. Dvisluoksniui blokų sustiprinimui panaudoti anglinio plieno $\varnothing 16AII$ ir

Ø12All armatūros strypai, išdėstyti 200mm žingsniu. Didelio aktyvumo atliekoms talpinti sekcijų stogo plokštėse sumontuota po šešias apvalias 1,004mm diametro angas (4 Pav.). Šios angos uždaromos betoniniais kamščiais. Biologinei apsaugai padidinti virš didelio aktyvumo atliekų saugojimo sekcijų stogo plokštės papildomai buvo suformuota 600 mm storio danga iš sustiprinto sunkiojo B25 klasės betono, $\rho=2400 \text{ kg/m}^3$. Angų uždarymui taip pat buvo pagaminti nauji betoniniai kamščiai (B25 klasės betonas, $\rho=3600 \text{ kg/m}^3$). Sustiprinimui buvo panaudoti anglinio plieno Ø25 mm ir Ø12 mm armatūros strypai.

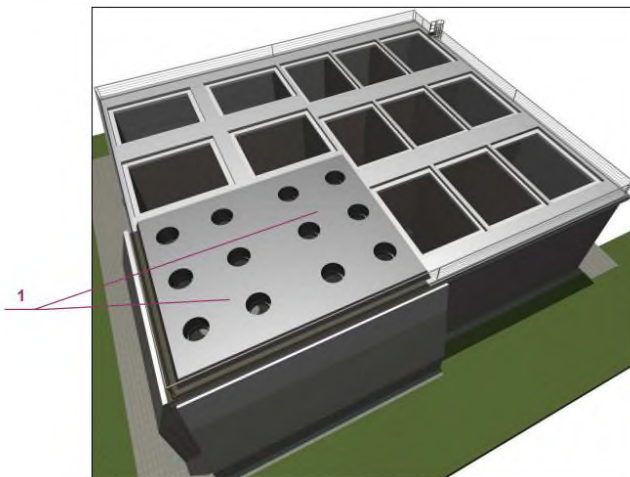

4 Pav. 157 pastato monolitinė stogo plokštė
1 – didelio aktyvumo atliekų saugojimo sekcijos

Pastato stogo perimetru suformuotas 850 mm aukščio metalinis stogo dangos aptvėrimas iš strypelių Ø26mm.

1 lentelė. Bendrieji 157 pastato konstrukcijos duomenys

Dydžiai	Ilgis, m	31,4
	Plotis, m	27,6
	Aukštis, (be Nr. 1 ir 4 sekcijas dengiančio asfalto sluoksnio ir betoninių kamščių), m	9,70-10,70
Pamatas	M100 tipo betono sluoksnis, mm	150
	Gumos ir bitumo hidroizoliacija, trys sluoksniai, mm	~5÷10
	M100 tipo betono sluoksnis, mm	30
	M200 monolitinis gelžbetonis, mm	800
Sienos (išskyrus sekcijų Nr. 1 ir 4 sienas)	M100 FS – 3 tipo betoniniai blokai, mm	300
	M200 tipo gelžbetonis, mm	300
Skcijų sienos, eilė A, ašis 3-4; eilė A-V, ašis 4	M200 FS – 4 tipo betoniniai blokai, mm	400
	M200 tipo gelžbetonis, mm	300
	M200 tipo gelžbetonis, mm	300
Perskyrimai	M200 tipo gelžbetonis, mm	300
Skcijų perskyrimai, eilė B, ašis 3-4	M200 FS – 4 tipo betoniniai blokai, mm	400
Skcijų perskyrimai, eilė B, ašis 1-3; eilė V, ašis 1-4; eilė A-V, ašis 3	M100 FS – 3 tipo betoniniai blokai, mm	300
	M200 tipo gelžbetonis, mm	300
Stogas	M200 tipo gelžbetonis, mm	500
	Asfalto sluoksnis, mm	30÷110
Didelio aktyvumo atliekų saugojimo sekcijų stogas (Nr. 1 ir 4 sekcijos)	M200 tipo gelžbetonio plokštė, mm	700
	B25 gelžbetonis, mm	600
	M100 tipo betono sluoksnis, mm	30-100
	Penki guminio asfalto sluoksniai (konservavimui)	
	Asfalto sluoksnis (konservavimui), mm	30


157/1 statinys

157/1 pastatas yra surenkama monolitinio gelžbetonio antžeminė konstrukcija. Pastatą sudaro trys atskiros dalys ir yra padalintas į 29 sekcijas vidutinio ir mažo aktyvumo atliekoms saugoti (5 pav.)



5 pav. Bendras 157/1 statinio vaizdas

Pastato pagrindas – M300 monolitinio gelžbetonio plokštė. Monolitinės plokštės paklotos ant 150mm storio M150 paruošiamojo sluoksnio, kurios išmatavimai yra 28,6×82m. Apačia armuota anglinio plieno Ø32AIII strypais, išsidėstytais 200mm žingsniu. Viršutinis sluoksnis suformuotas iš skersai išdėstytų anglinio plieno Ø25AIII ir Ø16AIII strypų, išsidėstytų 200mm žingsniu. Pastatas turi išorines bei vidines (skiriančios sekcijas) sienas. Išorinės pastato sienos (laikančioji konstrukcija) suformuotos iš M300 tipo betono sustiprintų plokščių.

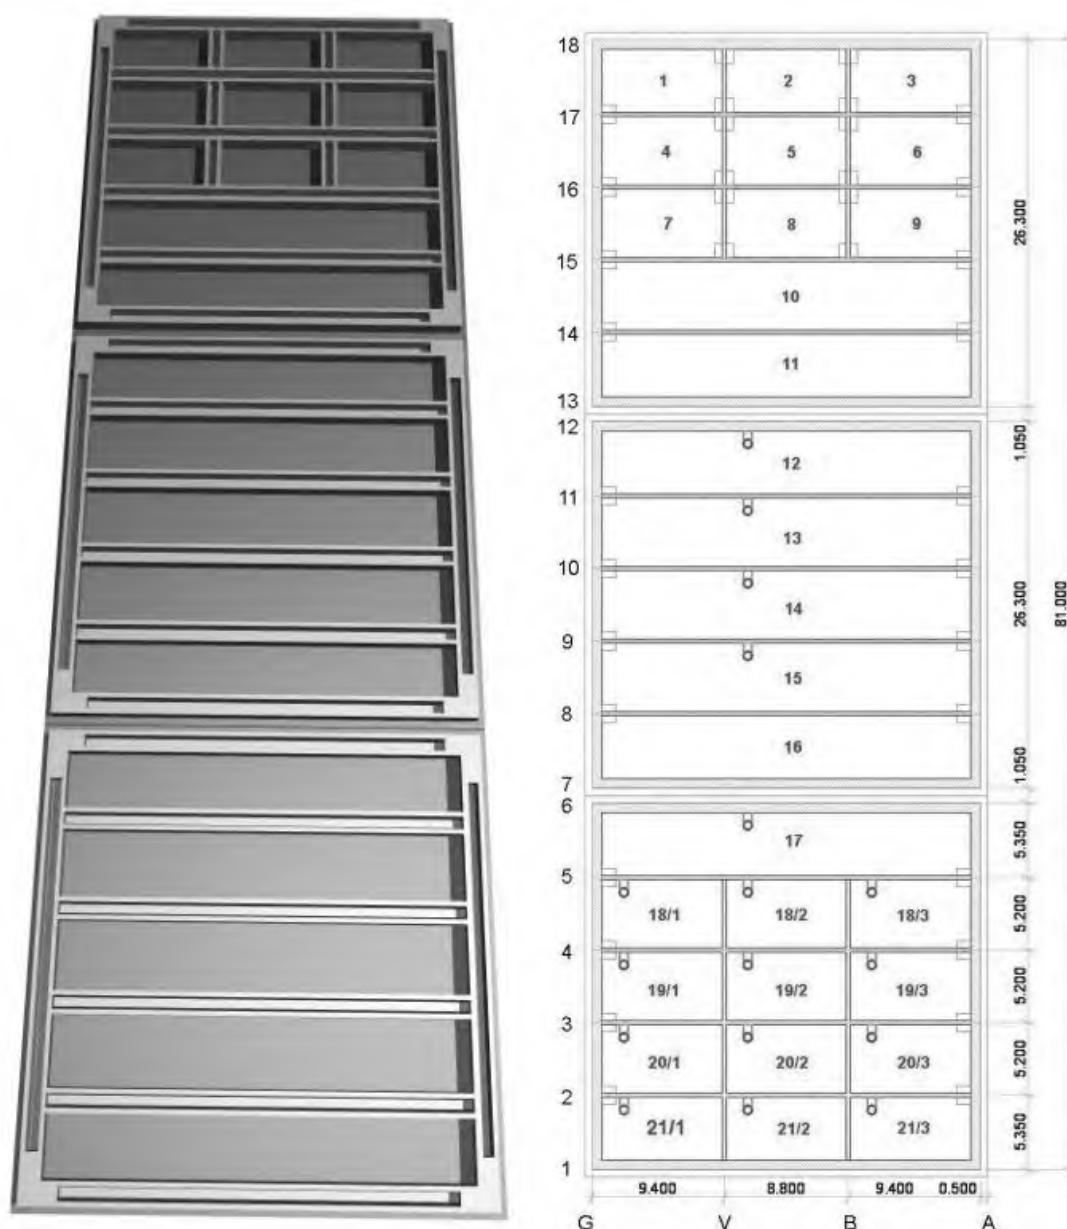

6 pav. 157/1 pastato grindinio konstrukcija
(Raudona spalva pažymėti sekcijų numeriai)

Monolitinės pastato sienos suformuotos iš 80mm storio M300 tipo betoninių plokščių bei M300 tipo gelžbetonio sustiprinto užpildo. Užpildas armuotas horizontaliai 400mm žingsniu išdėstytais $\varnothing 8$ mm ir vertikaliai 200mm žingsniu išdėstytais $\varnothing 20$ mm anglinio plieno armatūros strypais. Plokštės sustiprintos 2L (Nr.12) ir L (50×5mm) tipo anglinio plieno profiliais. Bendras išorinių sienų storis sudaro 700mm.

Pastate sekcijos atskirtos SP-1 tipo M200 gelžbetonio plokštėmis. Susidarę tarpai tarp išorinių sienų ir sekcijų perskyrų užpildyti M100 tipo įvairių matmenų betoniniais blokais. Smulkesni tarpai tarp plokščių užpildyti M200 tipo betonu. Degioms radioaktyviosioms atliekoms saugoti 1994 metais pastato 18÷21 sekcijose (išilgai B, V ašių bei I÷5eilių) buvo suformuoti papildomi atskyrimai. Atskyrimai suformuoti iš monolitinio 300mm storio sustiprinto M300 tipo betono. Sustiprinimui buvo panaudoti $\varnothing 25$, $\varnothing 12$, $\varnothing 8$ mm anglinio plieno strypai.

Monolitinė pastato stogo plokštė suformuota iš 500mm storio M300 tipo betono (7 Pav.). Ši plokštė armuota $\varnothing 16$, $\varnothing 12$, $\varnothing 8$ mm anglinio plieno strypais. Blokų formavimui buvo panaudoti įvairių tipų anglinio plieno profiliai: 2L (Nr. 27, Nr. 20 ir Nr. 12) bei L (63×5mm).



7 Pav. 157/1 pastato stogo monolitinė plokštė.

Atliekos talpinamos per stoge suformuotas 4x5,5m dydžio angas. Kiekvieną angą dengia sustiprintos keturios nuimamos M200 betono P-1I tipo plokštės. Stogo paviršiaus nuokrypis suformuotas iš papildomo M200 tipo betono sluoksnio. Gumos-bitumo izoliacija hermetizuoja tarpus tarp stogo ir nuimamų plokščių.

Pastato stogo perimetru suformuotas 850mm aukščio metalinis stogo dangos aptvėrimas iš strypelių Ø25 mm. Metalinio protarpio vietose stogo dangos aptvėrimo aukštis 150mm. 157/1 pastato konstrukciniai duomenys detaliau pateikti 4 lentelėje.

2 lentelė. Bendrieji 157/1 statinio konstrukcijos duomenys

Gabaritai	Ilgis (ašys 1÷6, 7÷12, 13÷18), m	82,00
	Plotis (ašys A, B, V, G), m	28,60
	Aukštis (be asfalto sluoksnio), m	9,70
Pamatas	M50 tipo betono sluoksnis, mm	~30
	M150 tipo betono sluoksnis, mm	150
	M300 tipo armuotas betono sluoksnis, mm	800
Sienos	M300 tipo armuotas betonas, mm	700
Pertvaros	Gelžbetonio M200 plokštės arba monolitinis gelžbetonis M300, mm	300
Stogas	M300 tipo betono sustiprintos plokštės, mm	500
	M200 tipo betono sluoksnis, mm	~100



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjams

2025-04-24

Nr. JS- 1643(13.67E)

CVP IS priemonėmis

I

Nr.

DĖL SUSITIKIMO METU PATEIKTŲ KLAUSIMŲ

Informuojame, kad atviro konkurso būdu vykdant tarptautinį viešąjį „**Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugų**“ pirkimą (Pirkimo ID 1476319), 2025-04-17 susitikimo su potencialaus tiekėjo atstovais metu buvo užduoti klausimai ir pateikti atsakymai į juos:

1. Klausimas: Ar pastatų betoninėse konstrukcijose liko metalinių dalių?

Atsakymas: Metalinės dalys gali būti paliktos betoninėse konstrukcijose tik tuo atveju, jeigu jos yra pastato konstrukciniai elementai (pvz. atramos, sijos) kurių radiacinį užterštumą galima lengvai išmatuoti arba įrodyti, kad užterštumas neįmanomas. Vamzdžių, technologinių įrangos liekanos ir pan., kurių paviršių neįmanoma pasiekti ir išmatuoti, turi būti pašalintos;

2. Klausimas: Ar pastatų betoninės konstrukcijos užterštos alfa, beta ar gama dalelėmis?

Atsakymas: VĮ IAE vertinimu, gama ir beta užterštumas yra (bus pateikti turimi nuklidiniai vektoriai, jų pavyzdžiai pateikti TS 5 priede). Alfa užterštumo nėra, kasmetinių matavimų monitoringo apimtyje aptikta irgi nebuvo;

3. Klausimas: Kokiam tikslui rengiama galutinė ataskaita? Kur bus naudojama ataskaita? Ar bus teikiama valstybinėms institucijoms, siekiant gauti tam tikrus leidimus?

Atsakymas: Galutinė ataskaita bus naudojama pagrindinių pastatų griovimo ir atskiros infrastruktūros sukūrimo (jei prireiks) strategijai parengti, taip pat bus naudojama kaip gairės parengti eksploataavimo nutraukimo technologinius projektus bei griovimo dokumentus pagal Statybos įstatymą. Nors projekto metu parengti dokumentai nebus derinami su reguliatoriumi, kiekvienas projekto etapo rezultatas bus pristatytas reguliatoriui.

Susitikimo metu buvo apžiūrėtas 101/1 pastatas bei padarytos nuotraukos (pridedamos).

We inform you that during a meeting with representatives of a potential supplier, held as part of an open tender „Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and

waste management of contaminated structures“ (tender ID 1476319) questions were asked and answers were provided:

1. Question: Are there any metal parts remaining in the concrete structures of the buildings?

Answer: Metal parts can be left in concrete structures only if they are structural elements of the building (e.g., supports, beams) whose radiation contamination can be easily measured or if it can be proven that contamination is impossible. Remnants of pipes, technological equipment, and similar items, whose surfaces cannot be reached and measured, must be removed.

2. Question: Are the concrete structures of the buildings contaminated with alpha, beta, or gamma particles?

Answer: .According to the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant assessment, there is gamma and beta contamination (available nuclide vectors will be provided, examples are provided in TS Annex 5). There is no alpha contamination, and it was not detected in the annual monitoring scope either.

3. Question: What is the purpose of the final report? Where will the report be used? Will it be submitted to state institutions to obtain certain permits?

Answer: The final report will be used to develop the strategy for dismantling the main buildings and for creating separate infrastructure (if needed). It will also serve as a guideline for preparing decommissioning technological projects and demolition documents in accordance with the Construction Law. Reports prepared during the project will not be subject to approval from regulatory authorities, but each project stage result will be presented to the regulator.


The building 101/1 was inspected and photos were taken during the meeting (attached).


Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė







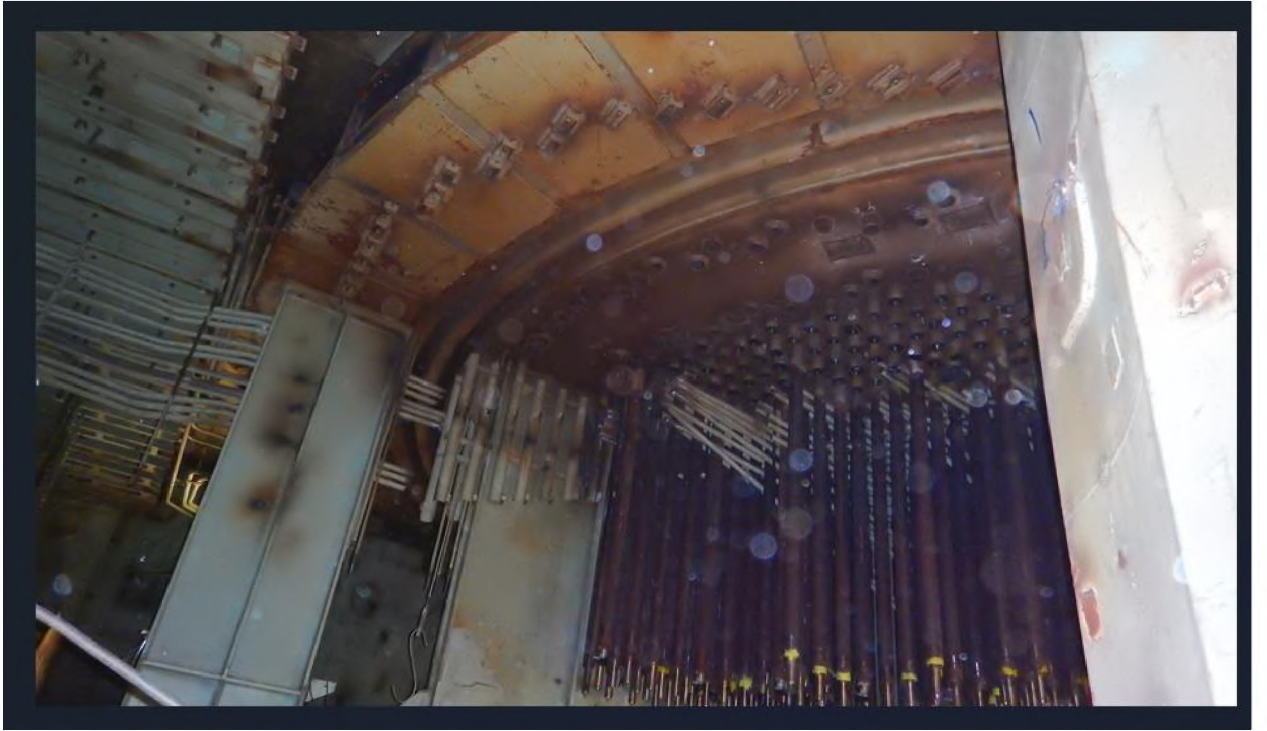

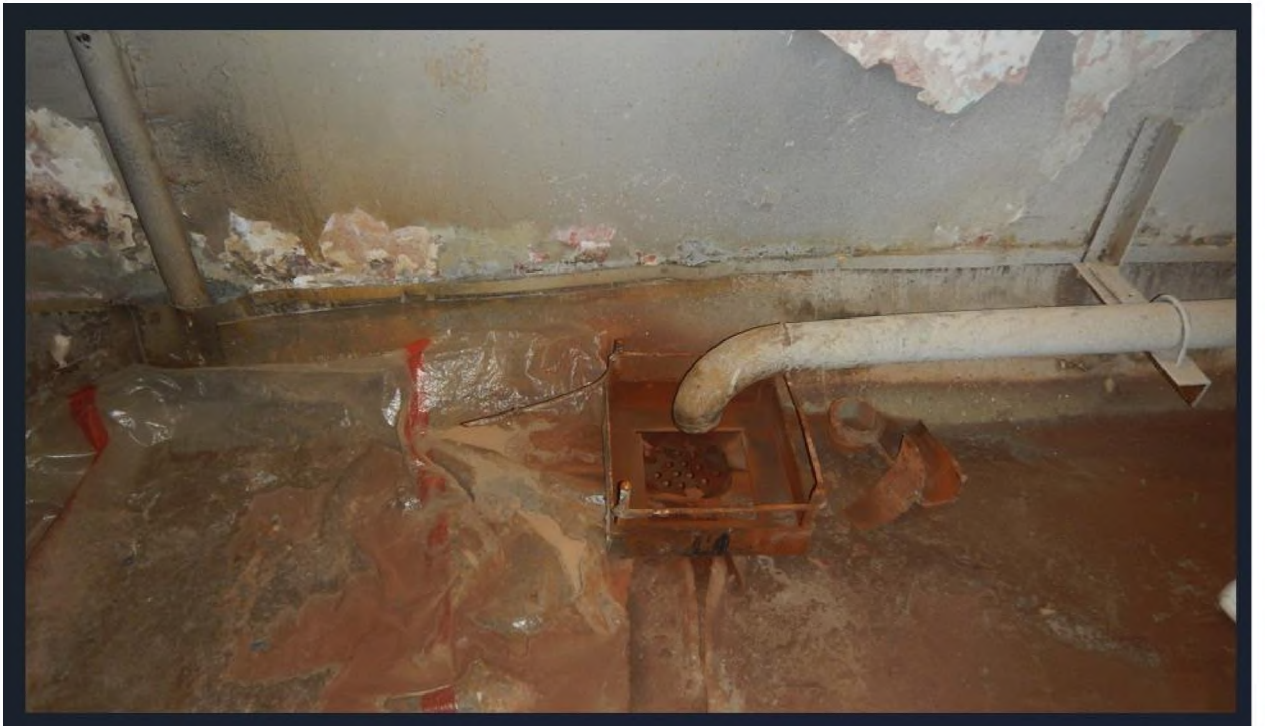









**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjams 2025-05-02 Nr. JS- 1771(13.67E)
CVP IS priemonėmis I _____ Nr. _____

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS IR PIRKIMO TERMINŲ PASIKEITIMO

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdant tarptautinį viešąjį pirkimą „**Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugų**“ pirkimo (Pirkimo ID 1476319, toliau – Pirkimas), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų klausimai/prašymai paaiškinti Pirkimo dokumentus. Komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus šio rašto priede.

Taip pat informuojame, kad Komisija nutarė pakeisti Pirkimo dokumentų A dalies terminus, išdėstant juos taip:

„2.1.2. Perkančioji organizacija prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi gauti ne vėliau kaip iki 2025-05-08 imtinai.

2.1.3. Atsakymas į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip iki 2025-05-19 imtinai.

2.1.4. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga: 2025-05-26 09:00 val.

2.1.5. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data: 2025-05-26.“

We hereby inform you that the Public Procurement Commission of the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant (hereinafter – the Commission), in the course of conducting an open international public procurement procedure for the acquisition of „Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and waste management of contaminated structures“ (tender ID 1476319, hereinafter – the Tender), has received questions/requests for clarification of the Tender documents from suppliers via the Central Public Procurement Information System. The Commission provides responses to the suppliers' submitted questions in the annex to this letter.

We also inform you that the Commission has decided to amend the deadlines in Part A of the Procurement Documents, setting them as follows:

“2.1.2. The contracting authority must receive the request to comment the PD no later than 2025-05-08 (inclusive).

2.1.3. The answer to the Supplier's request to clarify the PD must be forwarded in such a way that the Supplier would be able to receive it no later than 2025-05-19 (inclusive).

2.1.4. End of tenders' submission term: 2025-05-26 at 09:00.

2.1.5. Date of the initial access to tenders meeting: 2025-05-26.”

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Klausimas anglų kalba	Klausimas lietuvių kalba	Atsakymas anglų kalba	Atsakymas lietuvių kalba
Would it be possible to get 3 weeks more time for providing the offer?	Ar būtų galimybė pratęsti pasiūlymo pateikimą 3 savaitėmis?	Tender submission term is extended to 2025-05-26 9:00. Requests to comment the PD extended to 2025-05-08 (end of the day), answers to the comments extended to 2025-05-19.	Pratęsiam pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-26 9:00, pratęsiam prašymų paaikškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-08 (imtinai), atsakymų į tiekejo prašymą paaikškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-19.
Can you please advise whether it is possible to obtain the editable version of the following documents: 2_PD_A-D_parts_EN.pdf 1_PD_A-D_dalys_LT.pdf so that we can directly use the forms of the documents that are to be filled in and submitted as a part of the tender for the first part of the procurement?	Ar būtų galimybė gauti šių dokumentų redaguojamas versijas: 2_PD_A-D_parts_EN.pdf 1_PD_A-D_dalys_LT.pdf kad mes galėtume naudoti šias dokumentų formas, kurias reikia užpildyti ir pateikti kaip pirmos pirkimo dalies pasiūlymo dalį.	Forms in word format will be provided in LT and EN versions.	Pateiksim formas word formatu LT ir EN versijos.
The Form of the List of Main Delivered Goods and/or Provided Services, and/or Completed Works doesn't contain any placeholder or template for the Customers' certificates regarding the proper execution of previous contracts, referred to in 14.1.1 of A. Instructions for suppliers. Can we edit the existing form so that we add the necessary information and statement from the customer?	Pagrindinių pristatytų prekių ir (ar) suteiktų paslaugų, ir (ar) atliktų darbų sąrašo forma neturi jokio šablono užsakovų pažymoms, patvirtinantioms tinkamą ankstesnių sutarčių įvykdymą, kaip nurodyta PD A dalies 14.1.1 punkte („Nurodymai tiekėjams“). Ar galime redaguoti esamą formą, kad galėtume įtraukti reikiamą informaciją ir užsakovo patvirtinimą	Free-form is acceptable (with indicated amount, services performed and on time).	Laisvos forma pažyma (nurodyta suma, tinkamai ir laiku įvykdytos paslaugos).
Due to the numerous public holidays in the next weeks and the resulting shorter workweeks (starting with Easter this weekend - May 01 incl. bridge day and May 08 incl. bridge day) we would like to kindly ask whether it would be possible to extend the deadline for the tender submission by three weeks (old May 05 2025, new May 26, 2025).	Dėl artimiausiomis savaitėmis numatomų daugybės šventių dienų ir dėl to sutrumpintų darbo savaitių (pradedant Velykų savaitgalį, taip pat gegužės 1 d. ir gegužės 8 d. poilsio dienas) prašome apsisvarstyti galimybę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 3 savaitėmis - iš 2025 m. gegužės 5 d. į 2025 m. gegužės 26 d.	Tender submission term is extended to 2025-05-26 9:00. Requests to comment the PD extended to 2025-05-08 (end of the day), answers to the comments extended to 2025-05-19.	Pratęsiam pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-26 9:00, pratęsiam prašymų paaikškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-08 (imtinai), atsakymų į tiekejo prašymą paaikškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-19.
within the PCD it is said: "10.1.1. shall confirm that they agree with all requirements and conditions of the PD, including the Contract;" Does that mean that we have to accept any single paragraph of the given contract or is it allowed to comment at certain points and discuss these in the later negotiations?	PD nurodoma: "10.1.1. patvirtina, kad sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant Sutarties, reikalavimais ir sąlygomis;" Ar tai reiškia, kad turime priimti kiekvieną sutarties punktą, ar leidžiama komentuoti tam tikrus punktus ir aptarti juos vėlesnėse derybose?	The terms and conditions of the Contract and the procurement documents are approved and coordinated with the controlling-financing institutions before the procurement is announced and there is no possibility to change the essential terms and conditions of the procurement documents. According to the requirements of the Public Procurement Act <>, making essential changes to the PD would terminate the procurement and new announcement would be organised.	Sutarties ir pirkimo sąlygos yra patvirtintos ir suderintos su kontroliuojančiomis-finansuojančiomis institucijomis prieš skelbiant pirkimą ir galimybių keisti esmines pirkimo dokumentų sąlygas nėra. Remiantis VPĮ reikalavimais <>, atliekant esminius PD keitimus pirkimas būtų nutrauktas ir paskelbtas naujai.
It is specified in the in TS 15: "<...> SE-INPP is considering to prepare a detailed 3D model of main buildings in the controlled area. Mentioned data will be provided after signing the contract."	TS 15 nurodyta: "<...> IAE svarsto galimybę parengti detalų pagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų 3D modelį. Minėta informacija bus pateikta pasirašius Sutartį."	Technical drawings with building cross-sections will be provided after signing the contract. Based on the information currently available, the date for the preparation of detailed 3D models has not been set and INPP does not commit to providing 3D models during the execution of the contract.	Pasirašius sutartį bus pateikti techniniai brėžiniai su pastatų pjūviais. Remiantis šiuo metu turima informacija, detalų 3D modelių parengimo data nėra nustatyta ir IAE neįsipareigoja pateikti 3D modelius sutarties vykdymo metu.
Question: Will detailed 3D models of the main buildings in the controlled area be prepared and submitted after signing the Contract?	Klausimas. Ar tikrai detalūs pagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų 3D modeliai bus parengti ir pateikti pasirašius Sutartį?		
It is specified in the TS 21.9.3. "When evaluating timeline and costs, provide comparative financial and time efficiency indicators such as total decommissioning decontamination costs (Eur)/ decontamination decommissioned area (m2), total time for decontamination decommissioning (h) / decontamination deactivated area (m2), radioactivity levels before and after decontamination deactivation (radioactivity level reduction), demolition costs (Eur) / waste generated during demolition (m3), total amount of waste generated during demolition (m3) / total demolition time (h)), RW management costs (Eur) / volume of treated RW (m3) including landfill costs, reclamation costs (EUR) / demolition site area (m2)." Question: Is the evaluation based on quantitative criteria (efficiency indicators) required only for the recommended option, or for all considered options? If it is not required for all considered options, then would the ranking of options be done using qualitative criteria? Please confirm.	TS 21.9.3 nurodyta: "Vertinant įgyvendinimo laiką ir kaštus, pateikti palyginamuosius finansinius ir laiko efektyvumo rodiklius kaip bendri dezaktyvavimo kaštai (Eur) / dezaktyvuoto ploto vienetui (m2), bendras laikas skirtas dezaktyvimui (h) / dezaktyvuoto ploto vienetui (m2), radioaktyvumo lygis prieš ir po dezaktyvavimo (radioaktyvumo lygio sumažinimas), griovimo kaštai (Eur) / griovimo metu susidariusių atliekų vienetui (m3), bendras griovimo metu susidariusių atliekų kiekis (m3) / bendras griovimo laikas (h), RA tvarkymo kaštai (Eur) / sutvarkytų RA vienetui (m3) įskaitant atliekyno kaštus, rekultivacijos kaštai (Eur) / griovimo aikštelės ploto vienetui (m2)." Klausimas. Ar toks kiekybinių kriterijų (efektyvumo rodiklių) vertinimas reikalingas tik Rekomenduotinam sprendimui ar visiems nagrinėjamiems sprendimams? Jei to nereikia daryti visiems nagrinėjamiems sprendimams, tada sprendimų reitingavimas būtų atliekamas naudojant kokybinius kriterijus? Prašome tai patvirtinti.	Comparative financial and time efficiency indicators must be applied to all solutions under consideration.	Palyginamieji finansiniai ir laiko efektyvumo rodikliai turi būti pritaikyti visiems nagrinėjamiems sprendimams.
Shall sub-contractors fill out and sign the Declaration of tenderer?	Ar subrangovai turi užpildyti ir pasirašyti tiekejo deklaraciją?	Yes, they must (legal entities)	Taip, turi (juridiniai asmenys).
Tender template states: "The proposed services fully comply with the requirements and their characteristics specified in the procurement documents and are described in Annex 1 of the tender." However, Annex 1 is Declaration of Tenderer and does not describe the services. Should such additional description be attached to the tender, and if yes, do you have template or limitations or expected content for that?	Pasiūlymo šablone nurodyta: „Siūlomos paslaugos visiškai atitinka reikalavimus ir jų charakteristikas, nurodytas pirkimo dokumentuose, ir yra aprašytos PD pasiūlymo 1 priede." Tačiau 1 priedas yra Tiekejo deklaracija ir nes aprašo paslaugų. Ar toks papildomas paslaugų aprašymas turėtų būti pridėtas prie pasiūlymo? Jei taip – ar turite šabloną, apribojimus ar reikalavimus turiniui?	Technical error, corrected form uploaded.	Techninė klaida, pataisyta forma įkelta.
Is it ok to change in the Annex 1 "Procurement of Services for the Overarching Environmental Impact Assessment of the Entire Ignalina Nuclear Power Plant Decommissioning Process" into "Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and waste management of contaminated structures" in the first sentence?	Ar galima 1 priedo pirmajame sakinyje "Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso suminio poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimas" pakeisti į "Radiounkildams užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugos"?	Technical error, corrected form uploaded.	Techninė klaida, pataisyta forma įkelta.
Is Bachelor's degree counted as "higher education degree" in the list of experts?	Ar ekspertų sąrašė bakalauro laipsnis laikomas "aukštojo išsilavinimu"?	Yes, it is.	Taip, laikoma.
In the Technical Specification under Chapter IV Nr. 11 the number of measurements and samples are given. How many pages do the corresponding reports have? Is the raw data of these measurements made available after signing the contract?	TS IV skyriuje, 11 punkte nurodytas matavimų ir mėginių skaičius. Kiek puslapių turi atitinkamos ataskaitos? Ar šių matavimų pirminiai duomenys bus prieinami po sutarties pasirašymo?	These reports are defined in the Procurement documents E part (TS) table 4 in Chapter Standards and legal acts: 40. INPP experimental radiological survey of controlled zone concrete structures (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-12 (171 pages) 41. INPP contaminated concrete evaluation report (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 pages) Available raw data of these measurements made will be provided after signing the contract.	Šio ataskaitos yra nurodytos Pirkimo dokumentų E dalyje (TS) 4 lentelėje Standartai ir teisės aktai skyriuje: 40. IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-21 (171 puslapis). 41. IAE užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 puslapis) Turimi matavimų duomenys bus pateikti pasirašius sutartį.
Chapter V Nr. 22.3 of the Technical Specification states that "needed legal framework adjustments" are to be specified. Does the "legal framework" relate to the authorisation and rules for INPP or to the laws of Lithuania?	TS V skyriuje, 22.3 punkte teigiama, kad turi būti nurodyti „būtinai teisinės bazės pakeitimai". Ar "teisinė bazė" susijusi su IAE įgaliojimais ir taisyklėmis ar su Lietuvos įstatymais?	Needed legal framework adjustments are related to the laws of Lithuania.	Būtinai teisinės bazės pakeitimai yra susiję su Lietuvos įstatymais.

Please kindly provide clear instructions on the correct process for submitting commentary on the draft contract included in the tender documentation (shall we submit our comments as the clarification request till April 24, 2025 or should the comments be submitted as an attachment to the tender, or potential comments will be addressed only after evaluation with the tenderer with the most economically advantageous tender, or are there other instructions?). Please confirm whether the successful tenderer of this contract will be eligible to participate in future tenders for activities resulting from the feasibility study. Due to the complexity of the bid being prepared, we respectfully request an extension to the deadline for submission until May 23, 2025.

Prašome pateikti aiškias instrukcijas kaip teisingai teikti pastabas dėl pirkimo dokumentų sąlygose pateikto sutarties projekto (ar turime savo pastabas pateikti kaip paaiškinimo prašymą iki 2025 m. balandžio 24 d., ar komentarai turi būti pateikti kaip pasiūlymo priedas, ar galimi komentarai bus svarstomi tik po vertinimo su tiekėju, pateikiusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, ar galioja kokios nors kitos instrukcijos?). Prašome patvirtinti, ar šio pirkimo laimėtojas turės teisę dalyvauti būsimuose pirkimuose, susijusiuose su galimybių studijos vykdymomis veiklomis. Atsižvelgiant į rengiamo pasiūlymo sudėtingumą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gegužės 23 d.

The terms and conditions of the Contract and the procurement documents are approved and coordinated with the controlling-financing institutions before the procurement is announced and there is no possibility to change the essential terms and conditions of the procurement documents. According to the requirements of the Public Procurement Act <>, making essential changes to the PD would terminate the procurement and new announcement would be organised. Participation in this procurement does not limit the possibilities of participating in future projects. Tender submission term is extended to 2025-05-26 9:00. Requests to comment the PD extended to 2025-05-08 (end of the day), answers to the comments extended to 2025-05-19.

Sutarties ir pirkimo sąlygos yra patvirtintos ir suderintos su kontroliuojančiomis-finansuojančiomis institucijomis prieš skelbiant pirkimą ir galimybių keisti esmines pirkimo dokumentų sąlygas nėra. Remiantis VPĮ reikalavimais <>, atliekant esminius PD keitimus pirkimas būtų nutrauktas ir paskelbtas naujai. Dalyvavimas šiame pirkime neriboja galimybių dalyvauti būsimuose projektuose. Pratešiam pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-26 9:00, pratešiam prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-08 (imtinai), atsakymų į bekejo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-19.

Comments on guarantee draft

Pastabas dėl garantijos projekto

In accordance with points 6.4 and 6.8 of the PD Part A: 6.4. The Supplier must submit an guarantee of the validity of tender in electronic form together with the tender. The validity of the tender must be provided in the form of a bank or credit union guarantee or an insurance company's guarantee letter, according to the relevant sample form in Part C of the PD, for an amount of at least 30,000 EUR. 6.8. Before submitting the tender, the Supplier **may request the contracting authority to confirm** that it agrees to accept the proposed tender validity guarantee. Please note that the form provided is an **example**, but the **essential conditions must remain**.

Vadovaujantis PD A dalies 6.4 ir 6.8 punktu: 6.4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas pagal PD C dalyje pateiktą atitinkamą **pavyzdinę formą** ne mažesnei kaip 30000 eurų (-o) sumai. 6.8. Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas **gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti**, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta forma yra **tik pavyzdinė**, tačiau **turi būti išlaikytos esminės sąlygos**.

Chapter III. General information

- Appendix 1 and 2: to which extend are the cooling water in- and outlet channels and other culverts within the scope of the project?
- What is the status of / plan for dismantling of the graphite cores (R3 zone)? I.e. when will radiological data for the building structures in the R3 zone be available? Are these building structures expected to be activated and/or contaminated? → see p. 9 "24.1. The start of demolition for the Units is dependent upon the progress and outcomes of the reactor core dismantling and second-phase equipment removal in Blocks A1 and A2."
- P3 "7. as documentation required under the Construction Law for demolition" The overall purpose of the report and expected degree of detail is difficult to deduce from the technical specification, i.e. the purpose is to form the basis for strategic decisions, basis for the permit application or part of work preparation for implementation. We would like a clarification to be able to better estimate the expected degree of detail of the analysis.

III skyrius. Bendroji informacija apie projektą

- 1 ir 2 priedai: kiek plačiai aušinimo vandens paėmimo ir išleidimo kanalai bei kiti vamzdžiai patenka į šio projekto apimtį?
- kokia yra reaktoriaus aktyviosios zonos (R3 zonos išmontavimo projektas) būklė/planas? t. y. kada bus prieinami radiologiniai duomenys apie pastato konstrukcijas R3 zonos išmontavimo projekte? žr. 9 psl., 24.1.punktą "pagrindinių reaktoriaus pastatų griovimo pradžia priklauso nuo reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo ir antrojo etapo įrangos pašalinimo A1 ir A2 blokuose eigos ir rezultatų".
- P3 „7. bei griovimo dokumentus pagal Statybos įstatymą“ Bendrąją ataskaitos paskirtį ir tikėtiną detalumo lygį sunku nustatyti remiantis technine specifikacija, t. y. ar ataskaita skirta kaip pagrindas strateginiams sprendimams priimti, leidimo gavimo dokumentacijai ar kaip darbo paruošimo įgyvendinimui dalis. Norėtume gauti paaiškinimą, kad galėtume tiksliau įvertinti numatomą analizės detalumo laipsnį.

1. Cooling water in and outlet channels are out of scope of this project. These objects are scope in other project.
2. Currently R3D conceptual design project is being prepared, currently R3D zone dismantling dates are not defined. On R3D project scope the whole reactor will be removed, reactor concrete vault will remain (that is part of contaminated concrete optioneering project scope). Reactor dismantling is estimated to take approximately 10 years. Samples and measurements from reactor concrete vault was taken and will be available after signing the contract. Concrete from the reactor vault is not activated.
3. The final report will be used to develop the strategy for dismantling the main buildings and for creating separate infrastructure (if needed). It will also serve as a guideline for preparing decommissioning technological projects and demolition documents in accordance with the Construction Law. Reports prepared during the project will not be subject to approval from regulatory authorities, but each project stage result will be presented to the regulator.

1. Cirkuliaciniai vamzdiniai nepatenka į šio projekto apimtį. Šie objektai priklauso kitam projektui.

2. Šiuo metu rengiamas R3D koncepcinis projektas, R3D zonos išmontavimo datos dar nėra nustatytos. Pagal R3D projektą bus pašalintas visas reaktoriaus, o reaktoriaus betoninė šachtos išliks (tai yra radionuklidais užterštų statinių galimybių analizės projekto dalis). Reaktoriaus išmontavimas preliminariai truks apie 10 metų. Iš reaktoriaus betoninės šachtos buvo paimti mėginiai ir atlikti matavimai, kurie bus pateikti pasirašius sutartį. Betonas iš reaktoriaus šachtos nėra aktyvuotas.

3. Galutinė ataskaita bus naudojama pagrindinių pastatų išmontavimo ir atskiros infrastruktūros (jei reikės) sukūrimo strategijai parengti. Ji taip pat bus naudojama kaip gairės rengiant eksploatavimo nutraukimo technologinius projektus ir griovimo dokumentus pagal Statybos įstatymą. Projekto metu parengtos ataskaitos nebus tvirtinamos reguliavimo institucijų, tačiau kiekvieno projekto etapo rezultatas bus pristatytas reguliavimo institucijai.

Chapter IV: Initial data

- Has a survey of hazardous and/or environmentally harmful substances been carried out, e.g. the presence of asbestos, mercury, PCB and Chrome VI?
- P.3 "The detailed report on the radiological assessment will be provided after signing the contract" Can you provide information on available format and data of the report as well as language?
- P.4 "All concrete mentioned in the text is reinforced; where appropriate, separate consideration should be given to the cementitious and metallic materials." The radiological characterization appears to have focused on concrete structures (only). How much (radiological) data exists for contaminated objects, such as embedded pipes, metallic liners etc? Are this "non-cementitious objects" part of the scope of the project? If these are included, are the type and volume of metal mapped and quantified?
- Appendix 4: the radiological characterization performed so far appears to have focused on gamma-emitting radionuclides. How much is known about (potential) alpha (and beta) contamination?

IV skyrius. Bendrieji paslaugų reikalavimai

- ar buvo atliktas pavojingų ir/ar aplinkai kenksmingų medžiagų tyrimas, pavyzdžiui ar buvo nustatytas asbesto, gyvsidabrio, PCB ir chromo buvimas?
- "Detali eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita bus pateikta pasirašius sutartį Ar galite pateikti informaciją apie šios ataskaitos formatą, duomenis bei kalbą?"
- "Visas tekste minimas betonas yra armuotas, atitinkamai atskirai reikėtų vertinti cementines ir metalines medžiagas" Ar radiologinio charakterizavimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama (pvz., įmontuotus vamzdžius, metalinę dangą ir pan? Ar šie "ne cementiniai objektai" įtraukti į projekto apimtį? Jei taip, ar metalo tipas ir kiekis nustatytas (parengta kartograma) ir įvertintas?
- 4 priedas: iki šiol atliktas radiologinis apibūdinimas, atrodo, buvo orientuotas į gama spinduliuotę skleidžiančius radionuklidus. Kiek yra žinoma apie (galimą) alfa (ir beta) užterštumą?

1. Inventorisation of harmful substances was done only for technological equipment. But for contaminated concrete structures only radioactive contaminants should be considered as part of optioneering project.
2. Reports will provided in .pdf format, translated to English, these correspond to reports that are defined in the PD E (TS) table 4 of Chapter Standards and legal acts: 40. INPP experimental radiological survey of controlled zone concrete structures (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-12 (171 pages)
41. INPP contaminated concrete evaluation report (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 puslapių).
3. Metal parts can be left in concrete structures only if they are structural elements of the building (e.g., supports, beams) whose radiation contamination can be easily measured or if it can be proven that contamination is impossible. Remnants of pipes, technological equipment, and similar items, whose surfaces cannot be reached and measured, must be removed. Radiological data of technological equipment is available, full radiological data on buildings is not (only experimental radiological survey of controlled zone concrete structures). Available information on existing equipment and as-build documentation will be provided.
4. According to the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant assessment, there is gamma and beta contamination (available nuclide vectors will be provided, examples are provided in PD part E (TS) Annex 5). There is no alpha contamination, and it was not detected in the annual monitoring scope either.

1. Kenksmingų medžiagų inventorizacija atlikta tik technologinei įrangai. Tačiau radionuklidais užterštų statinių galimybių analizės apimtyje vertinami tik radionuklidais užterštas betonas.
2. Ataskaitos bus teikiamos .pdf formatu, išverstos į anglų kalbą, jos atitinka ataskaitas, apibūrinančias PD E dalyje (TS) 4 lentelėje skiriuje „Standartai ir reguliaciniai reikalavimai“; 40. IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-12 (171 puslapis).
41. IAE užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 puslapis).
3. Metalinės dalys betoninėse konstrukcijose gali būti paliktos tik tuo atveju, jei tai yra pastato konstrukciniai elementai (pvz., atramos, sijos), kurių radiacinį užterštumą galima lengvai išmatuoti arba jei galima įrodyti, kad užterštumas neįmanomas. Vamzdžių, technologinės įrangos ir panašių daiktų liekanos, kurių paviršių negalima pasiekti ir išmatuoti, turi būti pašalintos. Technologinės įrangos radiologiniai duomenys yra, pilnų pastatų radiologinių duomenų nėra (tik kontroliuojamos zonos betoninių konstrukcijų eksperimentinis radiologinis tyrimas). Bus pateikta turima informacija apie esamą įrangą ir statybiniai (as-build) dokumentai.
4. Remiantis VĮ Ignalinos atominės elektrinės vertinimu, yra gama ir beta tarša (bus pateikti turimi nuklidų vektoriai, pavyzdžiai pateikti PD E dalies (TS) 5 priede). Alfa taršos nėra, ji nebuvo aptikta ir metinės stebėsenos apimtyje.

Chapter V: Scope and requirements

- P. 5 "The Supplier shall evaluate possible options for decontamination and preparation for demolition of the selected structures". Does this include evaluation for removing/dismantling of embedded pipes and other "non-cementitious objects"? This question relates to p. 6 "Quantitative Analysis of Radioactive Materials." And task 2 "optioneering"
- P. 7. "For consideration of relevant techniques and technologies for decontamination and demolition and RW management the Supplier shall include: 21.5.2. reuse of waste generated for backfilling the voids in the remaining underground structures of selected structures (or other application) under CCL, including possible impact on the groundwater;" is the focus of this task on radioactive contaminants and/or of conventional contaminants / hazardous materials? Have conventional contaminants / hazardous materials characterized in the buildings included in the scope of the project?
 - P. 7. "For consideration of relevant techniques and technologies for decontamination and demolition and RW management the Supplier shall include: 21.5.4 the need for and use of current ventilation systems and potential to optimize them;" clarify the scope of this task. None of the required experts covers this task.
 - P. 9 "25. Evaluating solutions, Supplier will evaluate" Ask for clarification of "Evaluating solutions", e.g. proposed solutions for preparation activities for decontamination, demolition and waste management? Do we understand footnote (2) correctly that this task will provide input / become part of an EIA? What is Ignalina's timeline for preparing an EIA in relation to this project? Please clarify the expected scope by the supplier related to section 25.2?
 - P. 32, tables: clarify "main area", e.g. total floor area in the building?

V skyrius: Paslaugų apimtis ir aprašymas

- 5 psl. "Tiekėjas, remdamasis tarptautine patirtimi, turi įvertinti galimus pasirinktų statinių dezaktyvavimo ir paruošimo griauti variantus." Ar tai apima įmontuotų vamzdžių (dalių) bei kitų "ne cementuotų objektų" pašalinimo / išmontavimo vertinimą? Šis klausimas susijęs su 6 puslapyje "Radioaktyviųjų medžiagų kiekybine analize". Ir užduotimi Nr. 2 "Projekto sprendinio variantų parinkimas".
- 7 psl. "Vertinant atitinkamų dezaktyvavimo ir griovimo bei RA sutvarkymo metodus ir technologijas Tiekėjas turi atsižvelgti į: 21.5.2. įvertinti susidariusių atliekų pakartotinį panaudojimą likusių požeminių konstrukcijų užpildymui (ar kitą sprendinį) taikant SNRL, įskaitant galimą poveikį požeminiam vandeniui; Ar ši užduotis orientuota į radioaktyviųjų teršalų vertinimą, ir/ar į teršalų / pavojingų medžiagų įvertinimą? Ar teršalai / pavojingos medžiagos jau yra identifiкуotos tuose pastatuose, kurie patenka į šio projekto apimtį?"
- 7 psl. "Vertinant atitinkamų dezaktyvavimo ir griovimo bei RA sutvarkymo metodus ir technologijas Tiekėjas turi atsižvelgti į: 21.5.4. įvertinti esamų vėdinimo sistemų poreikį ir naudojimą bei galimybes jas optimizuoti; Prašome patikslinti šią užduotį. Nė vienas iš reikalaujamų ekspertų neapima šios srities.
- 9 psl. "Nagrinėdamas taikomas sprendinius, Tiekėjas turi įvertinti" Prašome paaiškinti, ką konkrečiai reiškia „taikomų sprendinių vertinimas“, t. y. ar tai susiję su siūlomais pasirengimo dezaktyvavimo, griovimo ir atliekų tvarkymo sprendiniais? Ar teisingai suprantame paaiškinamąją pastabą (2), kad ši užduotis pateiks informaciją / taps PAV (poveikio aplinkai vertinimo) dalimi? Koks yra Ignalinos PAV rengimo grafikas šio projekto atžvilgiu? Prašome paaiškinti, numatomą tiekėjo apimtį, susijusią su 25.2 punktu.
- 32 psl. lentelėje: paaiškinkite „bendras plotas“, pvz. bendras pastato grindų plotas?

1. Metal parts can be left in concrete structures only if they are structural elements of the building (e.g., supports, beams) whose radiation contamination can be easily measured or if it can be proven that contamination is impossible. Remnants of pipes, technological equipment, and similar items, whose surfaces cannot be reached and measured, must be removed. For quantitative analysis of radioactive materials - contaminated concrete and integrated metallic materials should be evaluated. Available information on existing equipment and as-built documentation will be provided.
2. Focus here is contaminated concrete and only radioactive contaminants should be evaluated.
3. The requirement emphasizes that for decontamination and for demolition preparation of main reactor buildings there is a need to re-evaluate the ventilation systems needs (as mentioned in requirements based good practise analysis). Existing ventilation system was designed for operating INPP, after dismantling equipment the plan is to remove ventilation system (ventilation stacks (height of 150m) will be dismantled before building demolition). The task here is to identify the size and capacity of ventilation that is needed for decontamination, demolition preparation activities.
4. INPP overarching EIA will be prepared in the end of 2025-beginning of 2026, Supplier for contaminated concrete structures optioneering will be able to use EIA report as input data for the project (accordingly to current timeline, report will be in draft version). EIA that is under preparation involves complete decommissioning projects and processes, therefore there will be uncertainties and evaluations will be based on assumptions. When evaluating proposed solutions, environmental impact in relation to other possible solutions will be evaluated, **impact to environmental impact assessment must be evaluated** (how proposed solution would impact current environmental impact assessment, measures to avoid any possible significant negative impact, impact on environmental impact assessment if conditional clearance levels would be adapted).
5. Yes. Total floor area in the building (block by block in this case).

1. Metalinės dalys betoninėse konstrukcijose gali būti paliktos tik tuo atveju, jei tai yra pastato konstrukciniai elementai (pvz., atramos, sijos), kurių radiacinį užterštumą galima lengvai išmatuoti arba jei galima įrodyti, kad užterštumas neįmanomas. Vamzdžių, technologinės įrangos ir panašių daiktų liekanos, kurių paviršių negalima pasiekti ir išmatuoti, turi būti pašalintos. Radioaktyviųjų medžiagų kiekybinei analizei atlikti turėtų būti įvertintas užterštas betonas ir integruotos metalinės medžiagos. Bus pateikta turima informacija apie esamą įrangą ir statybos dokumentaciją.

2. Čia pagrindinis dėmesys skiriama užterštam betonui ir turėtų būti vertinami tik užterštumas radionuklidais.
3. Reikalavime pabrėžiama, kad dezaktyvuojant ir ruošiant pagrindinius reaktoriaus pastatus griovimui, reikia iš naujo įvertinti ventilacijos sistemų poreikius (kaip minėta reikalavimuose - gerosios praktikos analize). Esama ventilacijos sistema buvo suprojektuota veikiančiai IAE, išmontavus įrangą, planuojama ją pašalinti (ventiliacijos kaminais (150 m aukščio) bus išmontuoti prieš pastato griovimą). Užduotis – nustatyti vėdinimo dydį ir pajėgumą, reikalingą dezaktyvavimo ir griovimo pasiruošimo veikiai.
4. IAE bendrasis poveikio aplinkai vertinimas bus parengtas 2025 m. pabaigoje – 2026 m. pradžioje. Radionuklidais užterštų statinių galimybių analizės tiekėjas galės naudoti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą kaip projekto įvesties duomenis (pagal dabartinę grafiką ataskaita bus juodažaisio versija). Rengiamas poveikio aplinkai vertinimas apima visus eksploatavimo nutraukimo projektus ir procesus, todėl joje bus neapibrėžtumų, o vertinimai bus grindžiami prielaidomis. Vertinant siūlomus sprendimus, turi būti įvertintas poveikis aplinkai, palyginti su kitais galimais sprendimais bei **įtaka** poveikio aplinkai vertinimui (kaip siūlomus sprendimas paveiktų dabartinį poveikio aplinkai vertinimą, priemonės, skirtos išvengti galimo išsišėmimo neįgydomo poveikio, įtaka poveikio aplinkai vertinimui, jei būtų pritaikyti sąlyginiai nebekontroliuojami lygiai).

5. Taip. Pateiktas pastato patalpų bendras grindų plotas (šiuo atveju – kiekvieno bloko).

Due to some near-term priorities and willingness to involve our most knowledgeable experts on this tender, we are asking INPP to postpone the offer submittal deadline from May 12 till May 26.

Dėl kai kurių artimiausių prioritetų ir noro įtraukti labiausiai išmanančius mūsų ekspertus į šį konkursą, prašome IAE atidėti pasiūlymų pateikimo terminą nuo gegužės 12 d. iki gegužės 26 d.

Tender submission term is extended to 2025-05-26 9:00. Requests to comment the PD extended to 2025-05-08 (end of the day), answers to the comments extended to 2025-05-19.

Pratęsim pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-26 9:00, pratęsim prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-08 (imtinai), atsakymų į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-19.

We would like to ask for an extension of the proposal submission period by two weeks if possible.

Norime paprašyti pratęsti pasiūlymo pateikimo laiką dviem savaitėmis, jeigu įmanoma.

Tender submission term is extended to 2025-05-26 9:00. Requests to comment the PD extended to 2025-05-08 (end of the day), answers to the comments extended to 2025-05-19.

Pratęsim pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-26 9:00, pratęsim prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-08 (imtinai), atsakymų į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo terminą iki 2025-05-19.



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjams

_____ Nr. JS-

CVP IS priemonėmis

| _____ Nr. _____

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdant tarptautinį viešąjį pirkimą „**Radionuklidais užterštų pastatų griovimo ir atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimo galimybių analizės paslaugų**“ pirkimo (Pirkimo ID 1476319, toliau – Pirkimas), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų klausimai/prašymai paaiškinti Pirkimo dokumentus. Komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus šio rašto priede.

We hereby inform you that the Public Procurement Commission of the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant (hereinafter – the Commission), in the course of conducting an open international public procurement procedure for the acquisition of „Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and waste management of contaminated structures“ (tender ID 1476319, hereinafter – the Tender), has received questions/requests for clarification of the Tender documents from suppliers via the Central Public Procurement Information System. The Commission provides responses to the suppliers' submitted questions in the annex to this letter.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Klausimas	Klausimas LT	Atsakymas IAE EN	Atsakymas IAE LT
It is our understanding from the TechSpec that the current estimates concerning contaminated building structures (concrete), e.g. as presented in table 2, are based on references [40] and [41]. These references summarize results of the radiological characterization of in total 83 rooms from 32 buildings/building structures according to table 2. A number of these buildings are out of scope for the project, e.g. building 130, 158/2. Hence, not more than ~5 rooms per building have been characterized in 2017. To what extent are additional results from radiological characterizations currently available for the project, including both concrete and non-mineral objects to be removed during the decontamination phase? If more results exist, in which form would those be available?	Remiantis TS aprašymu, mūsų supratimu, dabartiniai užterštų pastatų konstrukcijų (betono) įvertinimai, pvz., pateikti 2 lentelėje, vadovaujantis [40] ir [41] punktais. Pagal 2 lentelę, šiose nuorodose apibendrinami iš viso 83 patalpų iš 32 pastatų/statinių radiologinio charakterizavimo rezultatai. Keli iš šių pastatų nėra įtraukti į šio projekto apimtį, pavyzdžiui, 130, 158/2 pastatai. Vadinas, 2017 m. kiekviename pastate buvo charakterizuota ne daugiau kaip 5 patalpos. Kiek šiuo metu yra prieinami papildomi radiologinio chrakterizavimo rezultatai, įskaitant tiek betoninius, tiek kitos kilmės objektus, kuriuos reikės pašalinti dezaktyvavimo etape? Jei yra daugiau rezultatų, kokia forma būtų pateikiami?	Key references representing experimental radiological survey and contaminated concrete estimation are PD part E (TS) table 2, reference number 40 and 41: 40. INPP experimental radiological survey of controlled zone concrete structures (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-12 (171 pages) This report provides details on experimental radiological survey done in INPP controlled zone. 83 rooms were selected for measurements and sampling as representative for estimation of other premises and rooms, with similar equipment or systems (78 rooms from 101/1,2 building A-1, V-1, G-1, D-0, D-1, D-2 blocks and 5 rooms from structures 117/1 and 117/2. 117/1 and 117/2 are out of the scope of this project and are being demolished). Radiological survey was done in optimised way to gather and estimate distribution and depth of contamination. More detailed measurements were not done because of ongoing equipment dismantling works and the potential scope and amount of work regarding the size of the buildings. Selected room are representative for estimating contamination in different rooms/premises (different equipment, potential contamination sources). Details on measurements done are explained in PD part E (TS) Annex 4. Some of the estimations were done based on expert assesment without measurements, due to the fact that some of the buildings are still in operation (for example building 150). Additional measurements were not performed since then. Status and gap analysis task involves evaluation of the measurements done and recommendations and justifications for improvements and reduction of uncertainties. Additional measurements could be performed by INPP as stated in the PD part E (TS) 20.5 - the need for additional measurements and their detailed specification shall be presented and justified by the Supplier to the Client 41. INPP contaminated concrete evaluation report (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 pages) This report provide estimate on contaminated concrete in all INPP controlled zone, merging the data from engineering inventory of reinforced concrete constructions and experimental radiological survey data. Based on performed radiological survey the class of the room by contamination probability is evaluated, additional data such as systems of equipment existing in the room, operational history, including involvement in emergency situations is evaluated also.	Pagrindinės nuorodos į eksperimentinius radiologinius tyrimus ir užteršto betono įvertinimą pateiktos PD E dalies (TS) 2 lentelėje, 40 ir 41 punktuose: 40. IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinių radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita (PD-5), ArchPD-2345-76240v1, 2017-08-21 (171 puslapis) Šioje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie IAE kontroliuojamos zonos pastatų betono eksperimentinius radiologinius tyrimus. Matavimams ir mėginių ėmimui buvo atrinktos 83 patalpos (78 patalpos iš 101/1,2 pastato A-1, V-1, G-1, D-0, D-1, D-2 blokų ir 5 patalpos iš 117/1 ir 117/2 pastatų. 117/1 ir 117/2 nepatenka į šio projekto apimtį ir yra baigiami griauti). Radiologiniai tyrimai buvo atlikti optimizuotu būdu, siekiant surinkti ir įvertinti užterštumo pasiskirstymą ir gylį. Išsamesni matavimai nebuvo atlikti dėl vykdomų įrangos išmontavimo darbų ir darbų masto bei kiekio, atsižvelgiant į pastatų dydį. Pasirinktos patalpos yra reprezentatyvios vertinant užterštumą skirtinguose kambariuose/patalpose (skirtinga įranga, galimi užterštumo šaltiniai). Išsamesnė informacija apie atliktus matavimus paaiškinta PD E dalies (TS) 4 priede. Kai kurie įvertinimai buvo atlikti remiantis ekspertiniu vertinimu be matavimų, nes kai kurie pastatai yra eksploatuojami (pavyzdžiui, 150 pastatas). Papildomi matavimai nuo to laiko nebuvo atlikti. Statuso ir trūkumų analizės užduotis apima atliktų matavimų įvertinimą ir pagrindimą, ir rekomendacijas patobulinti esamą vertinimą siekiant sumažinti dabartinį neapibrėžtumą. Papildomus matavimus gali atlikti IAE, kaip nurodyta PD E dalies (TS) 20.5 punkte – Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui poreikį papildomiems matavimams kartu su matavimų detalia specifikacija ir jų reikalingumo pagrindimu. 41. IAE užteršto betono kiekio įvertinimo ataskaita (PD-4), ArchPD-2345-77040v1, 2019-02-08 (48 puslapiai) Šioje ataskaitoje pateikiamas užteršto betono įvertinimas IAE kontroliuojamoje zonoje, apjungiant geležbetoninių konstrukcijų inžinerinės inventORIZacijos ir eksperimentinių radiologinių tyrimų duomenis. Remiantis atliktu radiologiniu tyrimu įvertinama patalpos klasė pagal užterštumo tikimybę, taip pat įvertinami papildomi duomenys, tokie kaip patalpoje esančios įrangos sistemos, eksploatavimo istorija, įskaitant dalyvavimą ekstremaliose situacijose.
Clarification concerning Quality Assurance Plan: the preparation time is 30 days according to 27.1 and 60 days according to 46. (table 4)	Paaškindite dėl Kokybės užtikrinimo plano (KUP): pagal TS 27.1 punktą KUP turi būti parengtas per 30 dienų, o pagal TS 46 punktą - 60 dienų (4 lentelė)	Requirement 27.1 refers to timelines for Quality Assurance Plan preparation - first version must be prepared and submitted in 30 days, while the total coordination (comments, editing and final version preparation) must not exceed 60 days in total. PD part E (TS) table 4 refers to mentioned 60 days, but the first version of Quality Assurance Plan is expected after 30 days after the contract enters into force, as mentioned in requirement 27.1 Case B refers methods to conditional clearance with applied conditional clearance levels (according to NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR-1.9.2-2018). According to BSR requirements structures can be demolished after release from radiation control, while case C refers to option demolition of contaminated structures (with subsequent waste management). Conditional clearance are applied for waste that is generated, C case refers to conditions for demolition (detailing the regulatory frameworks and additional measures needed). Also different parts or blocks of building decontamination and preparation for demolition can be organised separately, therefore cases considered for buildings or parts thereof.	TS 27.1 punkto reikalavimas susijęs su kokybės užtikrinimo plano rengimo terminais - pirmoji versija turi būti parengta ir pateikta per 30 dienų, o bendras derinimas (pastabos, redagavimas ir galutinės versijos parengimas) iš viso neturi viršyti 60 dienų. PD E dalies (TS) 4 lentelėje nurodomos minėtos 60 dienų, tačiau pirmąją Kokybės užtikrinimo plano versiją tikimasi gauti 30 dienų po sutarties įsigaliojimo, kaip nurodyta 27.1 punkte B atveju vertinami sąlyginio išlaisvinimo metodai, taikant sąlyginius nebekontroliuojamus lygius (pagal Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.2-2018). Pagal BSR pastato griovimas galimas tik po atlasvinimo nuo radiologinės kontrolės, C atvejis yra griovimas užterštų konstrukcijų ir tuomet atliekų tvarkymas. Sąlyginis atlasvinimas yra apribojimas atliekų sutvarkymui, C atvejis yra apribojimai griovimui (vertinamos reglamentavimo sąlygos (teisinė bazė) ir reikalingos papildomos priemonės). Statinių dalies ar blokų dezaktyvavimas ir paruošimas griovimui gali būti organizuojamas atskirai, dėl to gali būti vertinami atskiri atvejai bendrai statiniams ar jų dalims/blokams.
According to para 25.2, can you please describe in more detail the meaning of the paragraph, especially the Deep Geological Repository relation to waste management of contaminated concrete structures.	Reikalavimas 25.2, patikslinkite detaliau ši reikalavimą, ypač giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno ryšį su užterštų betoninių konstrukcijų atliekų tvarkymu?	Requirement 25.2 refers to optioneering of possible solutions and selection of the most minimal impact, most rational solution for decontamination, demolition and radioactive waste management of contaminated structures. Deep Geological Repository is mentioned as an example of expensive and not the most rational solution, only justified waste should be put to Deep Geological Repository (when no other alternatives are possible). The requirement set out in 10.3 of Part A of the procurement documents regarding a copy of the joint activity (partnership)agreement apply only to groups of suppliers operating on the basis of a joint activity (partnership) agreement. This requirement does not apply when the supplier uses subcontractors.	25.2 reikalavime nurodomas galimų sprendimų svarstymas ir mažiausią poveikį darančio, racionaliausio užterštų konstrukcijų dezaktyvavimo, griovimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sprendimo pasirinkimas. Giluminis atliekynas minimas kaip pavyzdys ir minimas kaip brangus ir neracionaliausias sprendimas, ten turėtų būti dedamos tik pagrįstos atliekos (kai nėra kitų alternatyvų). Pirkimo dokumentų A dalies 10.3 p.nustatyti reikalavimai dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijos taikomi tik tiekėjų grupėms, viekančioms jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu. Šis reikalavimas netaikomas, kai tiekėjas pasitelkia subtiekiejus.
In the document 2_PD_A-D_parts_EN is stated "10.3. A copy of the joint activity (partnership) contract shall be signed by all members of the group of suppliers." Our interpretation is that this requirement is valid only for a consortium, and not e.g. for a group of companies where one is the tenderer and others are sub-contractors or supporting entities. Please confirm if the interpretation is right.	Dokumente 2_PD_A-D_parts_EN nurodyta: „10.3. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija turi būti pasirašyta visų tiekėjų grupės narių.“ Mūsų interpretacija yra tokia, kad šis reikalavimas taikomas tik konsorciui, o ne, pavyzdžiui, įmonių grupei, kurioje viena įmonė yra pirkimo dalyvis, o kitos – subrangovai arba palaikančiosios organizacijos. Prašome patvirtinti, ar ši interpretacija yra teisinga.		
Can you please advise, for the documents comprising the bid, what types of signatures can be used? Are qualified electronic signatures (according the EU legislation) preferred? In case the company does not use electronic signatures, can the bid documents be signed by hand and scanned?	Prašome patarti, kokie parašų tipai gali būti naudojami pasiūlymą sudarančiuose dokumentuose? Ar pirmenybė teikiama kvalifikuotiems elektroniniams parašams (pagal ES teisės aktus)? Jei įmonė nenaudoja elektroninių parašų, ar pasiūlymo dokumentai gali būti pasirašyti ranka ir nuskenuoti?	There is no requirement in the procurement documents for the supplier to sign the proposal with an electronic signature. However, according to point 6.6 of Part A of the procurement documents: "The supplier must provide a bid validity guarantee signed by the legal entity issuing the guarantee with a valid qualified electronic signature." Point 20.3 of Part A of the procurement documents states that: "<...> The winner shall sign the Contract within the deadline set by the contracting authority, indicating the date of signing, and return the signed Contract to the contracting authority, together with the performance guarantee of the Contract in paper form or signed by the legal entity issuing the guarantee with a qualified electronic signature."	Pirkimo dokumentuose nėra nustatytas reikalavimas tiekėjui pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu. Tačiau vadovaujantis Pirkimo dokumentų A dalies 6.6 p. "Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu ." Pirkimo dokumentų A dalies 20.3 p. numato, kad "<...> Laimėtojas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pasirašo Sutartį, nurodydamas pasirašymo datą, ir grąžina pasirašytą Sutartį perkančiajai organizacijai, kartu pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą popierine forma arba pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ."

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	



SUPPLIER'S TENDER FOR THE FIRST PART OF THE PROCUREMENT

Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and waste management of contaminated structures

Reg. No. 5874/2025
dated 23 May 2025
in Trnava

Supplier's name (if this is a group of suppliers, please indicate the group of suppliers acting on the grounds of joint activity contract and who it is comprised of: (please indicate the names of all partners))	Group of Suppliers: 1. VUJE, a. s. (LEADER) 2. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. – JAVYS, a. s. in short (MEMBER)
Partner in charge (please indicate the name of the partner in charge, if a group of suppliers is submitting the tender)	VUJE, a. s.
Supplier's address (if a group of suppliers is submitting the tender, please indicate the addresses of all partners)	1. Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovakia 2. Jaslovské Bohuniec 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovakia
First name and surname of the person in charge of the tender	
Phone and e-mail address	

Through this tender we highlight that we accept all procurement conditions specified in the PD.

The services offered:

		Currency: Euros
Sequence No	Name of services ²	Services price, ex. VAT ¹
1	Procurement of Services for Analysis and proposals for demolition and waste management of contaminated structures	797 520 EUR
Total price, ex. VAT¹		797 520 EUR
VAT (include rate)³		Not applied*
Total price, inc. VAT¹:		797 520 EUR
Total price, inc. VAT, in words: seven hundred and ninety-seven thousand five hundred and twenty euros		

**The tenderer shall submit a bid with a price excluding VAT.*

Given that the place of delivery of the service is in accordance with Slovak law, Section 15 of Act No. 222/2004 Coll. on value added tax (as amended) in the Member State of the recipient of the service, and that the recipient of the service is a person liable to pay tax pursuant to Section 69(3) of this Act, the reverse charge mechanism will apply to the aforementioned performance.

This practice is in accordance with Article 196 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.

If the sum in digits is different from the sum in words, the sum in words shall be deemed correct.

1. The prices shall be rounded up, by leaving two digits after the decimal point.
2. The name of the Service must conform to that indicated in the Technical Specification.
3. When in accordance with the valid statutes of law, the Supplier does not need to pay VAT, the Supplier shall

not complete the respective fields and indicate the reasons for not paying VAT.

By submitting this tender, we confirm that our offered price includes all taxes and all contract execution expenses, and that we assume risk for all expenses, which, by submitting the tender and adhering to the Technical Specification conditions, we included in the price of the tender.

Information about the Sub-suppliers or specialists and experts envisaged to be used during the execution of the Contract: *(to be completed if the Supplier intends to use for the execution of the Contract a Sub-supplier or specialists and experts, who during the submission of the tender are not the employees of the Supplier or Sub-supplier(s) being used by them; however, in the event of a successful tender, they will be employed):*

Sequence No	Name of the Sub-supplier, first name and surname of the specialists and/or experts	Part of obligations, by indicating specific contractual obligations being assumed, in respect of which the Sub-supplier is intended to be used, and/or qualification requirement(s), for the substantiation of which the indicated Sub-supplier, specialist and/or expert will be relied on

The Tender is submitted together with the following documents:

Sequence No	Name of submitted documents	Number of pages
1.	European Single Procurement Documents	
1.1.	ESPD VUJE, a. s.	17
1.2.	ESPD JAVYS, a. s.	24
2.	Memorandum of Understanding No. 9901/129/25/00 dated 19 May 2025 between VUJE, a. s. and JAVYS, a. s.	6
3.	Bank Guarantee No. GSB25001203 issued by AB Artea bankas	1
4.	References	
4.1.	Reference of VUJE, a. s.	2
4.2.	Reference of JAVYS, a. s.	1
5.	List of experts	7
6.	CVs and diplomas (sorted in alphabetical order):	
6.1a		2
6.1b		5
6.2a		2
6.2b		2
6.3a		5
6.3b		15
6.4a		3
6.4b		15
6.5a		5
6.5b		5
6.6a		4
6.6b		17
6.7a		2

6.7b		1
6.8a		3
6.8b		11
6.9a		4
6.9b		6
6.10a		4
6.10b		10
6.11a		3
6.11b		1
6.12a		4
6.12b		3
6.13a		2
6.13b		5
6.14a		2
6.14b		6
6.15a		4
6.15b		6
7.	ISO 9001 certificates	
7.1.	ISO 9001 VUJE, a. s.	1
7.2.	ISO 9001 JAVYS, a. s.	2
8.	Declarations of Supplier	
8.1	Declaration of Supplier – VUJE, a. s.	1
8.2	Declaration of Supplier – JAVYS, a. s.	1

To secure the Tender we provide the Tender Guarantee:

Specify the type of tender guarantee (bank guarantee or guarantee issued by a credit union or insurance company's letter of guarantee):	Bank Guarantee No. GSB25001203
Specify currency of tender guarantee:	EUR
Specify the amount of tender guarantee (amount in numbers):	30.000,00
Specify the guarantor:	AB Artea bankas

Tender validity period shall be 180 calendar days after the expiry of the deadline for submission of tenders (i.e. 22 November 2025).

We undertake to provide the security required by the Contracting Authority and meeting the requirements set out in the procurement documents to ensure the performance of the contract.

We indicate that confidential information is submitted in these parts of the tender documents:

Sequence No	Name of the confidential part of the tender (confidential document)
4.1.	Reference of VUJE, a. s.
4.2.	Reference of JAVYS, a. s.

By submitting this tender, we confirm that the economic entity submitting the tender and/or any proposed expert and other persons associated with the economic entity did not try and will not try that impartial and objective execution of this tender would be influenced by reasons associated with family, emotional life, political or civil dependence, economic interests or other general interests shared with the contracting authority that may cause a conflict of interests.

By submitting this tender, we confirm that:

- No limitations indicated in the Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine¹, including the amendments made through Council Regulation (EU) No 2022/576 of 8 April 2022² shall be imposed against the Supplier, sub-contractors, suppliers, and subjects, on whose capacities the Supplier relies on (in those cases when more than 10% of the value of the Contract falls to them);
- No limitations indicated in the Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine³, including the amendments made through Council Regulation (EU) No 2022/581 of 8 April 2022⁴ shall be imposed against the Supplier

VUJE, a. s.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0576>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220421>

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0581&from=LT>

LIST OF EXPERTS BY CATEGORIES

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	Employer of the expert (Name of Company)	Category of specialisation (mark "X" in each relevant column (there must be at least one per row))					
			Project Management	Radioactive waste management	Radiation protection	Engineering or physics in chemistry or radiochemistry or materials science	Civil Engineering	Environmental protection
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		JAVYS	X					
2		JAVYS	X	X	X			X
3		JAVYS			X			
4		JAVYS					X	
5		JAVYS		X		X		
6		JAVYS						X
7		JAVYS					X	
8		VUJE	X		X			
9		VUJE		X	X			
10		VUJE	X					
11		VUJE				X		
12		VUJE				X		
12		VUJE					X	
14		VUJE					X	
15		VUJE						X
TOTAL (indicate the number of persons)			4	3	4	3	4	3

EXPERT QUALIFICATIONS – PROJECT MANAGEMENT

IMPORTANT: All experts in the category “ Project management ” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	PROJECT MANAGEMENT (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in the field of project management and/or hold a certificate attesting to project management skills in accordance with Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Certification or equivalent methodology	(b) have at least 5 (five) years' work experience in the field of project management at a nuclear power plant, managing projects related to the modernisation, decommissioning or demolition of such a facility, or at an industrial site, managing projects related to the decontamination of such a facility	(c) have experience in managing at least 1 (one) completed project (or completed major milestone of the project) related to the decommissioning of a nuclear facility or the decontamination of an industrial facility.
	(1)	(2)	(3)	(4)
1			X	X
2			X	X
3			X	X
4		X		
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

EXPERT QUALIFICATIONS – RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

IMPORTANT: All experts in the category “Radioactive waste management” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in the fields of science and/or engineering, occupational safety, safety engineering or nuclear engineering	(b) have at least 5 (five) years' work experience related to the management of radioactive waste: radiological characterisation, transport and/or packaging of such waste	(c) have experience in implementing at least 1 (one) task (project) related to the preparation of safety documentation for the management of radioactive waste and/or the planning of the radioactive waste stream
	(1)	(2)	(3)	(4)
1		X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

EXPERT QUALIFICATIONS – RADIATION PROTECTION

IMPORTANT: All experts in the category “Radiation protection” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	RADIATION PROTECTION (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in materials science, chemistry, physics or nuclear engineering	(b) have at least 5 (five) years of work experience related to the preparation of safety analysis reports for nuclear energy facilities and/or preparation of other safety documents for nuclear energy facilities	(c) have experience in implementing at least 1 (one) task (project) related to the preparation of safety documents for the decommissioning of a nuclear energy facility and/or radioactive waste management (safety analysis, preparation of a technology project or similar)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1		X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	X
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

EXPERT QUALIFICATIONS – ENGINEERING OR PHYSICS IN CHEMISTRY OR RADIOCHEMISTRY OR MATERIALS SCIENCE

IMPORTANT: All experts in the category “Engineering or Physics in Chemistry or Radiochemistry or Materials science” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	ENGINEERING OR PHYSICS IN CHEMISTRY OR RADIOCHEMISTRY OR MATERIALS SCIENCE (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in the fields of environmental protection, materials science, chemistry, physics or nuclear engineering	(b) have at least 5 (five) years' work experience related to the assessment of radiological or industrial contamination of nuclear facilities and/or related to the assessment of radiological or chemical contamination of the environment	(c) have experience of participating in at least 1 (one) project in which radiological or chemical contamination of a nuclear or industrial facility has been assessed and/or removed
	(1)	(2)	(3)	(4)
1		X	X	
2		X	X	X
3		X	X	X
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

EXPERT QUALIFICATIONS – CIVIL ENGINEERING

IMPORTANT: All experts in the category “Civil Engineering” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	CIVIL ENGINEERING (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in the field of civil engineering	(b) have at least 5 (five) years of work experience in the field of civil engineering (including construction research, design, expertise, technical maintenance)	(c) have experience participating in at least 1 (one) project during which a demolition project for a building with radiological or chemical contamination was prepared and/or calculations of mechanical resistance and stability were prepared, and/or demolition of building with radiological or chemical contamination was carried out.
	(1)	(2)	(3)	(4)
1		X	X	X
2		X	X	X
3		X	X	X
4		X	X	X
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

EXPERT QUALIFICATIONS – ENVIRONMENTAL PROTECTION

IMPORTANT: All experts in the category “Environmental protection” must be indicated in the following table.

Sequence No	First name and surname of experts (surname in capital letters)	ENVIRONMENTAL PROTECTION (mark “X” in each relevant column (there must be at least one per row))		
		(a) have a higher education degree or equivalent academic qualification in the fields of environmental, chemical, physics or nuclear engineering	(b) have experience in participating in the preparation of at least 1 (one) report on the environmental impact of decommissioning activities or demolition of a nuclear facility or industrial facility contaminated with chemicals	(c) have experience in at least 1 (one) hydrogeological modelling or hydrogeological modelling assessment
		(2)	(3)	(4)
1		X		X
2		X	X	
3		X	X	X
		(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)	(There must be at least one “X” in this column)

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovakia

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Approval number(s): ISO 9001 – 0051164, ISO 14001 – 0051163, ISO 45001 – 0051165

The scope of this approval is applicable to:

Project management, engineering, research and development, analyses and calculations, design and development, manufacture, construction, assembly, commissioning, operation, diagnostics and testing of equipment, destructive and non-destructive testing, maintenance, repair, reconstruction, decommissioning, demolition, training, emergency planning, IT solutions, and consulting for the areas:

- nuclear facilities (the entire life cycle of the facility, including systems, structures, buildings, components, nuclear fuel, radioactive waste management and decontamination,
- electrical systems,
- renewable energy sources,
- conventional energy facilities and industry,
- steel structural units, pressure and non-pressure equipment,
- crisis management.

7

Area Operations Manager, Europe

Issued by: LRQA Limited



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
280044-2018-AQ-CZS-RvA

Initial certification date:
11 February 2016

Valid:
11 February 2025 – 10 February 2028

This is to certify that the management system of
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360, 919 30, Jaslovské Bohunice, Slovak Republic
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

**Decommissioning of Nuclear Facilities and Management of Radioactive Waste,
Institutional Radioactive Waste, Radioactive Materials of Unknown Origin
and Spent Nuclear Fuel.**

Place and date:
Barendrecht, 02 December 2024

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Zwolsseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands



Appendix to Certificate

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Jaslovské Bohunice 360, 919 30, Jaslovské Bohunice, Slovak Republic	Decommissioning of Nuclear Facilities and Management of Radioactive Waste, Institutional Radioactive Waste, Radioactive Materials of Unknown Origin and Spent Nuclear Fuel.
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Mochovce, 935 39, Mochovce, Slovak Republic	Radioactive Waste Treatment and Repositioning of Processed Radioactive Materials.
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovak Republic	Administration activities

	CONSORTIUM AGREEMENT	DOHODA O KONZORCIU
(1)		
(2)		
	WHEREAS:	VZHLADOM NA TO, ŽE:
(A)		
(B)		
(C)		

(D)		
	Article I Purpose of the Consortium, Name of the Consortium	Článok I Účel Konzorcia, názov Konzorcia
1.1		
1.1.1		
1.1.2		
1.2		
1.3		
	Article II Consortium Formation and Dissolution	Článok II Vznik a rozpustenie Konzorcia
2.1		
2.2		
2.2.1		
	Article III Legal Status of the Consortium and Members	Článok III Právne postavenie Konzorcia a Členov
3.1		

3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
	Article IV Scope of Member Activities	Článok IV Rozsah činností Členov
4.1		
4.2		
	Article V	Článok V

	Management of the Consortium	Správa Konzorcia
5.1	Leader:	Líder:
5.1.1		
5.1.2		
5.1.3		
5.1.4		
5.1.5		
5.2	Board of Representatives:	Rada zástupcov:
5.2.1		
5.2.2		

5.2.3		
5.2.4		
5.2.5		
5.3	Project Manager	Projektový manažér
5.3.1		
5.3.2		
5.3.3		
5.3.4		

	Article VI Contract Implementation	Článok VI Plnenie Zmluvy
6.1		
6.2	Changes Contract (scope of work):	Zmeny Zmluvy (rozsah plnenia):
6.2.1		
6.2.2		
6.3	Financing:	Financovanie:
6.3.1		
6.3.2		
6.4	Surety, Bonds and Guarantees:	Zábezpeka, banková záruka a ručenie

6.4.1		
	interests:	
6.5	Insurance:	Poistenie:
6.5.1		
6.6	Subcontracting:	Subdodávateľia:
6.6.1		
6.7	Defects and penalties:	Vady a zmluvné pokuty:
6.7.1		
6.7.2		
6.7.3		

	Article VII Confidentiality	Článok VII Mlčanlivosť
7.1		
7.2		
	Article VIII Penalties	Článok VIII Zmluvné pokuty
8.1		
	Article IX Termination of Membership in Consortium	Článok IX Ukončenie členstva v Konzorciu
9.1		

v
o
f
v
k
r
o
a
y
J
i
e

9.2		
9.3		
	Article X Disputes Resolution and Governing Law	Článok X Riešenie sporov a rozhodné právo
10.1		
10.2		
10.3		
	Article XI Delivery	Článok XI Doručovanie
11.1		
11.1.1		
11.1.2		

11.2		
11.3		
	Article XII Final provisions	Článok XII Záverečné ustanovenia
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		

	prevail.	anglické znenie.
12.8		
12.9		
12.10		

In / v Bratislava, on / dňa 24.11.2025

In / v Trnava, on / dňa 24.11.2025

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.:

VUJE, a.s.:

Podpredseda predstavenstva

Member of the Board of Directors

Člen predstavenstva

Chairman of the Board of Directors

Predseda predstavenstva

Vice-Chairman of the Board of Directors

Podpredseda predstavenstva

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

(data)

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.:	
Sutarties pavadinimas:	

Visos teikiamos paslaugos, nurodytos paslaugų sąrašė, buvo suteiktos, pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas suteiktas paslaugas priėmė ir patvirtina, kad suteiktos paslaugos atitinka sutarties sąlygas.

Tiekėjas patvirtina, kad jam netaikomi ribojimai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose.

Paslaugų sąrašas:

Valiuta:						Eur	
Eilės (Etapo) Nr.	Paslaugos suteikimo terminai		Paslaugos arba prekės pavadinimas ir/ar aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
	pradžia	pabaiga					
1	2		3	4	5	6	7=6×5
Iš viso be PVM:							
PVM [tarifas]*:							
Iš viso su PVM:							

Tiekėjo atstovas		Pirkėjo atstovas:	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

A.V.

A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

Trišalės atsiskaitymo sutarties forma

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS

20__ m. _____ d. Nr. _____

Vilnius

Perkančiosios organizacijos pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Tiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Tiekėjas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti tiekėjų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

ir

Subtiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subtiekęjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad [Pirkėjas ir Tiekėjas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekeju tvarka ir sąlygos.

1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Pirkimo sutarties sąlygos. Jokios šios Trišalės sutarties nuostatos neturi būti aiškinamos kaip prieštaraujančios ar panaikinančios Pirkimo sutarties sąlygas.

1.3. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.4. Avansinis mokėjimas nemokamas. Pirkėjo pareiga sumokėti Subtiekeiui pagal šią Trišalę sutartį atsiranda tuo pačiu momentu, kaip ir Pirkėjo pareiga sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutartį.

1.5. Kiekvieno mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų vertę ir/arba pristatytų prekių kiekį bei jų vertę].

1.6. Subtiekęjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.7. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekejo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekejo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.8. Tiekėjas gavęs iš Subtiekejo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekejo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.8.1. pasirašo ir patvirtina Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą;

1.8.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.8.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

1.9. Jeigu Tiekėjas nustato, kad SubtiekJėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes]* yra neteisinga, *[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės]* neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai SubtiekJėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.10. Per Tiekėjo nustatytą terminą SubtiekJėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

1.11. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienas]* nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes]* yra teisinga, *[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės]* atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir SubtiekJėjui.

1.12. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes]* yra neteisinga, *[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės]* neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.13. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir SubtiekJėjui.

1.14. SubtiekJėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS adresu <https://sabis.nbfc.lt/> pateikia ją Pirkėjui.

1.15. Jei SubtiekJėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.16. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje nurodytą atsiskaitymo terminą]* nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į SubtiekJėjo nurodytą banko sąskaitą.

1.17. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus SubtiekJėjui..

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimio sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku visų Šalių susitarimu šiais atvejais:

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimio sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienai kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekėjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

4.5. Susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

Tiekėjo atstovas		Subtiekėjo atstovas		Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:	
Pirkimo sutarties pavadinimas:	
Pirkimo sutarties pasirašymo data:	
Trišalės sutarties Nr.:	
Trišalės sutarties pasirašymo data:	
Tiekėjas:	
Subtiekėjas:	
Pirkėjas:	

Visos [tiekiamos prekės] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [paslaugų] sąraše, buvo [pristatytos] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas [pristatytas prekes] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas.

[Prekių] [Paslaugų] sąrašas:

Valiuta:									Eur
Eil. Nr.	[Užsakymo data]	[Pristatymo] [Suteikimo] data	Vietos adresas	[Garantinis terminas]	[Prekės] [Paslaugos] pavadinimas (įvardinant tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8×9
Iš viso be PVM:									
PVM [tarifas]*:									
Iš viso su PVM:									

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Pirkimo sutartį vykdymo.

Perdavė Subtiekėjo atstovas		Patvirtino Tiekėjo atstovas		Priėmė Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

A.V.

A.V.

T33206

** - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priešastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.*

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo formos. Tiekėjas gali pateikti ir kitos formos garantijas arba laidavimo raštus, suderinęs su perkančiąja organizacija. Tokių užtikrinimo dokumentų sąlygos privalo atitikti D dalyje „Kita informacija“ pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba sąlygų pirkėjo įsipareigojimams. Užtikrinimo formos bei užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtinumas prieš pateikiant užtikrinimą turi būti derinamos su pirkėju.

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

(perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

(data)

(vieta)

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties Nr. pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], įsipareigojimai pagal su [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... „[Sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija įsigalioja Sutarties įsigaliojimo dieną. Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]. Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Jeigu Garantijos gavėjo reikalavimas pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tačiau Garantantas nustato, kad Garantui dėl pagrįstų priežasčių reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavėjo reikalavimu, Garantantas privalo raštu paprašyti Garantijos gavėjo pateikti Garantui reikalingus dokumentus ar informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs. Papildomų dokumentų ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas nėra taikomas;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

||

T33206

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Garanto pavadinimas:

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

LAIDAVIMO RAŠTAS*

(perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

(data)

(vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo draudimo numerį].

Esant prieštaravimams tarp Draudimo taisyklių ir Laidavimo rašto nuostatų, pirmenybė suteikiama Laidavimo rašto nuostatoms.

Kliento [įrašykite tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau – Perkančioji organizacija) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo laidavimu.

Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Perkančiajai organizacijai [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu numato pasirašyti Sutartį, TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį. Klientas be Perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės pakeisti arba nutraukti Draudimo sutartį.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas asmuo [vardo raidė, pavardė, parašas]:

** - Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant nuorodą į taisykles, kurių pagrindu nustatytos draudimo sąlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklėse numatyta, kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijų draudimo liudijimo (poliso) egzempliorių pasirašymu, privalo būti pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi būti pateikta mokestinio pavedimo, įrodančio polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei, patvirtinta kopija.]*

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Adresatas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika VUJE, a. s. 2020392539, Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-18 Nr. PSt-420(13.67E)/2025
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.87
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-18 16:19:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-18 16:20:40 Dokumentų valdymo sistema Avilys
