Darbų vykdymo grafikas 2022-2023 m.

Objektas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mokomasis korpusas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, modernizavimo projektas
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Rangovas: UAB "Milsta"

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	mato vnt.	kiekis	trukmė, d.d.	2022 m. gegužės mėn.												2022 m. birželio mėn.																					2022 m. liepos mėn.																				
					16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	27	28	29	30	1	4	5	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mokomasis korpusas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, modernizavimo projektas																																																									
1	Darbo projekto parengimo darbai	kompl .	1	250													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Statybvietės paruošiamieji darbai: aptvėrimai, vagonelių pastatymas, laikina apskaita	kompl.	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																										
3	Projekte numatytų demontavimo darbų atlikimas	kompl.	1	14													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
4	Nuogrindos ardymo darbai ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m2	55	2						1	1																																															
5	Pamato atkasimo darbai darbai ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m3	190	8								1	1	1	1	1	1	1	1																																							
6	Pamato teptinės hidroizoliacijos įrengimas bei pamato apšiltinimas ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m2	245	10																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																													
7	Nuogrindos ardymo darbai ašyse "1-5"	m2	40	2																										1	1																											
8	Pamato atkasimo darbai darbai ašyse "1-5"	m3	145	6																												1	1	1	1	1	1																					
9	Pamato teptinės hidroizoliacijos įrengimas bei pamato apšiltinimas ašyse "1-5"	m2	200	8																																		1	1	1	1	1	1	1	1													
10	Nuogrindos ardymo darbai ašyse "I-A"	m2	25	2																																										1	1											
11	Pamato atkasimo darbai darbai ašyse "I-A"	m3	100	4																																												1	1	1	1							
12	Pamato teptinės hidroizoliacijos įrengimas bei pamato apšiltinimas ašyse "I-A"	m2	155	6																																																1	1	1	1	1	1	
13	Nuogrindos ardymo darbai ašyse "7-2"	m2	67	2																																																						1
14	Pamato atkasimo darbai darbai ašyse "7-2"	m3	226	9																																																						
15	Pamato teptinės hidroizoliacijos įrengimas bei pamato apšiltinimas ašyse "7-2"	m2	281	12																																																						
16	Pamatų užpylimo darbai	m3	660	16																										1	1	1	1													1	1	1	1									1
17	Ventkamerų ir šilumos punktų numatytų demontavimo darbų atlikimas	kompl.	1	20																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Parapetų mūro darbai, reikalingų sienų atkarpų mūro darbai	m3	33.3	20																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Langų bei lauko durų keitimo darbai	vnt.	15	33																																																						1
20	Pastolių montavimo darbai ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m2	900	3																										1	1	1																										
21	Fasado apšiltinimas ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m2	750	38																													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	Fasado apdailos įrengimas, skardinimo darbai ašyse "8-7, H-C, 5-8"	m2	750	65																																																						1
23	Pastolių montavimo darbai ašyse "1-5"	m2	600	2																																																						
24	Perdangos esamo pakalimo demontavimas ašyse "4-5"	m2	190	5																																																						
25	Fasado apšiltinimas ašyse "1-5"	m2	450	15																																																						
26	Perdangos apšiltinimas ašyse "4-5"	m2	190	7																																																						
27	Fasado apdailos įrengimas, skardinimo darbai ašyse "1-5"	m2	450	40																																																						
28	Perdangos pakalimo įrengimas	m2	190	47																																																						
29	Pastolių montavimo darbai ašyse "I-A"	m2	450	2																																																						
30	Fasado apšiltinimas ašyse "I-A"	m2	300	43																																																						
31	Fasado apdailos įrengimas, skardinimo darbai ašyse "I-A"	m2	300	25																																																							
32	Pastolių montavimo darbai ašyse "7-2"	m2	953	3																																																						
33	Fasado apšiltinimas ašyse "7-2"	m2	770	104																																																						
34	Fasado apdailos įrengimas, skardinimo darbai ašyse "7-2"	m2	770	91																																																							
35	Laiptų ir nuovažos įrengimas	m3	11.6	33																																																						
36	Stogo remonto darbai: šiltinimas bei dangos įrengimas 1sl. ašyse "4-5"	m2	790	18																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
37	Stogo langų montavimas ašyse "4-5"	vnt.	32	10																																							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
38	Dangos įrengimas 2sl. ašyse "4-5"	m2	790	10																																																				1	1	1
39	Stogo priklausinių montavimas: stogo kopėčios, stogo aptvėrimai ašyse "4-5"	kompl.	1	65																																																						
40	Stogo remonto darbai: šiltinimas bei dangos irengimas 1 sl. ašyse "5-8"	m2	840	19																																																						
41	Stogo langų montavimas ašyse "5-8"	vnt.	39	12																																																						
42	Dangos įrengimas 2sl. ašyse "5-8"	m2	840	11																																																						
42	Stogo priklausinių montavimas: stogo kopėčios, stogo aptvėrimai ašyse "5-8"	kompl.	1	65																																																						
43	Stogo remonto darbai: šiltinimas bei dangos irengimas 1 sl. ašyse "1-4"	m2	760	17																																																						
44	Stogo langų montavimas ašyse "1-4"	vnt.	24	8																																																						
45	Dangos įrengimas 2sl. ašyse "1-4"	m2	760	9																																																						
46	Stogo priklausinių montavimas: stogo kopėčios, stogo aptvėrimai ašyse "1-4"	kompl.	1	65																																																						
47	Ventkamerų ir šilumos punktų grindų įrengimo darbai	m2	667	10																																																						1
48	Ventkamerų ir šilumos punktų sienų apdailos darbai	m2	990	10																																																						
49	Ventkamerų ir šilumos punktų lubų, grindų apdailos darbai (667m2+667m2)	m2	1334	12																																																						
50	Angų kirtimas esamose konstrukcijose, metalinių saramų montavimas	tn	0.375	42																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Šildymo sistemos modernizavimas	kompl.	1	64																																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Vėdinimo sistemų modernizavimo darbų I stadijos atlikimas	kompl.	1	209																																																						1
53	Ortakių aptaisymas ir apdailos atstatymas po inžinerinių sistemų įrengimo	m2	1028	149																																																						
54	Vėdinimo įrenginių montavimas ant stogo	kompl.	1	35																																																						
55	Inžinerinių sistemų modernizavimo darbų II stadijos atlikimas	kompl.	1	44																																																						
56	Inžinerinių sistemų paleidimo-derinimo darbai	kompl.	1	33																																																						
57	Dangų atstatymo darbai	m2	414	47																																																						

I auditorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo grafikas

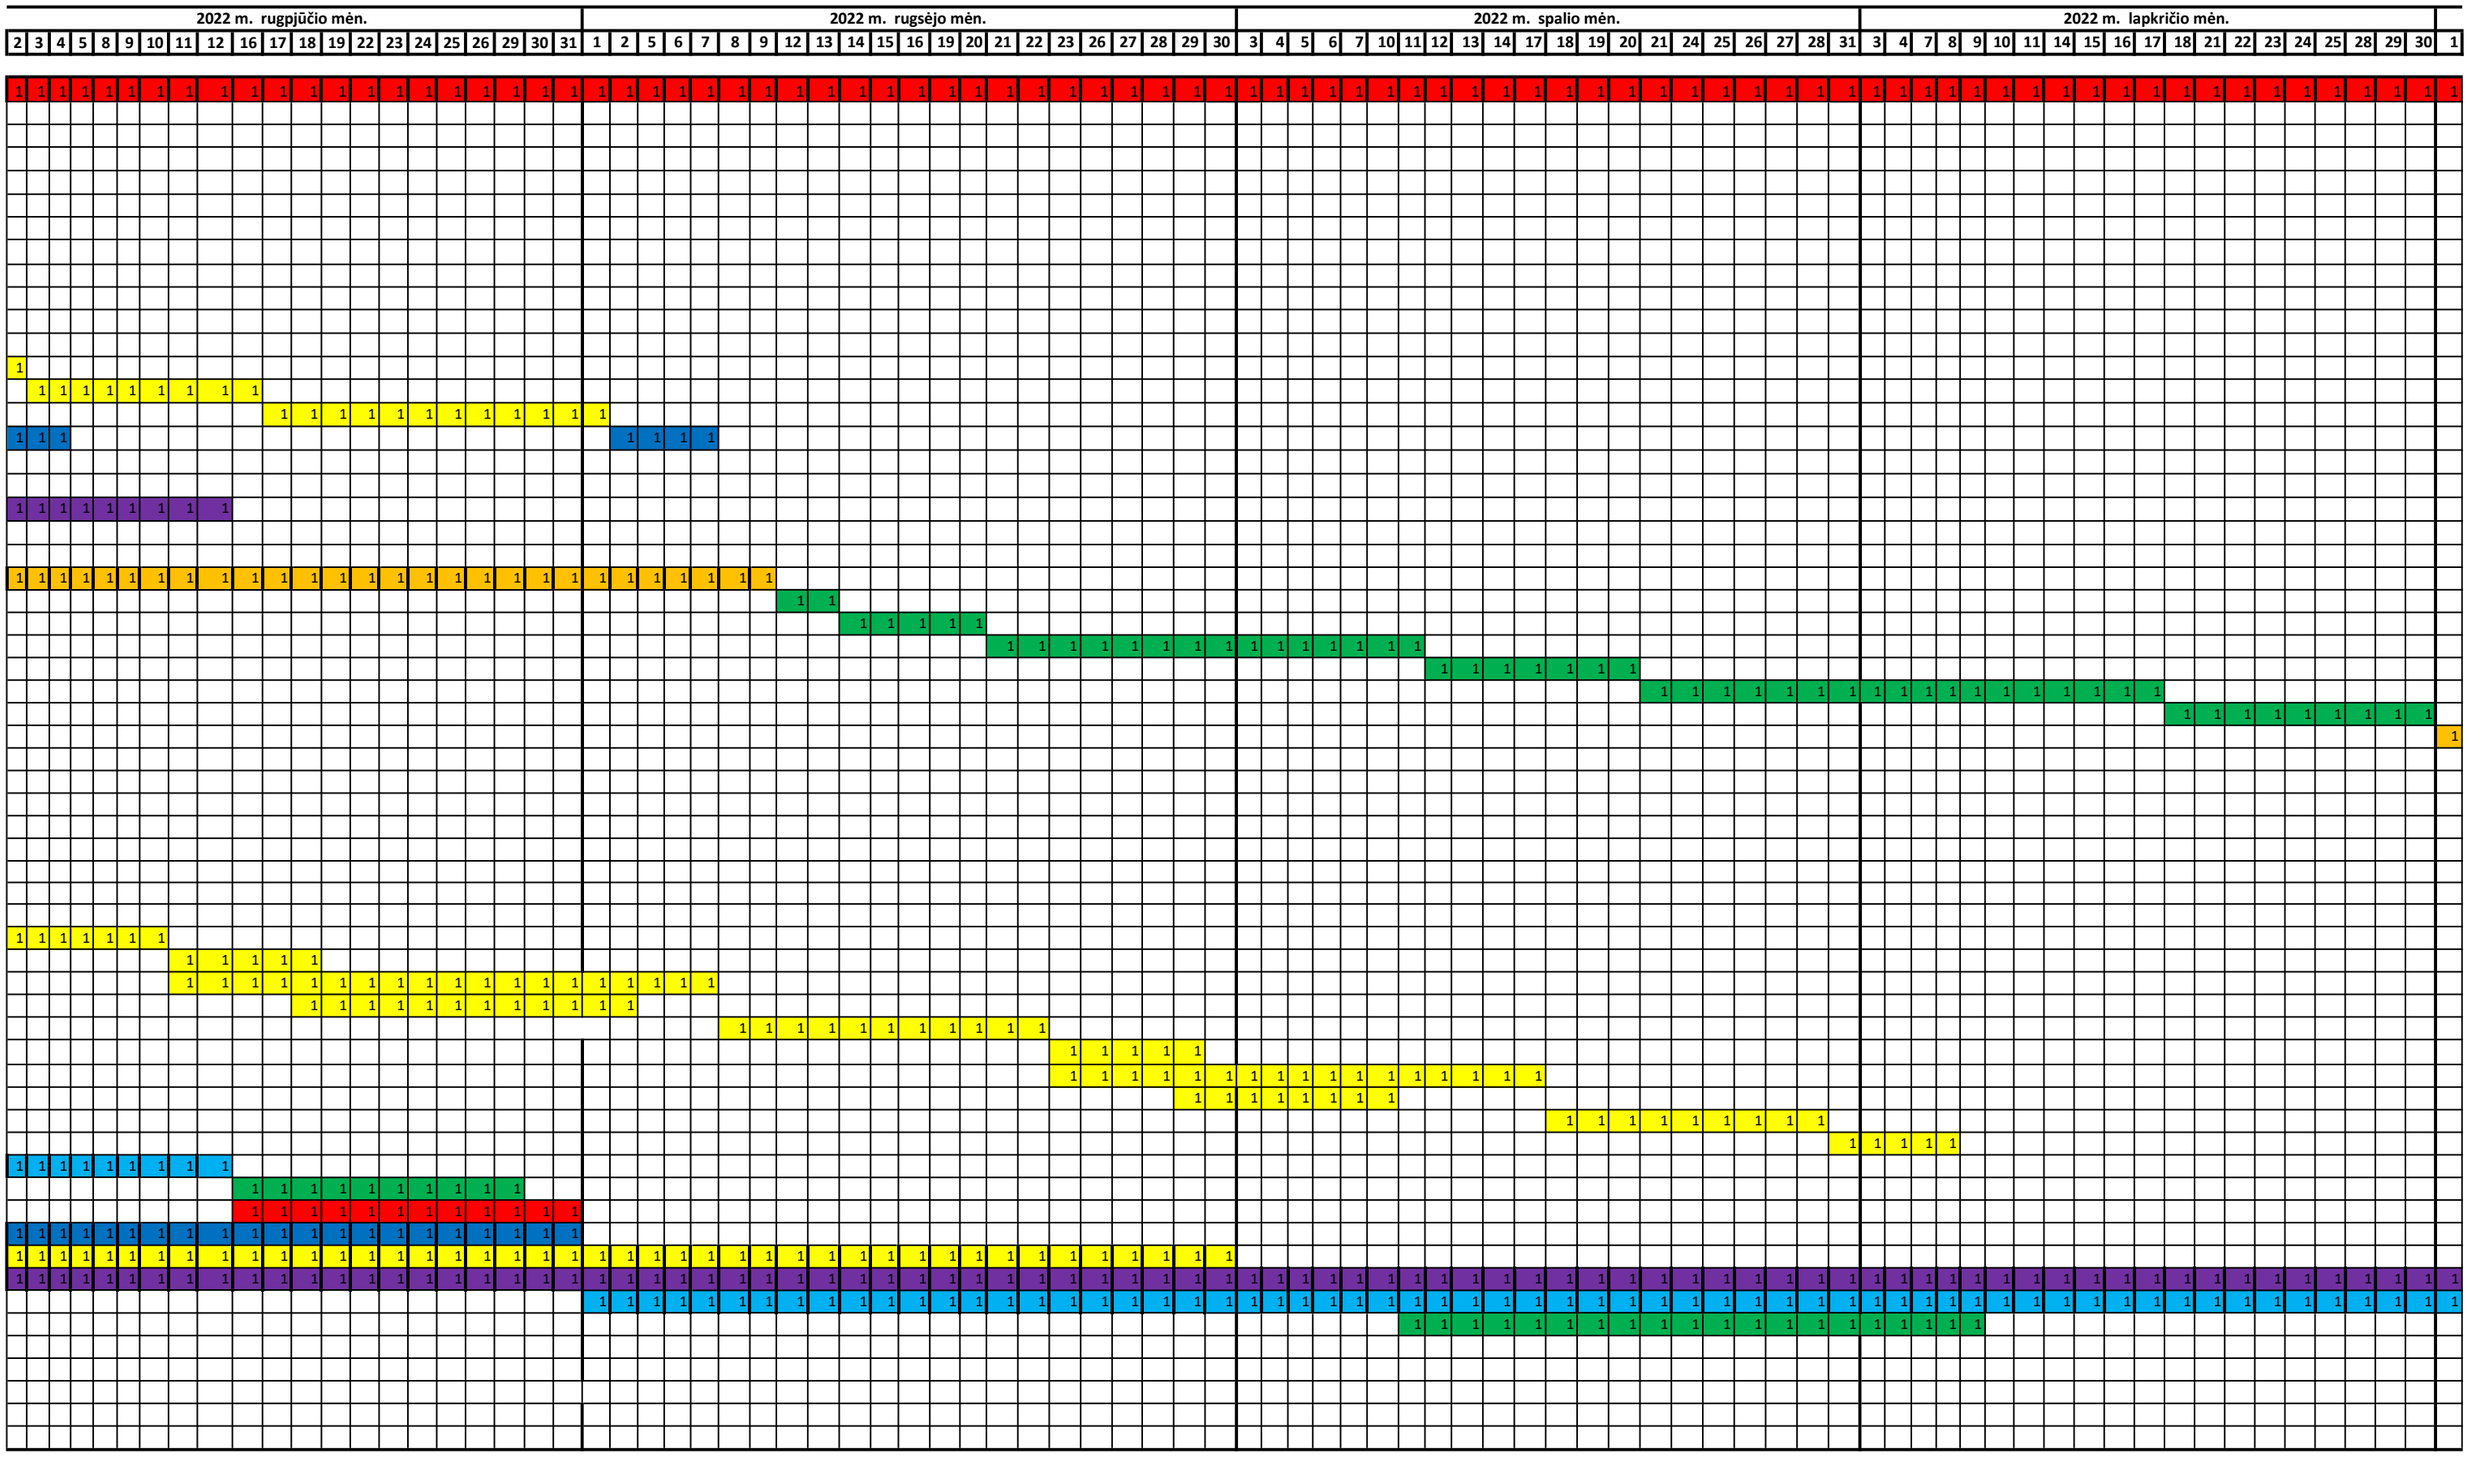

2022-04-13 sutartis Nr. 10.13-2022-307

2022 m. gruodžio mėn.																					2023 m. sausio mėn.																						2023 m. vasario mėn.																			2023 m. kovo mėn.																													
2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	17	20	21	22	23	24	27	28	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1																																																																																									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																							
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																				
																							1	1	1																																																																	
																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																																																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																																																																																				1	1	1	1	1	1	1
																																																																																				1	1	1	1	1	1	1
																																																																																				1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																											1	1	1	1	1	1	1
																																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																														
																																																													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

2023 m. balandis mėn.																							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																1	1	1	1	1	1	1	1
																1	1	1	1	1	1	1	1
															1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																		1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2023 m. gegužės mėn.																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	1	1	1	1	1	1																							
1	1																													
1	1	1	1	1																										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1																							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																									1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

2023 m. Birželio mėn																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1																													
1	1	1	1																											
