Statytojas	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Užsakovas	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinio projekto pavadinimas	„ŠVENTOSIOS PAKRANTĖS, ABIEJOSE UPĖS PUSĖSE, TARP VILNIAUS G. TILTO IR PĖSČIŲJŲ TILTO UKMERGĖJE SUTVARKYMO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ) STATYBA“
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio paskirtis	KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Statinio kategorija	NESUDĖTINGIEJI STATINIAI
Statinio projekto Nr.	P2409
Statinio projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statinio projekto dalis	PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS
Bylos žymuo Laida	SO

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
Projekto vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	13931	2023	
Projekto dalies vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	23861	2023	

Vilnius, 2024 m.

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai	Statinio projekto pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projekto dalis: Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas: Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	Laida: 0
	ARCH	Gabrielė Grigaitė			
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: P2409-XX-TDP-SO_PDSŽ	Lapas: 1 / Lapų: 2

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-BD-01	0	Bendroji dalis	
P2409-XX-TDP-SP-02	0	Sklypo plano dalis	
P2409-XX-TDP-SA-03	0	Statinio architektūrinė dalis	
P2409-XX-TDP-SK-04	0	Statinio konstrukcinė dalis	
P2409-XX-TDP-S-05	0	Susisiekimo dalis	
P2409-XX-TDP-E-06	0	Elektrotechnikos dalis	
P2409-XX-TDP-SO-07	**0**	**Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis**	
P2409-XX-TDP-KS-08	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-SO_PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
P2409-XX-TDP-SO_AR	22	0	Aiškinamasis raštas	

PROJEKTO PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
Nuorasas_Rastas del potvynio rizikos valdymo	2	0	Potvynio rizikos valdymas	

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P2409-XX-TDP-SO_B-01	16	0	Statybvietės schema M 1:250	
P2409-XX-TDP-SO_B-02	1	0	Kultūros paveldo schema	
P2409-XX-TDP-SO_B-03	16	0	Kultūros paveldo planas M 1:250	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2024		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	susisiekimo komunikacijų sprendimai		Statinio projekto pavadinimas „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas	Projekto dalis Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis		
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	ARCH	Simona Gaigalaitė	Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas		Laida
	ARCH	Gabrielė Grigaitė	Aiškinamasis raštas		0
	ARCH	Mantas Meštaras			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo P2409-XX-TDP-SO_AR	Lapas 1	Lapų 40

Turinys

1. Projekto rengimo pagrindas....4
1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai....4
1.2 Projektuojamo statinio duomenys....5
2. Projekto skirstymas etapais....5
3. Klimato sąlygos....5
4. Statybos vietos apibūdinimas....7
4.1 Technologiniai procesai....7
4.2 Statybos geodezinė kontrolė....8
5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas....8
6. Archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas statybos darbų metu....10
7. Esamos būklės analizė....11
7.1 Situacijos schema....11
7.2 Dabartinė teritorijos būklė....11
7.3 Urbanistinė situacija....12
7.4 Susisiekimo infrastruktūra....12
7.5 Gamtinis karkasas....12
8. Kultūros paveldo aprašymas....13
8.1 Ukmergės miesto nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių žemėlapis....13
8.2 Informacija apie objektą....14
8.3 Projekto sprendinių galimos įtakos NKV (unik. k. 2990 ir unik k. 17116) įvertinimas....20
8.4 Paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių tvarkymo priemonių sistema....21
8.5 PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimų vykdymo užtikrinimas:....22
8.6 Vertingųjų savybių: įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą apsauga....22
8.6.1 Įvažiavimas į 41 kvartalą....22
8.6.2 Skersgatvis į 45 kvartalą....24
8.7 Saugomi medžiai saugomoje teritorijoje....25
9. Projektiniai sprendiniai....26
10. Projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams....26
10.1 Apšvietimo atramų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams:....28
10.2 Teritorijų planavimo dokumentų taikymo eiga....28
11. Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas....29
12. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos....29
13. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai....30
14. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos....30
15. Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos....31
16. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos....32
17. Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu 32
18. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas nurodant techninius rodiklius....33
19. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos....34
20. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas....34
21. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai....34
22. Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos....34
23. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos....35
24. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą....35
25. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos....35
26. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos....36
27. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje....36
28. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės....36
29. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai....36
30. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas....37
31. Trasos paruošimas....38

31.1 Pagrindo įrengimas 38
31.2 Dangų įrengimas 39
32. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai....39
33. Privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo 39
34. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 39
35. Statybvietės aptvėrimas....39
36. Pavojingos statybvietės zonos 39
37. Statybos trukmė....40

1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
1116	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
LST 1516–98	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
PTR 2.13.01:2022	„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“
ISO 21542:2011	„Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“
ISO 23599:2012	„Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“
--	„Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22)“
VIII-1185	„Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas“
VIII-1312	„Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas“
VIII-971	„Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas“
VIII-1864	„Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas“
TPDR Nr. T000834270	Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas (koreguotas 2019-01-31 sprendimu Nr. 7-14; TPDR Nr. T000834270).

1.2 Projektuojamo statinio duomenys

Techninio projekto rengėjas: MB „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI“
Techninio projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.
Statinio vieta: Šventosios pakrantės teritorija Ukmergės mieste nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais.
Statinio pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį: Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

2. Projekto skirstymas etapais

Darbų įgyvendinimas numatomas 3 etapais:
1) I etapas - dešiniojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Paupio g. pusėje) nuo esamo tako iki pėsčiųjų tilto;
2) II etapas - kairiojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Gruodžio 17-osios g. pusėje) nuo pėsčiųjų tilto iki Vilniaus g. tilto;
3) III etapas - jungtis nuo pėsčiųjų tilto iki Sveikatos parko.
Projektavimo paslaugų etapavimas reikalingas, kad kiekvieną iš jų įvykdžius atskirai, objektą būtų galima priduoti eksploatuoti.

3. Klimato sąlygos

Klimatas apibūdinamas taip:

- Vyrauja vakarų, pietų ir pietvakarių vėjai, vidutinis greitis svyruoja nuo 2,5 iki 3,9 m/s;
- Vidutinis metinis kritulių kiekis – 650 mm;
- Vidutinė metinė oro temperatūra – +5,8-+7,1 ºC;
- Vidutinė žiemą (sausis, vasaris) – -6 ir -5,2 ºC;
- Vidutinė vasarą (liepa) – +16,8 ºC.
- Absoliutus maksimumas (1992 m)- +35,3ºC
- Absoliutus minimumas (1956 m)- -42,9 ºC
- Vidutinis metų vėjo greitis –nuo 2,5 iki 3,9 m/s.

Metinis kritulių kiekis - 630 mm.
Maksimalus sniego storis stebimas sausio-kovo mėnesiais ir sudaro 37-38 cm (gali svyruoti skirtingais metais). Pastovi sniego danga susidaro gruodžio mėn. pabaigoje.
Didžiausias įšalo gylis - 144 cm.
Dėl pakilusios žiemos mėnesių vidutinės oro temperatūros sumažėjo įšalo gylis. Per paskutinį dešimtmetį jis siekia 89 cm (2006 m).
Maksimalus sniego dangos storis siekia 38 cm, 2013 m- 33 cm.
Pateikti duomenys konkrečiais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyčiams ateityje gali kisti.

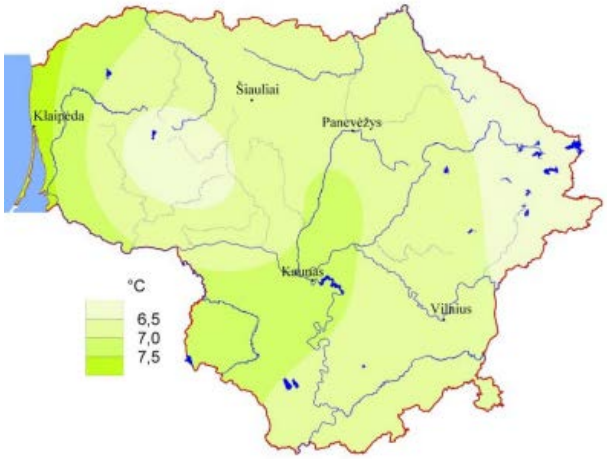

1 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

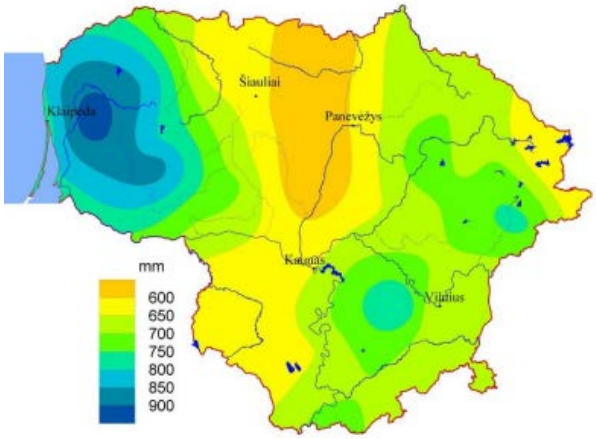

2 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

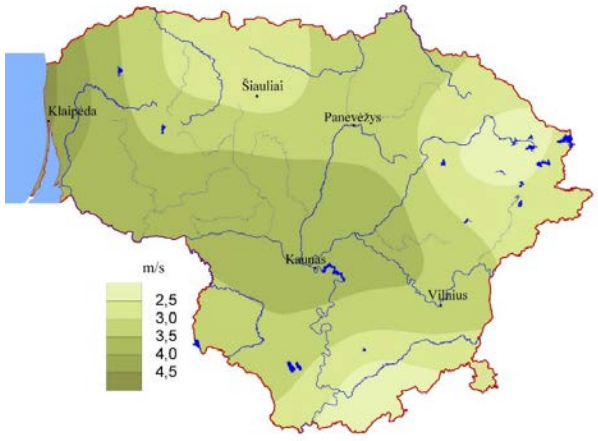

3 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

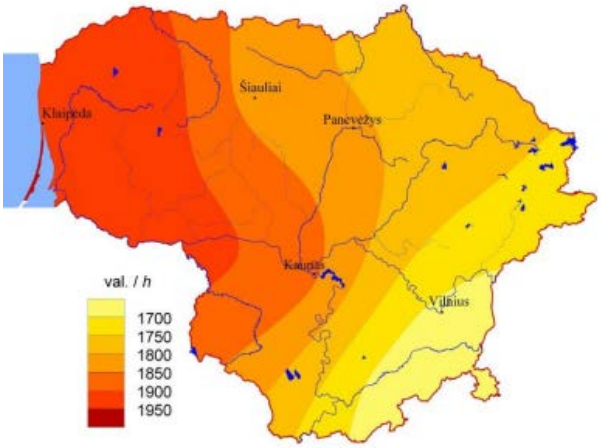

4 pav. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė
(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

4. Statybos vietos apibūdinimas

4.1 Technologiniai procesai

Darbai atliekami šia tvarka:

- Trasos nužymėjimas;
- Statybos sklypo paruošimas;
- Atvežamos pagrindo sluoksnių medžiagos ir sandėliuojamos keliose vietose išilgai trasos;
- Žemės sankasos įrengimas;
- Šalčiui nejautrių dangos sluoksnių įrengimas;
- Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas;
- Vedama elektra, montuojamas teritorijos apšvietimas
- Trinkelių dangos įrengimas, dedami bortai;
- Tankintų atsijų takų įrengimas;
- Medienos kompozito takų įrengimas;
- Cinkuotų presuotų grotelių takų įrengimas;
- Montuojami mažosios architektūros elementai;
- Įrengiamos želdinimo zonos bei vejos vietos;
- Išvežamos šiukšlės;
- Tvarkomi tako pakraščiai, sodinami krūmai ir žoliniai augalai, sėjama veja.

Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieną pamainą per parą. Objekte nebus statomi g/b rezervuarai kuriems reikalaujama atlikti hidraulinius bandymus. Būtinos technologinės pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijų montavimui. Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas. Pradedant statybos darbus, pateiktus sprendimus būtina peržiūrėti, kadangi laikotarpiu nuo projekto atidavimo iki jo įgyvendinimo pradžios gali pasikeisti statybinės aplinka: geologinių sąlygų pasikeitimas, papildomų inžinerinių komunikacijų paklojimas, gretimų teritorijų užstatymas ir pan. Vykdydamas statybos darbus Rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais statybos srityse. Rangovas turi turėti atitinkamą kvalifikacijos atestatą Rekonstrukcijos Projekte numatytų darbų vykdymui.

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė). Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo statybos sustabdymo. Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio priežiūrą iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos taršą iš statybvietės, taip pat už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą.

4.2 Statybos geodezinė kontrolė

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ III skyriaus reikalavimais rekomenduojama atlikti statybos geodezinių kontrolinė nuotrauką geodeziniams nužymėjimo darbams.

Nutiestus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. Geodezinių nuotraukų techniniai reikalavimai apibrėžiami specialiomis statybos taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinėms nuotraukoms atlikti specialistus iškviečia rangovas. Iškviečiama raštu, kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų rūšis, jų ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruoštos geodezinei nuotraukai.

Statybos darbų žurnalo III skyriuje pateikiamos statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas. Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16 pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai papildomi Žurnalai). Registruojant nurodomų schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas:

Lauko inžineriniai tinklai:

- Lauko nuotekų tinklai;
- Lauko elektros tinklai;

Geodezinė kontrolinė turi būti parengta ir kitais statybos norminių dokumentų nustatytais atvejais.

Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų bazė ir sudaroma galimybė užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą.

Statytojas per 3 darbo dienas iki objekto priėmimo komisijos darbo pradžios apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatytų požeminių tinklų komunikacijų geodezinę nuotrauką. Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodamas vienas geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui – kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Nuotraukose turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai.

5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas

Prieš pradedant statybos darbus turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, gautas statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtini brėžiniai ir techninės specifikacijos. Statybos rangovas privalo parengti technologinį projektą, darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. Prieš prasidedant statybos darbams Rangovas prie statybos sklypo (statybvietės) privalo įrengti stendą su informacija apie statomą statinį. Technologiniam projektui atlikti ekspertizę nebūtina. Statybos darbų zonos turi būti aptvertos, kad nepatektų pašaliniai asmenys.

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymo tvarka:

Statinio statybos techninės priežiūros kvalifikaciniai reikalavimai skirti: Inžineriniams tinklams (nuotekų šalinimas) ir kiti inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė).

Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai: vykdant statybos darbus, privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų

pirkimų dokumentuose. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik techninės priežiūros koordinavimo klausimais. Fiziniai asmenys einantys ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi būti atestuoti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis: statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas:

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

1. Kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 darbuotojų, prieš įrengiant statybvietę statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranešimą;
2. Prieš pradedant darbus turi būti nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos. Jos turi būti pažymimos ir numatoma jų apsauga;
3. Vykdant pavojingus darbus (fasadų ir stogų šiltinimas ir t. t.), Rangovas tiems darbams būtinai parengia technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai;
4. Jei statybvietėje dirbs daugiau nei vienas statybos rangovas privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių;
5. Įrengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) netoli modernizuojamo pastato arba esant galimybei ir suderinus tai su užsakovu, laikinas buitines patalpas siūloma įrengti pastato laisvose patalpose;
6. Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (2,0 m aukščio su 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus žmonių judėjimas); tvora įrengiama nekasant grunto. Visi išėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją.
7. Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.
8. Įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;
9. Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);
10. Turi būti parengtas statybos darbų technologijos projektas (fasadų ir stogų šiltinimas ir t. t.), kurį parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų;
11. Jei statybinės medžiagos bus sandėliuojamos kitiems savininkams priklausančioje žemėje statybos rangovas privalo gauti raštišką sutikimą;
12. Statybos aikštelė nakties metu apšviečiama prožektoriais, kurie įrengiami nekasant grunto. Atstumas tarp atramų 25 – 30m.
13. Prie statybvietės įrengiami visi reikalingi laikini kelio ženklai.
14. Turi būti įrengti saugūs vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties įėjimais įrengiami apsauginiai stogeliai apsaugai nuo krentančių medžiagų ar kitų daiktų.
15. Darbų eiliškumas bei inžinerinių tinklų atjungimas turi būti suderintas su modernizuojamo statinio administracija.

Darbų specifika:

1. Darbai šiltuoju metų laiku. Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai šaltuoju metų laiku. Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną. Darbų vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinės

sąlygos kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Meteorologinės sąlygos neturi turėti įtakos atliekamų darbų kokybei. Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas:

Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas.

Statybos metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų žurnale.

Uždariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.

Pareikalavus projektuotojui pažeistas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas pašiltintu gruntu.

Įrengiant komunikacijų pagrindus žiemą, šildant gruntą būtina:

šildomą plotą aptverti ne arčiau kaip 3 m atstumu ir pastatyti įspėjamuosius ženklus;

nakties metu apšviesti aptvertą šildomą grunto plotą;

šildant elektra naudoti neaukštesnė kaip 380 V įtampą, šildomą vietą privalo nuolat stebėti darbuotojas, turintis ne žemesnę kaip VK elektrosaugos kvalifikaciją;

atšildant gruntą degiomis dujomis arba garu, reikia imtis atitinkamų saugos priemonių, kad nenukentėtų darbuotojai.

Tikslus darbų eiliškumas ir jų atlikimo specifika privalo būti išspręsta technologiniame projekte. Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios bei asbesto turinčias medžiagos. Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti įrengtas informacinis skydas, kuriame būtų nurodytas Rangovas ir Subrangovai, taip pat statybos darbų vadovo, projekto vadovo, subrangovų darbų vadovų ir techninės priežiūros vadovo kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).

Kiekvieną dieną baigus darbus, sutvarkyti darbo vietą. Jei darbų metu, sugadintas ir pažeistas, gyventojų ar trečiųjų šalių kilnojamas/nekilnojamas turtas, Rangovas per 5 darbo dienas atstato iki sugadinimo buvusią būklę arba kompensuoja nuostolius.

Darbai turi būti vykdomi dienos metu (nuo 7 iki 19 val.). Paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas

6. Archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas statybos darbų metu

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai (archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. Inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių dalyvavimas yra būtinas, kai statybos darbai atliekami.

7. Esamos būklės analizė

7.1 Situacijos schema

5 pav. Situacijos schema. Projektuojama teritorija

7.2 Dabartinė teritorijos būklė

Ukmergės miestas įsikūręs Lietuvos vidurio lygumoje. Vakaruose ir Šiaurės vakaruose rajono kraštovaizdį sudaro lygumos, rytiniame pakraštyje prasideda Aukštaičių aukštuma. Teritorijos aukštumas nuo žemumų skiria Šventosios upė ir jos intakai. Ukmergės miestą į dvi dalis dalija per jį tekanti Šventosios upė.

Šventosios upės teritorija, tai apleisto ir sunykusio kraštovaizdžio arealo teritorija. Nagrinėjama teritorija yra Ukmergės mieste, nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais. Teritorija nėra užstatyta, neurbanizuota.

Šventosios upės ilgis 246 km, baseino plotis 6888,8 kv. m, vidutinis debitas 55,1 kūb.m/s. Šventoji upė yra Rytų Lietuvoje, didžiausias Neries intakas (Nemuno baseinas). Ši upė ilgiausia, kuri teka vien tik per Lietuvos teritoriją. Šventoji – viena iš didžiausių Lietuvos upių. Ji pasižymi plačiu iki 1 km slėniu.

Projektuojama teritorija patenka į Ukmergės senamiesčio (u.k. 17116) ir jo apsaugos zoną, Šventosios ichtiologinį draustinį, Natura 2000 teritorija – Šventosios upė, žemiau Andrioniškio. Būtina išsaugoti minėtų teritorijų vertę bei steigimo tikslus.

Ukmergės miestą į dvi dalis dalinanti Šventosios upė kartu su slėniu yra nacionalinės reikšmės saugoma teritorija – Šventosios ichtiologinis draustinis, kurio steigimo tikslas – išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes. Šventosios ichtiologinio draustinio ribos ties Ukmerge sutampa su tarptautinės svarbos Natura 2000 buveinių apsaugai svarbia teritorija – Šventosios upe žemiau Andrioniškio, kurioje saugomos šių nykstančių rūšių buveinės: auksaspalvio kirtiklio, Baltijos lašišos, kartuolės, paprastojo kirtiklio, pleištinės skėtės, ūdros bei upinės nėgės.

Šventosios upe ties Ukmerge praeina Nacionalinis Šventosios vandens turistinis maršrutas – vienas iš trijų nacionalinių maršrutų, kertančių Ukmergę. Kiti du – nacionalinė autoturizmo trasa „Aukštaitijos keliai“ ir nacionalinė dviračių turizmo trasa. Tačiau, kaip nurodoma Ukmergės miesto teritorijos bendrajame plane, turistinis-rekreacinis potencialas nėra pakankamai išnaudojamas, siektinas didesnio turistų srauto pritraukimas, taip pat miesto gyventojų poilsio sąlygų gerinimas, gyvenamosios aplinkos kokybės augimas.

Šventosios upės pakrantės teritorija apima valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Šių erdvių sukūrimui, projekto įgyvendinimui bus gautas Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas.

7.3 Urbanistinė situacija

- Projektuojama teritorija šiaurėje ribojasi su Paupio g., rytuose – su pėsčiųjų tiltu, pietuose – su Gruodžio 17-osios g., vakaruose – su Ukmergės tiltu;
- Projektuojama teritorija yra abiejose Šventosios upės pakrantės pusėse tarp Ukmergės ir pėsčiųjų tiltų;
- Parko teritorija priklauso intensyviai lankymui naudojamų želdynų ir aikščių kategorijai, t.y. rekreaciniai želdynai, miesto parkai ir skverai ir kitos aktyviai naudojamos teritorijos, miesto aikštės;
- Pastatų gretimybės: šiaurėje - gyvenamieji namai 2 ir 3 aukštų komercinės paskirties pastatai, pietuose – gyvenamieji namai 2 ir 3 aukštų;
- Gretimybės: Ukmergės miesto stadionas (220 m), parduotuvė „Poppri“ (70 m), Ukmergės „Viešpaties Prisikėlimo“ cerkvė (220 m), parduotuvė „Rimi“ (323 m), Ukmergės „Antano Smetonos“ gimnazija (368 m), Ukmergės r. savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (208 m)
- Pro sklypo teritoriją vakarinėje dalyje praeina žemos įtampos elektros oro linija bei buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis. Centrinėje dalyje praeina požeminis vandentiekio vamzdis.
- Kadangi parko želdynai priklauso intensyviai lankymui naudojamų želdynų funkcinei zonai, jie yra priskiriami rekreacinės paskirties želdynų ir mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynų kategorijoms.
- Projektuojama teritorija dalinai priklauso intensyvaus užstatymo mišriai gyvenamajai ir miškų ir miškingų teritorijų zonoms.

7.4 Susisiekimo infrastruktūra

- Automobilių eismas teritorijoje nėra įrengtas, bet gyventojai turi pasidarę savo privažiavimus.
- Teritorijoje susisiekimas vyksta įrengtais ir savadarbiais pėsčiųjų takais. Pagrindinis takas yra vakarinėje sklypo dalyje nuo Ukmergės tilto iki J. Basanavičiaus gatvės;

7.5 Gamtinis karkasas

- Projektuojama teritorija patenka į Šventosios upės ichtiologinį draustinį;
- Projektuojama teritorija patenka į Natura 2000 buveinių apsaugai svarbias teritorijas;
- Parke vyrauja lapuočiai medžiai ir krūmai, pagrinde gluosniai ir karklai. Auga kelios eglės ir vaismedžiai.
- Projektuojamą teritoriją kerta Šventosios upė. Kiti artimiausi vandens telkiniai – Dovydiškių tvenkinys (7km), Kurėnų ežeras (6,6 km), Mūšios tvenkinys (7,26 km);
- Kitos artimiausios žaliosios erdvės — Sveikatos parkas, Mirabelių takas Ukmergės pilies parkas, Ukmergės piliakalnis, Svajotojų parkas, Miniatiūrų parkas;

Fotofiksacija Nr. 1

Fotofiksacija Nr. 2

Fotofiksacija Nr. 3

Fotofiksacija Nr. 4

Įvertinus esamą projektuojamos vietos būklę, buvo nustatyta tokia situacija: sklype trūksta pėsčiųjų takų, apšvietimo, mažosios architektūros objektų, naujų želdinių, numatyti vaizdo stebėjimo kameras saugumui užtikrinti.

8. Kultūros paveldo aprašymas

8.1 Ukmergės miesto nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių žemėlapis

Vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrąją kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą reikšmę kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje turinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registro duomenimis planuojama teritorija patenka į nekilnojamosios kultūros paveldo objekto – Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299), paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijas bei Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) vizualinės apsaugos pozonį. Šios teritorijos taip pat yra tvarkomos vadovaujantis Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu – tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. ĮV-594 (toliau – Specialusis planas). Šventosios ichtiologinį draustinį, Natura 2000 teritorija – Šventosios upė, žemiau Andrioniškio. Būtina išsaugoti minėtų teritorijų vertę bei steigimo tikslus.

13 pav. Kultūros paveldas

Sutartiniai ženklai:

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos Ukmergės senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis

8.2 Informacija apie objektą

Unikalus objekto kodas 17116.
Pilnas pavadinimas Ukmergės senamiestis.
Adresas Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.
Įregistravimo registre data 1994-05-31.
Statusas Valstybės saugomas.
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis.
Rūšis Nekilnojamas.
Teritorijos KVR objektas: 1111172,00 kv. m.; Vizualinės apsaugos pozonis: 1141388,00 kv. m.
Vertybė pagal sandarą Vietovė.
Amžius XI-XX a.

Vertingosios savybės:

- **Vietovės plano struktūros tipas.**

Radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje (iki tol savaime susiklosčiusį radialinį planą ŠV miesto dalyje pakoregavo 1870 m. parengtas projektas, pagal kurį buvo numatyta tiesti naujas tiesias gatves, kurios su esamomis gatvėmis sudarytų kvartalus; esamas miesto planas susiformavo iki XIX a. pab.; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

- **Vietovės plano struktūros tinklas.**

Dešiniajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais, pagrindinėmis Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. bei stačiakampio plano Kęstučio a. centrinėje miesto dalyje; kairiajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su pagrindinėmis Vilniaus, Antakalnio ir Bugenių g. (dešiniajame krante turgaus a. prie Vienuolyno g. iš dalies pakito, buvusi turgaus a. Pilies kalne panaikinta XX a. 4 deš. įrengus čia skverą, kairiajame krante pagrindinių gatvių susikirtime buvusi turgaus a. neišliko; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

- **Kvartalai.**

Istorinių kvartalų ir sklypų ribos (-; iš dalies pakitusios; žr. 13.13, 29; BR Nr. 3-52; IKONOGR Nr. 22; -; 2013 m.);

- **Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos.**

Gatvių trasos: Kauno, Vilniaus, Vytauto g., Kęstučio a., Pilies, Pakalnės, Molėtų, Pirties, Utenos, Paupio, Piliakalnio, Gedimino, Vasario 16-osios, Klaipėdos, Giedraičių, Širvintų, Sodų g., Gedimino skg., P. Cvirkos, Ramygalos, Deltuvos, Vilkmergėlės, Kalkių, Daržų, Virėjų, Amatininkų, Bažnyčios, Vaižganto, Maironio g., Kurklių g. R atkarpa tarp Ukmergėlės upelio ir Darbininkų g., Darbininkų, Kalvių, Kranto g., Žuvų g. P atkarpa tarp Vytauto g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Medžiotojų, Upelio, J. Basanavičiaus, Antakalnio, Bugenių, Nuotekų, Pavasario, Bugenėlių, Akloji, Siauroji, Vėjų, Žalioji, Miškų, Kreivoji, S. Nėries, Gruodžio 17-osios, Lelijų, Gružų, Pievų, Smėlių g., Beržų g. R dalis (išskyrus Paupio g. V dalį iki Utenos g., Kranto g. atkarpą prie pastatų Žuvų g. Nr. 5 ir 7; dalis gatvių trasų XX a. II p. buvo iš dalies pakeistos arba panaikintos, Pakalnės g. R dalis pakeista 1942-1946 m.; Molėtų g. R dalis, Širvintų g. PV dalis, Aklosios g. ŠR dalis neišliko; senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; TRP; BR Nr. 5-52; IKONOGR Nr. 10, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 1.1, 2.1, 4-6, 10, 13, 3.1, 7, 10, 4.1, 3, 25.2, 13, 16, 18, 5.3, 5, 11-16, 6.1-3, 5, 6, 7.1-3, 5-7, 8.2, 9.1-7, 10.5-9, 12, 13, 11.3, 12.1-2, 7, 13.1, 3, 12, 15, 17, 14.15, 17, 18, 21-23, 28, 29, 15.1, 8, 16.1, 7, 17.1, 3, 5, 9, 11, 18.1, 6, 7, 9, 19.9-11, 20.1, 2, 4, 5, 7, 21.9, 11, 14, 22.2, 4-6, 23.9, 10, 12, 24.6, 9-12, 15, 26.1, 6, 11, 13, 27.1, 7, 8, 10, 11, 13, 28.1, 2, 4, 5, 8, 29.1, 7, 8, 30.1-3, 5-9, 31.1, 5-7, 32.1, 20, 33.8, 11, 34.7, 9, 11, 14, 17, 18, 35.1, 3, 5, 9, 36.4, 9, 14, 17, 37.3, 8, 38.1-4, 6, 39.19, 22, 26, 28, 33, 40.1, 4, 7, 41.5, 7, 8, 14, 42.9, 44.1, 45.1, 3, 4, 46.2, 47.1, 4, 48.1, 3-5, 9, 49.3, 6, 50.2, 51.1, 52.1-3, 53.3, 54.1, 6, 7, 56.2, 4, 57.3, 4, 6, 9, 11-14, 58.3, 4, 59.1, 60.2, 4, 61.3, 4, 62.1, 2, 63.1, 3, 5, 64.3, 5, 6, 65.1, 2; 2013 m.); Kęstučio a., jos apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (manoma, kad aikštė susidarė XV a. pab. - XVI a. pr., tačiau jos ankstyviausia forma nėra žinoma; palei Kauno-Daugpilio plentą susidariusi aikštė XVIII a. II p. buvo pailga ir siaura, nuo XIX a. ji vaizduojama netaisyklingo stačiakampio plano; kiek vėliau, pastačius pastatus R dalyje, aikštė sumažėjo, įgavo taisyklingesnio stačiakampio planą; nuo XIX a. vid. miesto

planuose aikštė vaizduojama jau su želdiniais; 1930 m. aikštės centre buvo pastatytas paminklas ,,Lituania restituta“, u.k. 15795, 1957 m. aikštės R dalyje pastačius „Draugystės“ kino teatrą, u.k. 33738 ir įrengus skverą priešais jį, buvo suardyta buvusios aikštės plano struktūra; -; TRP 27; BR Nr. 34; IKONOGR Nr. 5-9, 11, 13-15, 18, 21, 22, 36, 42-48; FF Nr. 0.20, 33.1, 4-6, 8, 18, 19; 2013 m.); turgaus a. 1 kvartale (iki XX a. vid. aikštė buvo trapecijos formos, vėliau sumažinta, įrengus skverą R dalyje; iš dalies pakitusi; TRP 27; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 21-23; FF Nr. 1.1, 3, 2.10-13; 2013 m.); Vienuolyno g.-bulvaro trasa, jos apželdinimo liepomis pobūdis (XX a. 4 deš. Vienuolyno g. viduryje įrengta pėsčiųjų alėja, pasodintos liepos, XXI a. pr. gatvė rekonstruota: pakeista grindų danga, pasodintos naujos liepos; -; TRP 27; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 27.1, 4, 6, 7, 28.1, 8, 12, 13; 2013 m.); įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., į 12 kvartalą iš Bažnyčios g., į 13 kvartalą iš Darbininkų g., į 39 kvartalą iš Vytauto g., į 32 kvartalą iš Kauno g., į 36 kvartalą iš Pirties g., į 48 ir 49 kvartalus nuo S. Nėries g., į 53 kvartalą nuo Bugenėlių g., įvažiavimas-įėjimas į 17 kvartalą iš Vytauto ir Darbininkų g., skersgatvis tarp 10 ir 13 kvartalų, buv. Kepėjų skersgatvis 19 kvartale, buv. Žuvų skersgatvis 24 kvartale, 2 skersgatviai, kertantys 21 kvartalą, įvažiavimai į 41 kvartalą iš Paupio g., skersgatvis į 45 kvartalą (nuo Pirties g. link Vilniaus g. vedusi buv. Šaltinių g. ir buv. Dirvonų g. po XX a. vid. virto įvažiavimais; iš dalies pakitę; TRP 13-19, 22, 23; BR Nr. 12, 15, 18, 20, 25-27, 30, 33, 38, 40, 44; IKONOGR Nr. 17-22, 24; FF Nr. 5.9-11, 10.9, 15, 12.3, 13.5, 6, 15, 16, 17.15, 18-20, 19.3, 6, 21.5, 8, 12, 13, 24.7, 12, 32.15, 36.16, 17, 39.3, 9, 41.13, 14, 16, 45.5, 48.7, 49.5, 53.2; 2013 m.); 42 kvartalą juosianti kelio trasa (po XX a. 5 deš. iš dalies pakito; -; TRP 19, 20; BR Nr. 39; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22; FF Nr. 42.1, 3-6, 12; 2013 m.); tašytų stačiakampių akmens trinkelių grindinys Kęstučio a. atkarpoje nuo namo Kauno g. Nr. 2 iki Gedimino g. (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė gera; TRP 17, 19; IKONOGR Nr. 43, 44, 46-49; FF Nr. 32.20, 33.1; 2013 m.); lauko akmenų ir tašytų stačiakampių akmens trinkelių grindinys 25 kvartalo P dalyje tarp pastatų Kęstučio a. Nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir pastatų Gedimino g. Nr. 4, 6 (-; būklė gera; TRP 17; -; FF Nr. 25.3-9; 2013 m.); lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos, Vasario 16-osios g. ŠR atkarpos tarp pastato Gedimino g. Nr. 21 ir Kranto g., Kranto g. atkarpos tarp sankryžos su Širvintų g. ir namo Kranto g. Nr. 12, Žuvų g. atkarpos tarp Širvintų g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Širvintų g. V atkarpos tarp pastatų Gedimino g. Nr. 9 ir Širvintų g. Nr. 20, kvartalo Nr. 24 skersgatvio ir P dalies kieme (grindiniai perkloti, rekonstruoti XX a. pab.-XXI a. pr., dalis senojo Vasario 16-osios g., Darbininkų g. grindinio likę fragmentiškai ir po dabartine danga, lauko akmenimis grįstos Kurklių ir Žuvų gatvių šiaurinės atkarpos nutiestos XX a. vid.; būklė bloga, patenkinama; TRP 16, 17; FF Nr. 13.12, 13, 15, 17, 14.27-33, 15.5, 21.6, 22.1-3, 22.5, 23.7, 9, 10, 24.10-14; 2013 m.); Antakalnio g. akmenų grindinys (2023 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu šurfuose aptiktas grindinys, datuojamas XX a. 3 deš.; būklė gera; žr. 15.33, 34; TRP 22; BR Nr. 53; FF Nr. 0.28; 2023 m.);

- Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos.

Perimetrinio - posesijinio užstatymo vietos 34 kvartalo Š dalyje, 35 kvartalo Š dalyje, 27 kvartalo PR dalyje (Vytauto, Vilniaus g., Kęstučio a. užstatymą formavę pastatai nugriauti per II pasaulinį karą, XX a. II p.; 34 kvartalo Š dalyje nugriovus pastatus, jų vietoje 1957 m. pastatytas kino teatras ir įrengtas skveras; -; TRP 17, 18; BR Nr. 9, 37; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 33, 43-48; FF Nr. 27.9, 34.1, 2, 35.1, 2, 11, 12; 2013 m.); sinagogos vieta 58 kvartale (mūrinė sinagoga nugriauta XX a. pab.-XXI a. pr.; -; TRP 22; IKONOGR 18, 22, 24-26; FF Nr. 58.4; 2013 m.); žydų maldos namų vieta 60 kvartale (maldos namai nugriauti XX a. 5 deš.; -; TRP 22; BR Nr. 48; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 60.2; 2013 m.);

- Vietovės gamtiniai elementai.

Reljefas: dešiniojo Šventosios kranto - į Š terasomis kylantis, išraiškingas reljefas, kurį formuoja dominantės - piliakalnis (3539) ir Pilies kalnas, Š-P, V-R krypčių Šventosios upės ir Ukmergėlės upelio slėniai; kairiojo Šventosios kranto - lygus, su nežymiu nuolydžiu į Š pusę (-; -; BR Nr. 2; IKONOGR Nr. 23, 24, 26, 27, 29-41, 54-58; FF Nr. 0.1-24, 6.1, 2, 7.1-3, 5, 10.5-7, 13, 14, 13.8, 9, 11-15, 17, 14.15-22, 24-30, 15.1-8, 16.4-7, 17.10-17, 19.9-11, 20.1-3; 32.3, 24, 26, 27, 29, 33.8, 11, 34.3, 4, 7, 10, 14-17, 35.1, 8-12, 36.3, 7, 11-17, 37.1-4, 6, 8-10, 38.1-7, 39.19-25, 28, 30-32, 40.4, 6, 41.1, 5, 9, 16-19, 42.1, 4-7, 11, 12, 43.1; 2013 m.); Šventosios upės krantų linijos (senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; -; TRP; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22, 25-28, 39-41; FF Nr. 0.1-4, 10-12, 41.17, 18; 2013 m.); Ukmergėlės upelio krantų linijos (P dalyje iš dalies pakitusios, Š dalyje pakitusios; mažiausiai pakito tarp 6 ir 10, 36 ir 38 kvartalų; -; TRP; IKONOGR Nr. 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22; FF Nr. 0.5, 18, 24, 6.3-6, 10.8, 11, 36.7, 11-15, 37.1, 6, 10, 11, 38.4, 41.1; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.);

- Tūrinė erdvinė struktūra.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių bei urbanistinės struktūros statinių formuojama daugialypė struktūra abipus Šventosios upės: dešiniajame krante - sudaryta iš pagrindinių Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. su Kęstučio a. centre ir vyraujančiu perimetriniu - posesijiniu, perimetriniu - reguliariu užstatymu, laipsniškai link pakraščių pereinančiu į sodybinį; dominuojančiais objektais - piliakalniu (3539) ir Pilies kalnu, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkve (35159) bei buv. odų fabriku Paupio g., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia su varpine (17240) Bažnyčios g., Švč. Trejybės bažnyčia Kauno g.; kairiajame krante - sudaryta iš pagrindinių Vilniaus, Antakalnio, Bugenių g. su vyraujančiu sodybiniu užstatymu (senamiesčio išskirtinumą lemia kompleksinis gamtinių elementų, plano struktūros ir užstatymo visuma; sovietmečiu buvo nugriauta didelė dalis vertingų pastatų pagrindinėse gatvėse, pastatyta senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatų, suformuota naujų erdvių, iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 18, 22, 27-64; FF Nr. 0.1-27; 2013, 2023 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros užstatymo tipai.

Perimetrinis - posesijinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mūriniais 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 18, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 35, iš jų atskiru 3 a. su pastoge savivaldybės pastatu Kęstučio a. Nr. 3, kvartale Nr. 33 (aukštis iki karnizo 3-8,80 m, iki kraigo 4,50-11,80 m; vyrauja mūriniai 2 a. pastatai; miesto savivaldybės pastatas Kęstučio a. Nr. 3 rekonstruotas 1965 m. užstatant 3 a., jo aukštis iki karnizo 11,20 m., iki kraigo - 14,50 m; 34 kvartalo Š dalies, 27, 35 kvartalų tankus perimetrinis - posesijinis užstatymas sunaikintas per II pasaulinį karą, XX a. II p.; dalis Pilies g. pastatų yra su cokoliniais aukštais; -; TRP 27; BR Nr. 25, 26, 34, 37; IKONOGR Nr. 18, 22, 29, 32, 36, 42-50, 53, 54, 58, 59; FF Nr. 18.2-4, 6, 7, 19.1-5, 21.1-14, 24.1-10, 12-15, 25.1-3, 5-12, 27.6-8, 32.21-23, 33.1-5, 7-14, 19, 35.1, 3-6; 2013 m.); perimetrinis - reguliarus vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 57 kvartalo ŠR dalyje (aukštis iki karnizo 2,50-9,40 m, iki kraigo 3,90-12,40 m; -; TRP 27, 28; BR Nr. 6, 7, 8-11, 21, 24-26, 32, 33, 35-38; IKONOGR Nr. 18, 22, 38, 37, 45, 52, 55, 60, 61; FF Nr. 2.6, 9, 2.14-17, 14.1-7, 10, 33, 34, 16.1, 2, 7, 17.1-4, 18.1, 8, 9, 19.6-11, 20.1-7, 22.1-3, 6, 23.1-12, 25.13-19, 26.1-3, 6-8, 10-12, 27.2-4, 10-14, 28.2, 3, 5-13, 29.1, 8, 9, 31.4-7, 32.4, 7, 9-15, 33.15-17, 34.4-7, 35.7-12, 36.1-3, 37.3-7, 39.1-5, 13-16, 20, 21, 33, 57.1, 2; 2013 m.); mišrus: sodybinis, sodybinis perimetrinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis, mezoninais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, kvartalo Nr. 44 PR dalyje ir kvartalo Nr. 58 P dalyje (aukštis iki karnizo 2,00-8,00 m, iki kraigo 3,50-10,50 m; būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba formuojant sodybą kvartalo gilumoje; vietomis istoriniai sklypai susmulkinti; dalies pastatų cokoliai paaukštinti, pritaikant pastatus prie reljefo; -; TRP 27, 28; BR Nr. 5, 7, 11, 12-25, 27, 28, 29-33, 37, 40-43, 45-50; IKONOGR Nr. 18, 22, 27, 28, 34, 35, 39-41, 57, 63, 64; FF Nr. 1.2, 2.2, 3, 5, 8, 18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.8, 9, 11-21, 23-32, 15.1-8, 16.3-6, 17.6, 8-16, 18-20, 22.4, 5, 29.2, 3, 5, 6, 30.2-9, 32.2, 3, 6, 16, 17, 25, 27, 34.10-13, 16, 24, 36.6-11, 16, 17, 37.9, 10, 38.2-4, 39.6-12, 17-19, 22-32, 40.3-7, 41.5, 7, 8-20, 42.1-8, 10-12, 44.3, 45.2, 4, 6, 46.2, 3, 47.2-6, 48.2, 4, 6, 8, 10, 49.1, 2, 4, 6, 50.4, 52.1, 3, 5, 53.6, 8, 54.1, 6, 8, 55.1, 2, 5, 56.1, 4, 57.5, 8, 14, 58.1, 59.3, 60.1, 3, 61.2, 3, 5, 62.2, 63.2, 64.1-4, 6, 7, 65.1-5; 2013 m.); atskirai stovintys XIX a. pab. - XX a. mūriniai, mediniai pastatai: mūrinis 1 a. su pastoge buv. žydų pradžios mokyklos pastatas (35184) Vasario 16-osios g. Nr. 11, 2 kvartale, buv. sinagoga (2273) Vilkmergėlės g. Nr. 13, 14 kvartale, mūrinė buv. sinagoga Širvintų g. Nr. 6, 26 kvartale, mūrinė buv. sinagoga ir mūrinė 1 a. su pastoge buv. autobusų stotis Vienuolyno g. Nr. 2, 10, 27 kvartale, mūrinis 2 a. su pastoge mokyklos pastatas Sodų g. Nr. 7, 29 kvartale, mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia (2119) ir mūrinis 1 a. pastatas Kauno g. Nr. 1, 28 kvartale, vandens bokštas Kauno g., 32 kvartale, 2 a. medinis namas su pastoge Pakalnės g. Nr. 21 ir mūrinis 2 a. su pastoge buv. "Draugystės" kino teatro pastatas (33738) Kęstučio a. Nr. 9, 34 kvartale, 1-3 a. su pastoge mūriniai buv. odų fabriko pastatai Paupio g. Nr. 13, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 8-11, 22, 32, 35, 36; IKONOGR Nr. 18, 28, 32, 52, 60, 61; FF Nr. 2.1, 19, 26.9, 27.1, 5, 28.1, 2, 29.4, 32.10, 34.1-3, 14, 15, 41.1, 3, 4; 2013 m.); atskirai stovinti XIX a. pr. Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, 17 kvartale bei XIX a. II p. medinė 1 a. su pastoge Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 23, 29; IKONOGR Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 27-29, 33-35, 63; FF Nr. 0.1, 25, 27, 17.5-7, 41.1; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros viešosios – atviros erdvės.

Aikštelė prie buv. autobusų stoties pastato Vienuolyno g. Nr. 10 (-; -; TRP 27; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 18, 23, 61; FF Nr. 27.5; 2013 m.); Pilies kalno parkas, jo apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (V parko dalyje buvo 1870 m. suplanuota trapecinė turgaus aikštė, kuri 1936 m. panaikinta; 1937-1938 m. parengtas „Ukmergės miesto sodo-parko Pilies kalne“ projektas, kurio autorius sodininkas S. Oželis-Kazlauskas; po XX a. vid., nugriovus likusį Pilies kalno užstatymą, ŠR dalyje parkas išplėstas, sovietmečiu parko ŠV dalyje įrengtas požeminis tualetas; TRP 27; BR Nr. 34-36; IKONOGR Nr. 18, 19, 21, 22, 24, 26, 32; FF Nr. 0.13-15, 34.18, 19, 21-27; 2013 m.); skveras ties Kauno ir Deltuvos g. sankryža (skveras įrengtas XX a. 4 deš., prieš tai nugriovus čia buvusią sodybą; XX a. pab. į skverą iš Kęstučio a. perkelta skulptūra „Vėliavnešiai“; TRP 27; IKONOGR Nr. 11, 13-15, 18, 22, 24; FF Nr. 31.1-3; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros panoramos.

Dešiniojo Šventosios kranto panorama Nr. 1 nuo tilto į ŠV, formuojama dominuojančių objektų Pilies kalno ir piliakalnio (3539), Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, taip pat gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 20; IKONOGR Nr. 27; FF Nr. 0.1; 2013 m.); senamiesčio panoramos Nr. 2, 3, 4, 5 nuo piliakalnio (3539) į P, V, Š, R, formuojamos kairiojo Šventosios kranto sodybinio užstatymo, dominuojančių objektų - Pilies kalno, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios su varpine (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18, 20; -; FF Nr. 0.2-6; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 6 nuo Pilies kalno į R, formuojama piliakalnio (3539), gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p., XXI a. pr. pristatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių priestatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 0.7; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 7 nuo Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios šventoriaus į P, PV, formuojama gyvenamųjų pastatų tūrių (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; -; FF Nr. 0.23; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros siluetai.

33 kvartalo P dalies, Pilies g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pilies g. Nr. 7 iki Nr. 13 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; IKONOGR Nr. 18, 62; FF Nr. 33.12; 2013 m.); 34 kvartalo P dalies, Pakalnės g. Š pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš P nuo pastato Pakalnės g. Nr. 3 iki Nr. 19 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 34.10; 2013 m.); 3 kvartalo R dalies, Gedimino g. V pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš R nuo pastato Gedimino g. Nr. 36 iki pastato Ramygalos g. Nr. 2 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr . į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 3.1-3, 5-7; 2013 m.); Gedimino g. R pusės užstatymo pirmo plano siluetas iš V nuo pastato Gedimino g. Nr. 45 iki Nr. 53 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. priedą Nr. 4; -; BR Nr. 12, 22; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 5.4, 5, 14.12-14; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros perspektyvos.

Kauno g. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi nuo Kauno ir Vienuolyno g. sankryžos į vandens bokštą (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 32.18; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 2 PV-ŠR kryptimi nuo namo Nr. 26 į Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvę (35159) (-; -; TRP 19; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 34.14; 2013 m.); Piliakalnio g. perspektyva Nr. 3 Š-P kryptimi nuo Vytauto ir Piliakalnio g. sankryžos į piliakalnį (3539) (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18; -; FF Nr. 37.8; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 4 R-V kryptimi nuo Gedimino ir Širvintų g. sankryžos į buv. sinagogos pastatą Vienuolyno g. Nr. 2 (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; -; FF Nr. 26.13; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 5 PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino g. į namą Širvintų g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 24 Š dalies užstatymas, skersgatvis, kertantis kvartalą Nr. 23 neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 24.10; 2013 m.); Gedimino g. perspektyva Nr. 6 PR-ŠV kryptimi nuo pastato Gedimino g. Nr. 5 į pastatą Gedimino g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 25 ŠV dalies užstatymas neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGR Nr. 18, 58, 59; FF Nr. 24.5-7; 2013 m.); Vasario 16-osios g. perspektyva Nr. 7 PV-ŠR kryptimi nuo pastato Vasario 16-osios g. Nr. 3 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 23, 24; IKONOGR Nr. 18; FF Nr. 14.30, 22.4, 23.12; 2013 m.); Maironio g. perspektyva Nr. 8 R-V kryptimi nuo pastato Bažnyčios g. Nr. 11 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (Maironio g. buvo suplanuota XIX a. II p., sujungta su Bažnyčios g. XX a. II p., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios pagrindinis fasadas atgręžtas į Bažnyčios g. pusę per XX a. 4 deš. rekonstrukciją; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; BR Nr. 19, 23; IKONOGR Nr. 15, 16, 21; FF Nr. 12.2; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 9 ŠV-PR kryptimi nuo ūkinio pastato Pakalnės g. Nr. 21 (-; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 42.7; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros išklotinės.

Gatvių užstatymo išklotinės: Kauno g. P pusės atkarpos nuo pastato Nr. 60 iki pastato Nr. 18, nuo kampinio pastato Nr. 2 iki pastato Vienuolyno g. Nr. 17 (išskyrus pastatus Kauno g. Nr. 44, 28, pastatų Nr. 60, 54, 48, 36, 20 asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastato Nr. 54 plokštuminius stoglangius, pastato Nr. 40 silikatinių plytų mūro priestatą, užmūrytą durų angą, pastatų Nr. 2, Vienuolyno g. Nr. 17 I a. rekonstruotas angas, pastato Nr. 2 stoglangius, pastatų silikatinių plytų mūro dūmtraukius; medinių pastatų angų autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 2 balkonai neišliko; -; TRP 19, 21; BR Nr. 32, 33; IKONOGR Nr. 49, 52; FF Nr. 32.4, 7, 9-13, 15, 20-23; 2013 m.); Kęstučio a. PR pusės iš pastatų Nr. 5 ir 7 bei įvažiavimo vartų arkos (išskyrus pastato Nr. 5 asbocementinę stogo dangą, silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Nr. 7 profiliuotos skardos stogo dangą, plokštuminius stoglangius; pastato Nr. 7 I a. angų, įvažiavimo vartų arkos autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 5 tūriniai stoglangiai neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 34; IKONOGR Nr. 29, 36, 42; FF Nr. 33.7-10; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės, Kęstučio a. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Vienuolyno g. Nr. 12 iki pastato Kęstučio a. Nr. 4 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 4 plokštuminius ir tūrinį stoglangius, pastato Vienuolyno g. Nr. 12 naujai iškirstą durų angą, pastatų Kęstučio a. Nr. 2, 4 I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 48, 50; FF Nr. 27.6-8; 2013 m.); Kęstučio a. ŠV pusės, Gedimino g. V pusės atkarpos nuo pastato Kęstučio a. Nr. 6 iki pastato Gedimino g. Nr. 6 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastatų I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 8; IKONOGR Nr. 43, 45, 48, 58, 59; FF Nr. 25.1, 2, 10, 11; 2013 m.); Vienuolyno g. PV pusės atkarpos nuo rusvų plytų mūro pirmo pastato iki pastato Nr. 11 (išskyrus pastatą Nr. 3A, pastato Nr. 7 priestatą, pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 10; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 28.9-13; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Nr. 2 iki pastato Nr. 8 (išskyrus pastato Nr. 6 rekonstruotą stogą, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 60; FF Nr. 27.2-4; 2013 m.); Vasario 16-osios g. Š pusės atkarpos nuo pastato Nr. 15 iki Nr. 25 (išskyrus pastatą Nr. 21, pastatų Nr. 19, 27 asbocementines stogų dangas, pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas angas; -; TRP 17; BR Nr. 6, 7; FF Nr. 2.15-17; 2013 m.); Vilniaus g. V pusės iš pastatų Nr. 5, 7 ir 9 (išskyrus ūkinį pastatą tarp pastatų Nr. 7 ir 9, asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastatų Nr. 9 ir Nr. 5 rekonstruotas angas; -; TRP 20; BR Nr. 35; FF Nr. 34.4-6; 2013 m.); Sodų g. R pusės atkarpos nuo pastato Nr. 3 iki pastato Nr. 15 (išskyrus pastatų Nr. 3, 11 asbocementines stogų dangas, pastatų rekonstruotas angas; -; TRP 19; BR Nr. 11; FF Nr. 29.2-6; 2013 m.); Vytauto g. Š pusės atkarpos nuo Gedimino g. iki pastato Vytauto g. Nr. 18 (išskyrus pastatą Vytauto g. Nr. 10, jungtį tap pastatų Vytauto g. Nr. 10 ir Nr. 12, pastatų Gedimino g. Nr. 1, Vytauto g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 16 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 4 rekonstruotą stogą, tūrinį stoglangį, dūmtraukį, pastato Nr. 12 silikatinių plytų mūro dūmtraukį, pastatų asbocementines stogų dangas; dalis fasadų apdailos ir puošybos elementų bei balkonų neišliko; -; TRP 17, 18; BR Nr. 25, 26; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 29, 33-35, 43, 46-48, 53-55, 58; FF Nr. 17.1, 2, 18.1-3, 19.1-4,

21.1, 2, 24.1-3; 2013 m.); Vytauto g. P pusės atkarpos nuo Piliakalnio g. iki pastato Vytauto g. Nr. 45 (išskyrus pastatą Nr. 39, pastatų Vytauto g. Nr. 15, Nr. 19 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 19 tūrinį stoglangį, pastato Vytauto g. Nr. 29 stogo antstatą, pastatų asbocementines stogų dangas, pastatų Vytauto g. Nr. 21, Nr. 31 dūmtraukius; pastato Vytauto g. Nr. 31 tūrinių stoglangių autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; -; TRP 18; BR Nr. 27, 28; IKONOGR Nr. 18, 22, 23, 53-55; FF Nr. 39.1-5, 13-15, 40.1, 2; 2013 m.); Gedimino g. R pusės atkarpos nuo Vytauto g. iki pastato Gedimino g. Nr. 41 (išskyrus pastatus Gedimino g. Nr. 3, 27, 31, pastato Gedimino g Nr. 11 3 a. Š priestatą, pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 19 II a. ir pastato Vytauto g. Nr. 35 mezonino rekonstruotas angas, pastatų Gedimino g. Nr. 5, 11, 19, 29 silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Gedimino g. Nr. 17 mezonino stačiakampį švieslangį, pastatų Gedimino g. Nr. 9, Nr. 17 tūrinius stoglangius; pastato Gedimino g Nr. 5 tūrinio stoglangio autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 22, 24, 26; 58, 59; FF Nr. 14.1, 2, 5-7, 12, 23.1-3, 5, 6, 24.4-9; 2013 m.); Žuvų g. R pusės atkarpos tarp Vytauto ir Širvintų g. (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastatų Žuvų g. Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 9 silikatinių plytų mūro dūmtraukius; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 26, IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.2-9; 2013 m.); Širvintų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Širvintų g. Nr. 16, 18, 20 (išskyrus pastatų rekonstruotas cokolinio, I a. angas, laiptus, pastato Širvintų g. Nr. 20 asbocementinę stogo dangą; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 24, IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.6, 22.1, 23,7, 8; 2013 m.);

- Tūrinės erdvinės struktūros dominantės.

Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5 ir buv. odų fabriko pagrindinis korpusas Paupio g. Nr. 13 (-; -; TRP 20; IKONOGR Nr. 27, 28; FF Nr. 0.1-3, 41.1-4; 2013 m.); Švč. Trejybės bažnyčia (2119) Kauno g. Nr. 1 (-; -; TRP 19; IKONOGR Nr. 43, 50; FF Nr. 0.26, 28.1, 2; 2013 m.); buv. sinagoga Vienuolyno g. Nr. 2 (-; -; TRP 17; IKONOGR Nr. 60; FF Nr. 27.1; 2013 m.); Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8 (-; -; TRP 16; BR Nr. 23; IKONOGR Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 29, 33-35, 63; FF Nr. 12.2, 17.5-7; 2013 m.); vandens bokštas Kauno g. (-; -; TRP 21; IKONOGR Nr. 52; FF Nr. 32.10; 2013 m.); gaisrinės bokštas (31799) Pilies g. (-; -; TRP 19; IKONOGR Nr. 36, 37; FF Nr. 33.12, 14; 2013 m.);

- Užstatymo bruožai.

Perimetriniam - posesijiniam užstatymui būdingas pastatų blokavimas palei sklypų ribas, suformuojant iš dalies uždarą arba uždarą kiemą. Perimetriniam - reguliariam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų, kiemo pastatus derinant prie sklypo ribos. Perimetrinio - posesijinio, perimetrinio - reguliariaus užstatymo pagrindiniams pastatams būdinga: mūrinės, medinės sienų konstrukcijos, paaukštinti cokoliai dėl kintančio reljefo, dvišlaičiai, valminiai, pusvalminiai, mansardiniai stogai, dengti lygios skardos lakštų, rečiau - molio čerpių dangomis, tūriniai dvišlaičiai, pusapskričiai stoglangiai, raudonų plytų mūro dūmtraukiai, puošnūs geometrinių, plastiškų formų frontonai, balkonai su metalinėmis tvorelėmis, įvažiavimų arkos. Mūriniai fasadai tinkuoti arba netinkuoti, puošti sudėtingo profilio karnizais, modifikuotų geometrinių formų puskolonėmis, piliastrais, nišomis, apvadais, traukomis, kampų rustais. Mediniams pastatams būdingi uždari prieangiai-verandos, fasadai apkalti lentelėmis. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba suformuojant sodybą kvartalo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingi mediniai, rečiau mūriniai gyvenamieji pastatai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais, dengtais lygios skardos lakštų danga. Būdingi stoginėliai, netinkuoti raudonų plytų mūro dūmtraukiai, fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Būdingas pastatų pritaikymas prie reljefo. Ūkinės paskirties statiniai nedidelio tūrio, medinių, mūrinių konstrukcijų, su dvišlaičiais, vienšlaičiais stogais. Dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g. (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 18, 27-64; FF Nr. 0.1-24, 2.1-9, 14-18, 3.1-10, 4.1-3, 5.1-16, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-4, 9.1-7, 10.1-15, 11.1-6, 12.1-7, 13.1-17, 14.1-34, 15.1-8, 16.1-7, 17.1-3, 8-20, 18.1-9, 19.1-11, 20.1-7, 21.1-14, 22.1-6, 23.1-3, 5-12, 24.1-15, 25.1-19, 26.1-3, 6-13, 27.1-8, 11-14, 28.1-3, 5-13, 29.1-9, 30.1-9, 31.1, 4-7, 32.1-17, 20-29, 33.1-5, 7-19, 34.4-20, 24, 26, 27, 35.3-12, 36.1-14, 16, 17, 37.1, 3-7, 9-11, 38.1-4, 6, 7, 39.1-33, 40.1-7, 41.5-20, 42.1-8, 10-12, 45.1-6, 46.1-3, 47.1-6, 48.1-11, 49.1, 2, 4-6, 50.4, 51.2, 52.1-5, 53.1-8, 54.1-8, 55.1-5, 56.1-4, 57.1-14, 58.1-3, 59.1-4, 60.1-5, 61.1-5, 62.1-3, 63.3, 64.1-7, 65.1-5; 2013 m.);

- Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius.

Pirmasis Ukmergės (iki Pirmojo pasaulinio karo oficialiai vadintos Vilkmerge) paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra 1333 m. Vartbergės kronikoje, kurioje rašoma, kad Livonijos ordino magistras buvo ir kovėsi prie „Vilkenberge“. Tuo metu buvo užpulta miesto centre esančio piliakalnio medinė Ukmergės pilis, kurią dar ne kartą vėliau puolė ir vietovę niokojo kalavijuočiai. Paskutinį kartą pilis sudeginta 1391 m. Vytauto ir Jogailos kovų metu. Palankios sąlygos gyvenvietei kurtis susidarė po 1392 m. Jos užuomazgai, spartesnei plėtrai įtakos turėjo administracijos ir teismų būstinės su valdovui asmeniškai priklausančiu dvaru, vietininko buveine bei didžiulės parapijos centro įkūrimas. Mieste kirtosi Varšuvos-Peterburgo bei Vilniaus-Liepojos prekybos keliai. Pirminė gyvenvietė 1392 -1435 m. pradėjo formuotis rytinėje aukštumos dalyje, kairiajame Ukmergėlės upelio krante. Gyvenvietės plėtra vyko savaimingai, statybos nebuvo reglamentuojamos. Tik pradėjusią kurtis gyvenvietę ir pilį piliakalnyje 1435 m. sunaikino kunigaikščio Švitrigailos ir jo sąjungininkės Livonijos ordino riterių

kariuomenė. XV a. pradžioje, ant dabartinio Pilies kalno buvo pastatyta mūrinė pilis, kuri galutinai sunyko XVIII a. pab. Po 1435 m. karo, valdovo dvaro sodyba pastatyta aukščiausioje vietoje, Pilies kalne. Čia tarp dvaro sodybos ir Sakalupio upelio buvo nužymėta nauja seniūno valdoma gyvenvietė. Ukmergė buvo vienas iš svarbių istorinės Deltuvos žemės centrų. Deltuvai netenkant strateginės reikšmės, Ukmergė augo ir stiprėjo. XV a. I p. miestui suteikiamos Magdeburgo teisės. 1486 m. sudarytame miestų ir miestelių mokesčių sąraše Vilkmergė pirmą kartą buvo įvardinta kaip miestas, po 1566 m. administracinės reformos tapo Vilniaus vaivadijos Ukmergės pavieto centru. XVI a. vid. Ukmergėje jau buvo vaitas - turėjo miestietišką savivaldą. Ukmergė stipriai nukentėjo nuo 1655 m. vykusių Rusijos ir Švedijos kariuomenių karo veiksmų ir vėliau sekusių maro ir bado, taip pat 1701 - 1709 m. visame krašte vykusio Šiaurės karo. 1787 m. miestas 4 kartus degė. 1792 m. suteiktos miesto teisės. 1796 m. Vilkmergė tapo vienu iš Rusijos imperijos Lietuvos gubernijos apskrities centrų. Tuo metu nedidelis provincijos miestelis su 1669 gyventojais, iš kurių 81% buvo žydai, pradėjo stabiliai augti. 1870 m. caro patvirtintas miesto plėtros planas tapo pagrindiniu, perspektyviniu planavimo dokumentu, kuris reguliavo miesto teritorijų planavimą ir statybas. Šio plano principinių sprendinių buvo laikomasi iki 1940 m. 1877 m. Ukmergė vėl kentėjo nuo kilusių gaisrų. Tuomet išdegė beveik visas miestas. Miestui atsistačius, vėl ėmė klestėti amatai, prekyba, veikė 3 plytinės, spirito varykla, 8 odos dirbtuvės, mokyklos, ligoninės. Dar kartą Ukmergės miesto plėtrą stabdė I pasaulinis karas, po kurio gyventojų skaičius sumažėjo 40%, sudegė daug pastatų, tiltas per Šventąją. Tarpukariu Ukmergė buvo apskrities centras ir miestas su apskrities teisėmis. 1935 m. patvirtintos I eilės miesto teisės. II pasaulinio karo metu miestas vėl nukentėjo - sugriauta nemažai pastatų centrinėje miesto dalyje, tiltas per Šventąją. 1946 m. rugpjūčio 3 d. Ukmergė tapo apskrities pavaldumo miestu. Po karo tapo rajono centru, veikė linų fabrikas, mašinų, remonto mechaninė gamykla, baldų, siuvimo, odos ir avalynės fabrikai, koklių, medienos apdirbimo įmonės.

- **Pastaba.**

Namas u. k. 48774, Ukmergės m., Kauno g. 40, 2023-12-12 NKPVT aktu Nr. KPD-RM-3066 tapo kultūros paveldo objektu.

Unikalus objekto kodas 2990.
Pilnas pavadinimas Ukmergės senojo miesto vieta.
Adresas Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m.
Įregistravimo registre data 1992-09-28.
Statusas Valstybės saugomas.
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis.
Rūšis Nekilnojamas.
Teritorijos KVR objektas: 454000 kv. m
Vertybė pagal sandarą Vietovė.
Amžius XV-XVIII a.
Vertingosios savybės:

- **Žemės ir jos paviršiaus elementa**i - kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios spalvos 60-150, vietomis iki 280 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų pamatų fragmentais, griuvenomis, (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų statybos metu; žr. 15.1-15.22; 2006); pavieniai radiniai ir jų sankaupos (-; būklė nenustatyta; žr. 15.1 - 15.18; 2006);

Atliekant žemės judinimo darbus - Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299) ir Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18[1] straipsniu ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Kartu nurodoma ir pirminė vertingųjų savybių apsauga vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

8.3 Projekto sprendinių galimos įtakos NKV (unik. k. 2990 ir unik k. 17116) įvertinimas

Techninio darbo projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.

Techninio darbo projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Statinio vieta: Šventosios pakrantės teritorija Ukmergės mieste nuo Vilniaus g. tilto iki pėsčiųjų tilto (abiejose upės pusėse), suformuojant jungtį su esamais parkais ir turistiniais objektais.

Statinio pavadinimas: „Šventosios pakrantės, abiejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.

Dabartinė situacija: Dabartinėje situacijoje projektuojamoje teritorijoje nėra ištisinių pėsčiųjų takų, yra tik atskiri jo segmentai, nesudarantys tolygios galimybės judėti. Esami mažosios architektūros elementai yra nusidėvėję, pakrantės nėra pritaikytos saugiam poilsiui.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Pagrindinis tikslas – pagerinti teritorijos susisiekimą ir užtikrinti patogią bei saugią viešąją erdvę žmonėms su negalia, šeimoms su vaikais, pėstiesiems. Projekto sprendiniai siekia užtikrinti nepertraukiamą ir saugų judėjimą, kartu išlaikant estetinį vietovės vientisumą su Ukmergės senamiesčio architektūra bei Šventosios upės kraštovaizdžiu.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas: Sprendiniai turi teigiamą poveikį tiek socialinei, tiek ekonominei aplinkai. Projektas gerina pėsčiųjų saugumą, skatina darnų judėjimą, padidina viešųjų erdvių patrauklumą ir pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms. Dėl numatytų estetinių sprendimų harmonijos su aplinkiniais istoriniais objektais projektas taip pat teigiamai prisideda prie teritorijos kraštovaizdžio išsaugojimo.

Galimo projektinių sprendinių (takų, mažosios architektūros, augmenijos) poveikio vertinimas unik. k. 2990 ir unik k. 17116 teritorijoms ir Ukmergės senamiesčio vizualinės apsaugos pozoniui		
Vertingoji savybė	**Teigiamas poveikis (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis**	**Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis**
Ukmergės senamiestis (unik.k. 17116)		
Planinės struktūros tipui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Planinės struktūros tinklui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Kvartalams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Keliams, gatvėms, aikštėms, įvažiavimams, privažiavimams, takams, jų tipams, trasoms, dangoms	Bus užtikrintas nenutrūkstamas pėsčiųjų susisiekimas projektuojamoje teritorijoje.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Vietovei reikšmingam buvusiam užstatymui ar jo dalių vietoms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Gamtiniams elementams	Projektuojami nauji želdiniai, kurie papildys esamą gamtinę aplinką. Kertamas vienas labai blogos būklės medis.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Tūrinei erdvinei struktūrai	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Užstatymo tipui	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Viešosioms-atvirosioms erdvėms	Sukuriama vieša atvira erdvė gyventojams ir lankytojams.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Panoramoms	Sukuriamas priėjimas prie vaizdingų panoramų.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Siluetams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Perspektyvoms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Išklotinėms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Dominantėms	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.
Užstatymo bruožams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.

Ukmergės senojo miesto vieta (unik.k. 2990)		
Žemės ir jos paviršiaus elementams	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio teigiamo poveikio nėra.	Nei trumpalaikio, nei ilgalaikio neigiamo poveikio nėra.

8.4 Paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių tvarkymo priemonių sistema

Remiantis Ukmergės miesto teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2022m. projektuojama teritorija priskiriama šioms zonoms:

a. **Ekstensyviai naudojamų želdynų zonai U_BZ_E_F:**

- **Tipas** - Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas** - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ);
- **Žemės naudojimo paskirtis** – Nenurodyta;
- **Žemės naudojimo būdai** – B, E, I2;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m** – Nenurodyta;
- **Užstatymo tankis, %** - Nenurodyta;
- **Užstatymo intensyvumas** – Nenurodyta;
- **Užstatymo tipai** – Nenurodyta;
- **Aukštų skaičius** – Nenurodyta;
- **Aukštis iki karnizo, m** – Nenurodyta;
- **Statinio paskirtys** – Inž.;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Teritorijos skirtos ekstensyvaus naudojimo želdynams – miestų miškams, atskiriesiems apsauginiams (ekologiniams, sanitariniams) želdynams, taip pat estetinės reikšmės želdynų formavimui, kitoms bendro naudojimo erdvėms. Teritorijose gali būti išlaikomos neužstatomos žemės ūkio teritorijos, kurios panaudojamos pievoms. Taip pat čia gali būti miško žemė. BZs - naudojimo reikalavimai pagal saugomų teritorijų dok. ir USSP.

a. **Intensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_F Visuomeniniai objektai:**

- **Tipas -** Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas** - Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ), Socialinės infrastruktūros teritorija (SI);
- **Žemės naudojimo paskirtis –** KT;
- **Žemės naudojimo būdai** – B, E, V, I2;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m –** 15;
- **Užstatymo tankis, %** - 5;
- **Užstatymo intensyvumas** – 0,1;
- **Užstatymo tipai** – ap;
- **Aukštų skaičius** – 1-2;
- **Aukštis iki karnizo, m** – Nenurodyta;
- **Statinio paskirtys** – Inž./Negyv. R;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Teritorijos skirtos intensyviai naudojamiems rekreacinės paskirties želdynams, parkams, skverams, taip pat kitoms bendro naudojimo erdvėms, miško parkams, visuomeniniams objektams. BZv zonose gali būti išdėstomi visuomeninės paskirties pastatai – sporto, kultūros objektai, bažnyčios, viešoji rekreacinė infrastruktūra;

a. **Gyvenamoji zona U_GG_F, Mažo užstatymo intensyvumo zona U_GG_M_F**

- **Tipas -** Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos;
- **Teritorijų naudojimo tipas –** Gyvenamoji teritorija (GG);
- **Žemės naudojimo paskirtis –** KT;
- **Žemės naudojimo būdai –** G1, G2, V, K, R, B, I2, E;
- **Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m** – 12;
- **Užstatymo tankis, %** - 35;

- **Užstatymo intensyvumas** – 0,6;
- **Užstatymo tipai** – GG1- su/pr GG1a –per;
- **Aukštų skaičius** – 2;
- **Aukštis iki karnizo, m** – 7,5;
- **Statinio paskirtys** – Gyv./Negyv.G /Inž.;
- **Aprašymas / kiti reikalavimai** – Panaudojimas. Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos užstatomos įvairaus užstatymo tipo gyvenamaisiais pastatais. Teritorijose gali būti vystomi komercinės paskirties, o taip pat kiti darbo vietas sukuriantys objektai. Mažm. Prekybos obj. bendr. plotas: GG1 – 500m^2; GG1/v – 2000 m^2. Papildomi reikalavimai pastatų skaičiui – atskirame kvartale 3 aukštų pastatai gali sudaryti ne daugiau 20% užstatomo ploto pagal detaliesiems planams nustatomus reglamentus. Kom. skl. - 0,25 ha.

8.5 PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimų vykdymo užtikrinimas:

Atliekant žemės judinimo darbus - Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299) ir Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – Valstybės saugomas) teritorijose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18[1] straipsniu ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Kartu nurodoma ir pirminė vertingųjų savybių apsauga vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

8.6 Vertingųjų savybių: įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą apsauga

Projekto sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Privedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), joms ar Ukmergės senamiesčio aplinkos autentiškumui neigiama įtaka nėra daroma.

8.6.1 Įvažiavimas į 41 kvartalą

Įrengiamas pėsčiųjų takas, kuris skirtas Šventosios upės pakrantės lankymui. Šiuo projektu atskirai jungtys nekeičiamos ar kitaip neįtakojamos jų vertingosios savybės.

Naujai projektuojamas takas, kuris tuo pačiu atliks ir pravažiavimo funkciją aplinkiniams gyventojams yra už 6 m nuo esamo įvažiavimo ir su juo nesijungia.

Takas Paupio g. pusėje tęsiamas vienodo medžiagiškumo (betoninių trinkelių) kaip ir esamas takas, kad būtų užtikrinamas vientisumas ir būtų išsaugomas Ukmergės senamiesčio aplinkos autentiškumas. Ties Įvažiavimu naujai projektuojamo tako ir esamo įvažiavimo dangos nesijungs, tačiau medžiagiškumas šalia einančio tako derės su įvažiavimo danga (įvažiavimo danga - asfaltas bei skalda, šalia Įvažiavimo numatomas takas iš trinkelių dangos). Tiek spalviškai, tiek medžiagiškumu jos dera tarpusavyje *(žiūrėti šio teksto 11 punkto dangų lentelės pirmą dangą).*

Šiuo metu įvažiavimas susideda iš dviejų dangų – seno, apibyrėjusio asfalto bei skaldos. Tokia tako danga pasirinkta siekiant išlaikyti vientisumą tarp naujai pasirinktų dangų, taip pat užtikrinant tolygų žmonių su negalia judėjimą, patogumą važiuojant automobiliais. Naujais projektuojamas takas nesijungia prie įvažiavimo į 41 kvartalą.

14 pav. Įvažiavimas į 41 kvartalą iš Paupio g. esama situacija (nuo Šventosios upės pusės)

15 pav. Įvažiavimas į 41 kvartalą iš Paupio g. esama situacija (Šventosios upės pusės link)

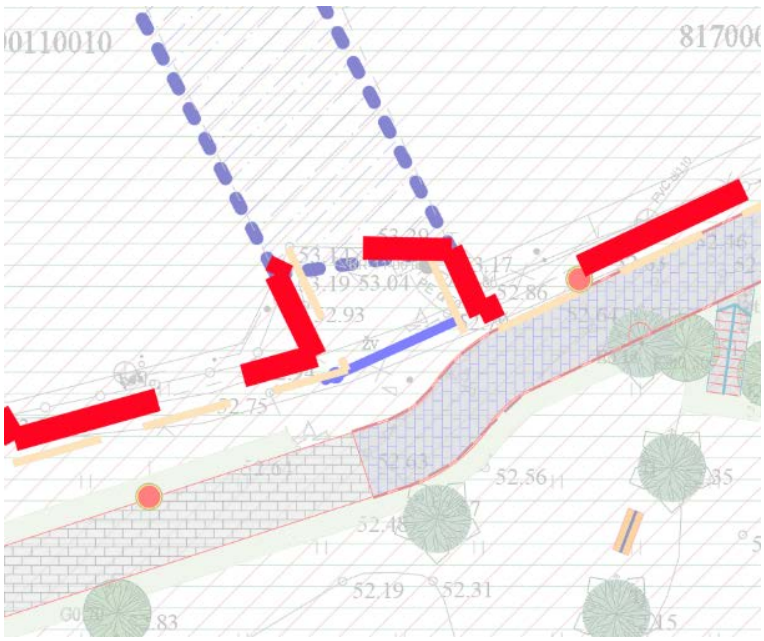

16 pav. Projektinių sprendinių gretimybės vertingąjai savybei -į važiavimo į 41 kvartalą iš Paupio g. (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)

8.6.2 Skersgatvis į 45 kvartalą

Skersgatvis yra iš skirtingos frakcijos skaldos. Naujai projektuojamam takui iki skersgatvio bus naudojama tankintų atsijų danga *(žiūrėti šio teksto 11 punkto dangų lentelės ketvirtą dangą)*, kuri prisitaiko prie natūralaus skersgatvio medžiagiškumo. Sprendiniais siekiama išlaikyti Ukmergės senamiesčio vertingas savybes.

Naujai projektuojamo tako plotis bus 1,5m pločio. Pasirinktas plotis yra mažesnis nei skersgatvio, kadangi priešingai nei skersgatvis – takas skirtas tik pėstiesiems, automobilių pravažiavimas numatomas nebus. Tokį pločio pasirinkimą nulėmė ir aplinkinių naujai projektuojamų takų identiškas plotis.

17 pav. Skersgatvio į 45 kvartalą esama situacija (nuo Gruodžio 17-osios gatvės pusės)

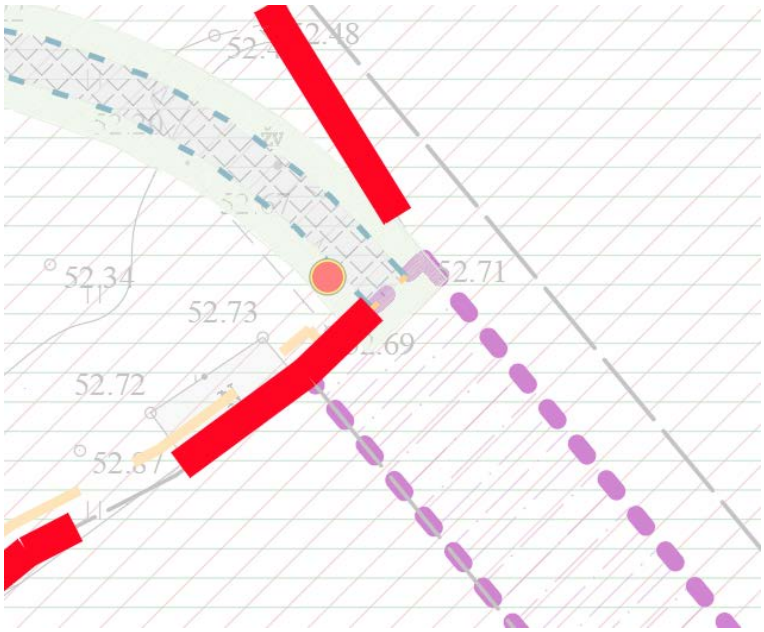

18 pav. Projektinių sprendinių gretimybės vertingajai savybei - skersgatviui į 45 kvartalą (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)

8.7 Saugomi medžiai saugomoje teritorijoje

Projektuojamoje teritorijoje kertamas vienas saugotinas medis, kuris patenka į saugomą teritoriją. Tai yra 8m aukščio ir 0.88 m. diametro trapusis gluosnis (Salix fragilis).

Ukmergės m., šventosios upės pakrantės (paupio g. Dalyje) Želdinių inventorizacijoje, kuri rengta 2024 m. vadovaujama dr. Juliaus Bačkaičio, nurodoma, kad minimo medžio būklė yra 5 (labai bloga), papildomai nurodoma, kad medyje yra medienos puvinys, pastebimos sausos šakos. Inventorizacijoje taip pat pažymėta, jog minimas medis turi būti kertamas:

Skl.	Rūšis	H, m	D, cm	Būklė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saugot.	Atkur. vertė, €
110	Gluosnis trapusis	8	88	5	medienos puvinys, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	220,00

19 pav. Pilni kertamo saugotino medžio duomenys pagal inventorizaciją

„Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba".

Kertamų medžių lentelė

Eil. Nr.	Kertamo medžio atitikmuo inventorizacijai	Kertamo medžio rūšis lotyniškai	Kertamo medžio rūšis lietuviškai	Aukštis m.	Diametras m.	Būklė	Pastabos	Saugomas	Vertė
5	Paupio g. Nr. 110	*Salix fragilis*	Trapusis gluosnis	8	0,88	5	Medienos puvinys, yra sausų šakų	S	220 €

20 pav. Pilni kertamo saugotino medžio duomenys pagal kertamų medžių lentelė (06 P2409-XX-TDP-SP_KML)

Galima daryti prielaidą, kad medienos puvinys yra sukeltas patogeno, kuris, nesunaikintas, gali infekuoti ir aplinkinius sveikus medžius. Projekto apimtyje netoliese buvusio gluosnio vietos yra suprojektuotas naujas tos pačios rūšies gluosnis.

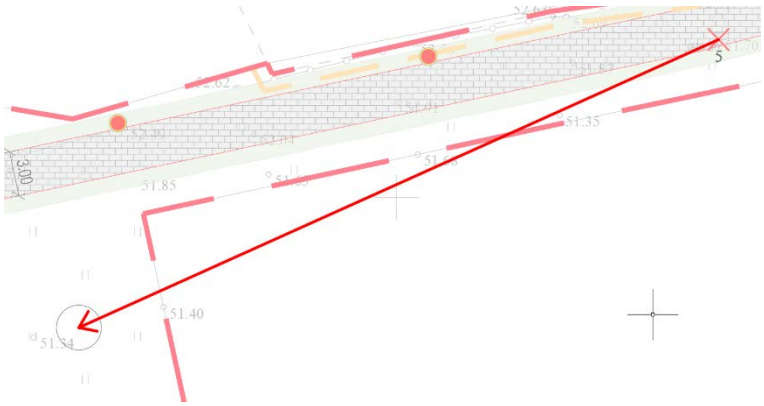

21 pav. Kertamas saugomas trapusis gluosnis (*kertamo medžio numeris brėžinyje - 5* ir atsodinamas trapusis gluosnis (iš projekto P2409-XX-TDP-BD_B-04)

Visi kiti projekto apimtyje kertami medžiai nepriskirti saugomiems, yra blogos būklės.

9. Projektiniai sprendiniai

Lankantis sklype ryškiai pasimatė dvi kardinaliai skirtingos zonos: viršutinis šlaitas, einantis palei gyventojų sklypus bei periodiškai apsemiama upės pakrantė, kuri ir be apsėmimų lieka drėgna ir nelabai praeinama. Būtent antroji zona yra ypač svarbi biologinės įvairovės išsaugojimui bei Natura 2000. Ji taip pat tikslingai apeinama dėl apsėmimo ir nestabilaus grunto. Dėl šių priežasčių pagrindinė tako trasa projektuojama tik viršutiniame šlaite (kur tai leidžia reljefas). Link upės dabar pramintų takų vietose veda 20 - 60 cm aukščio pakeltas cinkuotų presuotų grotelių takas. Tako aukščio intervalas parinktas tikslingai – jis užtikrins sėkmingą ir saugų vietos gyvūnų judėjimą bei maksimaliai leis nepažeisti augančių medžių šaknų, bet nereikalaus papildomų turėklų įrengimo, kurie vizualiai terštų aplinką bei užstotų vaizdą į upę. Pasirinkta medžiaga vizualiai pranyks vešliame augmenijos fone, vietomis savaime išlįs pro taką, taip pat leis laisvai vietomis pro jį augti. To siekiame norėdami sutelkti visą dėmesį į vaizdingą vietos aplinką. Taškai, kur dabar matomas gyventojų patekimas prie upės yra papildomi mažosios architektūros elementais (pikniko stalais, suolais, šiukšliadėžėmis). Taip jau dabar gyventojų naudojamos vietos taps dar patogesnės. Apsilankymo objekte metu, keliose vietose pasimatė itin gražūs vaizdai į upę, jose numatomi suolai. Kitos upės pusės sprendiniai yra funkciškai analogiški. Kadangi šioje pusėje didelę dalį užima medžiais tankiai apaugęs plotas – takas yra 1,5 m. pločio. Šioje pusėje yra potencialių paprastųjų tulžių perimviečių, jos bus maksimaliai apeinamos.

10. Projekto atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Projektuojamas statinys atitinka Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116) ir Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2990) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius. Projektuojamo sklypo teritorijos funkcinė paskirtis bei planuojama veikla neprieštarauja nustatytiems bendrojo plano sprendiniams. Laikomasi nustatytų teritorijų naudojimo prioritetų, urbanistinės struktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo gairių. Todėl planuojamas projektas yra suderintas su galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu ir neprieštarauja miesto plėtros strategijai bei teisės aktams.

Sprendiniai parengti atsižvelgiant į 2014-09-02 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtinto tvarkymo plano (Specialiojo plano) reikalavimus. Į tvarkomą teritoriją (Az4) patenka morfotipai Mt9 (želdynų plotai) ir Mt10 (bendro naudojimo viešos miesto erdvės.

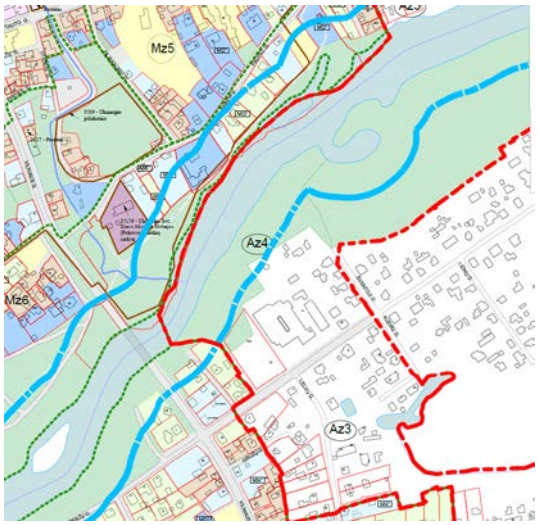

Mt9 - Želdynų plotai - bendro naudojimo viešos miesto erdvės (parkai, aikštės, skverai, gamtinės teritorijos, skirtos gyventojų rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gamtinio karkaso elementų apsaugai).

Mt10 - Bendro naudojimo viešos miesto erdvės (keliai, gatvės, šaligatviai, skersgatviai, laiptai ir pan.)

22 pav. Specialiojo plano iškarpa

Mt9 Galimi teritorijos tvarkybos darbai:

- Taikomieji tyrimai.
- Žaliųjų plotų ir želdinių nuolatinė priežiūra ir tvarkymas.
- Nevertingų medžių, krūmų ir kt. želdinių kirtimas, kelmų rovimas.
- Saugomų želdinių atsodinimas ta pačia rūšimi.
- Takų dangų remontas.
- Dangos ir inžinierinių įrenginių, elementų restauravimo darbai.
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Leidžiami tvarkomieji statybos darbai:

- Reikalingų naujų inžinierinių elementų įrengimas.
- Reglamentuotas naujų želdinių sodinimas.
- Reglamentuota nauja statyba tyrimais pagrįstoje, buvusių statinių vietoje, ar parko naudojimo, ar rekreacijos tikslais.
- Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai iš natūralių medžiagų – medžio, lauko akmens, metalo.
- Takų dangos keitimas ar naujos paklojimas prioritetą teikiant gruntinei, natūralaus medžio, natūralaus akmens dangoms, riedulių grindiniui ir trinkelėms.
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Mt10 Galimi teritorijos tvarkybos darbai:

- Taikomieji tyrimai.
- Dangos remonto darbai.
- Dangos restauravimo darbai.
- Išlikusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių) remontas.
- Išlikusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių) restauravimas.
- Medžių genėjimas;
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

Leidžiami tvarkomieji statybos darbai:

- Reikalingų naujų inžinierinių elementų įrengimas.
- Sunykusių teritorijos elementų (tame tarpe ir inžinierinių), taip pat dangų atstatymas.
- Naujų dangų klojimas, teikiant prioritetą: važiuojamai daliai - granitiniams tašytiems akmenims, asfaltui; šaligatviams, aikštėms – šaligatvių plytelėms, granitinėms trinkelėms. Galimos ir kt. naujų technologijų medžiagos.
- Sunykusių medžių atsodinimas ta pačia rūšimi;
- Šių darbų planavimas ir projektavimas.

10.1 Apšvietimo atramų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams:

- Projekte numatomi šviestuvai yra analogiški gretimoje Šventosios pakrantės atkarpoje esantiems šviestuvams. Jie sudarys vieningą visumą su aplinkinėmis teritorijomis bei atlieps architektūrinį ir urbanistinį kontekstą. Šviestuvai nekeis senamiesčio charakterio, nesutrikdys senųjų struktūrų suvokimo bei nesukels konflikto su paveldosaugos reikalavimais.

23 pav. Analogiškos apšvietimo atramos „Mirabelių“ take

10.2 Teritorijų planavimo dokumentų taikymo eiga

Rengiant projektinius sprendinius vadovaujamasi galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, paveldosaugos, aplinkosaugos bei kraštovaizdžio formavimo reikalavimais. Projektas suderintas su šiais dokumentais:

- **Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas, koreguotas 2019-01-31 sprendimu Nr. 7-14 (TPDR Nr. T000834270)**
  Vadovautasi šiame plane nustatytais žemės naudojimo reglamentais, teritorijos funkcinėmis zonomis, užstatymo, želdynų, susisiekimo infrastruktūros ir paveldosaugos sprendiniais. Projekto sprendiniai atitinka bendrojo plano reikalavimus.

- **Natura 2000 teritorijos**
  Atlikta planuojamos teritorijos atitikties Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų riboms analizė. Nustatyta, kad teritorija patenka į Šventosios ichtiologinį draustinį. Atsižvelgta į galimą poveikį saugomoms buveinėms ir rūšims, projekto sprendiniai pritaikyti siekiant išvengti neigiamo poveikio gamtai ir saugomoms rūšims.

- **Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras (KVR)**
  Naudota informacija iš sistemos kvr.kpd.lt. Įvertinta, kad planuojama teritorija patenka į Ukmergės senamiesčio ir Ukmergės senojo miesto vietos zonas ir vizualinį pozonį. Rengiant sprendinius įvertinti paveldosauginiai reikalavimai, užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas.

- **Tvarkymo planas, patvirtintas 2014-09-02 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594**
  Projekto sprendiniai parengti laikantis tvarkymo plane nustatytų sąlygų: teritorijos naudojimo būdų, kultūros paveldo vertybių apsaugos principų bei leidžiamų tvarkybos darbų. Įvertinti saugotinų teritorijų ribojimai bei specialieji paveldosaugos reikalavimai.

- **Medžių inventorizacija**

  Rengiant projektą naudotasi dr. Juliaus Baškausko 2024 m. parengtų želdinių inventorizacijų duomenimis:

  - Ukmergės m., Šventosios upės pakrantės (Paupio g. dalyje) želdinių inventorizacija;
  - Želdinių inventorizacija teritorijoje nuo Kareivinių g. Iki Šviesos g., Ukmergės m.;
  - Ukmergės m., Šventosios upės pakrantės (paupio g. dalyje) želdinių inventorizacija.

  Įvertinta medžių rūšinė sudėtis, būklė. Sprendiniuose numatytas vertingų medžių išsaugojimas kompensacinis želdinimas.

11. Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas

Statybos metu laikinas drenažas gali būti nenumatomas, tačiau siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, esant poreikiui, įrengiami nauji arba įrengiamas konstrukcinis drenažas.

12. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos

Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurių šiame Projekte nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos
- pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;
- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;
- laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;
- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;
- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;
- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;
- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

- apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);
- sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
- Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių reikalavimų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ nuostatomis.

Statybos sklype esantis gruntas, kurį numatyta panaudoti statybos darbams, turi būti iškastas ir transportuojamas tiesiai į tą vietą, kurioje numatytas jo panaudojimas arba saugomas numatomoje vietoje, o jei nėra galimybės to padaryti – jis turi būti išvežamas į su Užsakovu suderintą vietą antriniam panaudojimui arba utilizavimui.

13. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai

Griaunamų esamų statinių ar iškeliamų inžinerinių tinklų nėra.

14. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Statybos darbų vykdymo metu ir statybos užbaigimo metu aplinka aplink objektą turi būti saugoma nuo užteršimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytoją nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo” taisyklėmis, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo, tvarkymo, planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse” nuostatais). Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos –pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei.

Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis pateiktas lentelėje

Technologinis procesas	Atliekos					
	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
		Kiekis	Mato vnt.			
Medžių išvežimas	Nukirsti medžiai	101	vnt.	kietas	17 02 01	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Betoninės dangos išardymas	0,63 0,19	m^2 m^3	kietas	17 01 01	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Asfalto dangos išardymas	186,86 56,06	m^2 m^3	kietas	17 03 01	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Dangos be rišiklių išardymas	188,6 56,58	m^2 m^3	kietas	17 05 08	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Betoninių laiptų išardymas	1,3	m^2	kietas	17 01 01	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Negyvenamojo pastato išardymas	4,7	m^2	kietas	17 01 07	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą
Ardymo darbai	Persirengimo kabinos išardymas	1	vnt	kietas	--	Numatomas išvežimas į rangovo pasirinktą vietą

15. Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos

Statybos darbų metu gamybinės, ūkinės ar kito pobūdžio veiklos ribojimas, sustabdymas ar nutraukimas nėra numatomas.

16. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos

Papildomą žemės sklypą laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti nustato Rangovas, suderinęs su žemės sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo technologiniame projekte. Jei reikia rengti privažiavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ir sveikatai nekeltų pavojaus.

Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonoje be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo sandėliuoti medžiagas, įrengti transporto priemonių ir mechanizmų stovėjimo aikšteles draudžiama. Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos Rangovo technologiniame projekte.

17. Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti laikinus apskaitos prietaisus, todėl ir laikinos sandėliavimo aikštelės turėtų būti parinktos taip, kad netoliese būtų elektros tinklų linijos, nuo kurių Rangovas galėtų pasijungti tiekimą, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Vanduo bus atvežamas. Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies. Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas.

Statybos aikštelėje įrengiama laikinų patalpų zona. Statomos laikinos buitinės patalpos – vagonėlio pavidalo konteineriai su nenuimamomis važiuoklėmis. Viename iš konteinerių vagonėlių saugomi įrankiai ir smulkios statybinės medžiagos. Prie buitinių patalpų pastatomas kilnojamas biotualetas.

Laikinose buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos, apšilimo patalpa, prausykla, dušas, poilsio ir valgio patalpa, tualetas. Buitinių patalpų viename vagonėlyje, matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos vaistinėlė. Šio vagonėlio durys pažymimos raudono kryžiaus ženklu baltam fone. Laikinų buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas, įrengiamas priešgaisrinis stendas su visa reikiama įranga. Rangovas įrengia prie statybos aikštelės informacinį stendą apie statybą. Statybvietėje bus įrengiama mašinų plovimo - ratų plovimo įrenginys.

Gruntinio vandens, lietaus bei griovio vandens pašalinimo priemones turi numatyti Rangovas statybos technologiniame projekte. Statybos metu specialių priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta, todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų.

Statybinės atliekos susikaupusios konteineriuose statybos metu bus išvežamos į sąvartyną, rangovui sudarius sutartį su tokias paslaugas teikiančia įmone. Sutartis turi būti saugojama iki objekto pridavimo eksploatacijai. Tikslu mažiau teršti aplinkinį orą, būtina dirbti su tvarkingais mechanizmais. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose, naudotojai nepatirs nepatogumų. Priėjimai ir privažiavimai prie sklypų nebus apriboti. Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, pastoviai remontuojami. Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, priešingu atveju draudžiama. Visais atvejais rangovas po statybos darbų palieka sutvarkytą sklypą (be statybinio laužo) ir išlygintą. Reikalavimai mechanizmų keliamam triukšmui pagal STR 2.01.08:2003 1 lentelėje.

18. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones (konkretūs mechanizmai, jų judėjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

autosavivarčiai;
autokrautuvai;
traktoriai;
buldozeris;
ekskavatorius;
autokranas;
freza asfalto dangoms;
savaeigiai volai;
prikabinamas volas;
autogreideriai;
asfalto klotuvas;
autogudronatorius;
laistymo mašina – mechaninė šluota;
krovininės mašinos;
specializuotas automobilis;

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami tokie, kurie nesukeltų vibracijos aplink statybos sklypą esantiems pastatams. Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; techniškai tvarkingi; tinkamai ir teisingai naudojami; žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentelę); žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; teisingai sumontuoti ir naudojami; tvarkingi ir prižiūrimi; tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys negalėtų savaime iškristi.

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms nekeliami, bet statybos įranga ir transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir žmonėms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“, techniniame reglamente „mašinų sauga“ bei STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami statybos darbų technologijos projekte. Apytikslis elektros galingumo poreikis (įvertinus naudojimo koef.) statybinei įrangai, E= 20 kW. Bendrieji reikalavimai statybos įrangai ir transportui: Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo pateiktų instrukcijų nuorodas. Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos poveikio specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis. Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų naudojimo metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto charakterį. Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos. Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

19. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Visas personalas privalo būti supažindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo dėvėti oranžinius darbo rūbus arba signalines oranžines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai – signalines oranžines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti įsijungę oranžinės spalvos mirksinčius švyturėlius. Visi darbuotojai, dirbantys statybvietėje, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėt galiojantį sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras – leidimus, turi būti pasirašytinai supažindinti su paskyros – leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tą darbą, kuriam jie yra instruktuoti. Darbuotojai privalo žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, asmens higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones. Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba.

20. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. Asmenys, organizuojantys darbus kelyje, turi užtikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, – ir šviesomis. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir tvarka gali reguliuoti eismą. Statybvietė turi būti aptverta, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybos metu statybvietėje pėsčiųjų eismas nenumatomas.

21. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėmis atliekant kelio statybos darbus, rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos kliūtys ir darbų vietos privalo būti pažymėtos signaliniais ženklais Nr. 106. Nuimti kliūties arba darbų vietos ženklinimą signaliniais ženklais galima tik tada, kai pašalinamos kliūtys, užbaigiami darbai. Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti apskaičiuotos, išdėstytos ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimais. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

22. Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų

kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai.

23. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų.

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių. Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais. Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. Kai nebūtina įrengti dušų, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai.

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

24. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą

Medžiagos sandėliuojamos statybvietėje, numatytoje laikinoje sandėliavimo aikštelėje, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Medžiagos turi būti sandėliuojamos užtikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Kenksmingos bei pavojingos medžiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose. 23 Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu Geriamojo vandens įrenginiai turi būti įrengti prie gamybos patalpų arba poilsio patalpose. Geriamojo vandens įrenginiai turi būti žymimi ženklu „Geriamasis vanduo.“ Stacionarius geriamojo vandens įrenginius draudžiama įrengti: cheminių nuodingų ir pavojingų medžiagų gamybos ir sandėliavimo patalpose; prie intensyvaus transporto naudojimo vietų; prie pavojingų įrenginių. Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybės reikalavimus.

25. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių numatyta tvarka. Statybinės atliekos iki jų išvežimo į sąvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje: konteineriuose, uždaroje taroje, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Rangovas atsako už atliekų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. Statytojas baigęs darbus statyboje, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

26. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą – leidimą pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00“ 1 priedą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, taip pat turi būti aptvertos pagal „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“.

27. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. Statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, smėlio dėžė, kastuvai, kibirai, kablys, žarnos ir kt.) Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje.

28. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

29. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint privaloma vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.”

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Statybos laikotarpiu rangovas turi paruošti galimų avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų išdėstyta įspėjimų pateikimo seka teršalų išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir valymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Aikštelėje Rangovas turės numatyti medžiagas ir įrangą, reikalingą darbuipotencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, kurios bus laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti.

Inžineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi būti apsaugomi, darbai, jų apsaugos zonose, turi būti vykdomi laikantis, juos eksploatuojančių institucijų išduotų sąlygų ir techninių specifikacijų, reikalavimų. Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas vykdant žemės kasimo darbus ryšių, elektros tinklų apsaugos zonose. Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina išsikviesti tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus, darbus vykdyti vadovaujantis jų pateiktais nurodymais. Neigiamas poveikis aplinkai gali atsirasti statybos metu, dirbant mechanizmams, dėl mechanizmų gedimų ar jų mazgų ir agregatų nesandarumo. Užterštas gruntas ar statybos produktai turi būti išvežti, išvalyti arba utilizuoti. Esant sausiems orams būtina papildomai drėkinti statybvietę, kad sumažinti dulkių kiekį ore. Laikinos aikštelės vertikalų paviršių formuoti taip, kad paviršinis vanduo nuo aikštelės sutekėtų į vieną vietą, suformuotoje žemiausioje vietoje įrengti ne mažesnį kaip 1 m skersmens ir 2 m gylio šulinį paviršinio vandens surinkimui. Vykdant statybos darbus būtina tenkinti šias sąlygos:

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius, gatves bei privačias valdas;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; SS17023-02-TP-SO.AR Lapas Lapų Laida 24 27 0 • hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

30. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus ir tik parengęs statybos darbų technologijos projektą, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Rangovas technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos reikalavimų, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darbų kokybei. Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir techninį reglamentą „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“.

Statinio statybos darbus Rangovas pradėti gali gavus statybą leidžiančius dokumentus vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Statybos trukmė nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko išdirbiu, priimtu darbininkų sk., statybos - montavimo darbų apimtimi ir turi būti suderinta su Užsakovu. Statyba vykdoma viena pamaina.

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Viso
1	Statybos trukmė	mėn.	3
2	Darbuotojų skaičius statyboje:	žm.	10
3	a) darbininkų	žm.	9
4	b) vadovų, specialistų ir tarnautojų	žm.	1

Statybos darbų eiliškumo grafikas:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	Trasos nužymėjimas;	■					
2	Statybos sklypo paruošimas;	■					
3	Atvežamos pagrindo sluoksnių medžiagos ir sandėliuojamos keliose vietose išilgai trasos;	■					
4	Žemės sankasos įrengimas;	■	■				
5	Šalčiui nejautrių dangos sluoksnių įrengimas;		■				
6	Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas;		■				
7	Vedama elektra, montuojamas teritorijos apšvietimas			■			
8	Trinkelių dangos įrengimas, dedami bortai;			■			
9	Tankintų atsijų takų įrengimas;			■	■		
10	Medienos kompozito takų įrengimas;				■		
11	Cinkuotų presuotų grotelių takų įrengimas;				■		
12	Montuojami mažosios architektūros elementai;					■	
13	Įrengiamos želdinimo salelės bei vejos vietos;					■	
14	Išvežamos šiukšlės.						■
15	Tvarkomi tako pakraščiai, sodinami krūmai ir žoliniai augalai, sėjama veja						■

Esant neigiamai temperatūrai bei grunto įšalui nulinio ciklo darbai atlikti nerekomenduojami dėl išaugusių darbo bei medžiagų sąnaudų. Šildymo sistemos remonto bei langų ir durų keitimo darbai gali būti vykdomi tik ne šildymo sezono metu. Taip pat vykdant fasadų šiltinimo darbūs būtina atsižvelgti į pasirinktos fasadų šiltinimo sistemos reikalavimus, t.y. kokioje žemiausioje temperatūroje leidžiama dirbti su atitiktomis medžiagomis bei konkrečiuose statybos procesuose.

31. Trasos paruošimas

Statybos aikštelė aptveriama laikinomis aptvėrimo priemonėmis. Statybos aikštelėje pastatomas vagonėlis su buitinėmis patalpomis. Prie buitinių patalpų, rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. Rangovas privalo garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą, lietaus vandens nuleidimą, apsaugoti ją nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio ir pavasario polaidžio. Prieš pradėdamas statybos darbus, turi būti pašalintas dirvožemio sluoksnis ir kitos netinkamos ar pavojingos medžiagos.

31.1 Pagrindo įrengimas

Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų.

31.2 Dangų įrengimas

Techniniam prižiūrėtojui priėmus pagrindo sluoksnius, klojama betoninių trinkelių danga, betoninės trinkelės įrengiamos pagal ĮT SBR 19 bei ĮT Trinkelės Baigiamieji ir apdailos darbai.

32. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai

Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nepateikiami dėl jų neaktualumo.

33. Privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais, statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

34. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Eil. nr.	Pavadinimas	Minimalus valandų skaičius	Pastabos
1	Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 m^2;1000m^3)	700	
2	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	36	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
3	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12	
4	Užbaigimo komisija	24	

35. Statybvietės aptvėrimas

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. Asmenys, organizuojantys darbus kelyje, turi užtikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, – ir šviesomis. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir tvarka gali reguliuoti eismą. Statybvietė turi būti aptverta, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybos metu statybvietėje pėsčiųjų eismas nenumatomas.

36. Pavojingos statybvietės zonos

Pradedant statybos darbus ir dirbant statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose gali atsirasti rizikos veiksnių. Pagal DT 5-00 pavojingos zonos skiriamos į tris grupes: - prie elektros įrenginių, įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; - neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; - vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes. Pavojingų zonų ribos, kuriose veikia ribinę vertę viršijančių kenksmingų medžiagų rizikos veiksniai, nustatomos matavimais. Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksnių, priskiriamos vietos:

- šalia išmontuojamų konstrukcijų ar įrenginių;
- vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių išmontavimo darbai;
- vietos, virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;

- vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrenginiai.

37. Statybos trukmė

Statybvietės paruošimo ir statybos drabų trukmė nustatyta, atsižvelgiant į suspaustas darbų vykdymo sąlygas, išsaugant esamus veikiančius ir klojant naujus tinklus ir užtikrinant šalia esamų pastatų funkcionavimą. Priimta darbų trukmė – 3 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia.
Pastaba: Tikslų darbų eiliškumą paruošia rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame projekte) susiderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

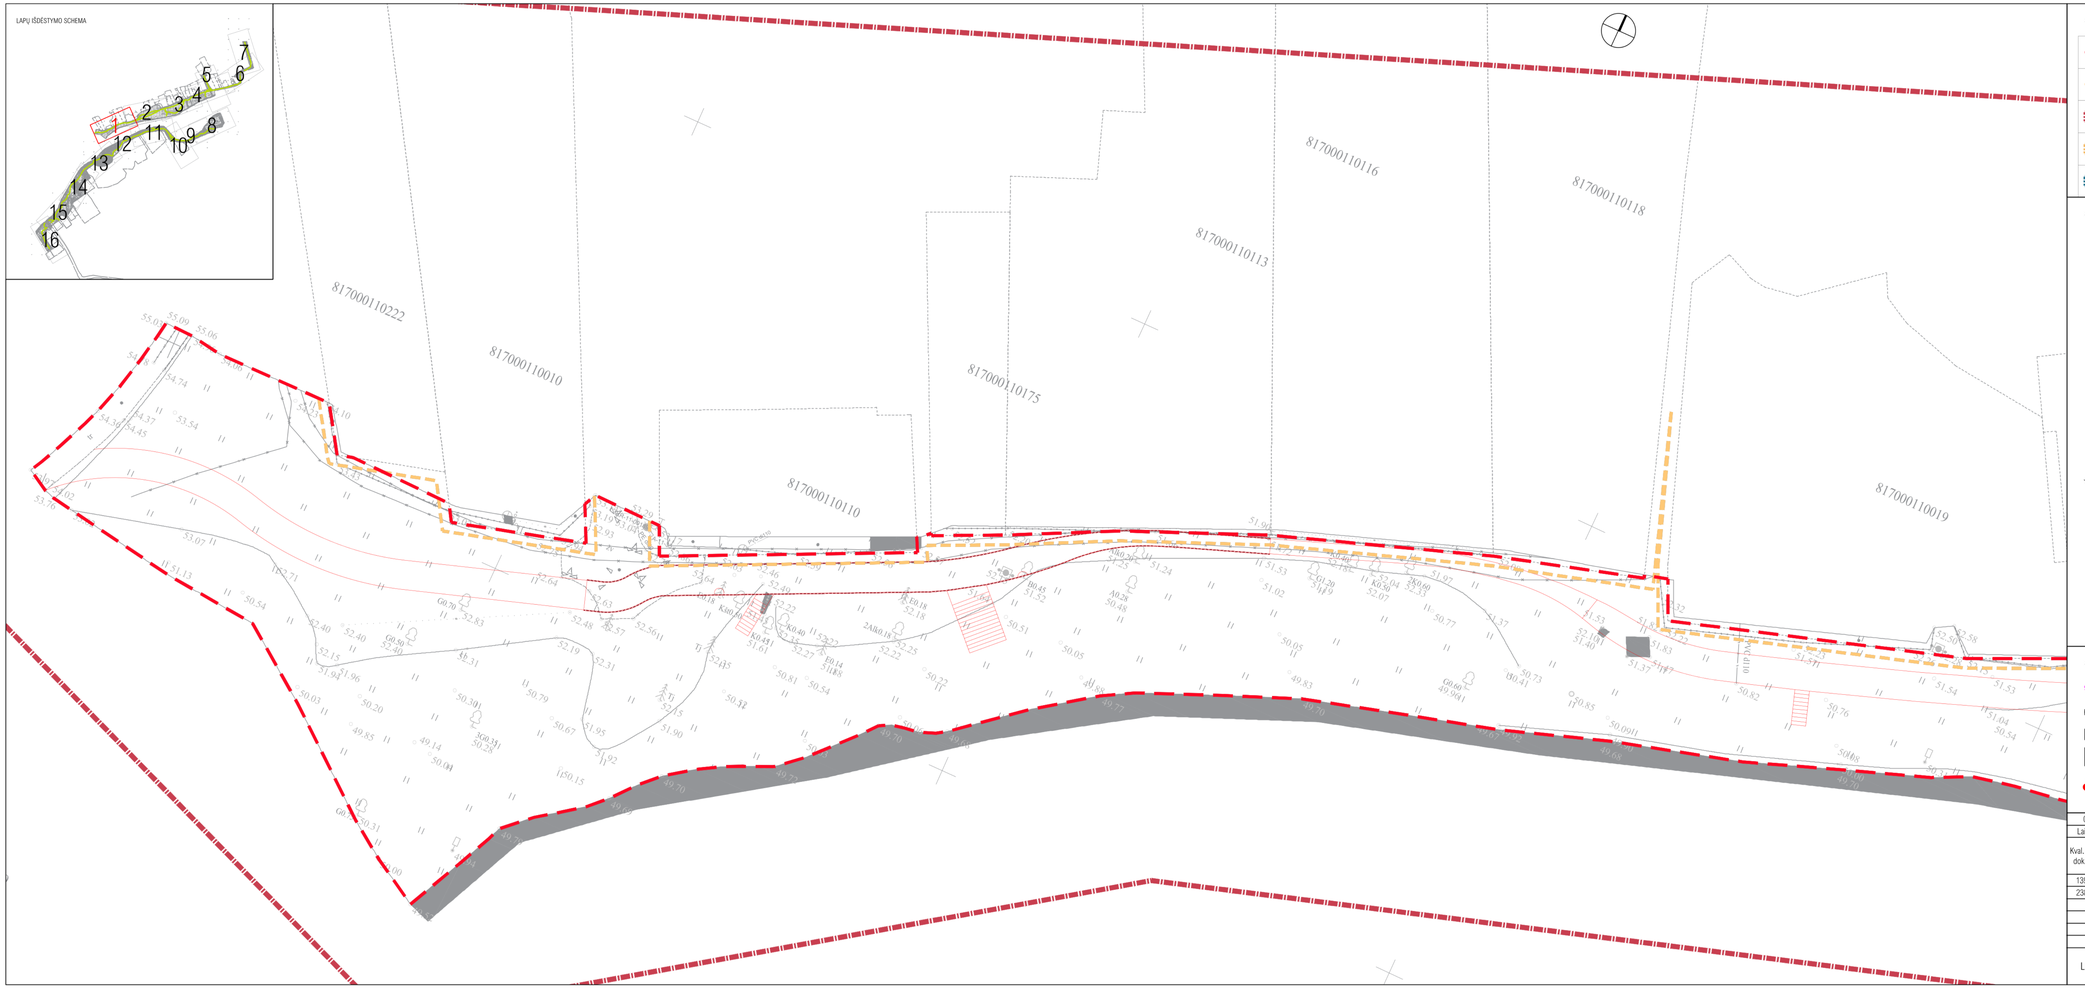

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)

STATYBVIETĖS SCHEMA

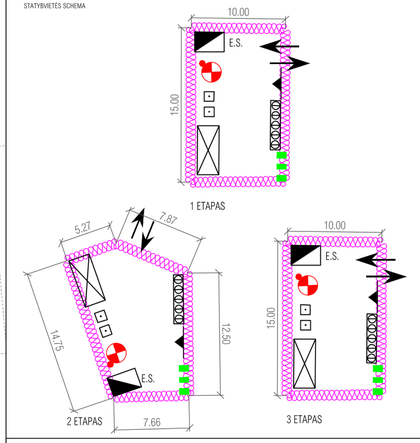

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVINIAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba	
13931	SPV	M. Gaigalas	PROJEKTO DALIS: Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
23861	SPDV	M. Gaigalas	
	ARCH	S. Gaigalaitė	
	ARCH	M. Meštaras	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Statybvietės schema M 1:250 — Laida: 0
	ARCH	G. Grigaitė	
LT	STATYTOJAS IR JAM ATSTOVAUJANTIS ASMUO: Ukmergės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P2409-XX-TDP-SO_B-01 — Lapas: 1 — Lapų: 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

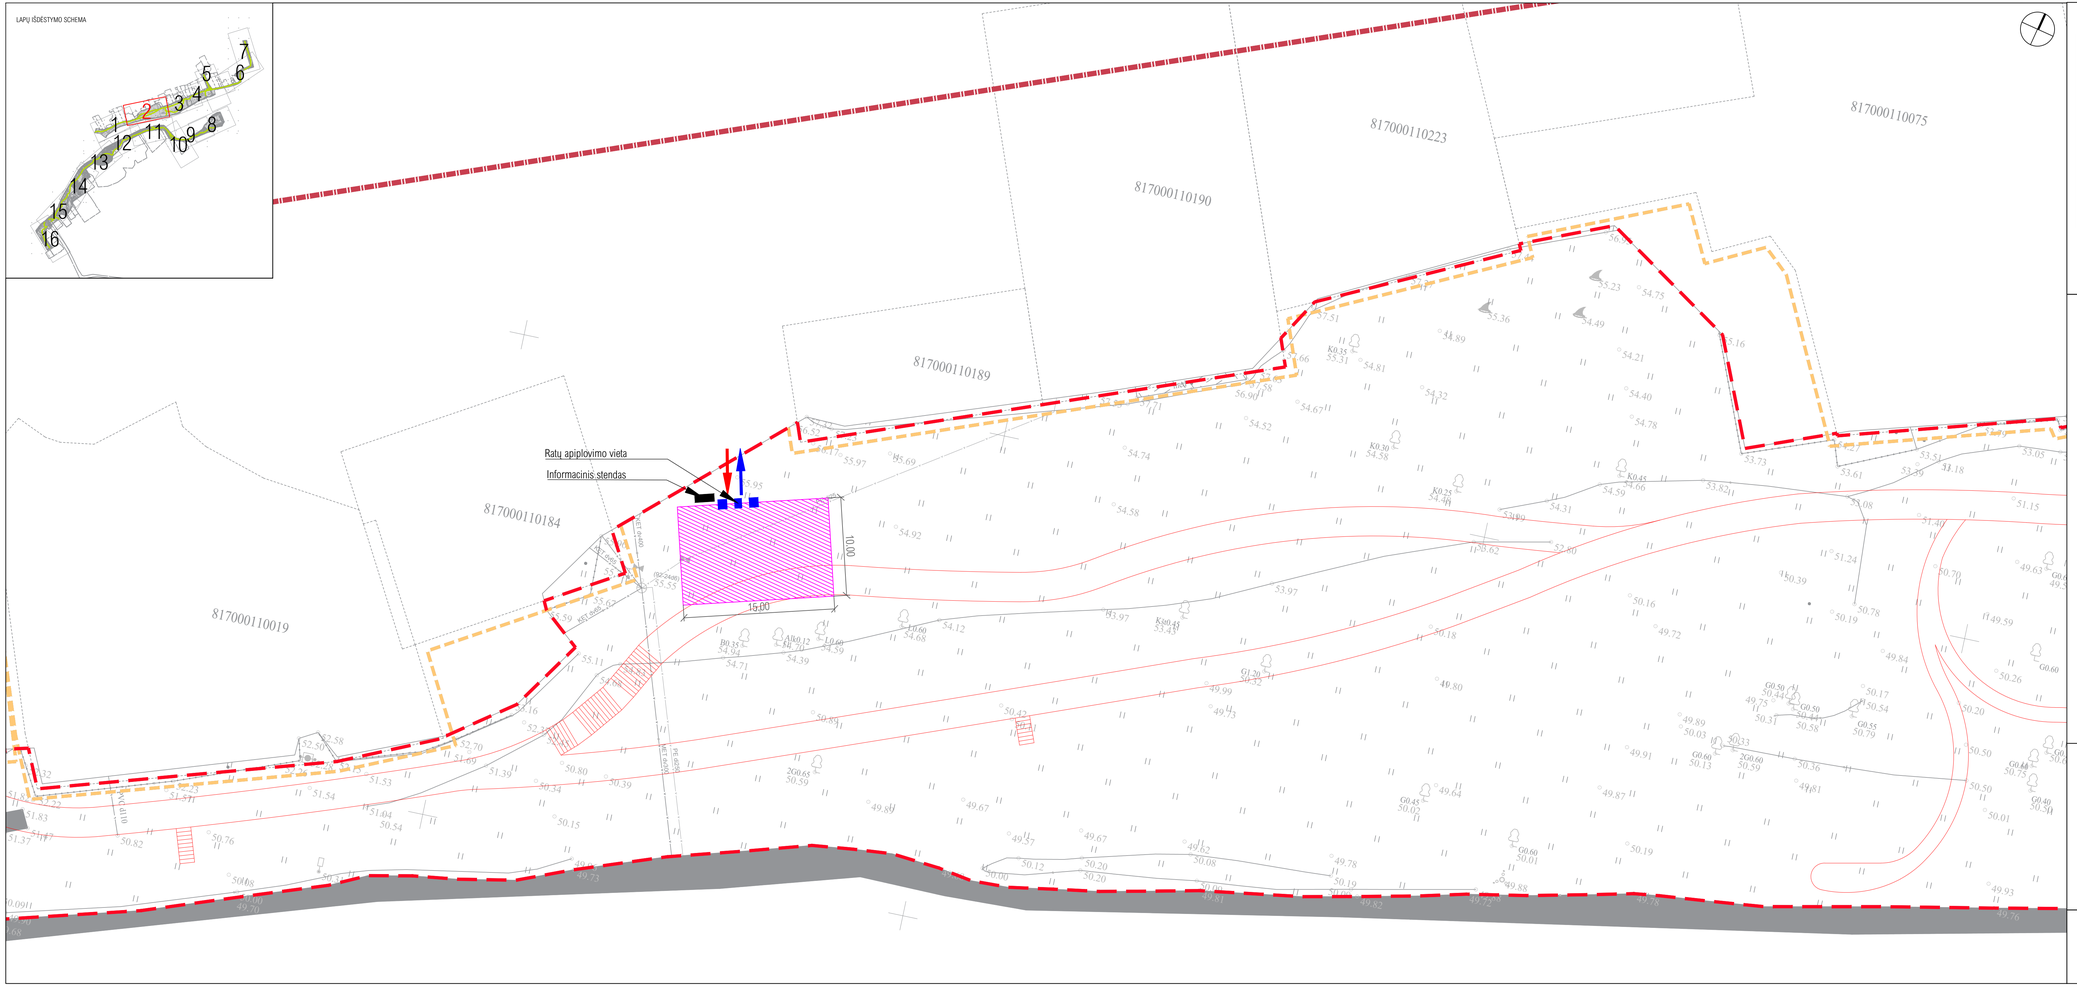

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTINIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

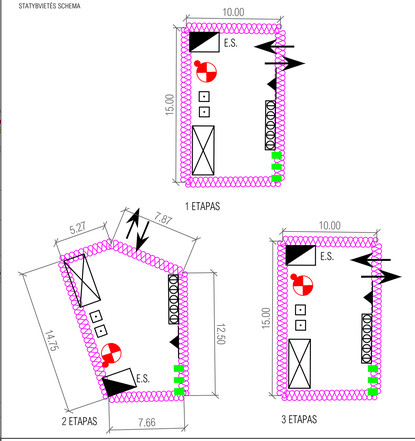

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVINAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 2 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

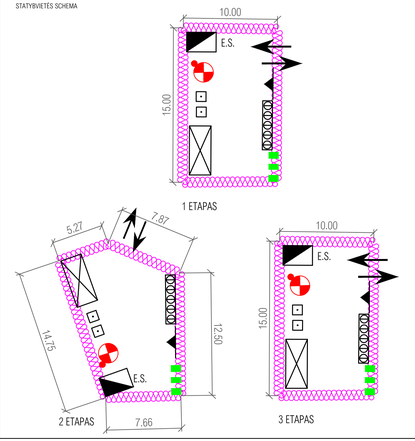

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVIAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 3 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

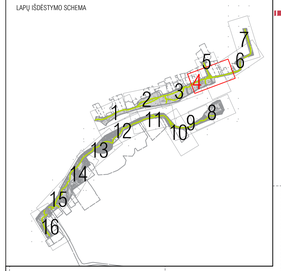

817000110194

817000110260

817000110193

817000100009

817000100025

817000100146

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTINIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

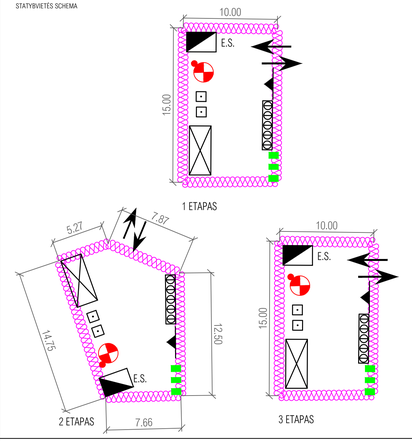

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVINAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Statybvietės schema M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-01	4	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

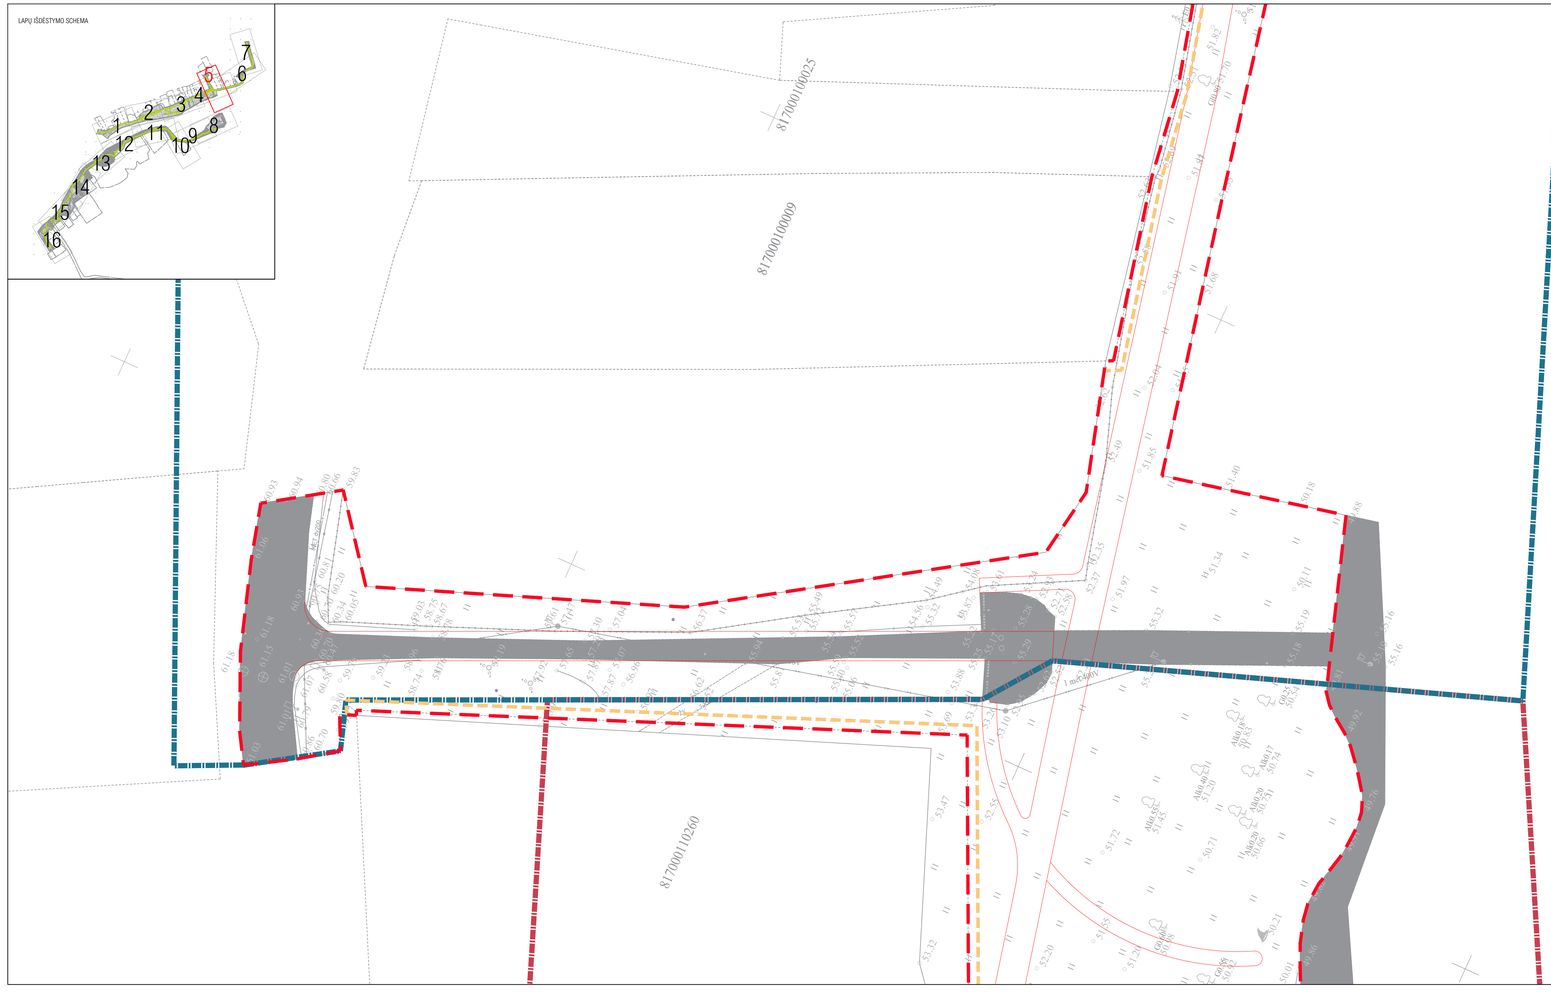

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

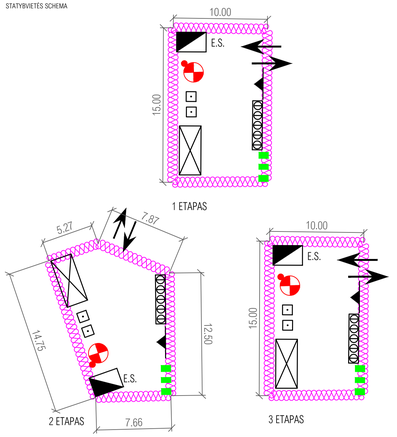

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 5 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTYMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

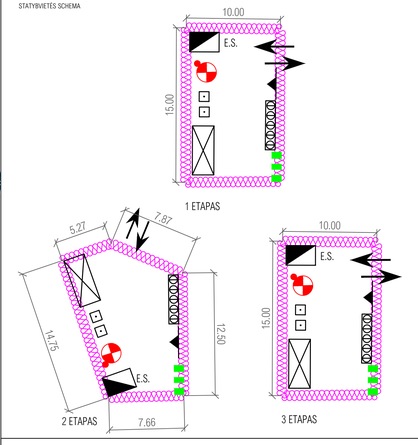

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
IŠ RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVINAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 6 / Lapų 16

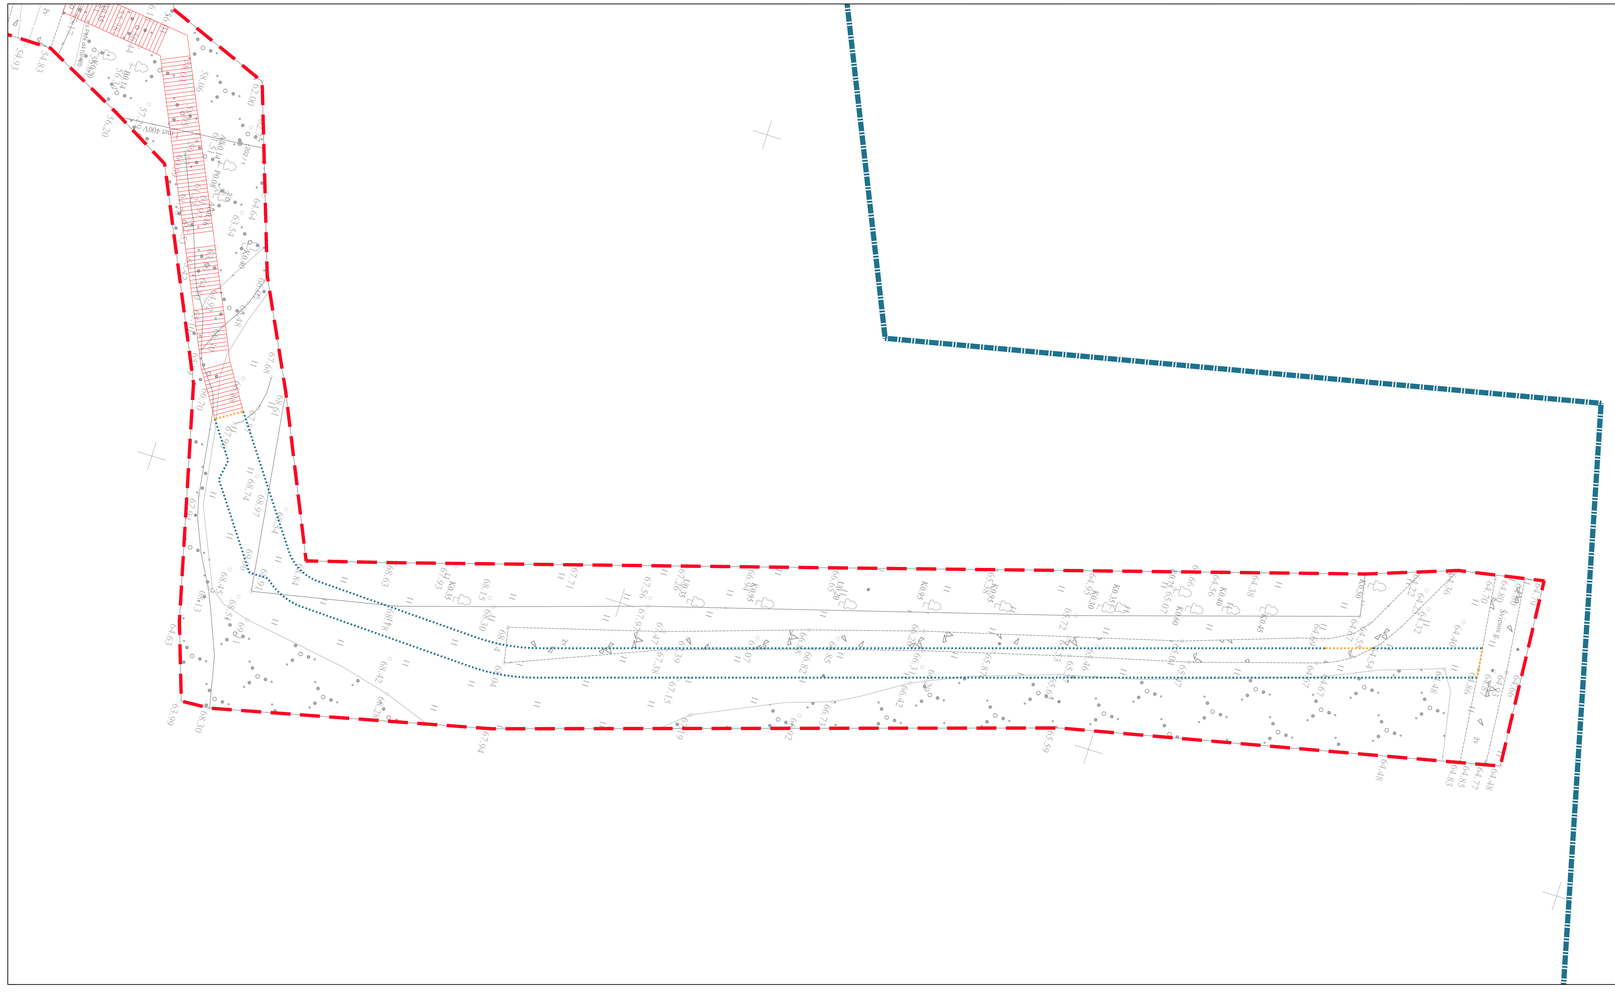

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

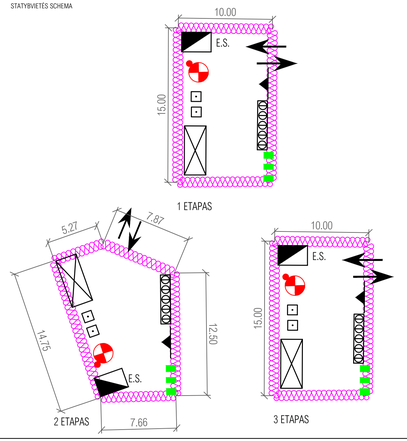

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

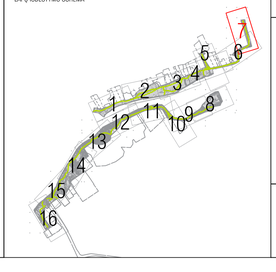

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Statybvietės schema M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-01	7	16

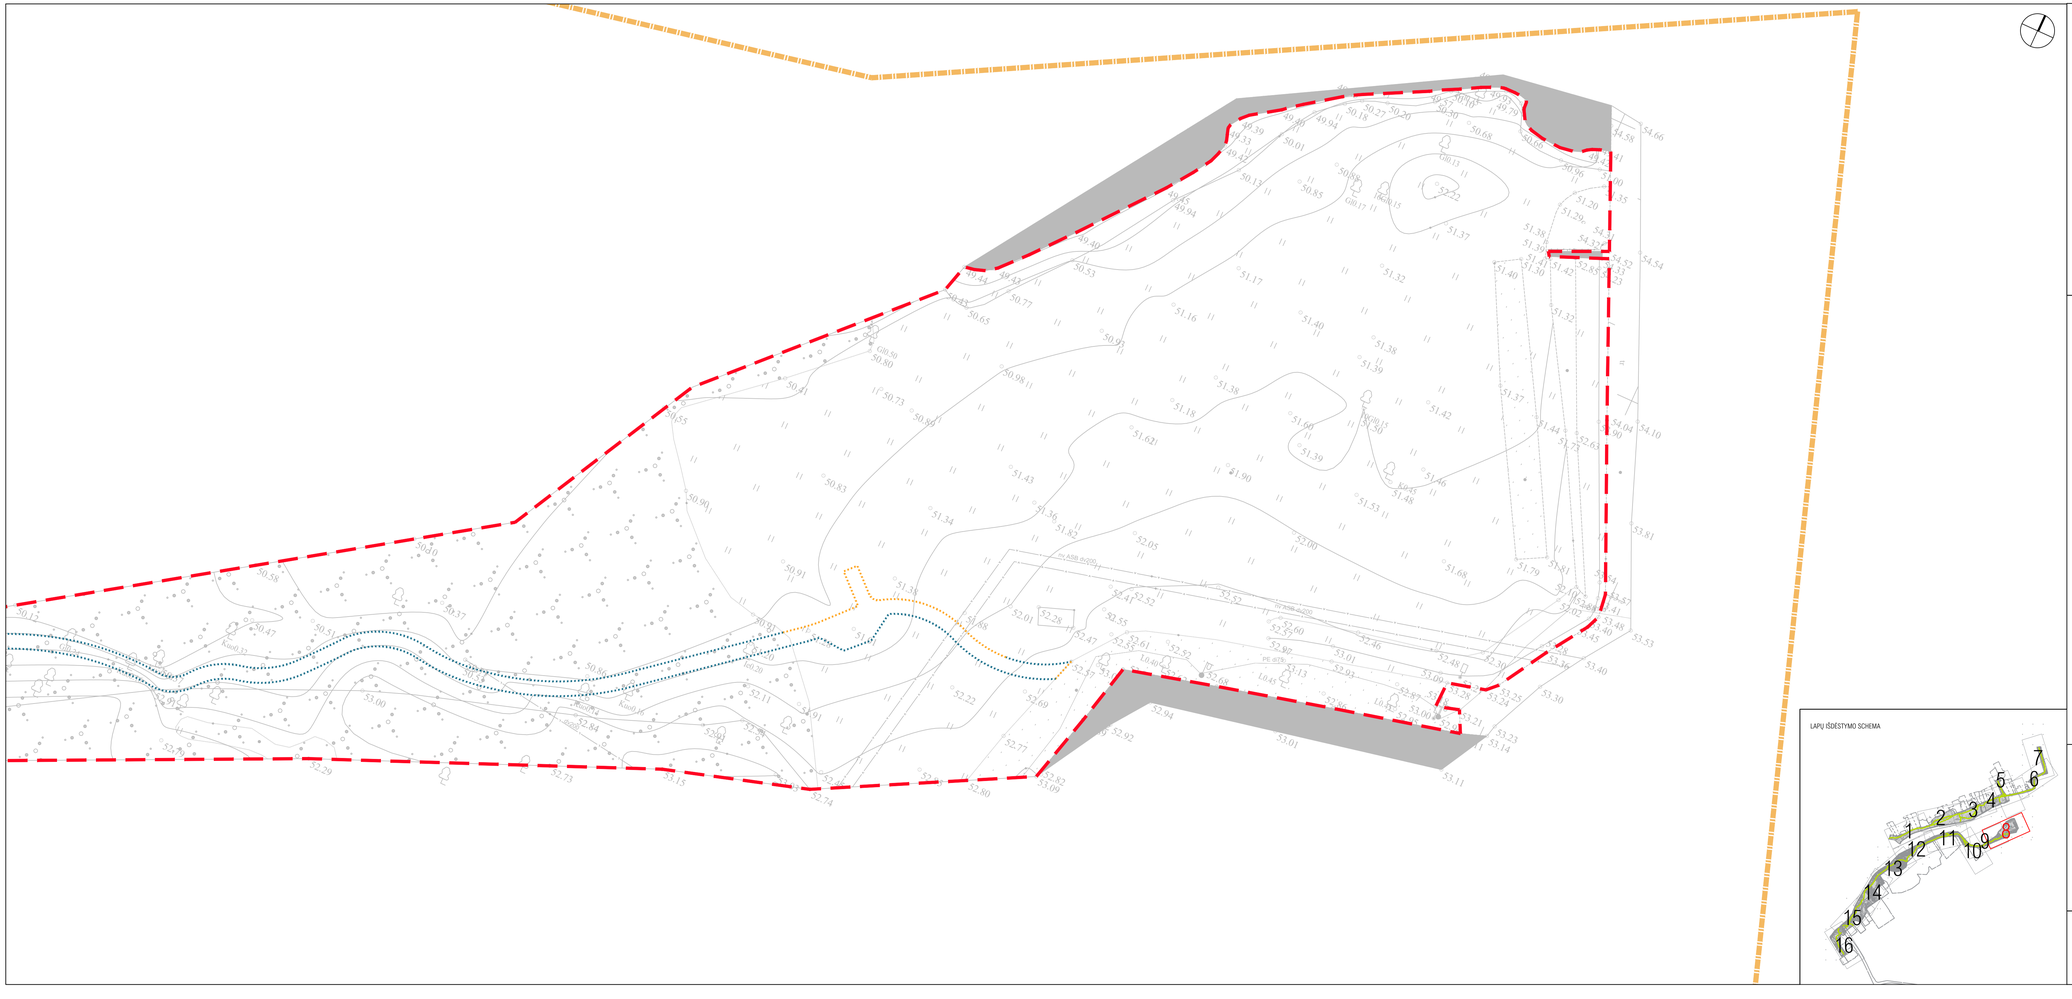

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

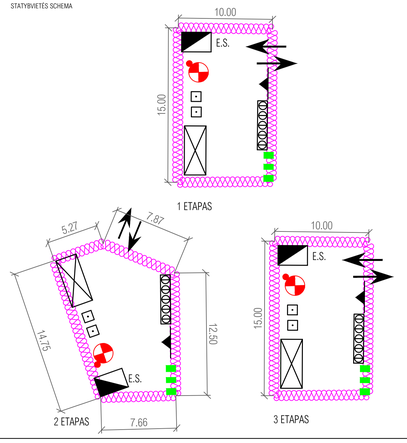

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 8 / Lapų 16

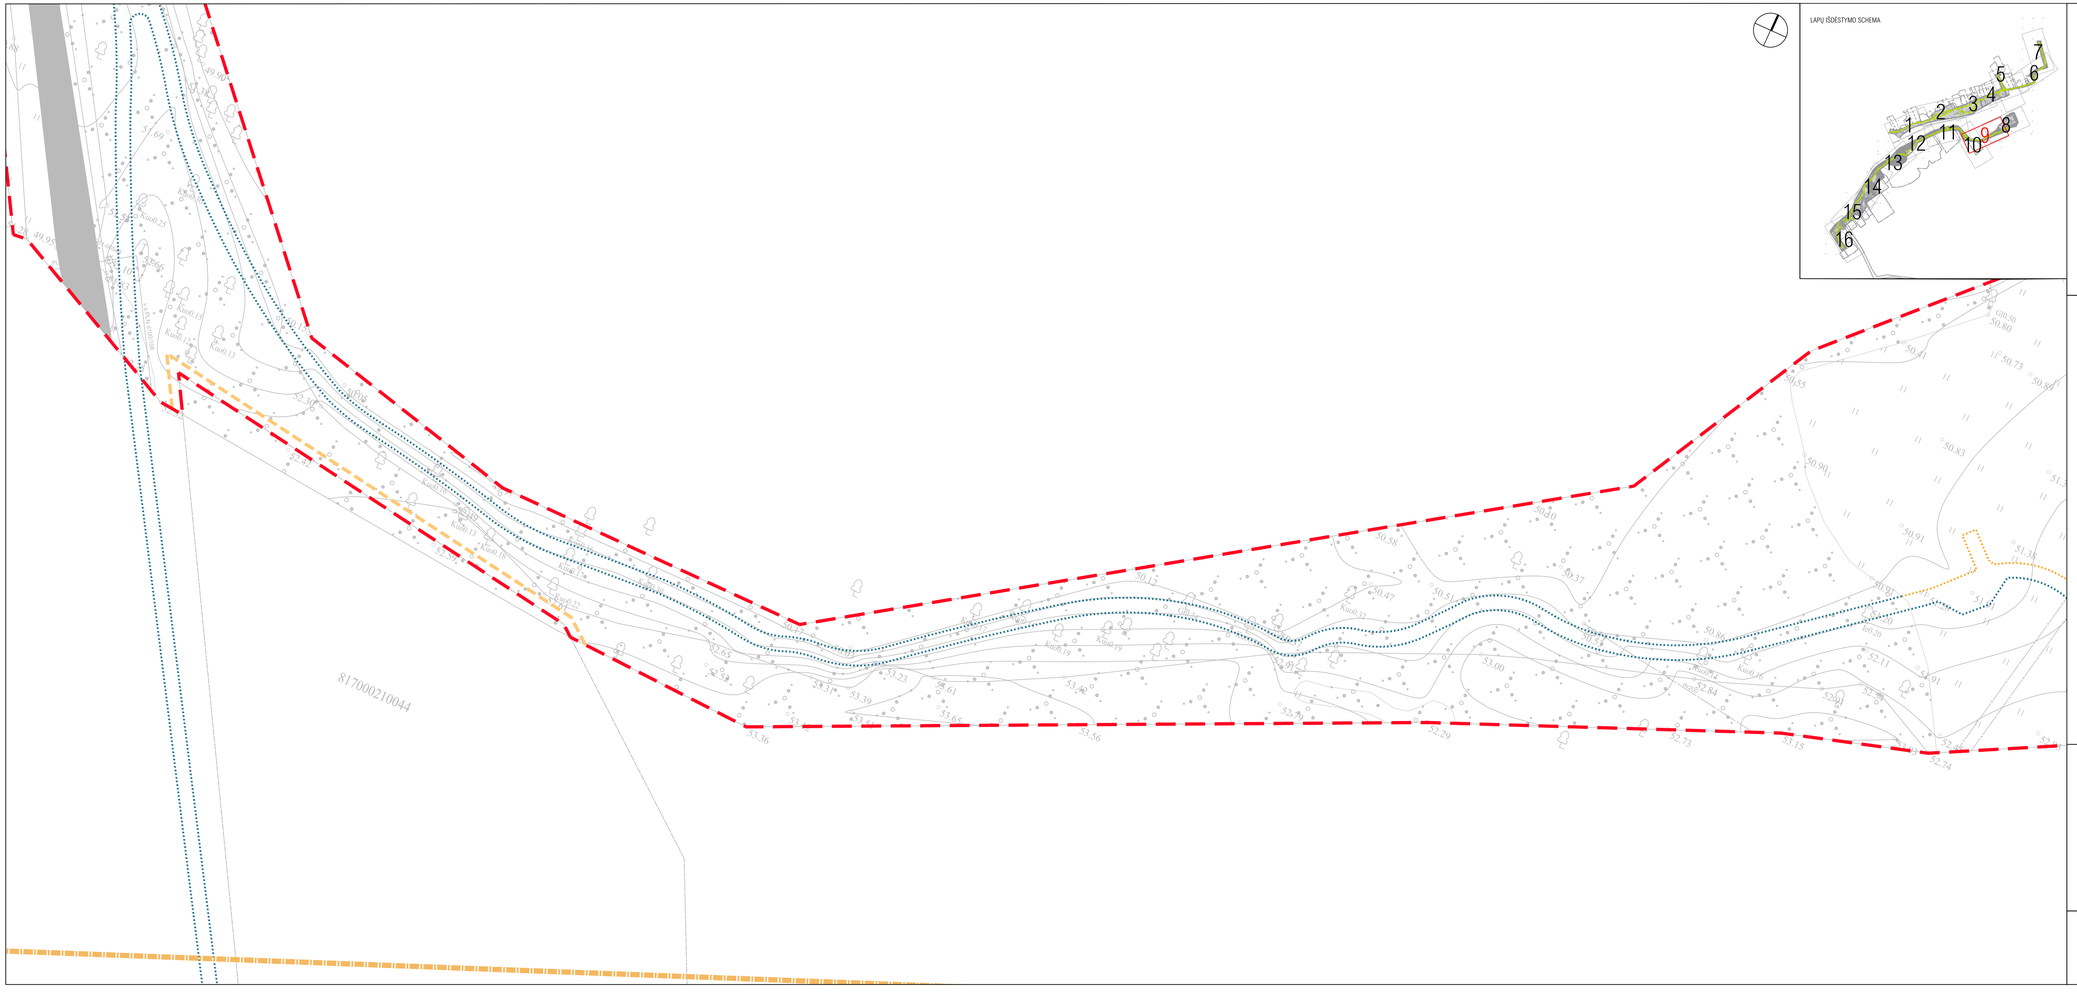

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTINIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

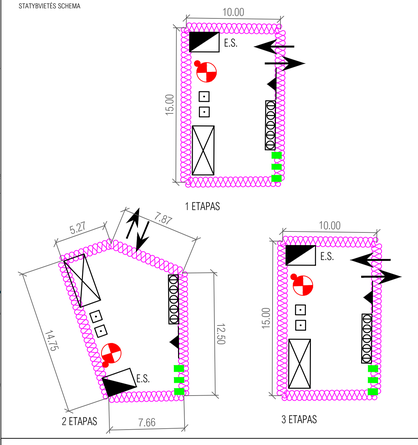

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Statybvietės schema M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-01	9	16

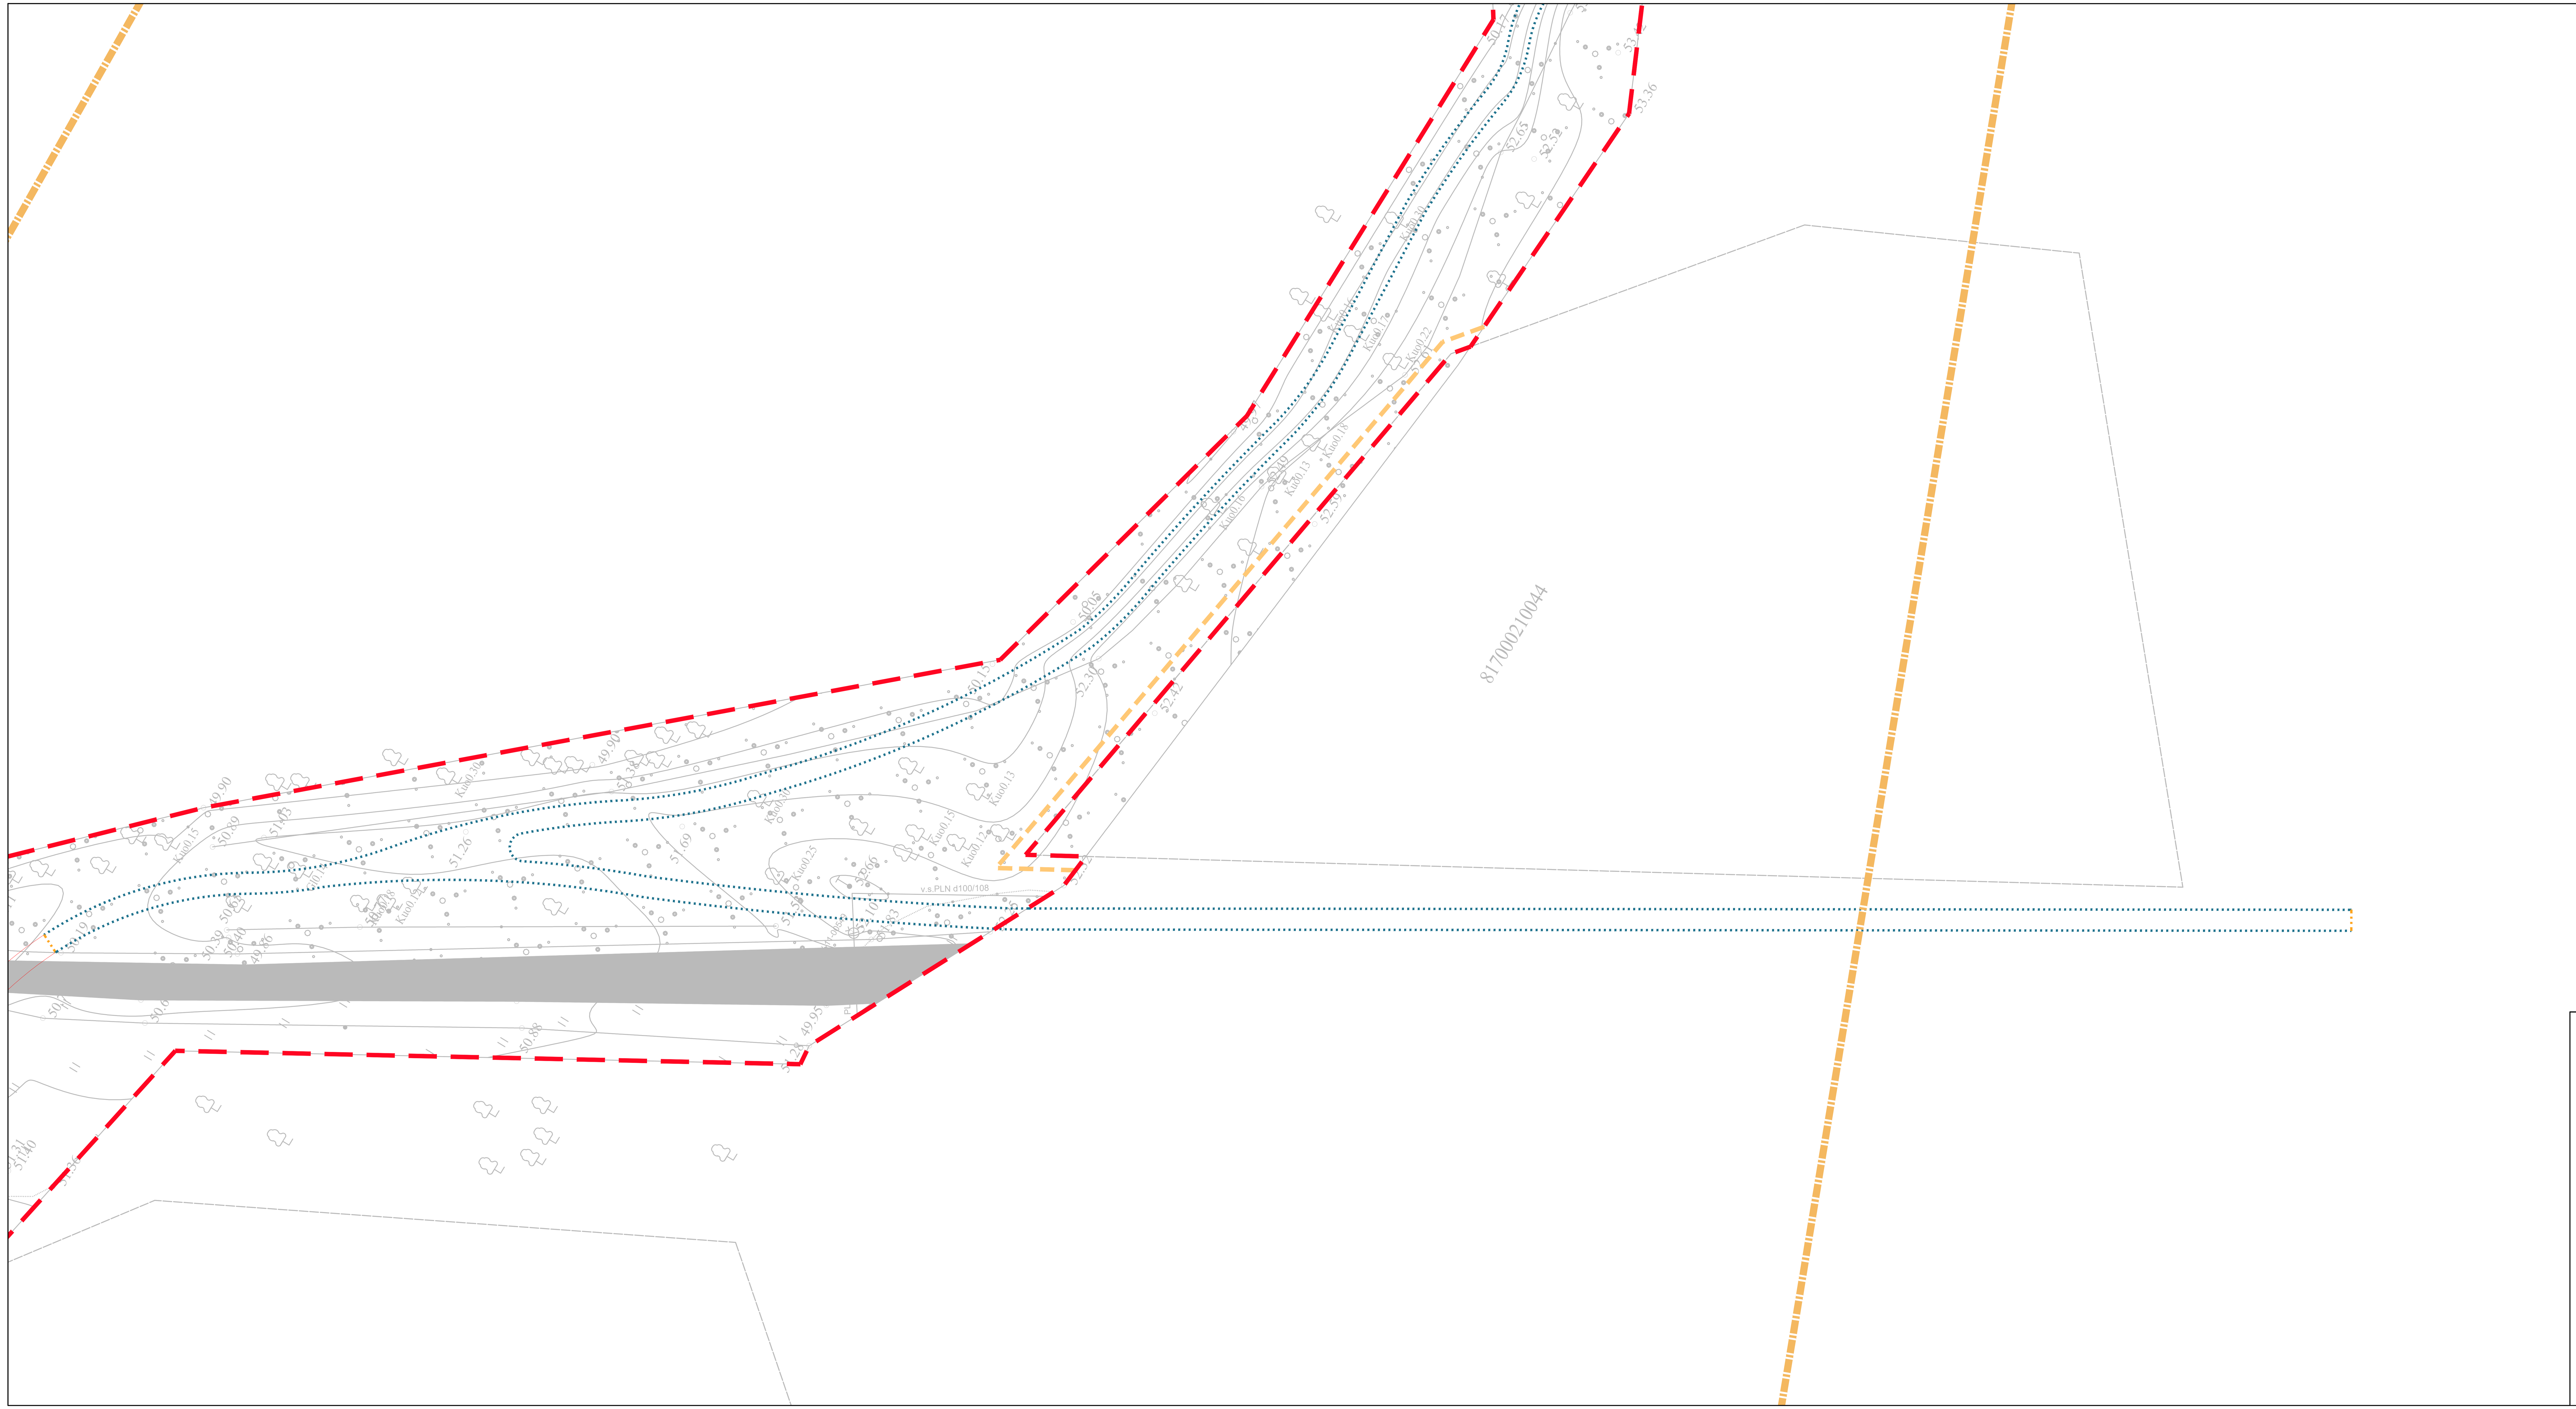

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

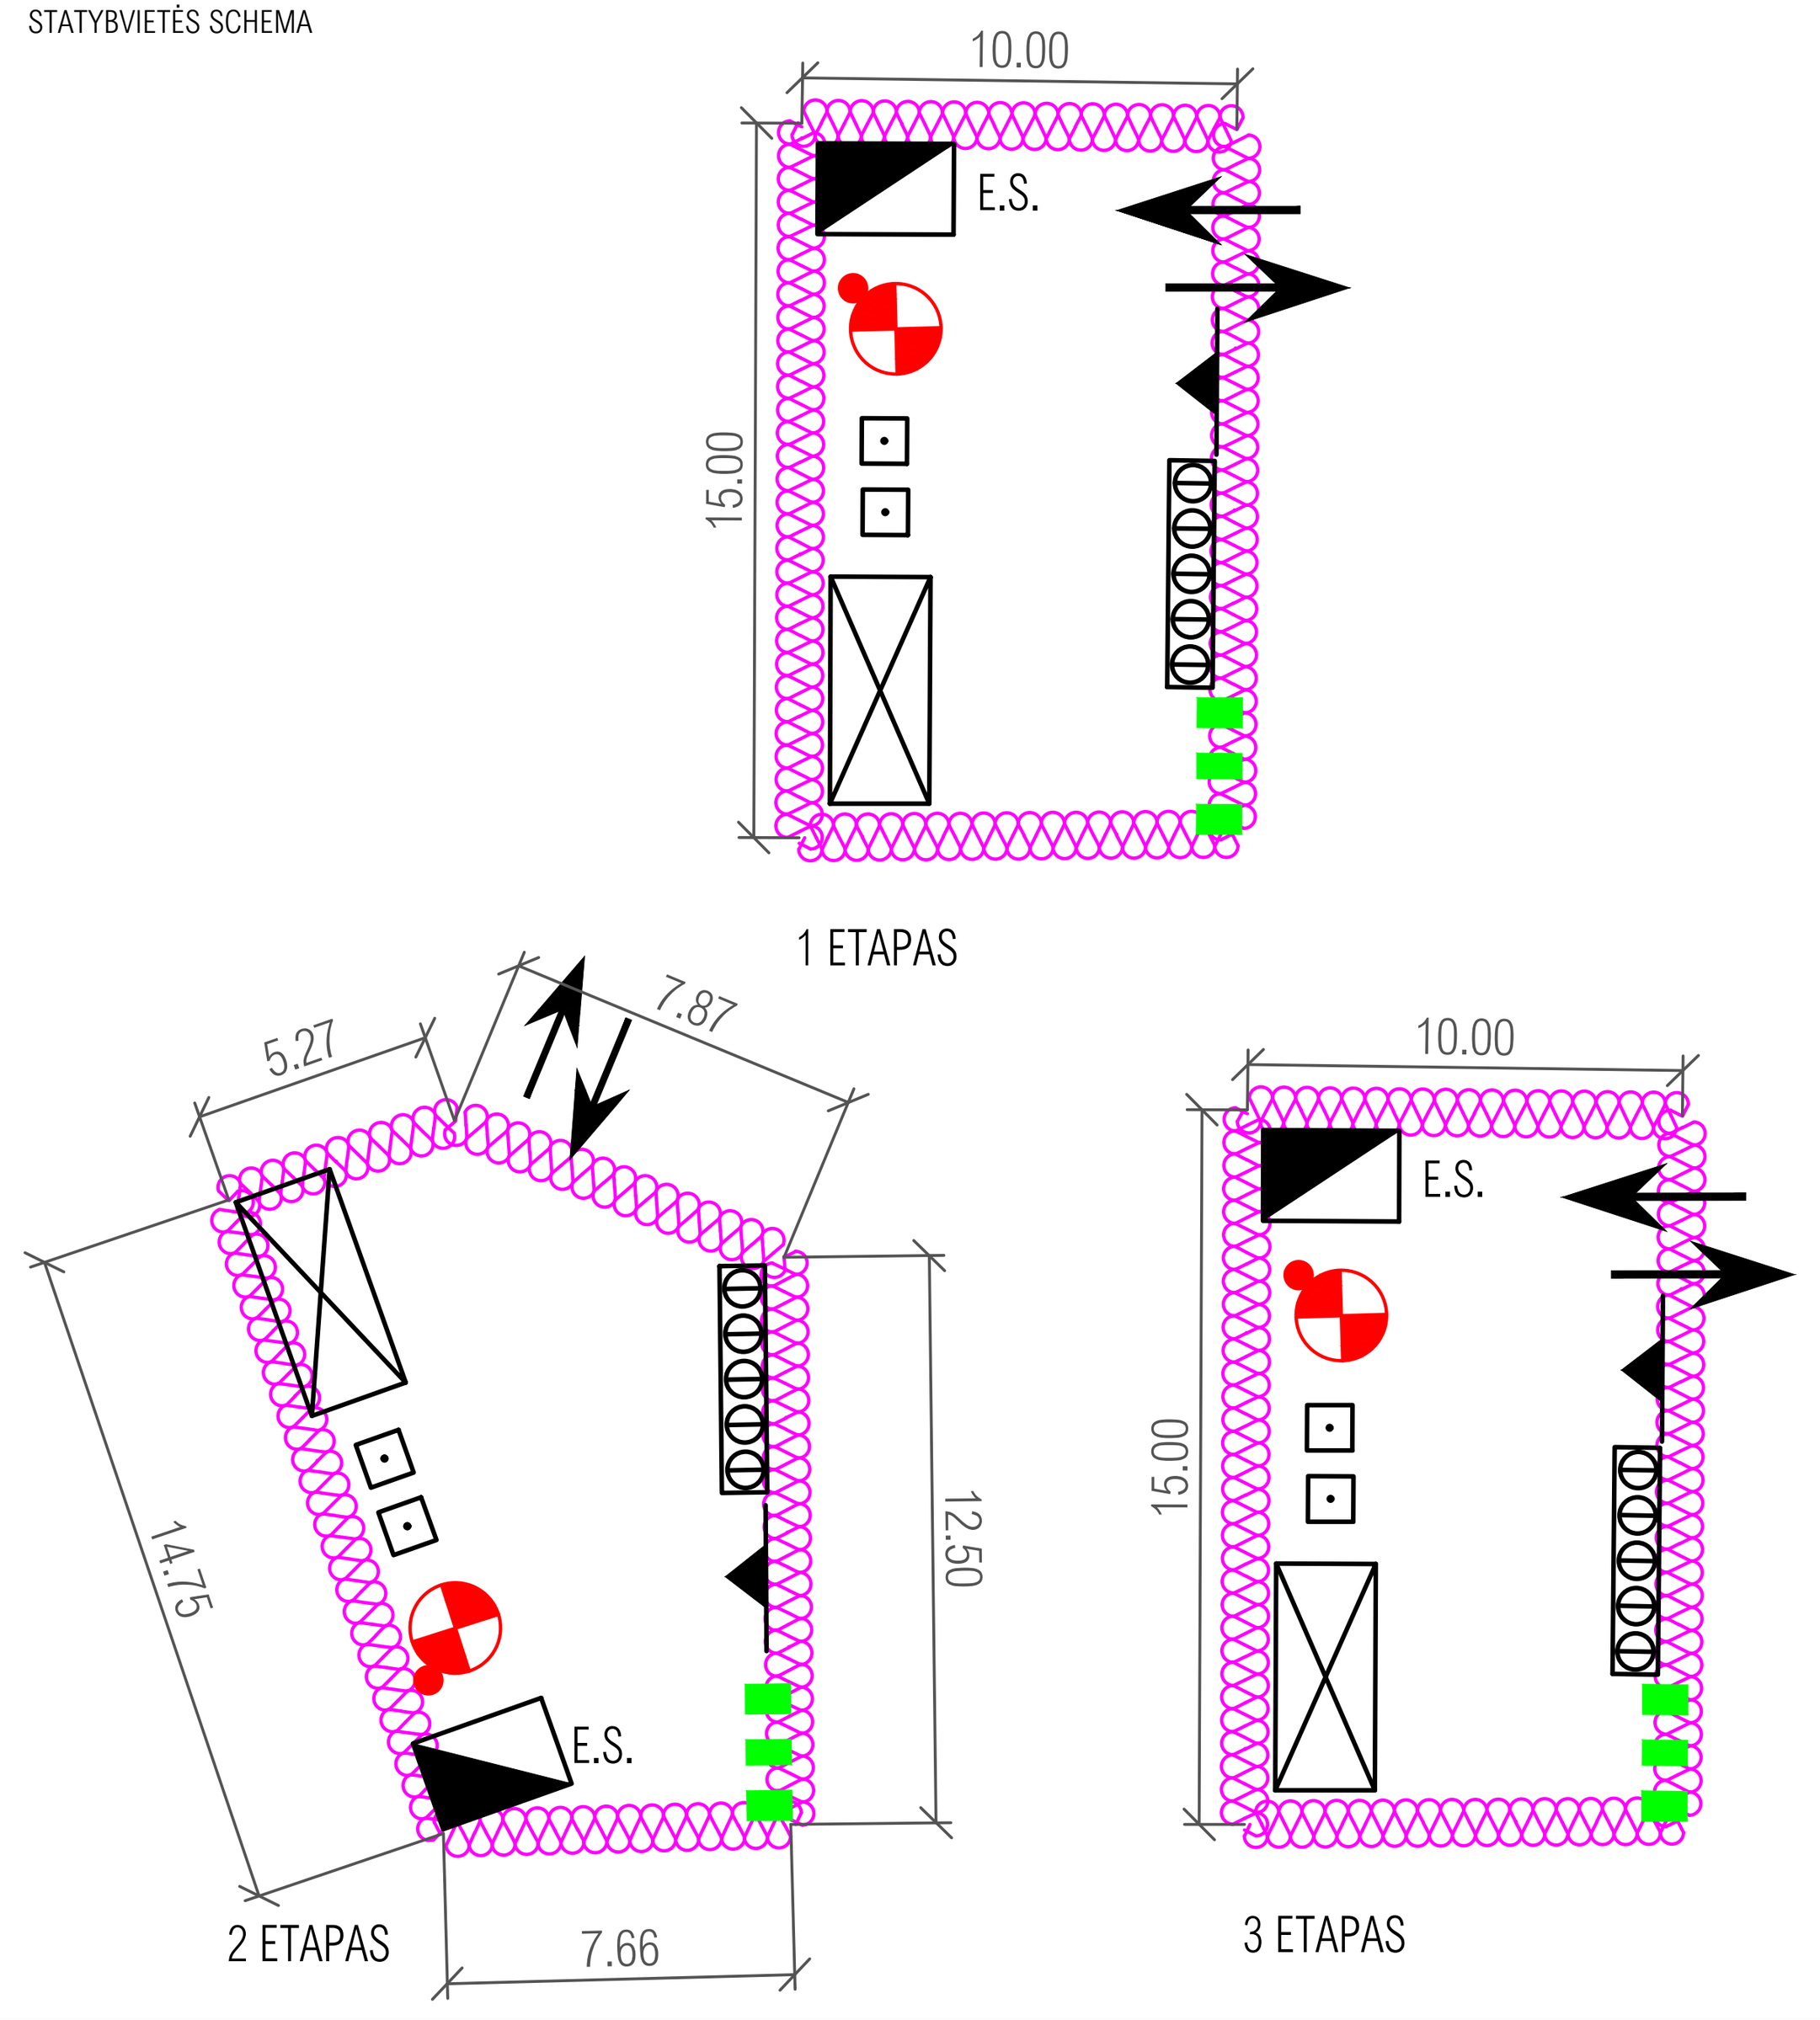

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

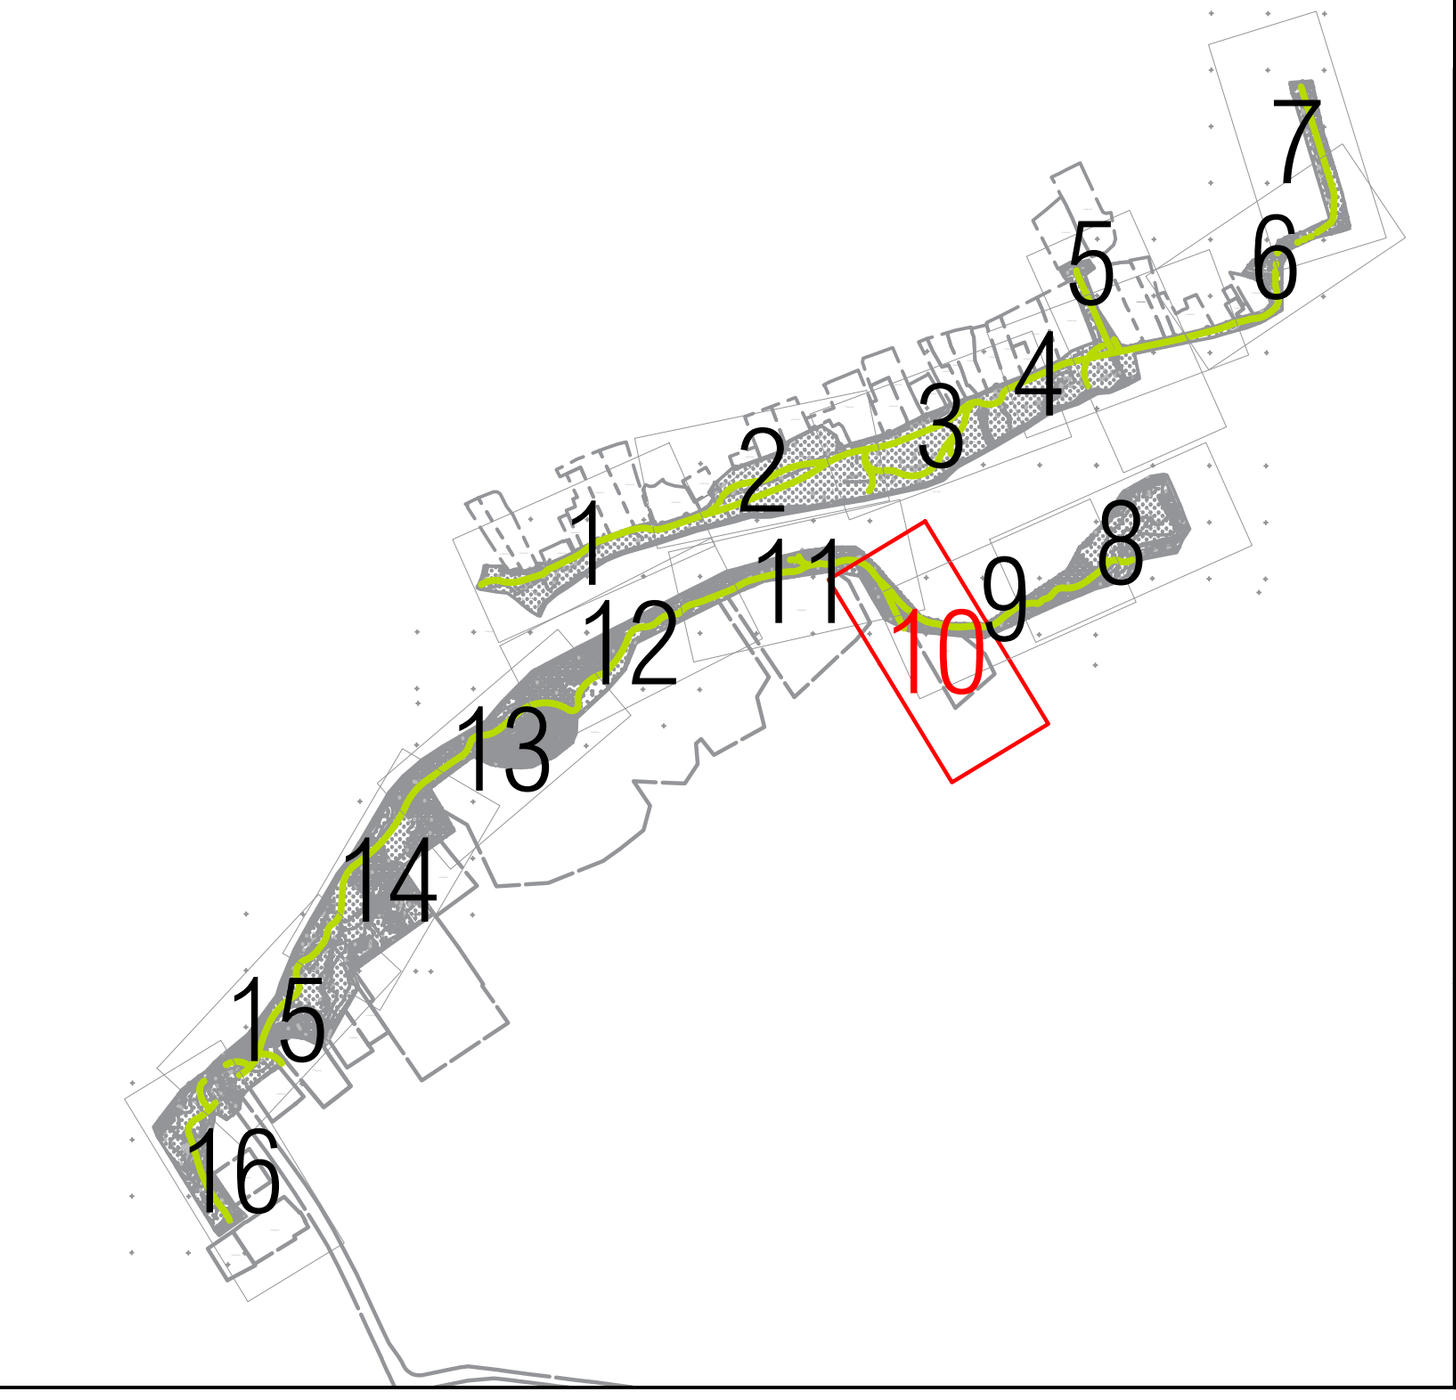

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLEIKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Statybvietės schema M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-01	10	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

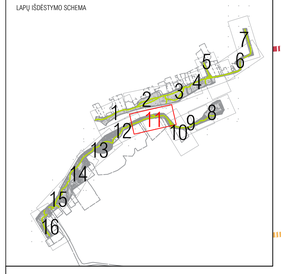

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

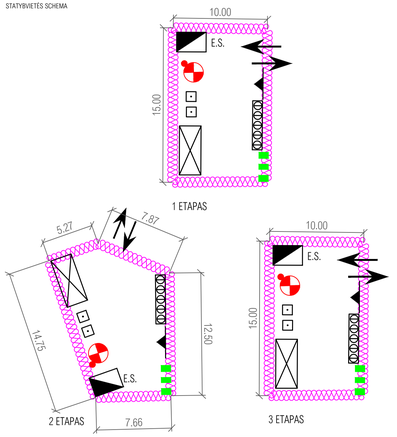

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 11 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

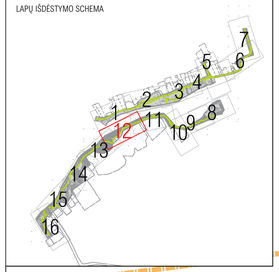

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTYMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

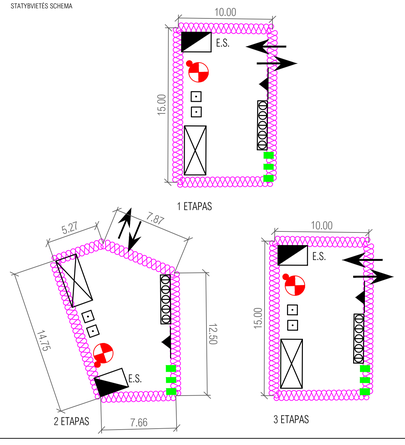

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVIAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 12 / Lapų 16

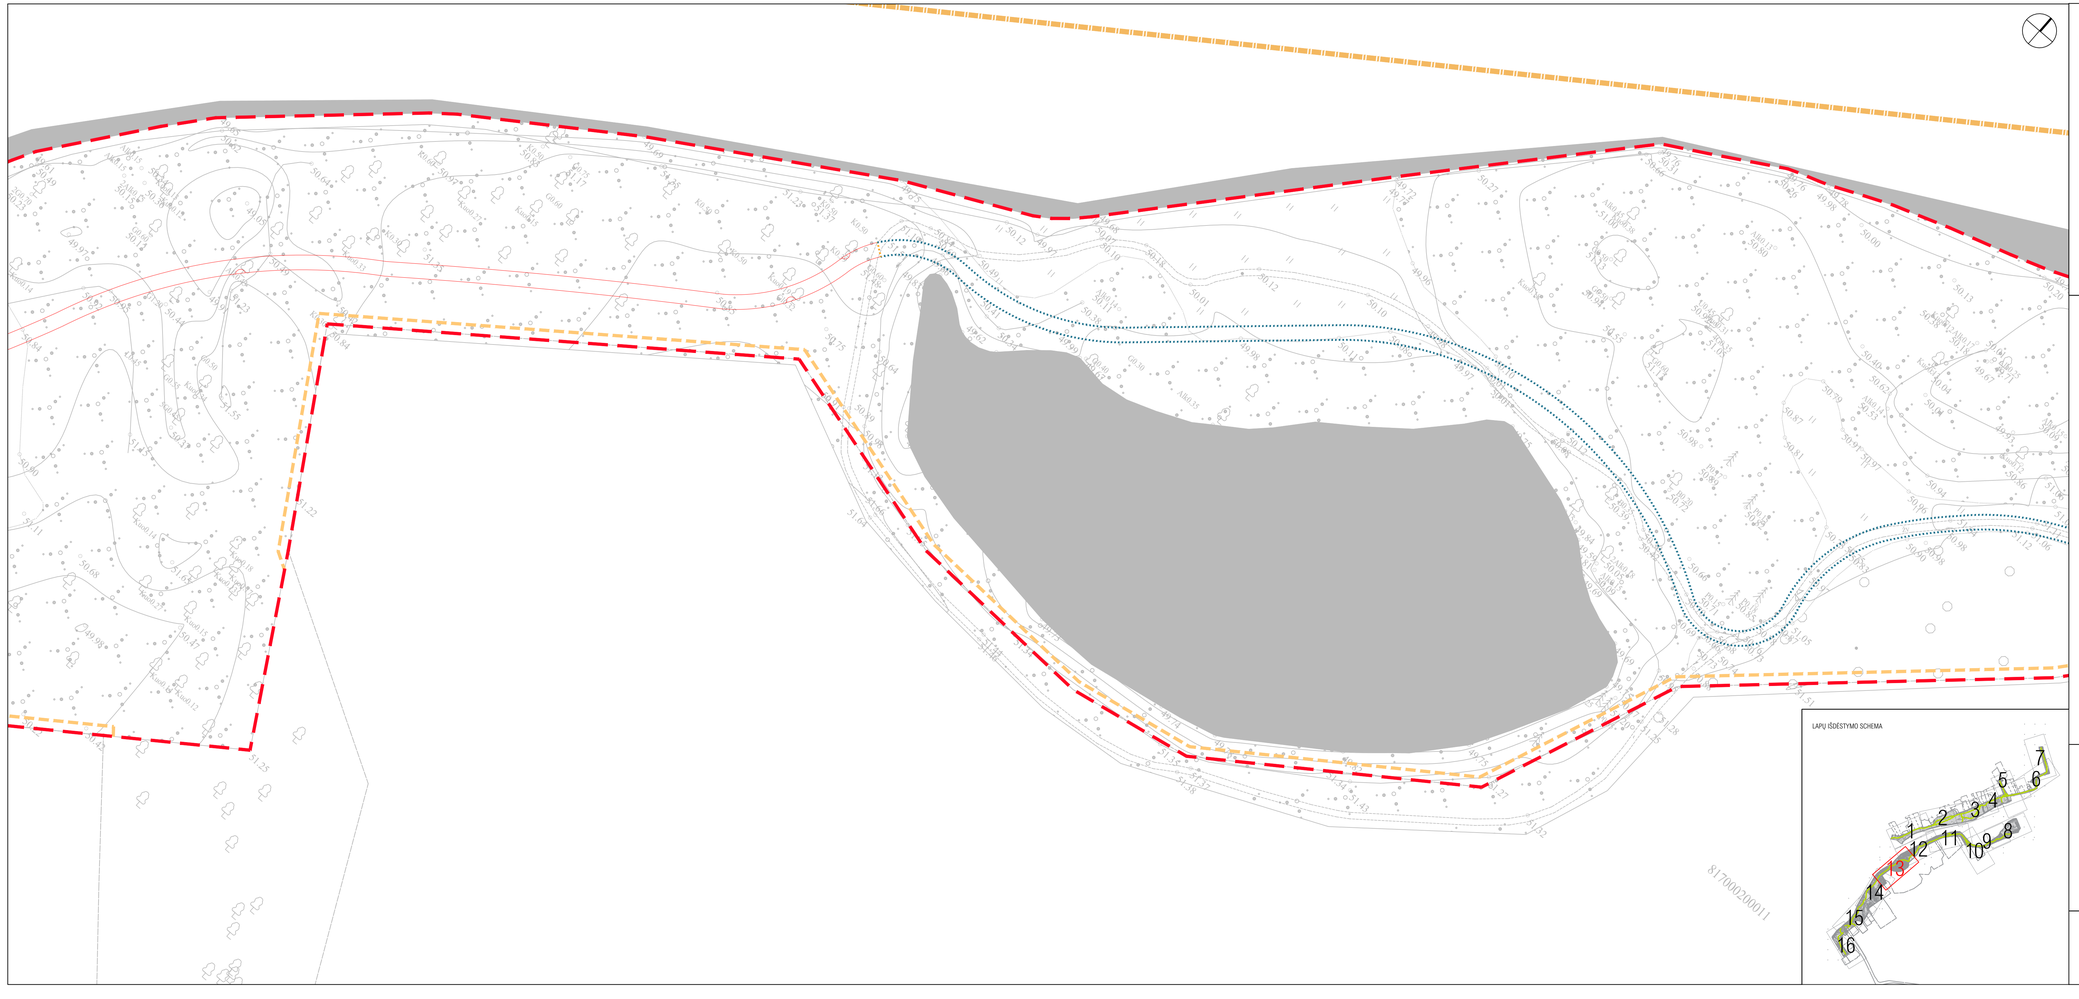

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTYMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

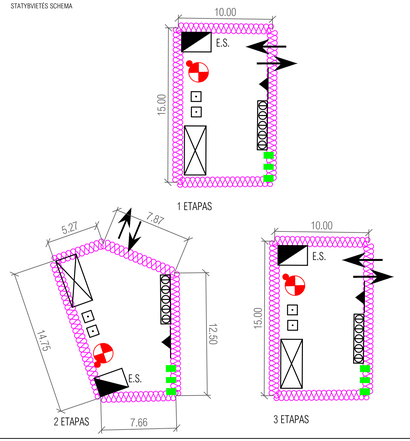

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 13 / Lapų 16

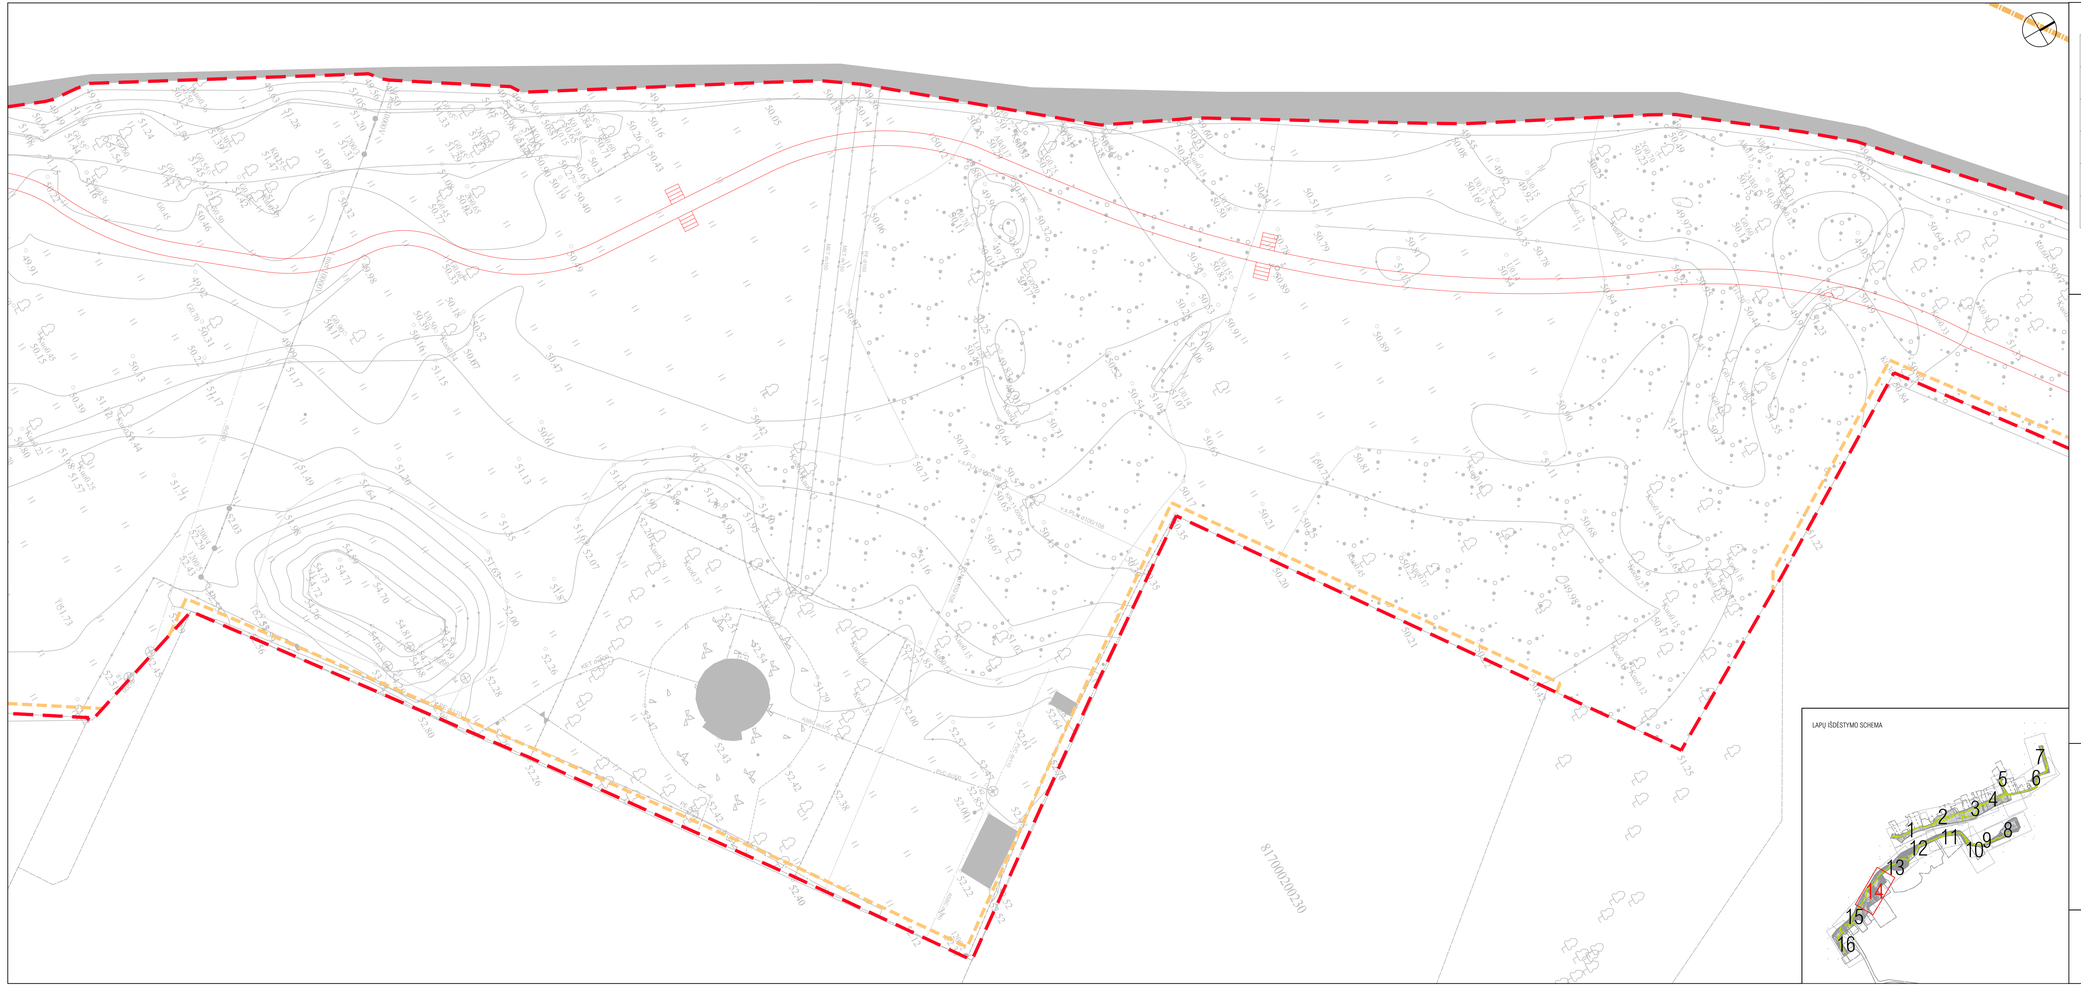

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

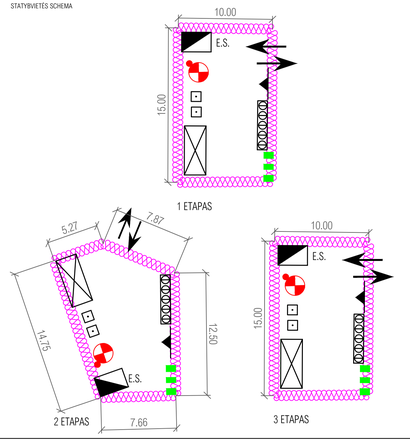

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVIAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 14 / Lapų 16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

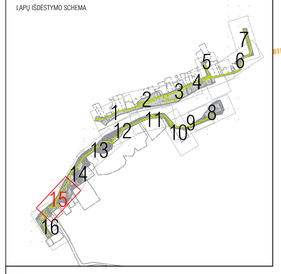

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTINIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

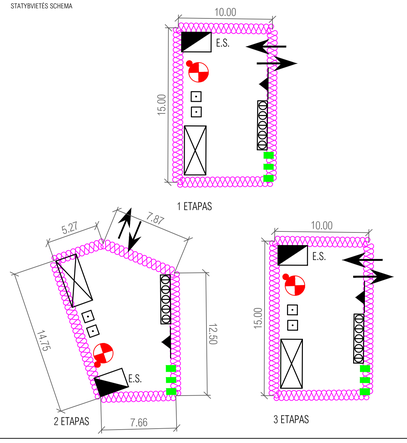

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
5 RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVIAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 15 / Lapų 16

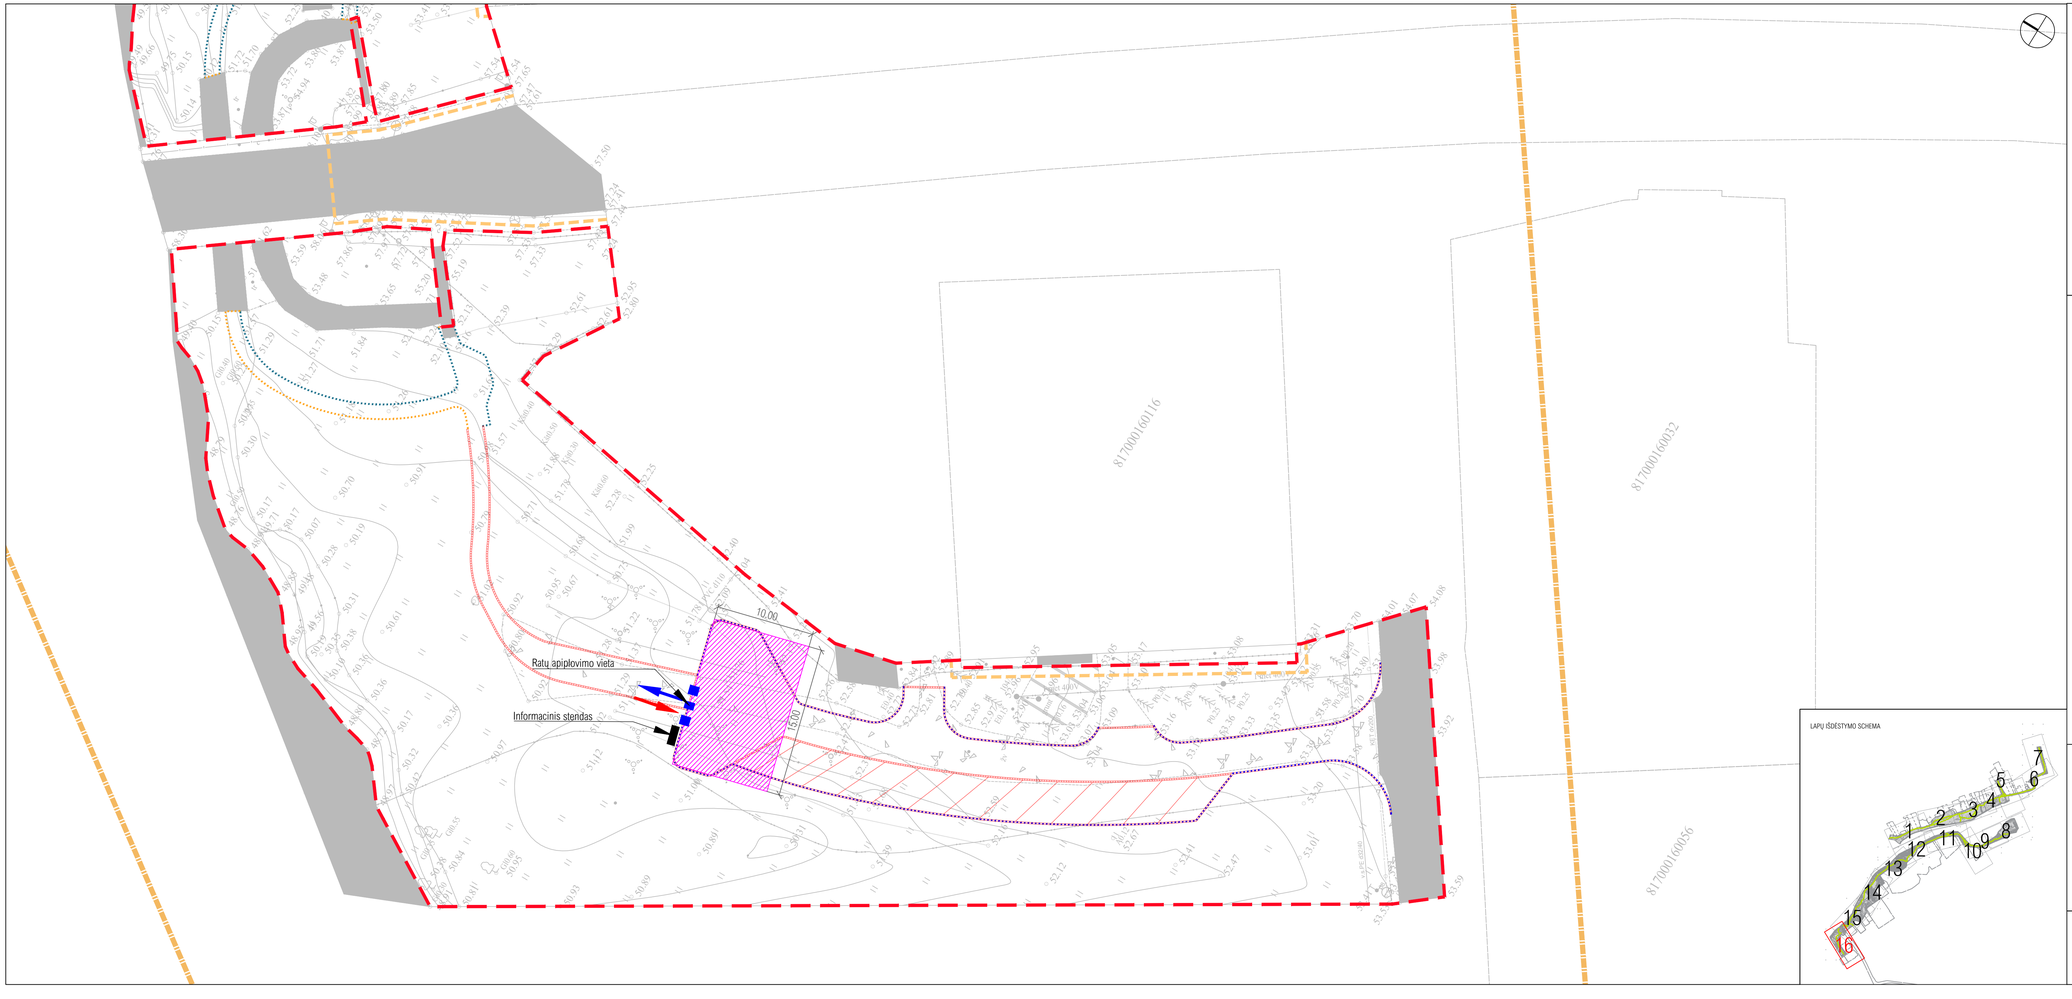

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
SKLYPIO APSAUGOS ZONA (1 M.)	PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
1 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
2 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
3 ETAPAS	PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
DANGŲ SUSKIRSTINIMO RIBA	

STATYBVIETĖS SCHEMA

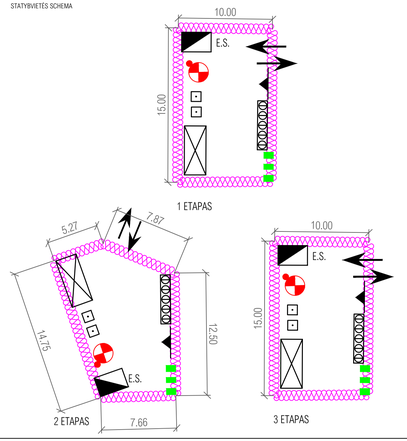

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATYBOS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS	PRIEŠGAISRINIS SKYDAS IR RŪKYMO VIETA
S RŪŠIUOJAMŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETA	BIOTUALETAS
LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS-RANGOVAMAS	AVARINIS IŠĖJIMAS
LAIKINOS ELEKTROS PASKIRSTYMO SPINTOS	INFORMACINIS STENDAS
LAIKINAS APŠVIETIMAS	RATŲ APIPLOVIMO VIETA
	IŠVAŽIAVIMAS IR ĮVAŽIAVIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Statybvietės schema M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-01	Lapas 16 / Lapų 16

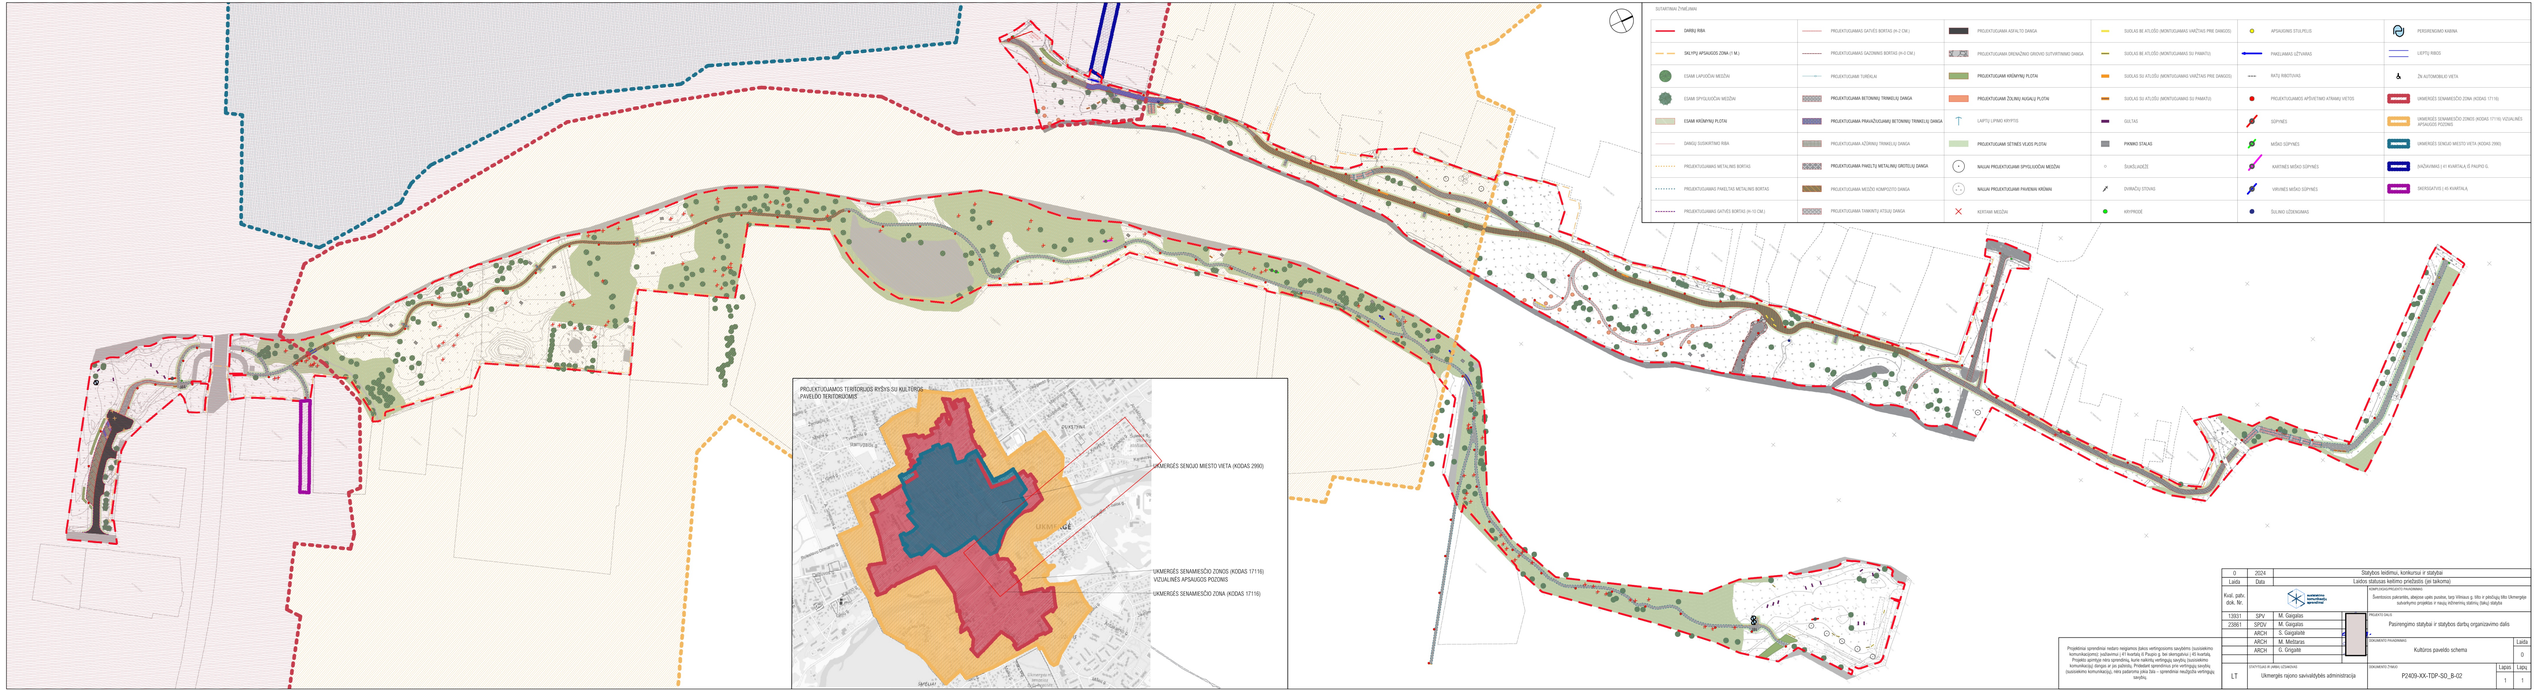

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.

13931	SPV	M. Gargalas
23951	SPDV	M. Gargalas
	ARCH	Š. Gargalaitė
	ARCH	M. Meilianas
	ARCH	G. Grigaitė

KOMPLEKSINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Šventosios pakrantės, ateityje uždr. pusiau, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje suvienijimo projektas ir naujų inžinerinių statinių, šalia(į) statybos

PROJEKTO DALIS
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Kultūros paveldo schema

Laida
0

STATYTOJAS IR JAME UŽSAKOVAS
LT Ukmergės rajono savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SO_B-02

Lapas	Lapų
1	1

Projektinių sprendinių nedaro reikšmingos įtakos veiklos/objekto savybėms (susiskaidymui, komunikacijoms); sudaromų ir/ ar kuriamų IV Pusynų g. bei skersgatvių ir VI kvartalų. Projekto apimtys nėra sprendimų, kurie nekelia reikšmingų savybių (susiskaidymo komunikacijų) dėmės ar jas padvejotų. Priskirtieji sprendimus prie veiklos/objekto savybių, (susiskaidymo komunikacijų), nėra padaromų įtaka žala – sprendimai neužgožia veiklos/objekto savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- ĮVAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲJŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKELIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠULINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (tiltų) statyba

13931	SPV	M. Gaigalas
23861	SPDV	M. Gaigalas
	ARCH	S. Gaigalaitė
	ARCH	M. Meštaras
	ARCH	G. Grigaitė

PROJEKTO DALIS
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Kultūros paveldo planas M 1:250

Laida 0

STATYTOJAS IR JAM ATSTOVAUJANTIS ASMUO
Ukmergės rajono savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
P2409-XX-TDP-SO_B-03

Lapas 1 | Lapų 16

LT

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

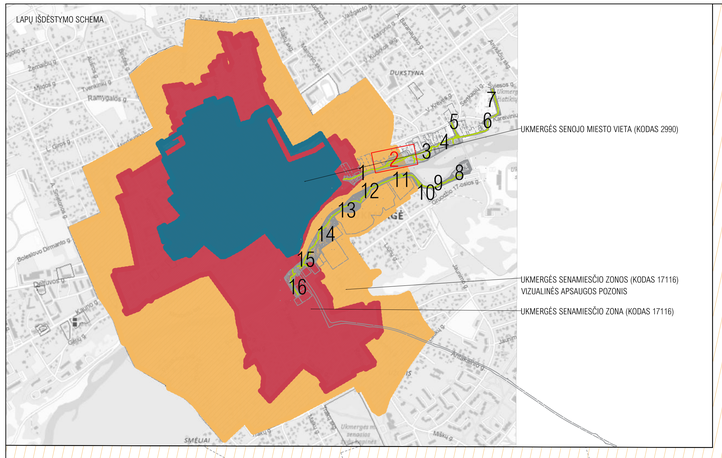

817000110223
817000110075
817000110190
817000110189
817000110184
817000110019
3.00
2.00
1.50
820.00

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠIUKLINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): (važiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvio į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 2 / Lapų 16

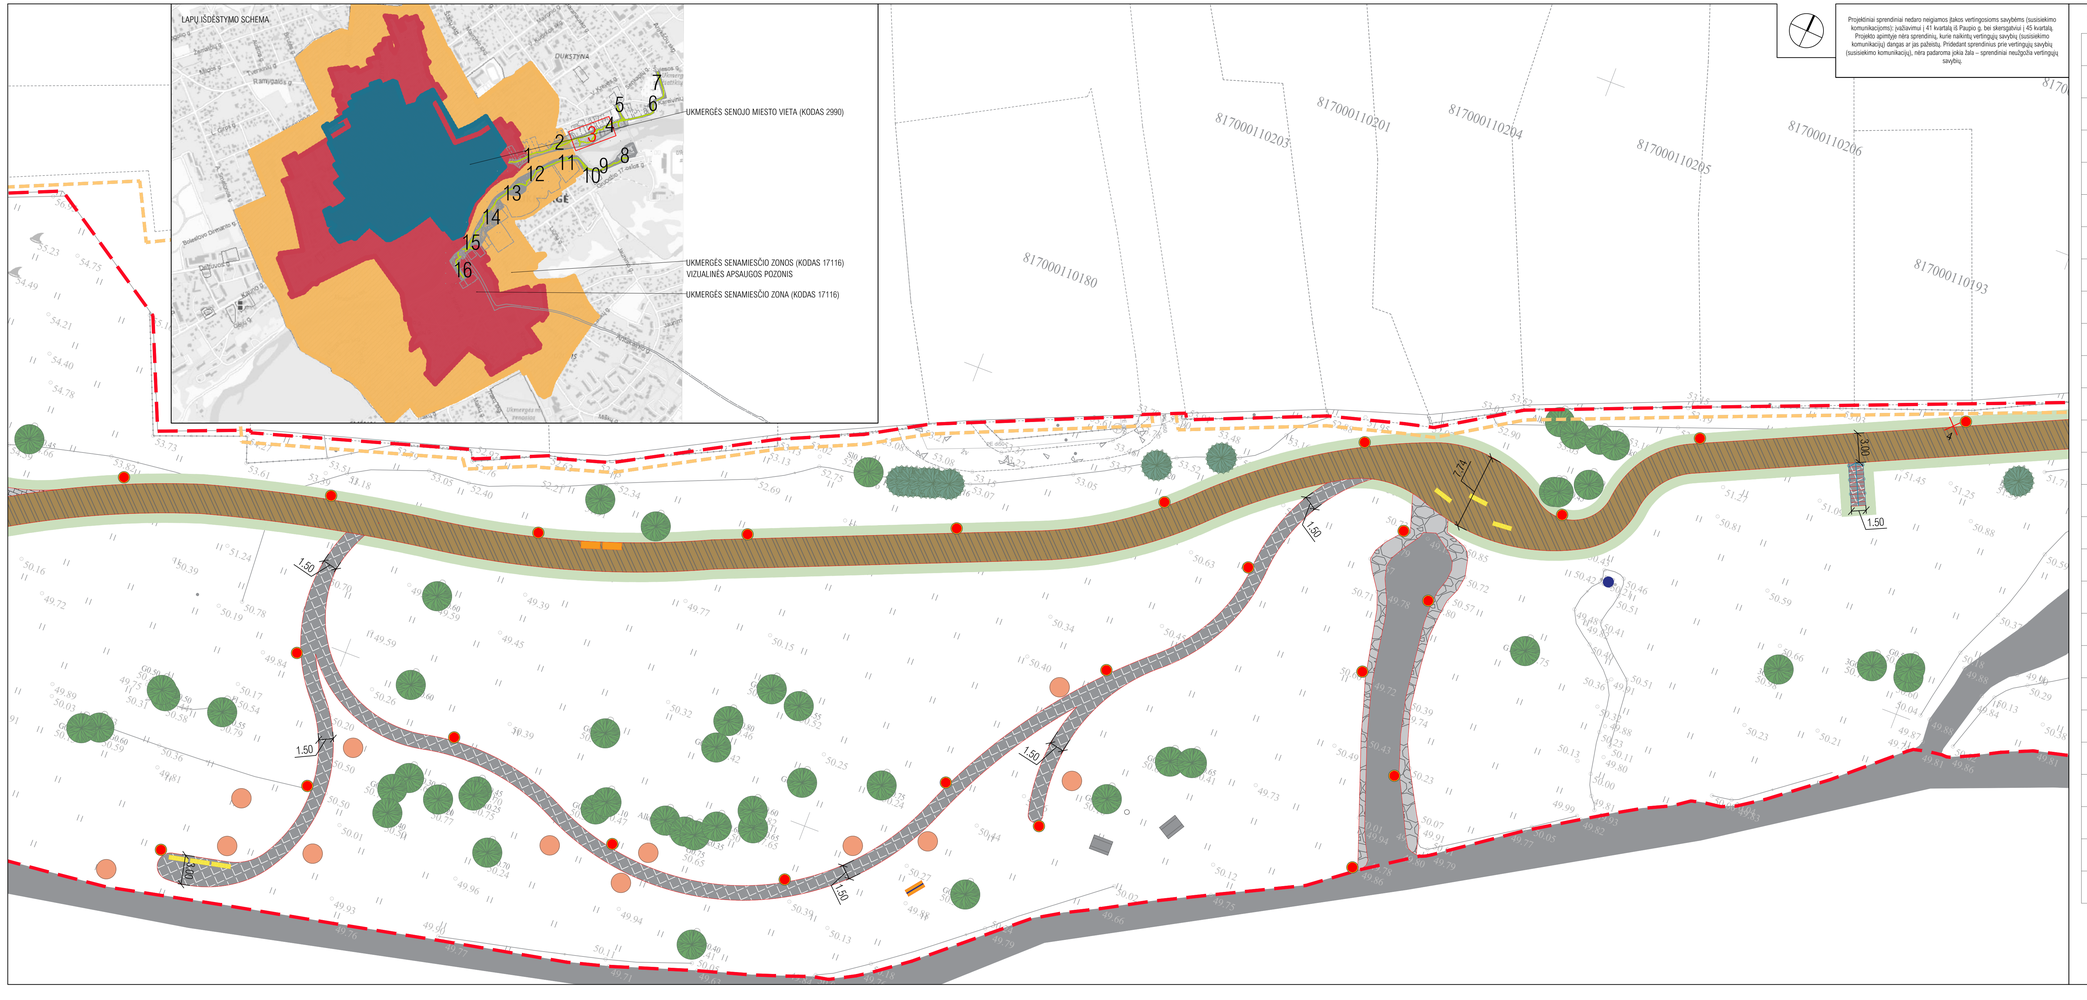

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto ajimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybų.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKĖLIMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠIUKLINIŲ UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 3 / Lapų 16

LAPU IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKELIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠIUKLINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250	0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas / Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	4 / 16

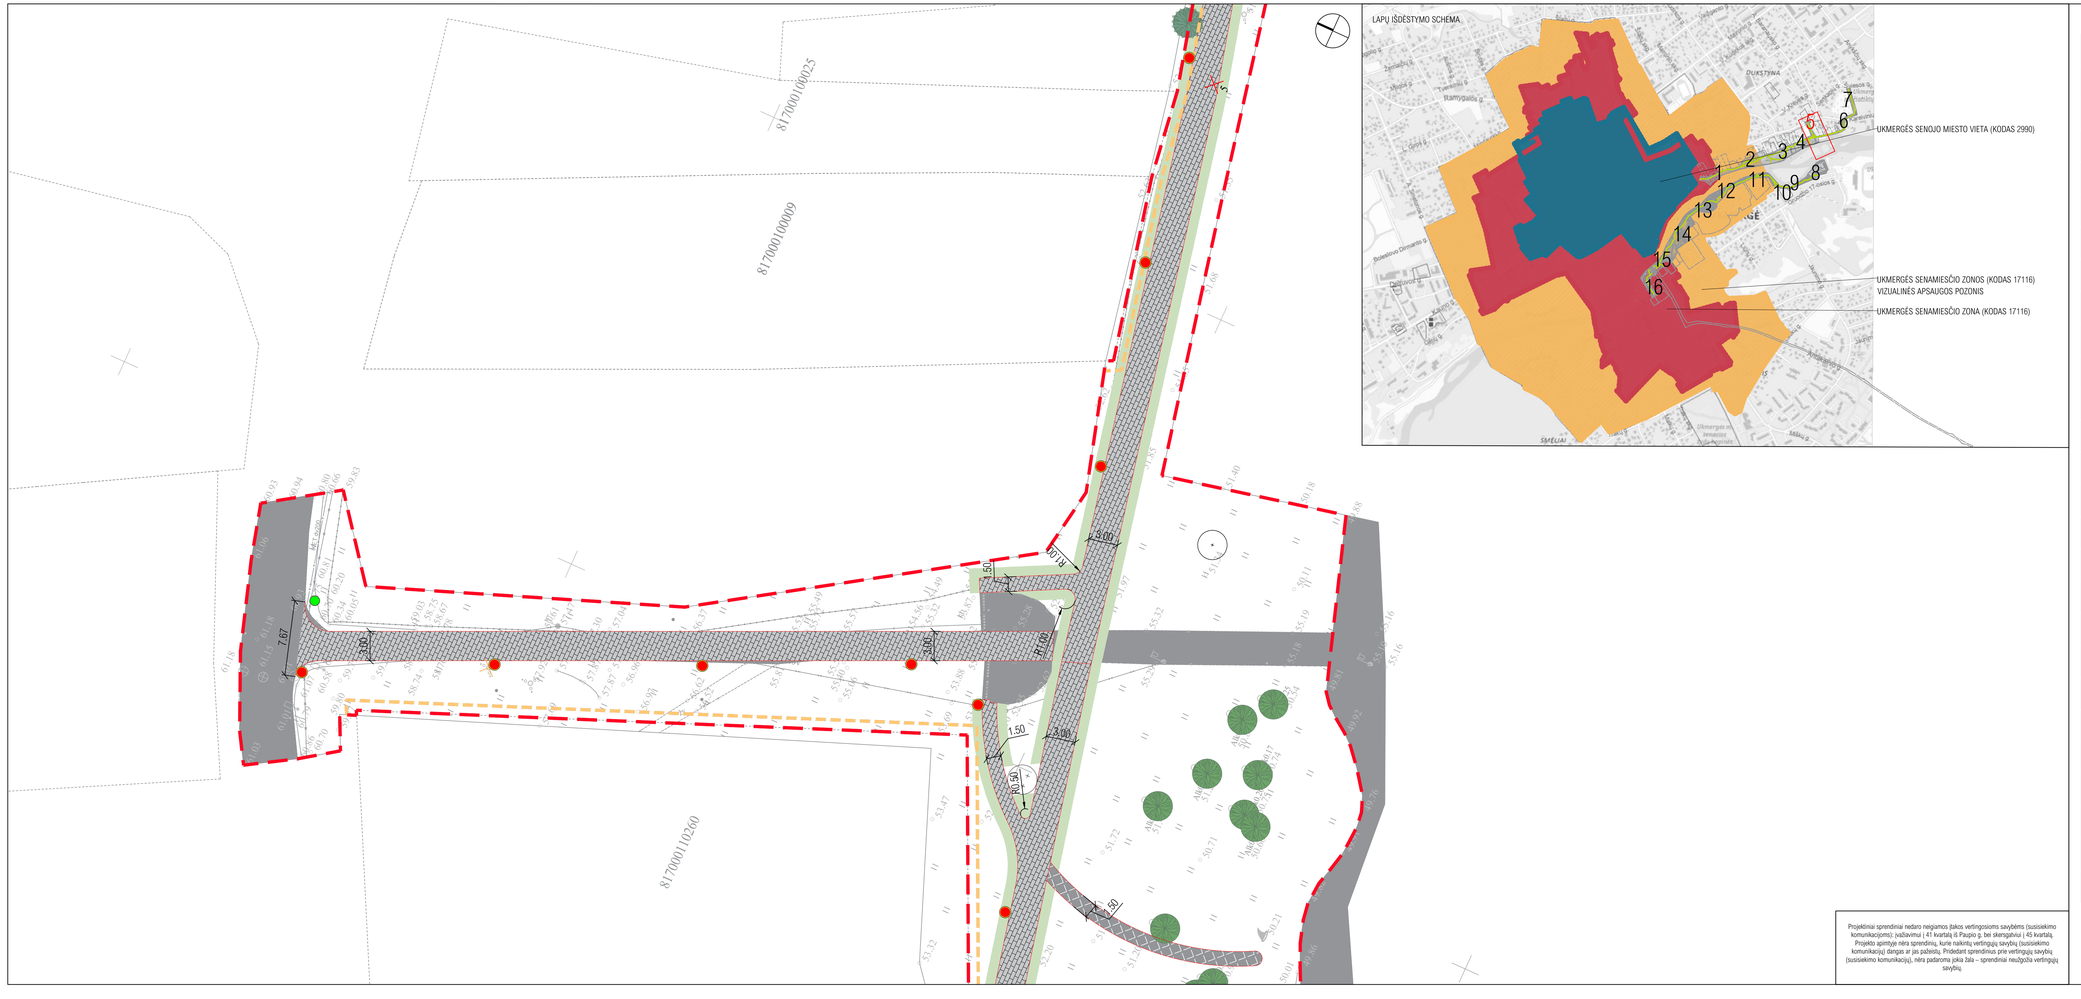

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲJ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožta vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	5	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	ĮVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 6 / Lapų 16

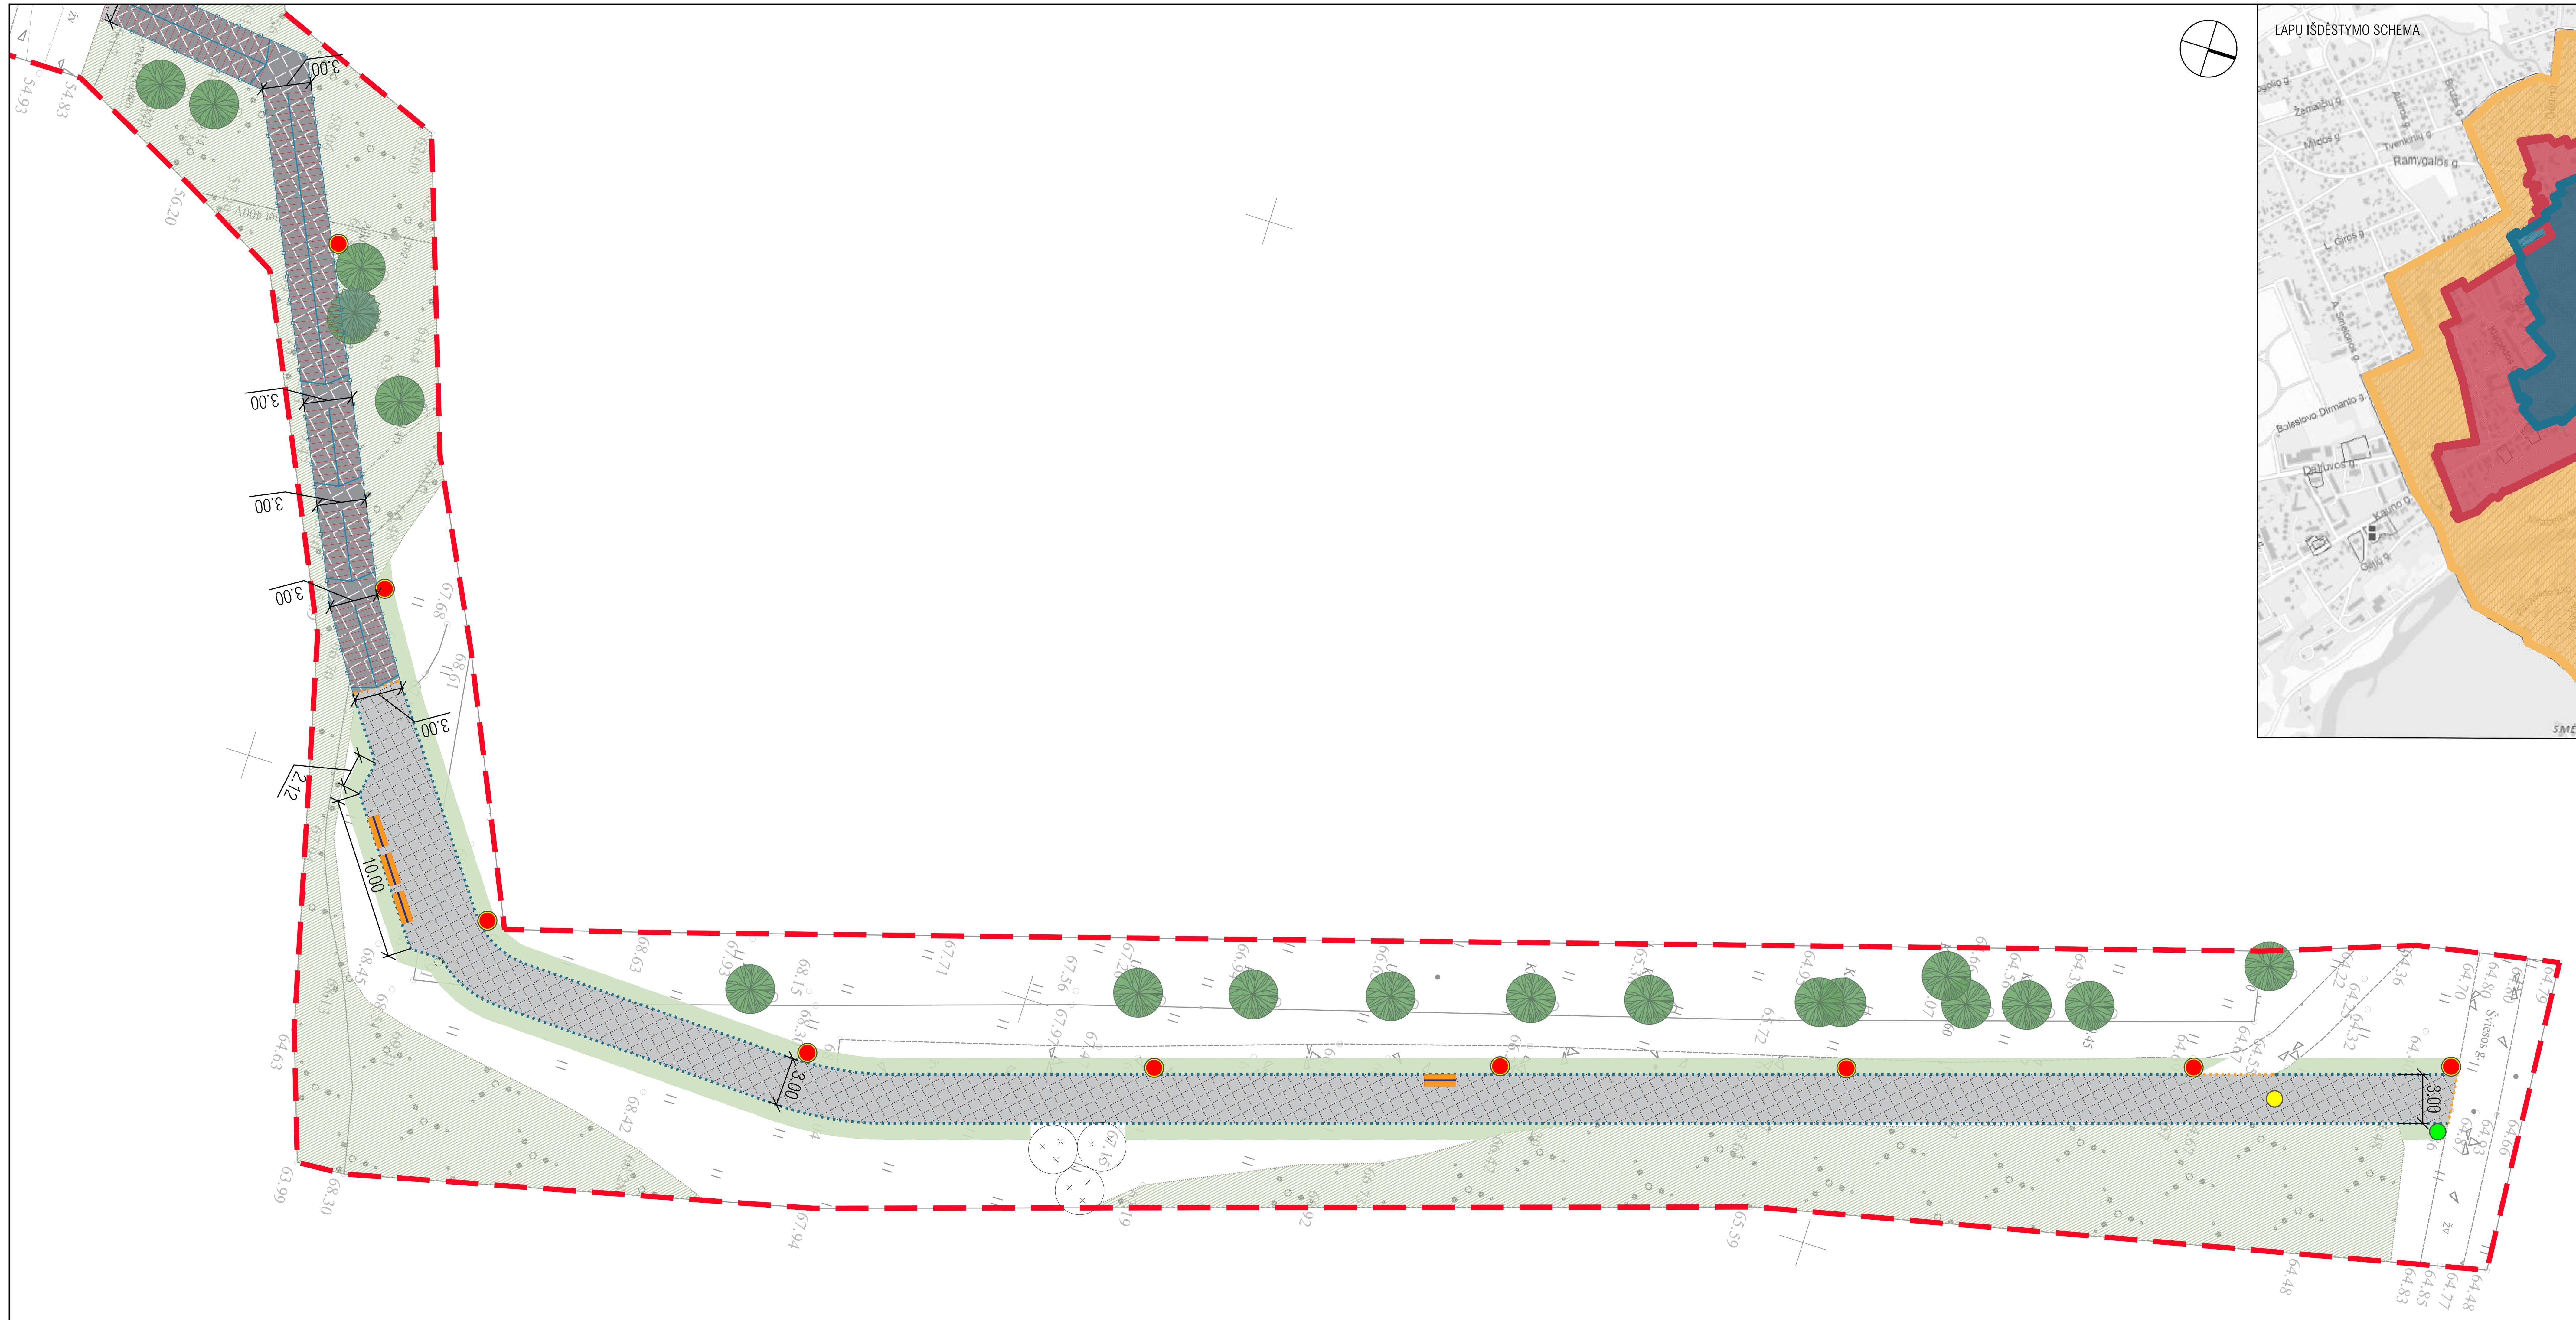

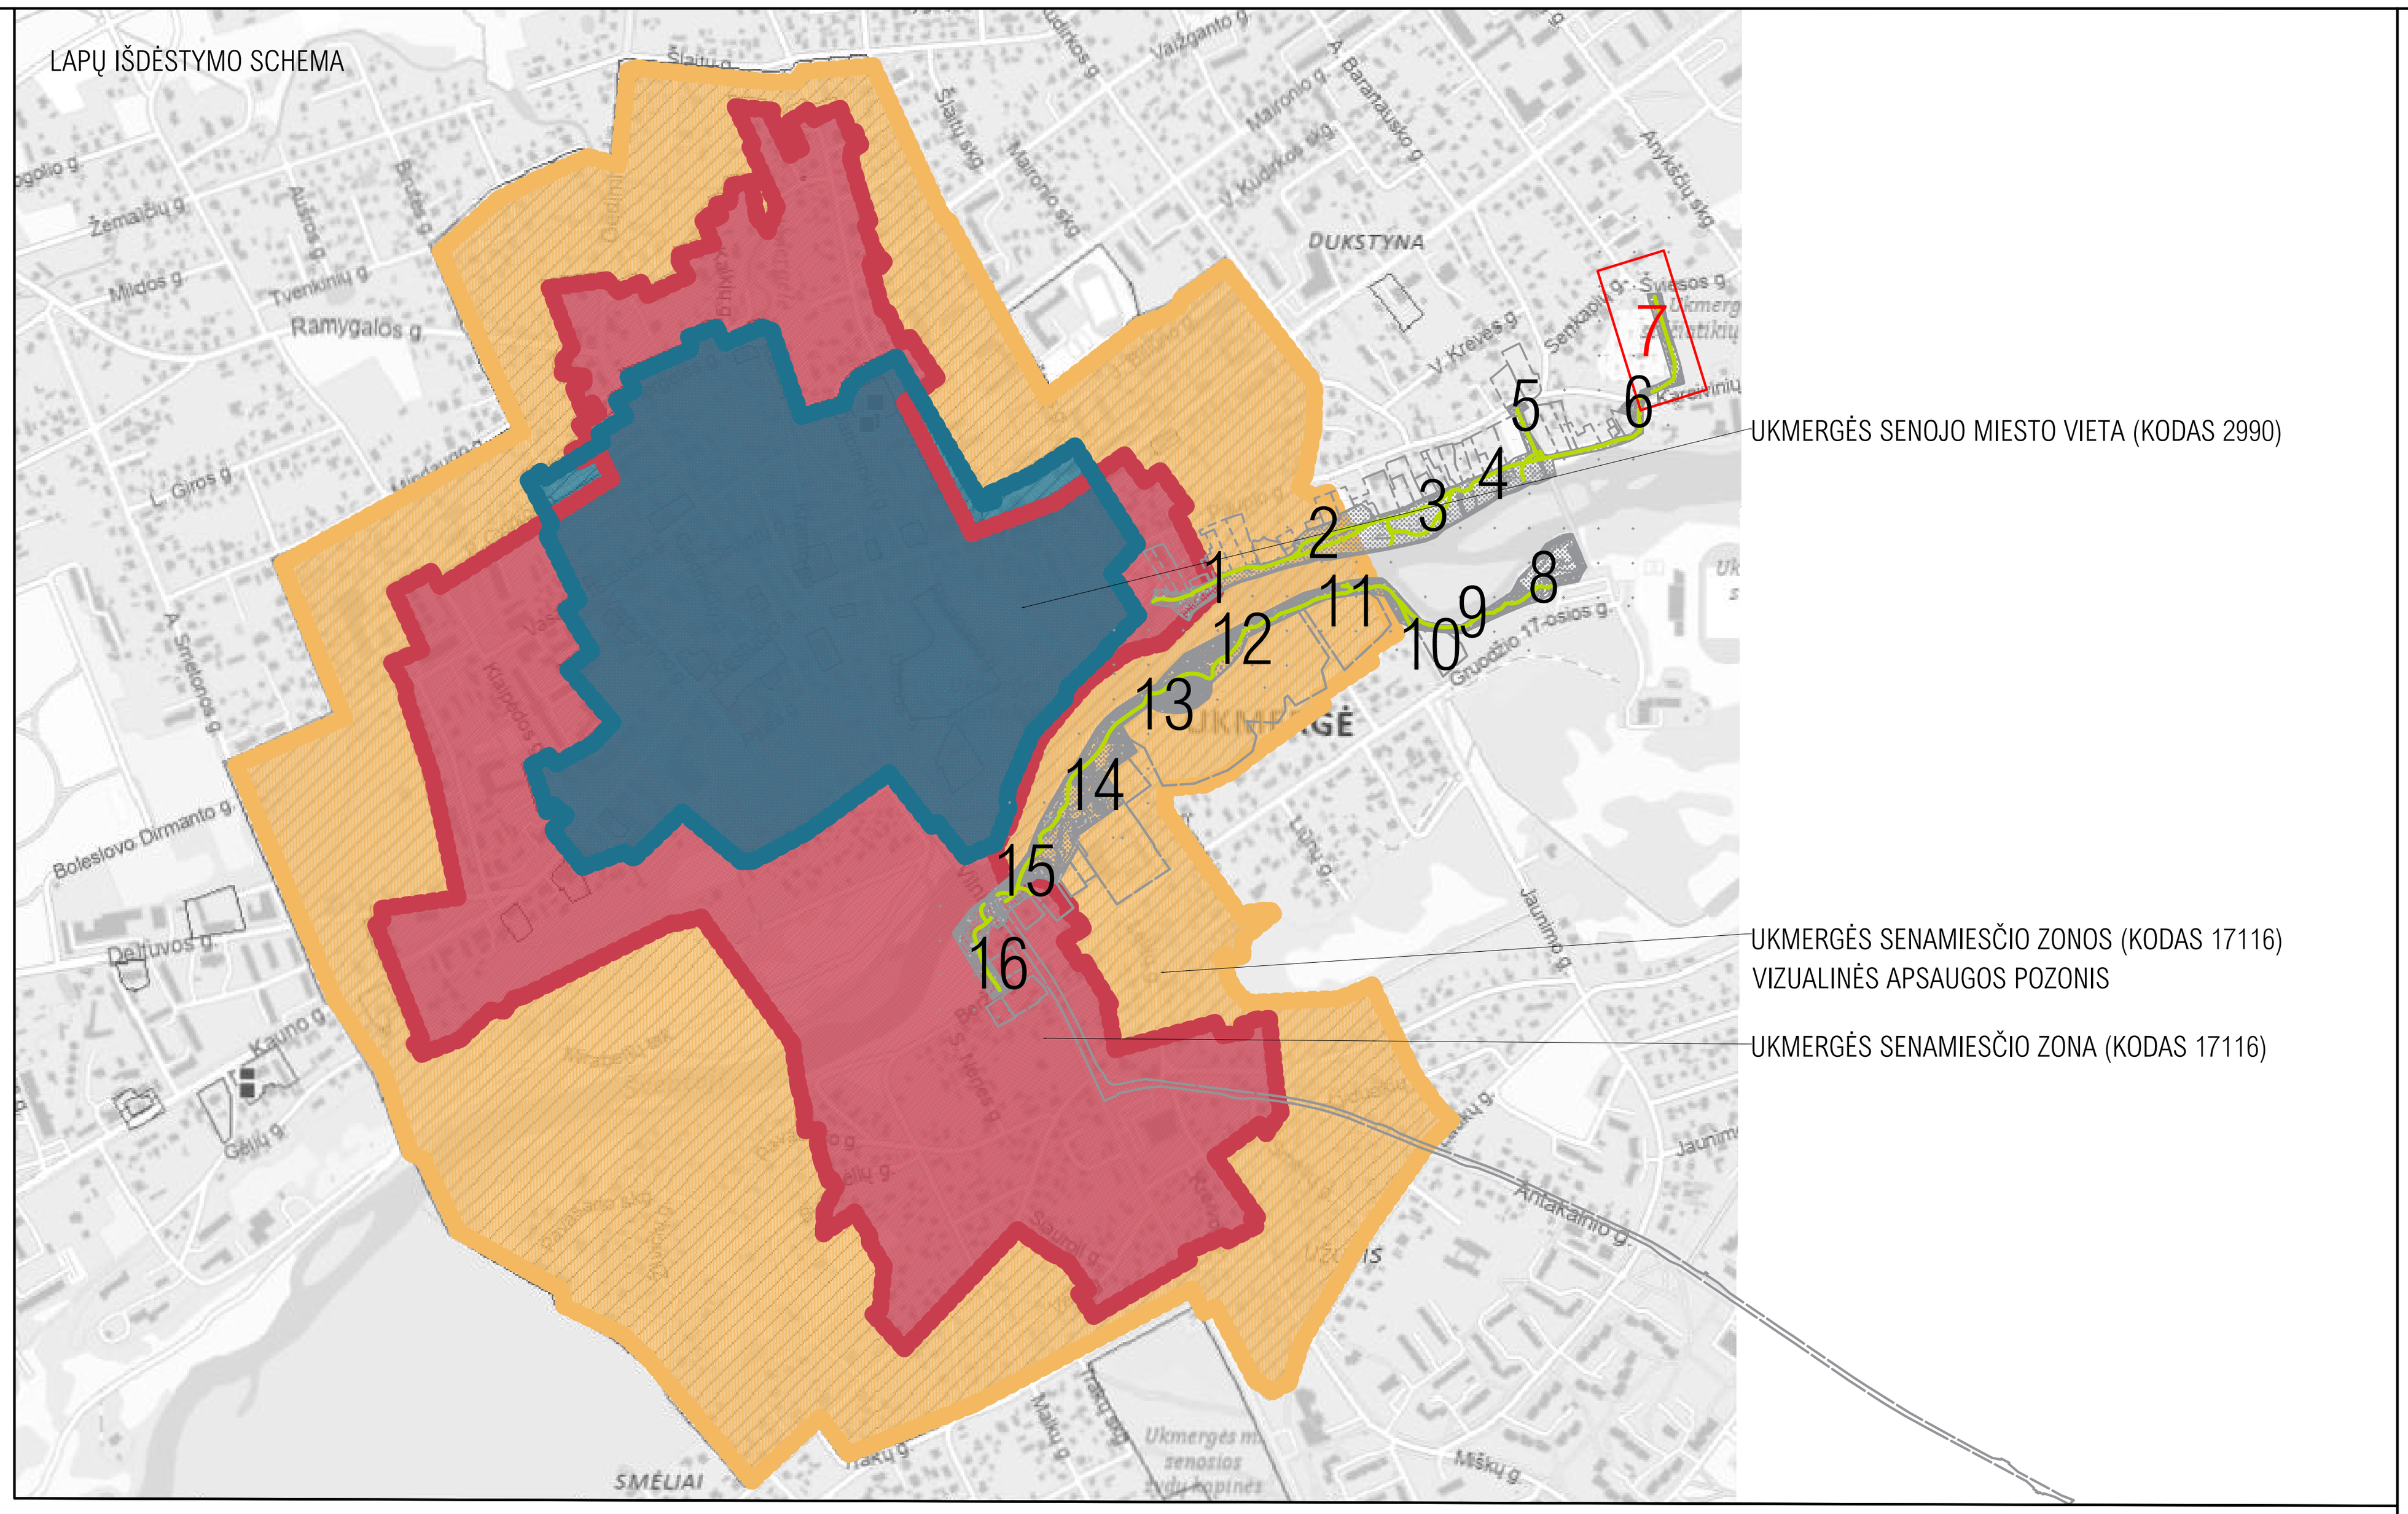

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GRIOVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	ĮVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	7	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

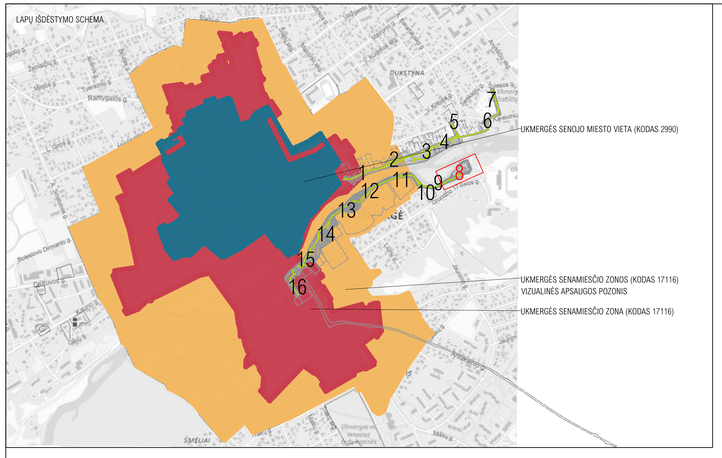

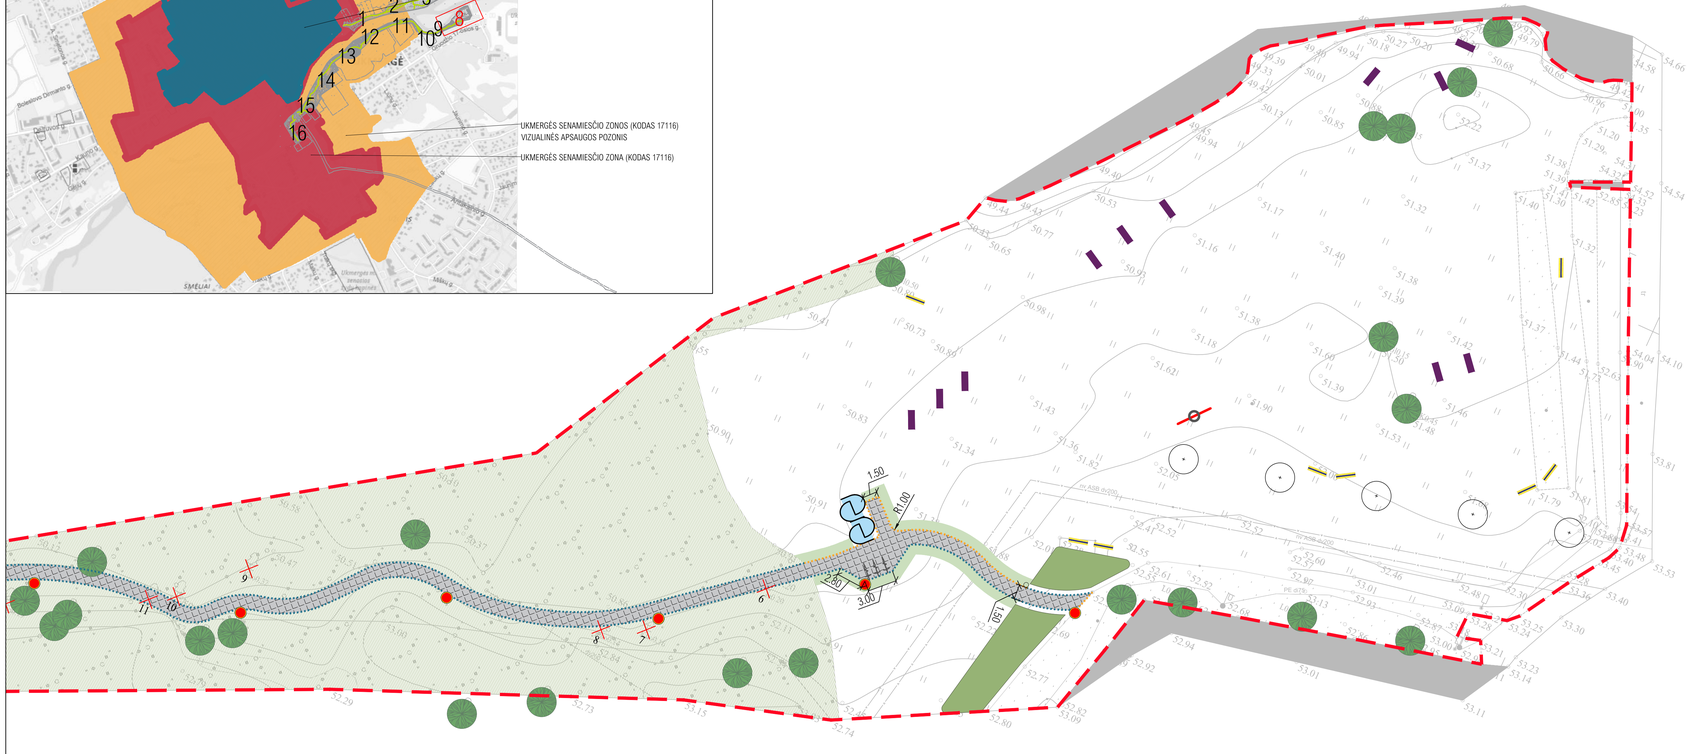

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatvių į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 8 / Lapų 16

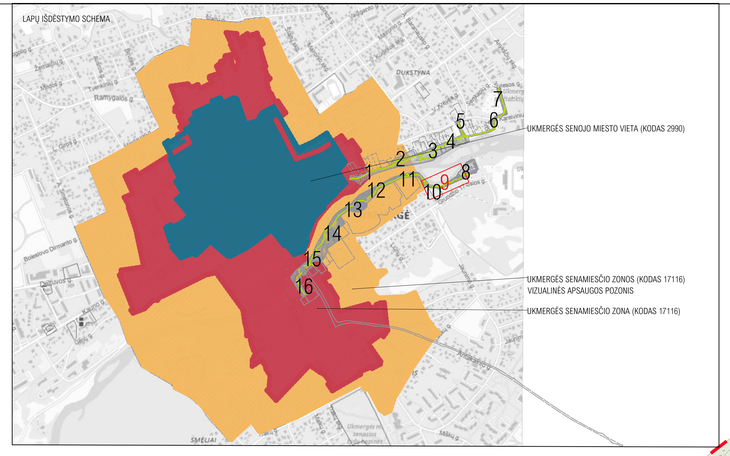

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲJ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	9	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

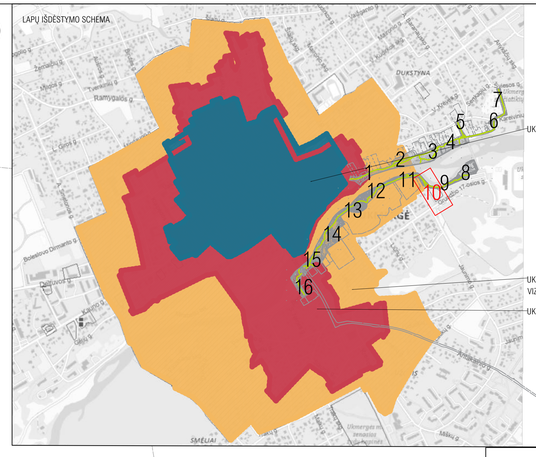

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms); įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Prisidenant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma įtaka žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- DARBŲ RIBA
- SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)
- ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI
- ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)
- PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)
- PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA
- PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA
- PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI
- PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI
- LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
- KERTAMI MEDŽIAI

- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
- SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
- GULTAS
- PIKNIKO STALAS
- ŠIUKŠLIADĖŽĖ
- DVIRAČIŲ STOVAS
- KRYPRODĖ
- APSAUGINIS STULPELIS
- PAKELIAMAS UŽTVARAS
- RATŲ RIBOTUVAS
- PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
- SŪPYNĖS
- MIŠKO SŪPYNĖS
- KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
- ŠULINIO UŽDENGIMAS
- PERSIRENGIMO KABINA
- LIEPTŲ RIBOS
- ŽN AUTOMOBILIO VIETA
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
- UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
- UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
- VAŽIAVIMAS | 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
- SKERSGATVIS | 45 KVARTALĄ

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250	0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas / Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	10 / 16

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybų (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pritaikant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

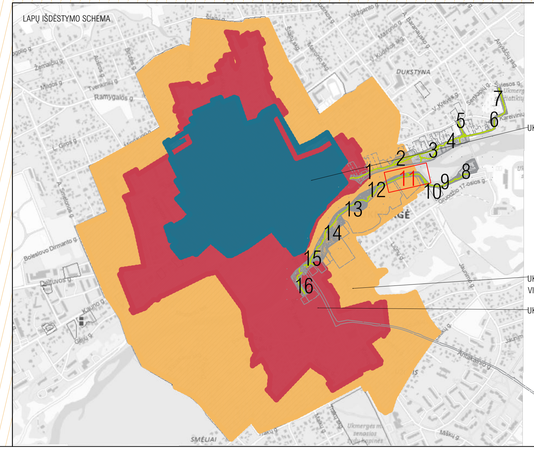

UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	11	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą.
Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neutralūs vertingųjų savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	KERTAMI MEDŽIAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	12	16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS	41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS	45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijomis: važiavimui | 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui | 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie nakotų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 13 / Lapų 16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	ĮVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	IVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

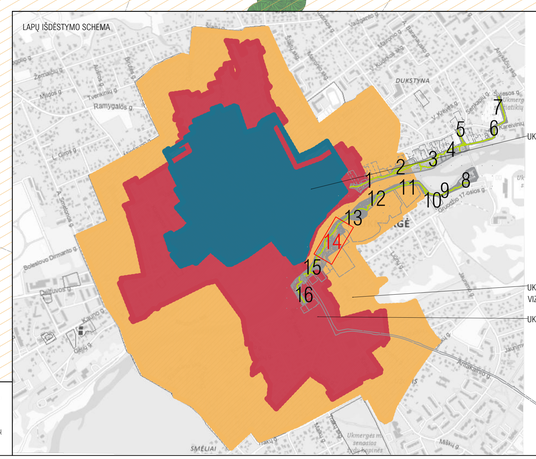

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto aprėpty nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neutrguoja vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Kultūros paveldo planas M 1:250	Laida 0
DOKUMENTO ŽYMUO	P2409-XX-TDP-SO_B-03	Lapas 14 / Lapų 16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPIŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKELIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI ŠĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	IVAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

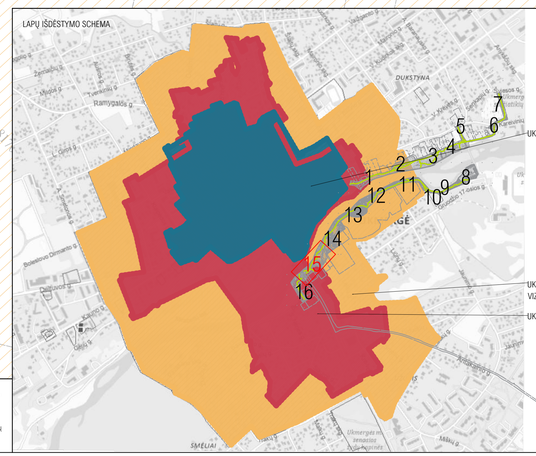

Projektiniai sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma jokia žala – sprendiniai neultgsba vertingųjų savybių.

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	15	16

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

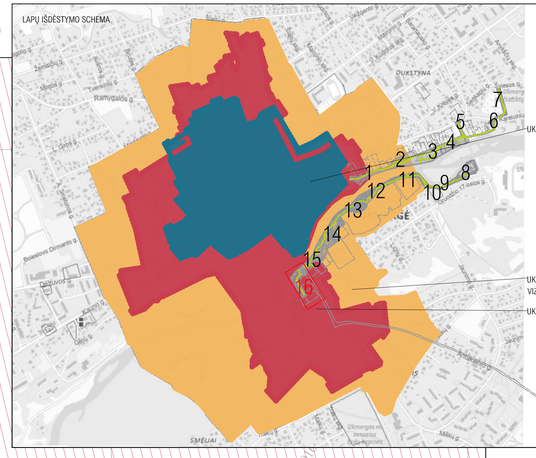

UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS

UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)

Projektiniais sprendiniai nedaro neigiamos įtakos vertingosioms savybėms (susisiekimo komunikacijoms): įvažiavimui į 41 kvartalą iš Paupio g. bei skersgatviui į 45 kvartalą. Projekto apimtyje nėra sprendinių, kurie naikintų vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų) dangas ar jas pažeistų. Pridedant sprendinius prie vertingųjų savybių (susisiekimo komunikacijų), nėra padaroma įtaka žala – sprendiniai neužgožia vertingųjų savybių.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ RIBA	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
SKLYPŲ APSAUGOS ZONA (1 M.)	SUOLAS BE ATLOŠO (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI LAPUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS VARŽTAIS PRIE DANGOS)
ESAMI SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI	SUOLAS SU ATLOŠU (MONTUOJAMAS SU PAMATU)
ESAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	GULTAS
DANGŲ SUSIKIRTIMO RIBA	PIKNIKO STALAS
PROJEKTUOJAMAS METALINIS BORTAS	ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS PAKELTAS METALINIS BORTAS	DVIRAČIŲ STOVAS
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-10 CM.)	KRYPRODĖ
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS BORTAS (H-2 CM.)	APSAUGINIS STULPELIS
PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-0 CM.)	PAKĖLIAMAS UŽTVARAS
PROJEKTUOJAMI TURĖKLAI	RATŲ RIBOTUVAS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMŲ VIETOS
PROJEKTUOJAMA PRAVAŽIUOJAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGA	MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA PAKELTŲ METALINIŲ GROTELIŲ DANGA	KARTINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA MEDŽIO KOMPOZITO DANGA	VIRVINĖS MIŠKO SŪPYNĖS
PROJEKTUOJAMA TANKINTŲ ATSIJŲ DANGA	ŠULINIO UŽDENGIMAS
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA	PERSIRENGIMO KABINA
PROJEKTUOJAMA DRENAŽINIO GROVIO SUTVIRTINIMO DANGA	LIEPTŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMI KRŪMYNŲ PLOTAI	ŽN AUTOMOBILIO VIETA
PROJEKTUOJAMI ŽOLINIŲ AUGALŲ PLOTAI	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONA (KODAS 17116)
LAIPTŲ LIPIMO KRYPTIS	UKMERGĖS SENAMIESČIO ZONOS (KODAS 17116) VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIS
PROJEKTUOJAMI SĖTINĖS VEJOS PLOTAI	UKMERGĖS SENOJO MIESTO VIETA (KODAS 2990)
NAUJAI PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI	VAŽIAVIMAS Į 41 KVARTALĄ IŠ PAUPIO G.
NAUJAI PROJEKTUOJAMI PAVIENIAI KRŪMAI	SKERSGATVIS Į 45 KVARTALĄ
KERTAMI MEDŽIAI	

DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Kultūros paveldo planas M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
P2409-XX-TDP-SO_B-03	16	16
