

**SUSITARIMAS DĖL 2022 M. SPALIO 4 D. PROJEKTO „KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ
SEN. GIRAITĖS K. KAŠTONŲ G. KAPITALINIO REMONTO“ RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. S-1250 DARBŲ SUSTABDYMO**

2023 m. *lapkričio 6* d. Nr. S-*1396*
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Kauno keliai“, įm. k. 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama įmonės generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, sudaro susitarimą dėl 2022 m. spalio 4 d. projekto „Kauno r. sav. Užliedžių sen., Giraitės k., Kaštonų g. kapitalinio remonto“ rangos darbų sutarties Nr. S-1250 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties bendrosios dalies (Sutarties BD) 6.6.2 papunkčiu, atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. lapkričio 15 d. rašte Nr. 338-04 (Reg. Nr. GD-10446) „Dėl sutarties nuotekų šalinimo dalies darbų“ ir 2022 m. gruodžio 16 d. MB „DPKTP“ rašte Nr. 55 (Reg. Nr. GD-11663) nurodytas aplinkybes, sustabdo darbų vykdymą, dėl papildomos projektavimo paslaugos, be kurios negalima įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Darbų vykdymą sustabdyti iki papildomų projektinių sprendinių pateikimo, o juos atlikus, Sutarties šalys pasirašys susitarimą dėl Darbų atnaujinimo.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

4. Susitarimo priedai:

1. Priedas Nr. 1. Rangovo raštas, 2 lapas.

2. Priedas Nr. 2. MB „DPKTP“ raštas, 3 lapai.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

A. s. LT914010042503135057

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel.: 8 37 30 55 02

El. p. info@krs.lt

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135640993

PVM mokėtojo kodas LT356409917

A.s. LT517044060003897125

Tel. 8 614 921 58

El. p. info@kaunokeliai.lt

Bankas AB SEB Bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Ramūnas Šilinis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
 Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2022-11-15 Nr. 338-04

Kauno rajono savivaldybės administracijai
info@krs.lt

DĖL SUTARTIES NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES DARBŲ

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2022 metų rugsėjo mėnesio 26 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-378. Sutartyje Rangovas pagal Užsakovo pateiktą „**Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas**“ techninį darbo projektą (toliau – Projektas) įsipareigoja atlikti Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinio remonto, apšvietimo, lietaus ir nuotekų inžinerinių tinklų įrengimo darbus, bei parengti atliktų darbų kontrolines geodezines nuotraukas, statinių kadastrinių matavimų bylas ir kitą dokumentaciją, kuri turi būti parengta statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti. Sutarties vertė 825.745,87 Eur be PVM.

Projekto nuotekų šalinimo dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad visas gatvės surinktas paviršinis vanduo nuvedamas į Topolių ir Žaliąją gatves, į projektuojamus šulinius L1Š-38 ir L1Š-25. Didžioji dalis surenkamo nuotekų srauto nukreipiamos į Kaštonų ir Žaliosios gatvės sankryžoje projektuojamą šulinį L1Š-25, iš kur nuotekos kito projekto etapu nukreipiamos iki Žaliosios g. esančių melioracijos tinklų. Likusi lietaus nuotekų tinklu surenkama nuotekų dalis nukreipiama į Topolių gatvės projektuojamą šulinį L1Š-38 kur kito projekto etapu bus pratęsti iki melioracijos tinklų.

Informuojame Užsakovą, kad šiai dienai vis dar nėra įrengtų pasijungimo tinklų, Rangovas negali pradėti vykdyti darbų, kadangi klojant trasas bus užtvindytos klojamos lietaus nuotekų linijos, tranšėjos, nebus galimybės pajungti projektuojamų pokonstrukcinio drenažo tinklų, kadangi bus užsemta ir įmirkyta žemės sankasa.

Kadangi šiai dienai vis dar nėra pakloti pasijungimo tinklai, siūlome nuo šulinio L1Š-1 iki L1Š-25 kloti projekte nurodytais sprendiniais (tik ties šuliniu L1Š-25 suvienodinti projektuojamų vamzdžių aukščius). Ties projektuojamą šuliniu L1Š-25 įrengti siurblinę. Nuo siurblinės nukreipti visą vandenį link Topolių g. šulinio Nr. L1Š-38 (taip sujungiant ir atkarpą tarp šulinių L1Š-31 ir L1Š-30). Tarp šulinių L1Š-25 ir L1Š-30 gautųsi atvirkštinis nuolydis, tačiau siurblinė spaudiminiu būdu išstumtų vandenį.



1 lapas/lapų 2




UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Vadovaujantis tuo kas pateikta aukščiau, bei Sutarties sąlygomis, prašome Užsakovo nurodyti kaip atlikti darbus, pateikti naujus patvirtintus sprendinius pagal kuriuos būtų galimybė įgyvendinti projektą laiku ir tinkamai, kad būtų išpildyti projekte numatomi tikslai. Taip pat informuojame, kad remiantis sutarties sąlygų 6.6. punktu prašysime, kad būtų stabdomi darbai iki tol, kol bus gauti sprendiniai kaip toliau vykdyti darbus.

Rangovo atstovas

Statinio statybos vadovas

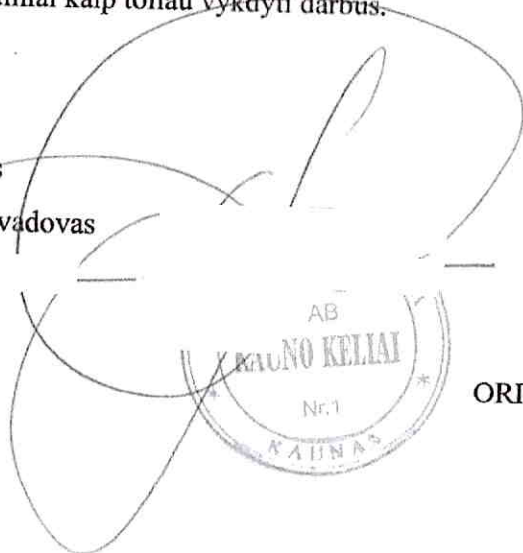

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



MB "DPKTP"

Įmonės kodas 305562793

Statybininkų g. 2A, Garliava, LT-53262 Kauno r. tel. +37062090505

A.s. Nr. LT72723000000603321 UAB Medicinos bankas

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriui
Savanorių per. 371, Kaunas
El. p. info@krs.lt

2022-12-16 Nr. 55

Kopija:
UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
El. p. info@kaunokeliai.lt

DĖL NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES DARBŲ

MB "DPKTP" veikia pagal 2022 m. spalio 4 d. pasirašytą sutartį Nr. UŽVPS-30 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir MB „DPKTP“ dėl objekto **„Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, Giraitės k., Kaštonų g. kapitalinio remonto darbai“** techninės priežiūros paslaugų.

Rangovas UAB „Kauno keliai“ 2022-11-15 raštu Nr. 338-04 informavo, kad vis dar nėra įrengti L1Š-38 ir L1Š-25 pasijungimo šuliniai kurie turėjo būti įrengti kitu projektu. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta minėtame UAB „Kauno keliai“ rašte, neprieštarauju, kad darbai būtų stabdomi iki bus pateikti tinkami sprendiniai darbų vykdymui.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo UAB „Kauno keliai“ 2021-11-15 raštas Nr. 338-04, – 2 lapai.

Techninės priežiūros inžinierius _____

Originalas siunčiamas nebus



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 – 37) 452389, faksas (8 – 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2022-11-15 Nr. 338-04

Kauno rajono savivaldybės administracijai
info@krs.lt

DĖL SUTARTIES NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES DARBŲ

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2022 metų rugsėjo mėnesio 26 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-378. Sutartyje Rangovas pagal Užsakovo pateiktą „**Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas**“ techninį darbo projektą (toliau – Projektas) įsipareigoja atlikti Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinio remonto, apšvietimo, lietaus ir nuotekų inžinerinių tinklų įrengimo darbus, bei parengti atliktų darbų kontrolines geodezines nuotraukas, statinių kadastrinių matavimų bylas ir kitą dokumentaciją, kuri turi būti parengta statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti. Sutarties vertė 825.745,87 Eur be PVM.

Projekto nuotekų šalinimo dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad visas gatvės surinktas paviršinis vanduo nuvedamas į Topolių ir Žaliąją gatves, į projektuojamus šulinius L1Š-38 ir L1Š-25. Didžioji dalis surenkamo nuotekų srauto nukreipiamos į Kaštonų ir Žaliosios gatvės sankryžoje projektuojamą šulinį L1Š-25, iš kur nuotekos kito projekto etapu nukreipiamos iki Žaliosios g. esančių melioracijos tinklų. Likusi lietaus nuotekų tinklu surenkama nuotekų dalis nukreipiama į Topolių gatvės projektuojamą šulinį L1Š-38 kur kito projekto etapu bus pratęsti iki melioracijos tinklų.

Informuojame Užsakovą, kad šiai dienai vis dar nėra įrengtų pasijungimo tinklų, Rangovas negali pradėti vykdyti darbų, kadangi klojant trasas bus užtvindytos klojamos lietaus nuotekų linijos, tranšėjos, nebus galimybės pajungti projektuojamų pokonstrukcinio drenažo tinklų, kadangi bus užsemta ir įmirkyta žemės sankasa.

Kadangi šiai dienai vis dar nėra pakloti pasijungimo tinklai, siūlome nuo šulinio L1Š-1 iki L1Š-25 kloti projekte nurodytais sprendiniais (tik ties šuliniu L1Š-25 suvienodinti projektuojamų vamzdžių aukščius). Ties projektuojamu šuliniu L1Š-25 įrengti siurblinę. Nuo siurblinės nukreipti visą vandenį link Topolių g. šulinio Nr. L1Š-38 (taip sujungiant ir atkarpą tarp šulinių L1Š-31 ir L1Š-30). Tarp šulinių L1Š-25 ir L1Š-30 gautųsi atvirkštinis nuolydis, tačiau siurblinė spaudiminiu būdu išstumtų vandenį.



www.kaunokeliai.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėskienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT355409917

Vadovaujantis tuo kas pateikta aukščiau, bei Sutarties sąlygomis, prašome Užsakovo nurodyti kaip atlikti darbus, pateikti naujus patvirtintus sprendinius pagal kuriuos būtų galimybė įgyvendinti projektą laiku ir tinkamai, kad būtų išpildyti projekte numatomi tikslai. Taip pat informuojame, kad remiantis sutarties sąlygų 6.6. punktu prašysime, kad būtų stabdomi darbai iki tol, kol bus gauti sprendiniai kaip toliau vykdyti darbus.

Rangovo atstovas

Statinio statybos vadovas



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



www.kaunokeliai.lt

