

Pasiūlymas

TS-LKD internetinio balsavimo įrankio sukūrimas

Vilnius, 2020 m. balandžio 30 d.

Paruošė: Gabriele Sinkevičiūtė, gabriele@gpyr.lt


Tikslas

Projekto tikslas – internetinio balsavimo įrankio sukūrimas, programavimas ir palaikymas. Internetinio balsavimo įrankis – tai aiškos struktūros ir švaraus dizaino, saugus, skaidrus, patogus ir pagal atnaujintą stilių sukurtas sprendimas. Jis turi atitikti visus reikalavimus, keliamus asmens duomenų saugumui, užtikrinti skaidrų balsavimą, būti maksimaliai saugus.

Preliminari balsavimo įrankio logika

1. Kandidatų informacijos paruošimas
2. Balsavimo informacijos paruošimas
3. Informacinė svetainė
4. Administravimas
5. Rinkimai (administratorius)
 - 5.1. Rinkimų paleidimas
 - 5.2. Monitorinimas
 - 5.3. Rinkimų uždarymas
6. Rinkimai (vartotojas)
 - 6.1. Balsavimo nuorodos gavimas
 - 6.2. Prisijungimas
 - 6.3. Balsavimas
7. DDoS atakos valdymo planas
8. Duomenų eksportavimas
9. Duomenų backup
10. Rinkimų rezultatai svetainėje

Internetinio balsavimo įrankio darbų etapai

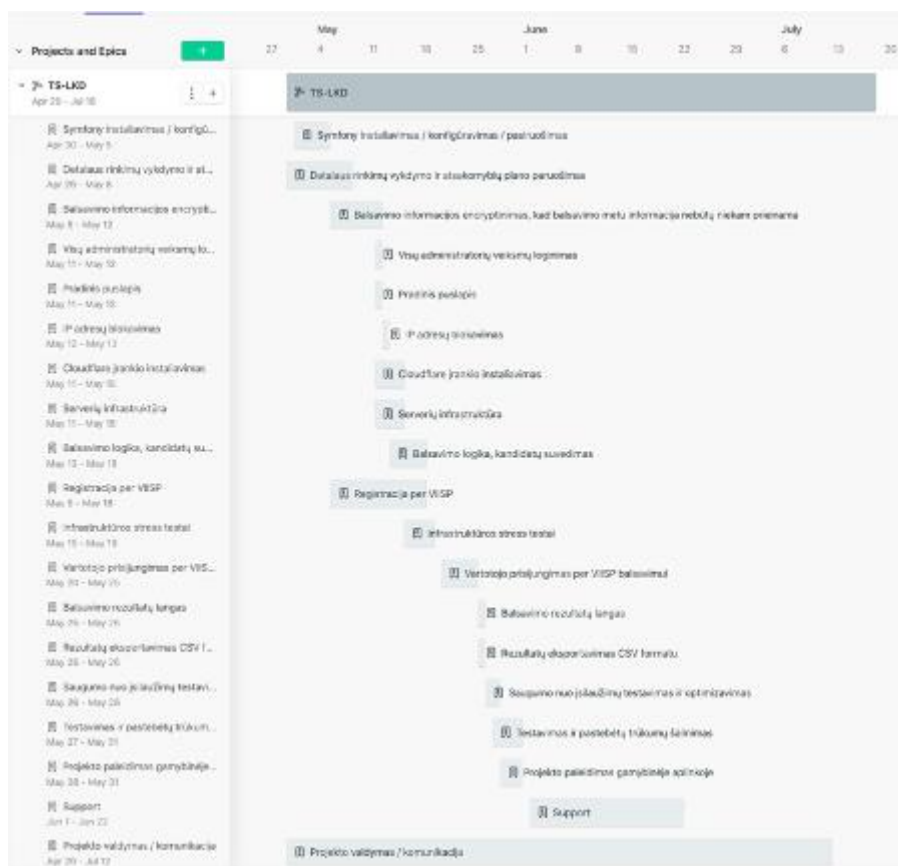

MB „Puikūs metai“

Juridinio asmens kodas: 30521647

PVM kodas: LT100012595511

Adresas: Didžioji 6-3, Vilnius

Internetinio balsavimo įrankio darbų kaina

Sritis	Darbai	Vnt.	Val.	€9 780	Įkainis: €40
Dizainas	Balsavimo svetainės dizaino sukūrimas (su <i>responsive</i>)	1	16	€640	
Front-end	Html+css programavimo darbai	1	24	€960	
E-mail	El. laiško dizainas ir programavimas (informaciniai laiškai su sėkmės / klaidos pranešimais)	1	2	€80	
Tekstai	El.laiško, front-end tekstai	1	4	€160	
Pasiruošimas	Symfony instaliavimas / konfigūravimas / pasiruošimas	1	10	€400	
Homepage	Pradinis puslapis	1	4	€160	
Balsavimas	Vartotojų prisijungimas per VIISP balsavimui, asmens kodo verifikavimas su duota kodų DB.	1	80	€3 200	
Balsavimas	Logika: balsavimas sutartą dieną nuo x iki y laiko, sesijos laiko ribojimas, kandidatų suvedimas.	1	10	€400	
Balsavimas	Rezultatų eksportavimas CSV form. x dieną ir laiku	1	6	€240	
Balsavimas	Rezultatų langas po balsavimo pasibaigimo	1	6	€240	
Testavimas	Testavimas (back-end ir front-end)	1	22	€880	
PM	Projekto valdymas / komunikacija	1	16	€640	
PM	Rinkimų vykdymo ir atsakomybių plano paruošimas	1	32	€1 280	
Papildomi kaštai	Serverio palaikymo, VIISP, Cloudfare, domeno įsigijimo ir palaikymo kaštai*	0	0	€0,00	
Papildomi kaštai	Nenumatytų pakeitimų biudžetas**	1	12,5	€500	

*Į šių sąmatą neįtraukti serverio palaikymo, VIISP, Cloudfare, domeno įsigijimo ir palaikymo kaštai

** Užsakovas el. paštu turi leisti pradėti naudoti Nenumatytų pakeitimų biudžetą.

MOKĖJIMO SĄLYGOS

30 proc. avansas: mokamas per 7 darbo dienas po sutarties dėl balsavimo el. įrankio kūrimo, programavimo ir palaikymo darbų pasirašymo.

40 proc. mokėjimas: mokamas po balsavimo įrankio streso testų atlikimo per 7 darbo dienas.

30 proc. galutinis mokėjimas: mokamas atlikus balsavimo el. įrankio sukūrimo darbus ir pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Mokamas per 7 darbo dienas.

Terminai

- Informacinė svetainė - veikia dvi savaitės iki balsavimo dienos
- Balsavimo svetainė veikia likus savaitei iki balsavimo dienos
- Saugumo testai atliekami likus ne mažiau kaip savaitei iki balsavimo dienos
