



































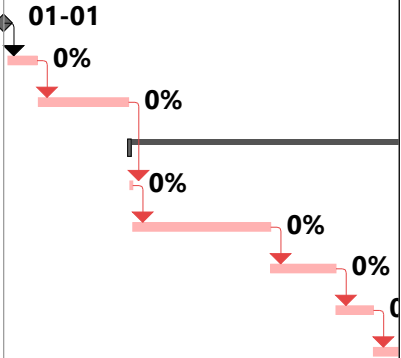







































SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)

























| ID | WBS |  | Task Mode | Task Name | D | 2025, Half 1 | J | F | M |
|----|-------|--|---|--|---|--------------|---|---|---|
| 0 | 0 | |  | PROJEKTAVIMAS | | | | | |
| 1 | 1 | |  | Tiekėjo darbų atlikimo grafikas | | | | | |
| 2 | 1.1 | |  | S3 - Pasirašyta sutartis | | | | | |
| 3 | 1.2 | |  | Prašymas pateikti reikalingą dokumentaciją/informaciją projektavimo darbams | | | | | |
| 4 | 1.3 | |  | Pateikta reikalinga dokumentacija/informacija projektavimo darbams | | | | | |
| 5 | 1.4 | |  | Darbų atlikimo grafikas | | | | | |
| 6 | 1.4.1 | |  | Parengti darbų atlikimo grafiką | | | | | |
| 7 | 1.4.2 | |  | Pateikti 1 peržiūrai darbų atlikimo grafiką | | | | | |
| 8 | 1.4.3 | |  | Pateikti pastabas po 1 peržiūros | | | | | |
| 9 | 1.4.4 | |  | Pateikti 2 peržiūrai darbų atlikimo grafiką | | | | | |
| 10 | 1.4.5 | |  | Pateikti pastabas po 2 peržiūros | | | | | |
| 11 | 1.4.6 | |  | Darbų atlikimo grafikas suderintas | | | | | |
| 12 | 2 | |  | I ETAPAS | | | | | |
| 13 | 2.1 |  |  | Projektuotojas pateikia galiojantį civilinės atsakomybės draudimo dokumentą | | | | | |
| 14 | 2.2 | |  | Prašymas pateikti reikalingą dokumentaciją/informaciją techniniams darbams | | | | | |
| 15 | 2.3 | |  | Pateikta reikalinga dokumentacija/informacija techniniams darbams | | | | | |
| 16 | 2.4 | |  | Konsultacijos rengimo metu | | | | | |
| 17 | 2.5 |  |  | Pateikti geologinių tyrinėjimų vietas susiderinimui | | | | | |
| 18 | 2.6 | |  | Atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai ir pateika įregistravimo pažymą | | | | | |
| 19 | 2.7 | |  | Projektiniai pasiūlymai (PP) | | | | | |
| 20 | 2.7.1 |  |  | Projektinių pasiūlymų projekto rengimas | | | | | |
| 21 | 2.7.2 | |  | Pakoreguoti ir pateikti projektinių pasiūlymų projektą 1 peržiūrai | | | | | |












| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone |  | External Tasks |  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone |  | External Milestone |  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress |  | Inactive Task |  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary |  | Inactive Milestone |  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary |  | Inactive Summary |  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary |  | Deadline |  |

























SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)

| ID | WBS |  | Task Mode | Task Name | D | 2025, Half 1 | J | F | M |
|----|-------|---|--|---|---|--------------|---|---|---|
| 22 | 2.7.3 | |  | Pateikti pastabas po 1 projektinių pasiūlymų projekto peržiūros | | | | | |
| 23 | 2.7.4 | |  | Pakoreguoti ir pateikti projektinių pasiūlymų projektą 2 peržiūrai | | | | | |
| 24 | 2.7.5 | |  | Pateikti pastabas po 2 projektinių pasiūlymų projekto peržiūros | | | | | |
| 25 | 2.7.6 | |  | Pakoreguoti ir pateikti projektinių pasiūlymų projektą 3 peržiūrai | | | | | |
| 26 | 2.7.7 | |  | Pateikti pastabas/suderinti po 3 projektinių pasiūlymų projekto | | | | | |
| 27 | 2.7.8 | |  | Projektiniai pasiūlymai suderinti | | | | | |
| 28 | 2.8 | |  | Statybą leidžiantis dokumentas | | | | | |
| 29 | 2.8.1 | |  | Komunikacija - Projektinių sprendinių pristatymas visuomenei | | | | | |
| 30 | 2.8.2 | |  | Projektiniai pasiūlymai pateikti į Infostatybą su visais reikiama dokumentais | | | | | |
| 31 | 2.8.3 | |  | Patikrinta pateiktos dokumentacijos sudėtis | | | | | |
| 32 | 2.8.4 | |  | Suinteresuotos organizacijos patikrino pateiktą dokumentaciją | | | | | |
| 33 | 2.8.5 | |  | Išduotas statybos leidimas | | | | | |
| 34 | 2.8.6 | |  | Komunikacija - SLD gavimas | | | | | |
| 35 | 3 | |  | II ETAPAS | | | | | |
| 36 | 3.1 | |  | Techninis darbo projektas (TDP) | | | | | |
| 37 | 3.1.1 | |  | Techninio darbo projekto rengimas | | | | | |
| 38 | 3.1.2 | |  | Pakoreguoti ir pateikti techninį darbo projektą 1 peržiūrai | | | | | |
| 39 | 3.1.3 | |  | Ekspertizės paslaugų pirkimo inicijavimas | | | | | |
| 40 | 3.1.4 | |  | Pateikti pastabas po 1 techninio darbo projekto peržiūros | | | | | |
| 41 | 3.1.5 | |  | Pakoreguoti ir pateikti techninį darbo projektą 2 peržiūrai | | | | | |
| 42 | 3.1.6 | |  | Pateikti pastabas po 2 techninio darbo projekto peržiūros | | | | | |
| 43 | 3.1.7 | |  | Pakoreguoti ir pateikti techninį darbo projektą 3 peržiūrai | | | | | |


| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone |  | External Tasks |  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone |  | External Milestone |  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress |  | Inactive Task |  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary |  | Inactive Milestone |  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary |  | Inactive Summary |  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary |  | Deadline |  |









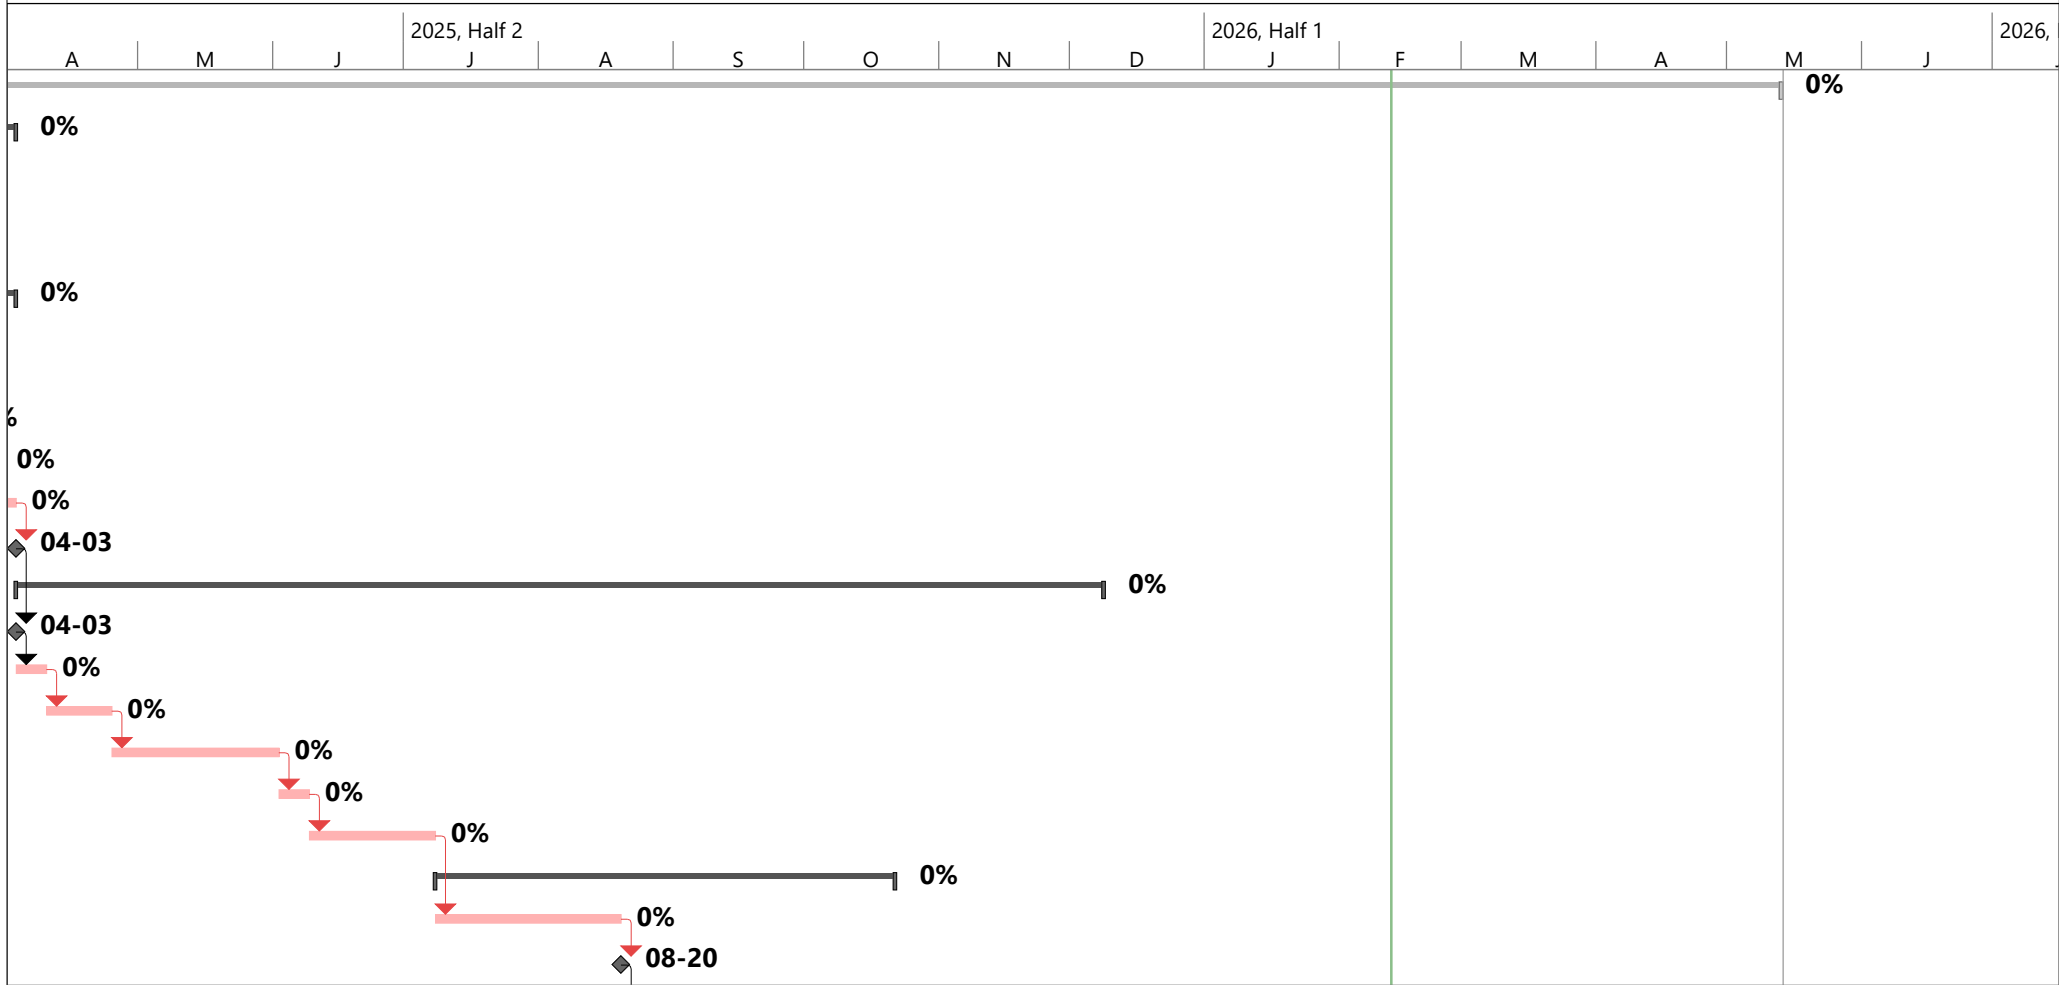















SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)

| ID | WBS |  | Task Mode | Task Name | D | 2025, Half 1 | J | F | M |
|----|----------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| 44 | 3.1.8 | |  | Pateikti pastabas/suderinti po 3 techninio darbo projekto peržiūros | | | | | |
| 45 | 3.1.9 | |  | Pasirašyta Techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų sutartis | | | | | |
| 46 | 3.1.10 | |  | Techninis darbo projektas suderintas | | | | | |
| 47 | 3.1.11 | |  | Techninio darbo projekto bendroji ekspertizė | | | | | |
| 48 | 3.1.11.1 | |  | Techninio darbo projekto bendroji ekspertizė | | | | | |
| 49 | 3.1.11.2 | |  | Pateikta ekspertizės teigiama išvada projektui | | | | | |
| 50 | 3.1.11.3 | |  | Pateiktas nurodymas apie techninio darbo projekto bendrųjų statinio rodiklių patvirtinimą | | | | | |
| 51 | 3.1.11.4 | |  | Techninis darbo projektas patvirtintas | | | | | |


| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--|--|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone  | External Tasks  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone  | External Milestone  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress  | Inactive Task  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary  | Inactive Milestone  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary  | Inactive Summary  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary  | Deadline  |









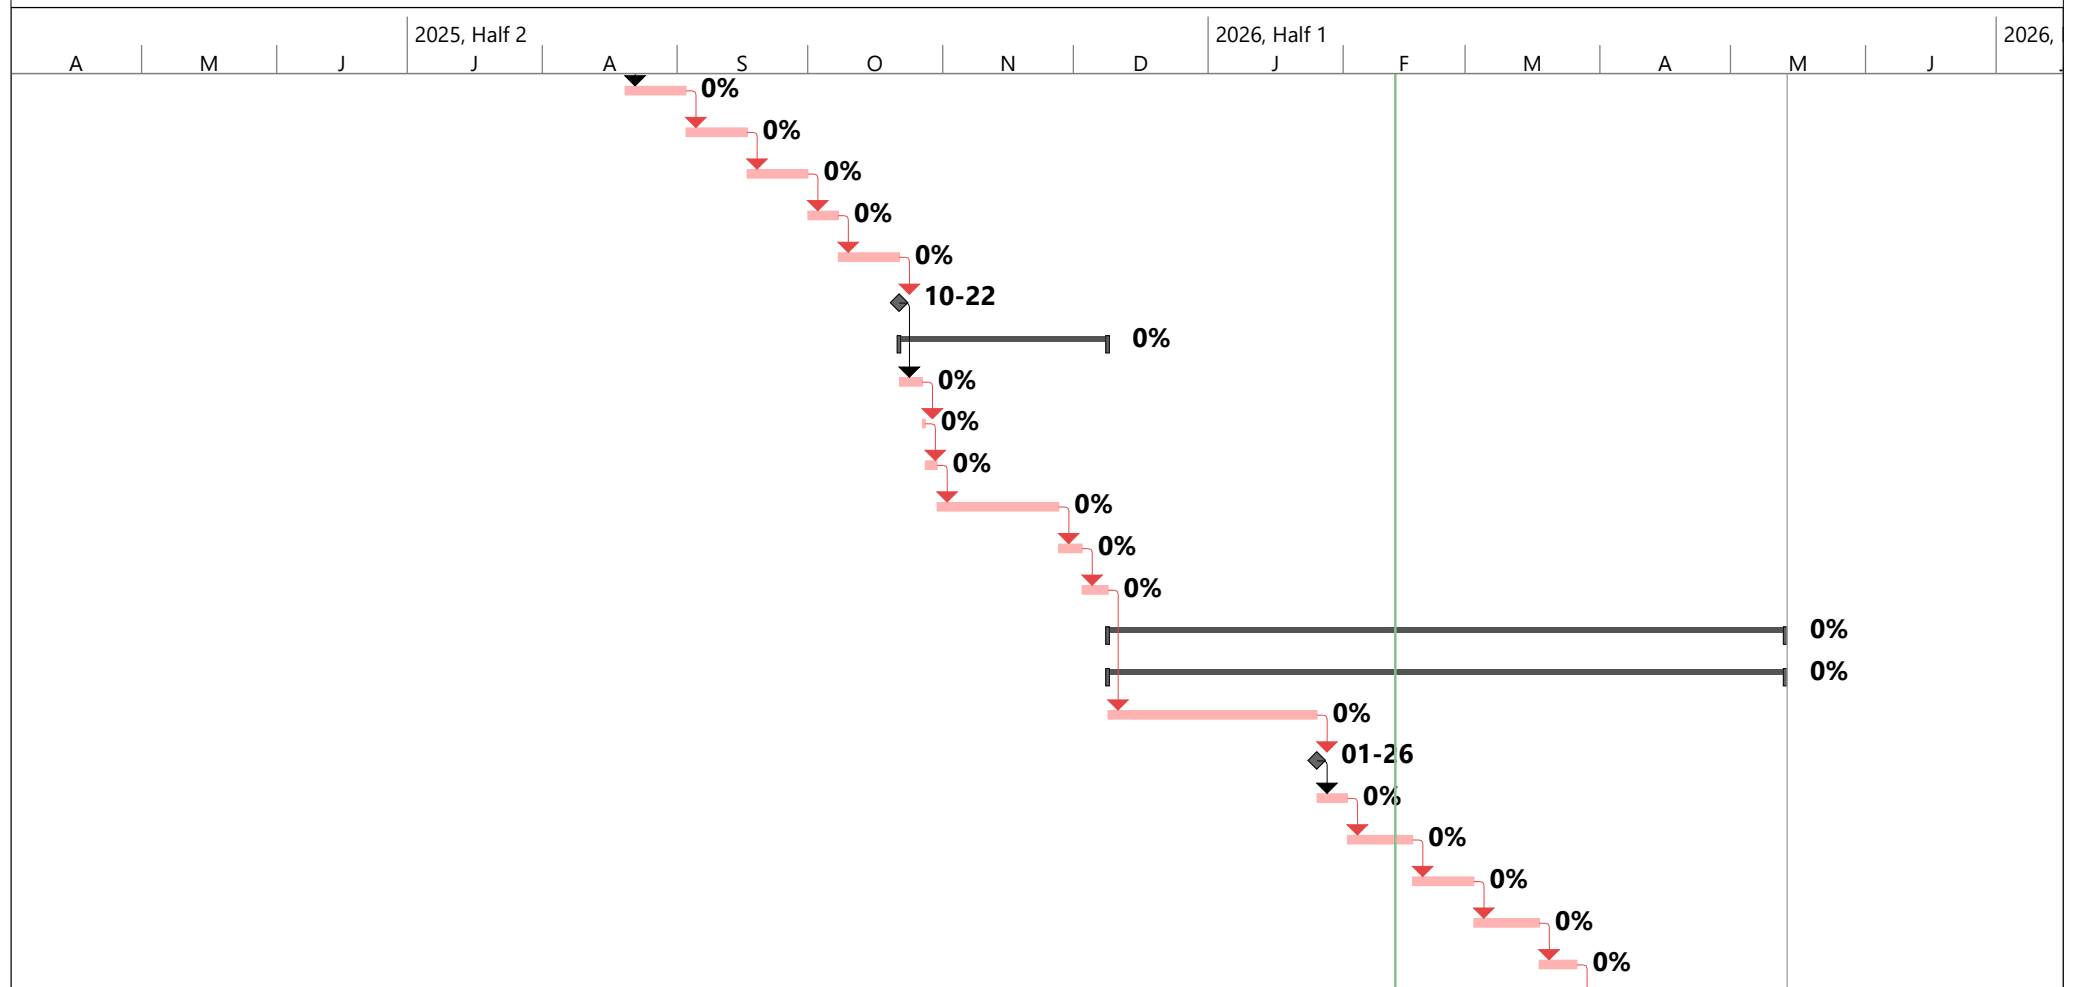















SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)




| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone |  | External Tasks |  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone |  | External Milestone |  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress |  | Inactive Task |  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary |  | Inactive Milestone |  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary |  | Inactive Summary |  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary |  | Deadline |  |









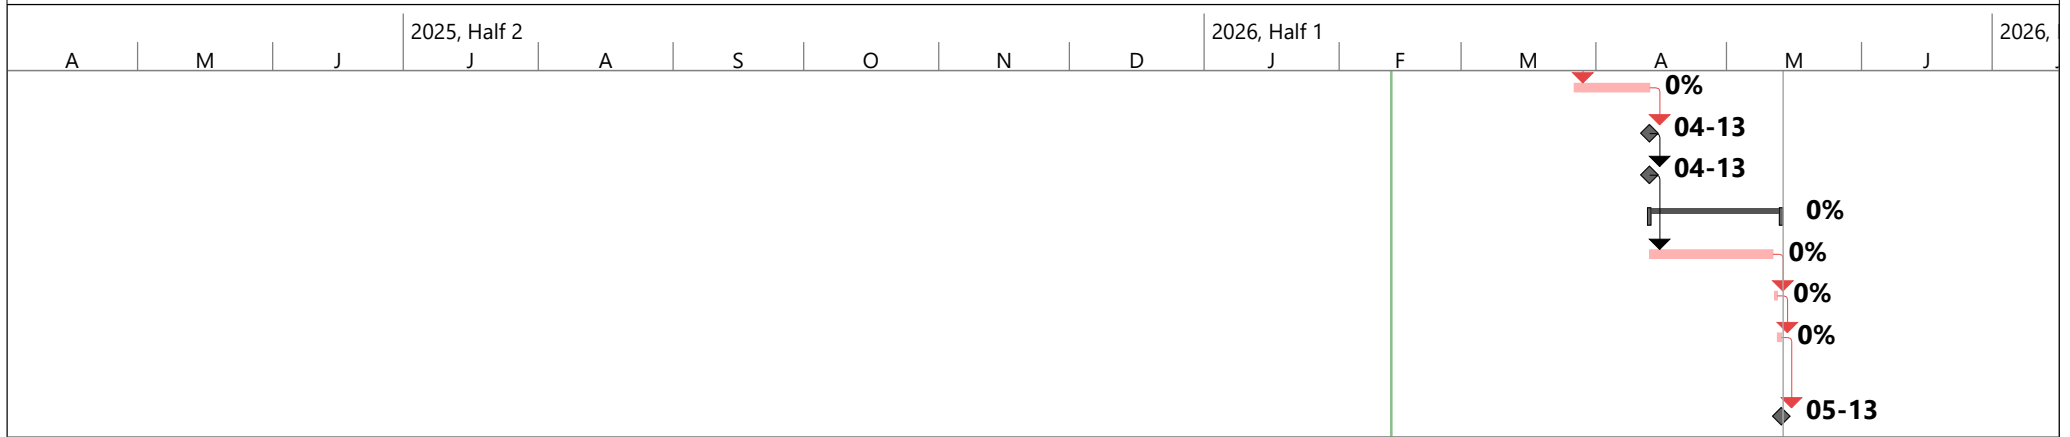















SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)



| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone |  | External Tasks |  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone |  | External Milestone |  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress |  | Inactive Task |  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary |  | Inactive Milestone |  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary |  | Inactive Summary |  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary |  | Deadline |  |

SS 4. Projektavimo grafiko forma (pavyzdys)



| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--|--|
| Critical |  | Manual Task |  | Baseline Milestone  | External Tasks  |
| Critical Split |  | Start-only |  | Milestone  | External Milestone  |
| Critical Progress |  | Finish-only |  | Summary Progress  | Inactive Task  |
| Task |  | Duration-only |  | Summary  | Inactive Milestone  |
| Split |  | Baseline |  | Manual Summary  | Inactive Summary  |
| Task Progress |  | Baseline Split |  | Project Summary  | Deadline  |
