

# MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE RANGOS SUTARTIS

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. VP-21-56-23  
Jurbarkas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama Jurbarko regioninio padalinio vadovo Dariaus Baziliausko, veikiančio pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įgaliojimą Nr. VD-20-1034 (toliau – **Užsakovas**),

ir  
**UAB „Jurmelsta“**, įmonės kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

## 1. Sutarties objektas:

1.1. **Veliuonos g-ja, kv.75, skl.22 - kv.84, skl.19**, rangos darbų, kurie vykdomi vadovaujantis Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas), VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašu (toliau – Aprašas) (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), (toliau – Darbai) pirkimas-pardavimas.

## 2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės:

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas, nustatytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Kainodaros taisyklių nustatymo metodika).


2.2. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos<sup>1</sup>, 2.11 ir 36.2.3 papunkčiuose) yra 4747,41 (keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 41 cent.) Eur su PVM. Pradinė **Sutarties vertė be PVM yra 3923,48** (trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai, 48 cent.) Eur, 21 proc. PVM yra 823,93 (aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai, 93 cent.) Eur.

2.3. Sutartyje Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys pradinės Sutarties vertės. Į pradinę Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. y. visą riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pradinę Sutarties vertę ar Darbų įkainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas).

2.5. Šalys susitaria, kad Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti keičiami (koreguojami), suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo atstovų, Miško infrastruktūros skyriaus atstovų ir projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų

<sup>1</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC>;



raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos tapačios sprendinių charakteristikos arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą inicijuoja Rangovas ir tai iššaukia būtinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darbų, vykdomų pagal keičiamus sprendinius, pradžios savo resursais.

2.6. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

2.7. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

### 3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaitoma su Rangovu per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai priimami Šalims pasirašant atliktų darbų aktą (toliau – Aktas). Aktą rengia Rangovas. Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – Pažyma) (Sutarties 4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas ir darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas jam pateiktus šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkis) darbo dienas ir pasirašyti arba pareikšti pastabas.

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu.

3.4. Rangovas įsipareigoja atliktus Darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovas sąskaitose nurodo šios Sutarties datą bei numerį, taip pat, kad sąskaita „skirta VĮ Valstybinių miškų urėdijai (įrašyti pavadinimą) regioniniam padalinii“. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais<sup>2</sup>, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

3.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

3.6. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiais nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.8. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

### 4. Užsakovo teisės ir pareigos:

4.1. Pateikti Rangovui Aprašą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti.

4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytomis sąlygomis.

4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus.

4.4. Jei Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Apraše (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus pašalinti.

<sup>2</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Užsakovo teisėmis.

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas Darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Darbų techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Darbų techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Darbų techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) (pagal darbo sutartį) ar juridinį (-ius) asmenį (-ius).

## 5. Rangovo teisės ir pareigos:

5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte nurodytu terminu ir baigti per 30 darbo dienų terminą nuo Darbų pradžios. Pastarasis terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui esant šioms aplinkybėms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeičia Užsakovo poreikis Darbams.

5.2. Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Aprašu (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais.

5.3. Pagal Rangovo pasiūlymą (Sutarties 3 priedas) Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darbų atlikimui naudoti neatlygintą papildomą 30 m<sup>3</sup> medžiagos (žvyras fr. 0/32 ) kiekį.

5.4. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba neatitikimus Projekte bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti.

5.6. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir/ar Darbų techninio prižiūrėtojo rašytinius nurodymus.

5.8. Iki Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir Darbų techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, privažiavimo kelius iki objekto ir aplinkines teritorijas, jei jie buvo sugadinti.

5.9. Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus Darbų trūkumus.

5.10. Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.

5.11. Užtikrinti privažiavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkama eksploatavimą, o sugadinimo atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.

5.12. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų laikymąsi objekte, nekaupti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų materialinių vertybių apsaugą.

5.13. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu.

5.14. Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų garantinį laiką. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.15. Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų atidavimo naudoti dienos.

5.16. Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, suremontuoto kelio ilgį, atliktų Darbų kiekį ir kainas.

3

- 5.17. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.  
5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

## **6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas:**

- 6.1. Darbų pradžia – Šalims pasirašius Sutartį.  
6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų nuo Darbų pradžios. LR aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo Užsakovui arba Užsakovui neskyrus įmonės lėšų, Darbai nepradedami, ši Sutartis nevykdoma, Šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.  
6.3. Sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  
6.4. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų.  
6.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.  
6.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatytais atvejais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrįstas Rangovo išlaidas.  
6.7. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.  
6.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus nuostolius ar/ir išlaidas ir/ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.  
6.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.  
6.10. Rangovas negali perleisti kam nors visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, išskyrus Sutarties 9 punkte nurodytą atvejį.  
6.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu.  
6.12. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  
6.13. Vykdamas Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos klaidų šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.  
6.14. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas.

## **7. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą**

- 7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Šiame punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų, vėliau Rangovui neužbaigus Darbų taikoma 10 % (dešimties procentų) bauda nuo neatliktų darbų vertės, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).  
7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės 6.9 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % (dešimties procentų) baudą nuo visos pradinės Sutarties vertės, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių

nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką, kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui vieno tūkstančio eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius ir/arba baudą, nurodytus Sutartyje.

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.6. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Užsakovas moka Rangovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą bei, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas.

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.

## **8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (FORCE MAJEURE)**

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neišvengiamų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamas nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

5

Šaliai žala, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## 9. Subranga:

9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisę pasitelkti šiuos subrangovus/subtiekėjus: /šiam punkte įrašyti, kad subtiekėjai/subrangovai nepasitelkiami arba nurodyti šiuos ūkio subjektus ir užduotis, kurioms jie pasitelkiamil.

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekėjai gali būti keičiami, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. Subrangovai/subtiekėjai/ gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju galimybė. Toks atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštaruoja Sutarties Šalys ir subrangovas/subtiekėjas. Subrangovas/subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos/subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Šiame punkte nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

## 10. Papildomi darbai

10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) priežiūros ir taisymo (remonto) darbai, ir Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios Sutarties vertę. Neatliekami darbai – Darbai ar Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas. Šiame punkte nurodyti Darbai nepaneigia ir neprieštaruoja Sutarties 3.5 punkte nustatytam Rangovo atliktų Darbų įvertinimui ir atskaitymui.

10.2. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

10.2.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

10.2.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

10.2.1.2 reikalingų atlikti papildomų darbų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.2.1.3 įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.2.2 ir bent vienai iš šių priežasčių:

10.2.2.1 kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

10.2.2.2 kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

10.3. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Darbų dalies.

10.4. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 10.2 punkte, papildomiems darbams įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

10.5. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.5.1 paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projektuotojo suderinimą ir Darbų techninio prižiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nuroydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis);

10.5.2 gavęs Sutarties 10.5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių

nustatymo metodikos ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.5.3 Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu;

10.5.4 Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.5.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas, susiderinęs su Miško infrastruktūros skyriaus atstovais, pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

10.5.5 gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais. Visus parengtus dokumentus Darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia projektuotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomus darbus;

10.5.6 Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą;

10.5.7 tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslų papildomų darbų ar apimčių kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.5.1 – 10.5.4 papunkčiuose, Šalys per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.

10.6. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti darbų techninis prižiūrėtojas.

10.7. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu.

10.8. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį ir papildomus darbus.

10.9. Papildomų darbų kaina nustatoma:

10.9.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba;

10.9.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba;

10.9.3 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.1 – 10.9.2 papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo<sup>3</sup>, galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą (nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente).

10.9.4 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.3 papunktyje nurodytų įkainių. Tokiu atveju įkainių kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar įrengimams išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

10.10. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

10.11. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime.

## 11. Asmens duomenų tvarkymas:

11.1. Šalys įsipareigoja:

11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą;

<sup>3</sup> Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.



Įmonės kodas 132340880  
PVM mokėtojo kodas LT323408811  
Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327  
Kaunas  
Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154  
Vilnius  
Užsakovo Jurbarko regioninio padalinio  
**kontaktinis adresas:** Miškininkų g. 5, Jurbarkas  
Tel. 8-447-72262  
El. p. jurbarkas@vmu.lt

Įmonės kodas 158257064  
PVM mokėtojo kodas: LT582570610  
Registruotos buveinės adresas:  
Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas

Jurbarko regioninio padalinio vadovas  
Darius Baziliauskas

  
(parašas)

Direktorius Kęstutis Naujokas

  
(parašas)  
A.V. (jei taikoma)  


**MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS  
FORMŲ MIŠKUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninis padalinys (toliau – VMU), adresas Miškininkų g. 5, Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: medienos ruošos ir prekybos vadovas Vidmantas Šidlauskas tel. 8 686 10639
2. OBJEKTAS	VMU prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašo objektai Nr. 18, Nr. 21, Nr. 23 (toliau – Sąrašas) (Specialiųjų sąlygų 12 priedas).
3. OBJEKTO ADRESAS	VMU teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai II <sub>v</sub> - IV <sub>v</sub> kategorijos
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas)
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	Nurodytuose objektuose bus prižiūrimi ir/arba taisomi (remontuojami) miško keliai arba kelio atkarpos pagal parengtą paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas), (Specialiųjų sąlygų 10 priedas) vadovaujantis 2015 gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisiekiama komunikacija: vietinės reikšmės miško keliai.
9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	Darbų atlikimo terminas per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo.

Užsakovas




Rangovas


## **II „Primega“**

Vaižganto g. 26, Garliavos m., Kauno r. tel. 8-680-50832

<b>Statytojas</b>	<b>VĮ Valstybinių miškų urėdija</b>
<b>Projektuotojas</b>	<b>II „Primega“</b>
<b>Statinio projekto pavadinimas</b>	<b>VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašo parengimas 2020 metams</b>
<b>Statinio (statinių) adresas</b>	<b>Globių g-ja, Smalininkų g-ja, Balandinės g-ja, Veliuonos g-ja</b>
<b>Statybos rūšis</b>	<b>Paprastasis remontas</b>
<b>Statinio kategorija</b>	<b>Nesudėtingi statiniai</b>
<b>Statinio (statinių) paskirtis</b>	<b>Susisiekimo komunikacijos – keliai</b>
<b>Statinio projekto etapas</b>	<b>Paprastojo remonto aprašas</b>
<b>Statinio projekto dalis</b>	<b>Bendroji dalis</b>
<b>Bylos (dokumento) žymuo</b>	<b>PRI 20-06-PRA-BD</b>

<b>Pareigos</b>	<b>Vardas ir pavardė</b>	<b>Kvalif. patv. dok. Nr.</b>	<b>Parašas</b>
<b>Direktorius</b>	<b>Remigijus Pužas</b>		
<b>Projekto ir projekto dalies vadovas</b>	<b>Remigijus Pužas</b>	<b>6165 15405</b>	

2020 m.



## APRAŠO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapai	Laida	Pastabos
PRI 20-06-PRA-DŽ	Bylos dokumentų žiniaraštis	2	0	
PRI 20-06-PRA-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	3 – 4	0	
PRI 20-06-PRA-AR	Aiškinamasis raštas	5 – 6	0	
PRI 20-06-PRA-TS	Techninės specifikacijos	7 – 9	0	
PRI 20-06-PRA-SKŽ	Sanaudų kiekių žiniaraštis	10 – 20	0	
<b>Priedai</b>				
	Projektavimo dokumentų kopijos	21 – 29		
	Kiti dokumentai	30 – 31		
<b>Brėžiniai</b>				
Situacijos planas	01- Globių girininkija Kv. 26 skl. 10 - Kv. 29 skl. 3.	32	0	
Situacijos planas	02- Smalininkų girininkija Kv. 12 skl. 10 - Kv. 38 skl. 10	33	0	
Situacijos planas	03- Balandinės girininkija Kv. 53 skl. 33 - Kv. 50 skl. 31	34 – 35	0	
Situacijos planas	04- Globių girininkija Kv. 15 skl. 49 - Kv. 20 skl. 4	36	0	
Situacijos planas	05- Balandinės girininkija Kv. 35 skl. 46 - Kv. 35 skl. 43; Kv. 35 skl. 41	37	0	
Situacijos planas	06- Balandinės girininkija Kv. 135 skl. 29 - Kv. 31 skl. 17	38	0	
Situacijos planas	07- Balandinės girininkija Kv. 48 skl. 39 - Kv. 59 skl. 26	39	0	
Situacijos planas	08- Veliuonos girininkija Kv. 75 skl. 22 - Kv. 84 skl. 19	40	0	

Atestato Nr

6165

Proj.vad.

R. Pužas

2020-07

**II „Primega“**

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto darbų visų nuosavybės formų miškuose aprašas 2020 metams

Laida

0

Lapas

1

Lapų

1

Projekto bylos dokumentų  
žiniaraštis  
PRI 20-06-PRA-BD-DŽ




## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>				
<b>1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 01- Globių girininkija Kv. 26 skl. 10 - Kv. 29 skl. 3</b>				
1.1. Kategorija		IVv	IVv	
1.2. Ilgis*	km	2,950	0,800	Iš viso: 3,750
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,0	3,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	4,0	3,5	
<b>2. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 02- Smalininkų girininkija Kv. 12 skl. 10 - Kv. 38 skl. 10</b>				
2.1. Kategorija		IVv		
2.2. Ilgis*	km	1,300		
2.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,0		
2.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1		
2.5. Eismo juostų plotis	m	4,0		
<b>3. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 03- Balandinės girininkija Kv. 53 skl. 33 - Kv. 50 skl. 31</b>				
3.1. Kategorija		IIIv	IVv	
3.2. Ilgis*	km	3,170	0,080	Iš viso: 3,250 km
3.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,5	4,0	
3.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
3.5. Eismo juostų plotis	m	4,5	4,0	
<b>4. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 04- Globių girininkija Kv. 15 skl. 49 - Kv. 20 skl. 4</b>				
4.1. Kategorija		IVv	IVv	
4.2. Ilgis*	km	1,010	0,290	Iš viso: 1,300 km
4.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	2,75	
4.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
4.5. Eismo juostų plotis	m	3,0	2,75	
<b>5. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 05- Balandinės girininkija Kv. 35 skl. 46 - Kv. 35 skl. 43; Kv. 35 skl. 41</b>				
5.1. Kategorija		IIIv	IVv	
5.2. Ilgis*	km	0,450	0,650	Iš viso: 1,100 km
5.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,0	3,5	
5.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
5.5. Eismo juostų plotis	m	4,0	3,5	
<b>6. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 06- Balandinės girininkija Kv. 135 skl. 29 - Kv. 31 skl. 17</b>				
6.1. Kategorija		IIIv	IVv	
6.2. Ilgis*	km	4,530	1,320	Iš viso: 5,850 km
6.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,5	3,5	
6.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
6.5. Eismo juostų plotis	m	4,5	3,5	

Atestato Nr.	<b>IĮ „Primega“</b>				VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto darbų visų nuosavybės formų miškuose aprašas 2020 metams	Laida
						O
6165	Proj.vad.	R. Pužas		2020-07	Bendrieji statinio rodikliai PRI 20-06-PRA-BD-BSR	Lapas
						1
						2




7. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 07- Balandinės girininkija Kv. 48 skl. 39 - Kv. 59 skl. 26				
7.1. Kategorija		IVv	IVv	
7.2. Ilgis*	km	0,678	1,422	Iš viso: 2,100 km
7.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	3,5	
7.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	1	
7.5. Eismo juostų plotis	m	3,0	3,5	
8. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 08- Veliuonos girininkija Kv. 75 skl. 22 - Kv. 84 skl. 19				
8.1. Kategorija		IIIv		
8.2. Ilgis*	km	0,700		
8.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,0		
8.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1		
8.5. Eismo juostų plotis	m	4,0		

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai nustatyti pagal remonto aprašo parengimo pirkimo techninę specifikaciją. Atliekant kelių remontą, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų, norint pasiekti numatomus tikslus.

Statinio projekto vadovas Remigijus Pužas



kv. atestato Nr. 6165, 2020-07

PRI 20-06-PRA-BD-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0




## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių taisymo (remonto) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas parengtas pagal sutarties su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioniniu padaliniu techninės specifikacijos reikalavimus ir patvirtintą remontuojamų (taisomų) kelių sąrašą, bei privalomuosius projektavimo normatyvinius dokumentus.

Aprašo rengėjas II „Primega“. Projekto vadovas Remigijus Pužas (atestato Nr. 6165) el. paštas: remigijus@primega.lt, tel. +370 680 50832.

Remontuojamų kelių detalūs parametrai pateikti aprašo dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“. Bendras remontuojamų miško kelių ilgis yra 19,35 km. Atliekant kelių remontą, kelių ilgių rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų, norint pasiekti numatomus remonto darbų tikslus.

Rengiant aprašą, atlikti reikiami tyrinėjimai ir nustatyta esamų kelių būklė ir deformacijos. Atlikta remontuojamų kelių vaizdo fiksacija filmuojant, kuri pateikiama prie aprašo skaitmeninėse laikmenose.

Tyrinėjimų pagrindu nustatytas detalus remonto darbų kiekių ir sąnaudų poreikis atskiriems keliams pateikiamas aprašo dokumente „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“. Užsakovo pageidavimu, siekiant kuo tiksliau Rangovui nurodyti remontuojamų kelių darbų kiekių ir sąnaudų poreikį atskiruose kelių ruožuose, žiniaraštyje įdėta skiltis „Vieta (kelio piketai)“. Remontuojami keliai situacijos plane supiketuoti kas 100 metrų.

Rengiant aprašą numatomi tik aptarti su Užsakovu minimaliai reikalingiausi darbai pagal remontui skiriamų lėšų kiekį.

Remontuojamų kelių trasos nebus keičiamos. Visi kelių remonto darbai bus vykdomi esamų kelių zonoje.

Kelių važiuojamosios dalies danga – žvyras. Danga aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodomu minimaliu sluoksnio storiumi atstatoma ant išlygintos, suprofiluotos ir sutankintos esamos kelių dangos.

Danga numatoma su dvišlaičiu 3,0 % nuolydžiu. Kelio dangos nuolydis, atsižvelgiant į situaciją, gali būti keičiamas į vienslaidį 3,0 % nuolydį. Ties staigesniais kelio posūkiais numatoma atstatyti virąsus su 4% nuolydžiu į vidinę posūkio pusę.

Atestato Nr.	II „Primega“				VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto darbų visų nuosavybės formų miškuose aprašas 2020 metams	Laida
6165	Proj.vad.	R. Pužas		2020-07	Lapas	O
					Aiškinamasis raštas PRI 20-06-PRA-BD-AR	Lapų
						1
						2




Apraše nurodomų apsisukimo aikštelių ir nuovažų nuo jų parametrus kelių pabaigose reikia tikslinti su Užsakovu pagal apraše numatomą aikštelių plotą. Aikštelių danga numatoma su ne mažesniu 2,0 % nuolydžiu link kraštų.

Vandens nuleidimui numatoma reikiamose vietose, nurodytuose sąnaudų kiekių žiniaraštyje, nukasti netinkamą kelkraščių gruntą (velėnas, sąnašas) ir atstatyti pakelės kiuvetus, išvalyti pralaidas ir pakeles kiuvetus bei atlikti kitus reikiamus darbus.

Vykdamant remonto darbus, būtina saugoti, kad į aplinką nepatektų degalų, tepalų ir kitų naftos produktų ar toksinių medžiagų. Avarinių išsiliejimų atveju remonto darbus vykdamantis Rangovas turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Aprašo rengėjas nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių reikalavimų bei neprivalo jų detalčiai aprašyti.

Remontuojami keliai nepatenka į archeologinių ir kultūros vertybių apsaugos zonas.

Surinktas į krūvas medienos atliekas iš statybvietės išveš Užsakovas, kitų atliekų nesusidaro.

Atsakomybę už darbų vietos įrengimą prisiima rangovas, kuris turi laikytis DT 5.00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ ir kitų galiojančių saugos darbe, kelių eismo taisyklių reikalavimų, higienos, statybos ir kitų normatyvinių reikalavimų, susijusių su atliekamais darbais.

Rangovas saugų eismą remontuojamais keliais turi užtikrinti apstatant laikiniais kelio ženklais pagal T DVAER 12 tipines schemas. Eismas reguliuojamas naudojant kelio ženklus. Iškasas kelyje aptverti signalinėmis juostomis, nakčiai pastatyti signalinius ženklus.

Remonto darbus vykdamantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas šiame apraše.

Reikalavimai kelių remonto darbų atlikimui nurodyti techninėse specifikacijose bei sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

PRI 20-06-PRA-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Remonto darbai turi būti vykdomi pagal remonto aprašą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių ir medžiagų atitiktį ir eksploatacines savybes patvirtinančius dokumentus, užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

Remonto darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir statybos techniniais reglamentais. Vykdyti remonto darbus gali tik įmonės, turinčios teisę užsiimti šia veikla. Vykdamas remonto darbus, privalu laikytis remonto apraše numatytų reikalavimų, techninės priežiūros vadovų, rangos sutartyje nurodytų reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prieštarauja aktualių LR teisės aktų reikalavimams – vadovautis LR teisės aktų reikalavimais.

Jeigu brėžiniai ir techninės specifikacijos prieštarauja tarpusavyje – vadovautis techninėmis specifikacijomis ir informuoti techninės priežiūros vadovą ir statytoją.

Projekto specifikacijose neaprašyti darbai turi būti atliekami pagal galiojančias standartines specifikacijas arba standartines normas ir taisykles bei techninio prižiūrėtojo nurodymais ir pritarimu.

Darbų etapai ir jų priėmimo laikas turi būti derinami Rangovo su techninės priežiūros vadovu ir statytoju.

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus:

- Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, vyriausybės nutarimais, statybos normas (RSN), standartus (LST), statybos taisykles (ST), statybos techninius reglamentus (STR).

Aukščiau išvardytų dokumentų reikalavimai apima šias statybos sritis:

- statybos darbų organizavimą;
- statybos paruošiamuosius darbus;
- vykdomus visų rūšių statybos ir montavimo darbus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadovą ir pradėti darbus tik po to, kai iš statytojo gauna nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą techninę dokumentaciją.

Rangovas privalo turėti medžiagų ir gaminių atitiktį arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai

Atestato Nr.	II „Primega“				VI Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto darbų visų nuosavybės formų miškuose aprašas 2020 metams.	Laida
6165	Proj.vad.	R. Pužas		2020-07	Techninės specifikacijos PRI 20-06-PRA-BD-TS	O
						Lapas
						Lapų
						1
						3





tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitiktis ar eksploatacinių savybių deklaracijomis.

Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei šiose techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus ir pasiekti numatomus projekto tikslus.

Grunto transportavimo metodus, užpylimo ant esamų dangų, formavimo ir tankinimo technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jo taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti bendrųjų normatyvinių dokumentų ir projekto techninių specifikacijų nurodymams.

Darbų vykdymo metu, atskiruose ruožuose, nepasiekus reikiamo sutankinimo rodiklio DPr ir Ev2, rangovas atlieka gruntų pakeitimą pagal IT ŽS 17 224 ir 524 p.

Grunto pakeitimo darbus rangovas turi įsivertinti savo rizika. Grunto pakeitimo darbai nėra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį ir tikslinami pagal poreikį darbų vykdymo metu.

Už darbų saugą visą statybos laikotarpį atsako Rangovas.

Vykdant žemės ir dangos įrengimo darbus būtina vadovautis šiais ir kitais privalomaisiais normatyviniais dokumentais:

- STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra";
- ST 188710638.06:2004 "Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas";
- R 34-01: 2001 "Automobilių kelių pagrindai";
- R 35-01: 2001 "Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos";
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
- IT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15.

Prieš duobių ir provėžų užpylimą smėliu ir dangos pastorinimą, privaloma pašalinti medienos likučius, augmeniją ir šiukšles. Smėlis turi atitikti LST 1331:2002 reikalavimus:

- grūdelių, didesnių kaip 2 mm, ne mažiau kaip 30 % mišinio masės;
- smulkesnių kaip 0,063 mm dalelių gali būti iki 7 % mišinio masės.

Smėlis gali būti naudojamas, jei įrodoma, kad statybos metu bus pasiekti reikiami pakloto sluoksnio tankiai, deformacijos moduliai, laidumas vandeniui (filtracijos koeficientai) ir atsparumas šalčiui. Filtracijos koeficientas sutankintoje sluoksnio būklėje turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m/d.

PRI 20-06-PRA-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0




Šalčiui atsparaus sluoksnio mažiausias sutankinimo rodiklis  $D_{pr}$  turi būti 100%. Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama.

Esamas kelio paviršius suprofiluojamas ir dangos atstatomos pagal aiškinamajame rašte bei sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytus parametrus.

Žvyro dangą rengti prisilaikant statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ reikalavimų ir ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. Žvyro dangos įrengimui naudojami stambiagrūdžiai gruntai turi atitikti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07“ reikalavimus, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19 bei LST EN 13242:2003 reikalavimus.

Optimalaus žvyro mišinyje 0/45 dalelių, mažesnių kaip 0,05 mm gali būti iki 7 % mišinio kiekio.

Naudojami stambiagrūdžiai gruntai gali būti patikrinti nepriklausomoje laboratorijoje statybos darbus prižiūrinčių asmenų ar institucijų. Nustačius, kad naudojama medžiaga yra netinkama, Rangovas privalo padengti visus Užsakovo ir prižiūrinčių asmenų patirtus nuostolius ir pašalinti trūkumus.

Žvyro dangos sluoksnis gali būti klojamas esant neigiamai temperatūrai tik užtikrinus, kad darbų kokybė nenukentės. Dangos sluoksnio sutankinimo rodiklis  $D_{pr}$  turi būti ne mažesnis kaip 103 %. Dangos sluoksnio aukštis nuo projekcinio neturi nukrypti daugiau kaip nurodyta normatyve ĮT SBR 19.

Užbaigti darbai turi būti priduoti komisijai arba statytojui, statinį pripažįstant tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Rangovo savikontrolės ir statytojo kontroliniai bandymai ir tyrimai yra darbų priėmimo pagrindas. Atidavimas naudoti įforminamas aktu.

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta LR įstatymais. Garantinio laikotarpio metu pastebėti trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

PRI 20-06-PRA-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

## SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Vietinės reikšmės (miško) kelias: 01-Globių girininkija Kv. 26 skl. 10 - Kv. 29 skl. 3

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūklų (1 medis)	29+50÷37+50 atskirose vietose	vnt.	22
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	0+00÷4+50 po 1,0 m	ha	0,09
3	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	29+50÷37+50 po 1,0 m	ha	0,16
4	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai reti	4+50+15+60	100m <sup>2</sup>	55,50
5	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	15+60+22+50 28+00÷29+50	100m <sup>2</sup>	40,50
6	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs	22+50÷28+00	100m <sup>2</sup>	27,50
7	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	0+00÷4+50 4+50+15+60	ha	0,65
8	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai vidutinio tankumo	28+00÷29+50 15+60+22+50 29+50÷37+50	ha	0,57
9	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai tankūs	22+50÷28+00	ha	0,28
10	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	0+00÷37+50	t.m <sup>2</sup>	22,10
11	Netinkamo kelkraščių grunto (velėnų, sąnašų) nukasimas arba kiuveto atstatymas ekskavatoriumi, supilant ir skleidžiant vietoje	29+50+31+50 33+50÷37+00 reikiamose vietose	t.m <sup>3</sup>	0,12
12	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	4+50÷24+00 reikiamose vietose	100m <sup>2</sup>	11,60
13	Kelio dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu), plotis 4,0 m	0+00÷4+50 24+00÷26+50	100m <sup>3</sup>	1,40
14	Kelio dangos sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 10 cm storio sluoksniu)	26+50÷29+50 plotis 4 m 29+50÷37+50 plotis 3,5 m	100m <sup>3</sup>	4,00
15	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai smelio sluoksnio storis min.	29+50+31+50 33+50÷37+00	100m <sup>3</sup>	2,20

Atestato Nr.	II „Primega“				VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto darbų visų nuosavybės formų miškuose aprašas 2020 metams	Laida
						O
6165	Proj.vad.	R. Pužas		2020-07	Sanaudų kiekių žiniaraštis PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas
						1
						11




	10 cm			
16	Žvyro dangų valymas, surenkant skiedros ir medienos nuobiras	Užterštose vietose	t.m2	0,62
17	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	11+72	m3	0,80
18	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	11+72	m	6,20
19	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko)	Kelkraštyje prie pralaidos pk. 15+60D	vnt.	2
20	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	Rem. pralaidos užpilas pk. 11+72	100m3	0,08

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	11	0

*Braunius*

*Braunius*

## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 02-Smalininkų girininkija Kv. 12 skl. 10 - Kv. 38 skl. 10

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūkle (1 medis)	0+00+13+00 reikiamose vietose	vnt.	36
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	0+00÷13+00 po 1 m	ha	0,26
3	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	0+00÷13+00	ha	0,26
4	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	0+00÷13+00	t.m2	6,50
5	Netinkamo kelkraščių grunto (velėnų, sąnašų) nukasimas arba kiuveto atstatymas ekskavatoriumi, supilant ir skleidžiant vietoje	0+00÷13+00 reikiamose vietose	t.m3	0,17
6	Kelio dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu), plotis 4,0 m	3+90÷13+00	100m3	1,82
7	Kelio dangos sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 8 cm storio sluoksniu) plotis 4,0 m	0+00÷3+90	100m3	1,25

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	11	0




## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 03-Balandinės girininkija Kv. 53 skl. 33 - Kv. 50 skl. 31

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūkle (1 medis)	„B“ atskirose vietose	vnt.	18
2	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai reti	„A“ 19+00÷22+00 griovių ir kiuvetų šlaitai abejose pusėse ir dugnas	100m <sup>2</sup>	23,82
3	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	„A“ 0+00÷1+26 „A“ 22+00÷28+00 „B“ 0+00÷4+50 griovių ir kiuvetų šlaitai abejose pusėse ir dugnas	100m <sup>2</sup>	73,32
4	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs	„A“ 1+26÷19+00 griovių ir kiuvetų šlaitai abejose pusėse ir dugnas	100m <sup>2</sup>	141,92
5	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	„A“ 19+00÷22+00	ha	0,24
6	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai vidutinio tankumo	„A“ 0+00÷1+26 „A“ 22+00÷28+00 „B“ 0+00÷4+50	ha	0,74
7	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai tankūs	„A“ 1+26÷19+00	ha	1,42
8	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	„A“ 0+00÷28+00 „B“ 0+00÷4+50	t.m <sup>2</sup>	14,49
9	Kiuveto nukasimas ekskavatoriumi, supilant į sankasą	„A“ 1+26÷1+56 D	t.m <sup>2</sup>	0,024
10	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	„A“ 1+56÷20+00 „A“ 22+00÷28+00 „B“ 0+00÷3+00 reikiamose vietose	100m <sup>2</sup>	61,10
11	Kelio ir aikštelės dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu), plotis 4,5 m ir aikštelė kelio „A“ pabaigoje	„A“ 0+00÷1+26 „A“ 20+00÷22+00 „B“ 3+00÷3+70	100m <sup>3</sup>	1,09
12	Kelio ir aikštelės dangos atstatymas iš žvyro (storis 12 cm, viensluoksnė) plotis 4,0 m	„B“ 3+70÷4+50 ir apsisukimo aikštelė 215 m <sup>2</sup> ploto	100m <sup>2</sup>	5,35
13	Išlyginamųjų kelio ir aikštelės pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas 20 cm smėlio	„B“ 3+70÷4+50 ir apsisukimo aikštelė	100m <sup>3</sup>	1,14
14	Žvyro dangų valymas, surenkant skiedros nuobiras	„A“ ir „B“ užterštose vietose	t.m <sup>2</sup>	2,87

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	11	0

15	0,5m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	A" pk. 1+38 D	vnt.	1
16	Supulto grunto tankinimas vibroplokštėmis	„A“ 1+26÷1+56 D praplatinama sankasa	100m <sup>3</sup>	0,24
17	Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu su žolių apšėjimu	„A“ 1+26÷1+56 D kelio šlaitas	10m <sup>2</sup>	2,80
18	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko)	Kelkraštyje prie pralaidos pk. 1+38 D	vnt.	3
19	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	„A“ 1+38; 12+12D; 13+84D; 15+64D; 21+74	m <sup>3</sup>	3,20
20	Sąnašų iš griovio kasimas rankiniu būdu, paskleidžiant sąnašas ant griovio kraštų	„A“ ruože griovio 30 m į kairę nuo pralaidos pk. 1+38; „A“ ruože nuleidžiamojo griovio 30 m į dešinę nuo pralaidos pk. 13+84; „A“ ruože dešinysis pakelės kiuvetas tarp pk. 20+00 – 22+00	m <sup>3</sup>	8,70
21	Kelio dangos pastorinimas 6 cm iš sodrinto žvyro, plotis 4,5 m	„A“ 1+26÷1+56	100m <sup>2</sup>	1,35
22	Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles ir paskleidžiant augalinį sluoksnį rankiniu būdu	„A“ 1+26÷1+56 D kiuveto šlaitas nuo miško pusės	100m <sup>2</sup>	0,22
23	Griovio tvirtinimas skalda prie pralaidos	„A“ pk. 1+38 D	m <sup>3</sup>	0,20

Pastaba: apsisukimo aikštelės 215 m<sup>2</sup> ploto ir nuovažų nuo jos parametrus „B“ kelio pabaigoje tikslinti su Užsakovu

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	11	0

## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 04-Globių girininkija Kv. 15 skl. 49 - Kv. 20 skl. 4

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūkle (1 medis)	0+00÷13+00 reikiamose vietose	vnt.	18
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	0+00÷10+10 po 1,5 m 10+10÷13+00 1,0 m dešinėje	ha	0,37
3	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	0+00÷10+10 10+10÷13+00	ha	0,37
4	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	0+00÷13+00	t.m2	7,15
5	Kiuvetų atstatymas ekskavatoriais, supilant ir skleidžiant vietoje	1+90÷3+50 10+10÷13+00 K	t.m3	0,33
6	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	0+00÷1+90 8+00÷10+10 reikiamose vietose	100m2	7,24
7	Kelio dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu), plotis 3,0 m	3+50÷8+00	100m3	0,68
8	Kelio dangos sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 16 cm storio sluoksniu)	1+90÷3+50, plotis 3,0 m 10+10÷13+00, plotis 2,75 m	100m3	2,05


PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	6	11	0




Vietinės reikšmės (miško) kelias: 05-Balandinės girininkija Kv. 35 skl. 46 - Kv. 35 skl. 43; Kv. 35 skl. 41

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūkle (1 medis)	0+00÷11+00 reikiamose vietose	vnt.	20
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	0+00÷4+00 po 1,0 m 8+50÷11+00 po 1,0 m	ha	0,13
3	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	4+00÷8+50 po 1,0 m	ha	0,09
4	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	0+00÷4+00 8+50÷11+00	ha	0,13
5	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai vidutinio tankumo	4+00÷8+50 po 1,0 m	ha	0,09
6	Kelio paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	0+00÷4+00 ir 8+50÷11+00 po 3,5 m 4+00÷8+50 po 4 m	t.m2	4,08
7	Netinkamo kelkraščių grunto (velėnų, sąnašų) nukasimas arba kiuveto atstatymas ekskavatoriumi, supilant ir skleidžiant vietoje	0+00÷8+50 reikiamose vietose	t.m3	0,12
8	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	8+50÷10+00 reikiamose vietose	100m2	5,25
9	Kelio dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu)	4+00÷8+50, plotis 4,0 m 10+00÷11+00, plotis 3,5 m	100m3	1,08
10	Kelio dangos sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 10 cm storio sluoksniu)	0+00÷4+00, plotis 3,5 m	100m3	1,40

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	7	11	0

## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 06-Balandinės girininkija Kv. 135 skl. 29 - Kv. 31 skl. 17

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūklų (1 medis)	„B“ 1+00÷4+40 reikiamose vietose	vnt.	22
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	„A“ 0+00÷45+30 po 2 m „B“ 0+00÷4+40 po 2 m „C“ 0+00÷8+80 po 2 m	ha	2,33
3	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių krašto, šlaito ir dugno pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	„A“ 0+00÷0+80D „A“ 0+80÷45+30D „B“ 0+00÷4+40 D „C“ 0+00÷8+80D	100m <sup>2</sup>	204,75
4	Krūmų atžalų, storesnių kaip 7 mm, ant griovių krašto, šlaito ir dugno pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs	„A“ 0+00÷0+80K	100m <sup>2</sup>	3,20
5	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	„A“ 0+00÷45+30 „B“ 0+00÷4+40 „C“ 0+00÷8+80	ha	2,33
6	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai vidutinio tankumo	„A“ 0+00÷0+80D „A“ 0+80÷45+30D „B“ 0+00÷4+40 D „C“ 0+00÷8+80D	ha	2,05
7	Nupjautų krūmų ir atžalų sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai tankūs	„A“ 0+00÷0+80K	ha	0,03
8	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės, pravažiuojant 2 kartus	„A“ 0+00÷45+30 „B“ 0+00÷4+40 „C“ 0+00÷8+80	t.m <sup>2</sup>	36,05
9	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	„A“ 0+00÷27+00 reikiamose vietose	100m <sup>2</sup>	25,26
10	Kelio ir nuvažų dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu)	„A“ 27+00÷45+30, plotis 4,5 m „B“ 0+10÷4+40, plotis 3,5 m „C“ 0+00÷3+00, plotis 3,5 m	100m <sup>3</sup>	5,37
11	Apsisukimo aikštelių dangos ir nuvažų sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 16 cm storio sluoksniu)	Kelio „B“ aikštelė ir nuvažos kelio pabaigoje, plotas 300 m <sup>2</sup> Kelio „C“ aikštelė ir nuvažos kelio pabaigoje, plotas 300 m <sup>2</sup>	100m <sup>3</sup>	0,96
12	Kelio dangos atstatymas iš žvyro (storis 12 cm, vienasluoksnė)	„C“ 3+00÷8+80, plotis 3,5 m	100m <sup>2</sup>	20,3
13	Išlyginamųjų aikštelių ir nuvažų pagrindo sluoksnio įrengimas, kai pagrindas 20 cm smėlio	Kelio „B“ aikštelė ir nuvažos kelio pabaigoje, Kelio „C“ aikštelė ir	100m <sup>3</sup>	1,36

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ

Lapas	Lapų	Laida
8	11	0

18

		nuovažos kelio pabaigoje		
14	Žvyro dangų valymas, surenkant medienos ir skiedros nuobiras	„A“ užterštose vietose	t.m2	1,84

Pastaba: apsisukimo aikštelių ir nuovažų nuo jų parametrus „B“ ir „C“ kelių pabaigose tikslinti su Užsakovu

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	9	11	0




## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 07-Balandinės girininkija Kv. 48 skl. 39 - Kv. 59 skl. 26

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūklų (1 medis)	„A“ 0+00÷6+20 „B“ 0+00÷14+22 reikiamose vietose	vnt.	27
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	„A“ 0+00÷6+78 po 1 m „B“ 3+00÷14+22 po 1 m	ha	0,38
3	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo	„B“ 0+00÷3+00 po 1 m	ha	0,06
4	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	„A“ 0+00÷6+78 „B“ 3+00÷14+22	ha	0,36
5	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai vidutinio tankumo	„B“ 0+00÷3+00 po 1 m	ha	0,06
6	Kelio ir kelkraščių paviršiaus planiravimas autogreideriu	„A“ 0+00÷6+78 „B“ 0+00÷14+22	t.m2	7,01
7	Netinkamo kelkraščių grunto (velėnų, sąnašų) nukasimas arba kiuveto atstatymas ekskavatoriumi, supilant ir skleidžiant vietoje	„A“ 0+50÷6+20 reikiamose vietose „B“ atskirose reikiamose vietose	t.m3	0,17
8	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	„A“ 4+50÷6+78 „B“ 13+20÷14+22 reikiamose vietose	100m2	4,16
9	Kelio ir nuovažų dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 5 cm storio sluoksniu)	„A“ 0+00÷2+50, plotis 3,0 m „B“ 0+00÷13+20, plotis 3,5 m	100m3	2,70
10	Kelio dangos sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 12 cm storio sluoksniu)	„A“ 2+50÷4+50, plotis 3,0 m	100m3	0,72
11	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas 20 cm smėlio	„A“ 2+50÷4+50	100m3	1,2
12	Vandens pralaidos iš 0,5 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	„B“ pk. 12+10	10m	1

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	10	11	0




## Vietinės reikšmės (miško) kelias: 08-Veliuonos girininkija Kv. 75 skl. 22 - Kv. 84 skl. 19

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, aprašymas	Vieta (kelio piketai)	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1	Medžių, kai kamieno storis iki 40 cm, šakų genėjimas mechaniniu pjūklų (1 medis)	5+00÷6+10D reikiamose vietose	vnt.	16
2	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai reti	0+00÷7+00 po 2 m	ha	0,28
3	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas ir pašalinimas, kai krūmai reti	0+00÷7+00	ha	0,28
4	Kelio ir kelkraščių planavimas autogreideriu, kai gruntas II grupės, pravažiuojant 2 kartus	0+00÷7+00	t.m2	4,20
5	Kelio įdubų ištaisymas, užpilant žvyru	0+00 – 1+00 reikiamose vietose	100m2	3,80
6	Kelio dangos viršutinio sluoksnio atstatymas iš žvyro (min. 6 cm storio sluoksniu)	1+00÷7+00, plotis 4,0 m	100m3	1,44
7	Žvyro dangų valymas, surenkant medienos atliekas	0+00÷7+00 atskiruose ruožuose	t.m2	1,40

## Bendrosios pastabos:

- 1) Žvyro dangos sluoksnio atstatymo kiekis nurodytas sutankinto būvio. Žvyro medžiagos kiekį (išeiga) turi įvertinti rangovas;
- 2) Remonto metu medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami, kadangi išskirtų ir nurodytų ruožų medžiagų ir darbų kiekiai yra apskaičiuoti remiantis tuose ruožuose galiojančiais skersiniais pjūviais;
- 3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus ir pasiekti projekto tikslus;
- 4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.

PRI 20-06-PRA-BD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	11	11	0





1

**LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS**  
**KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS**  
 Priedas Nr. 12

M 1:25000

Globių g-ja, kv 26-29, rem. kelio ilgis - 3,75 km.

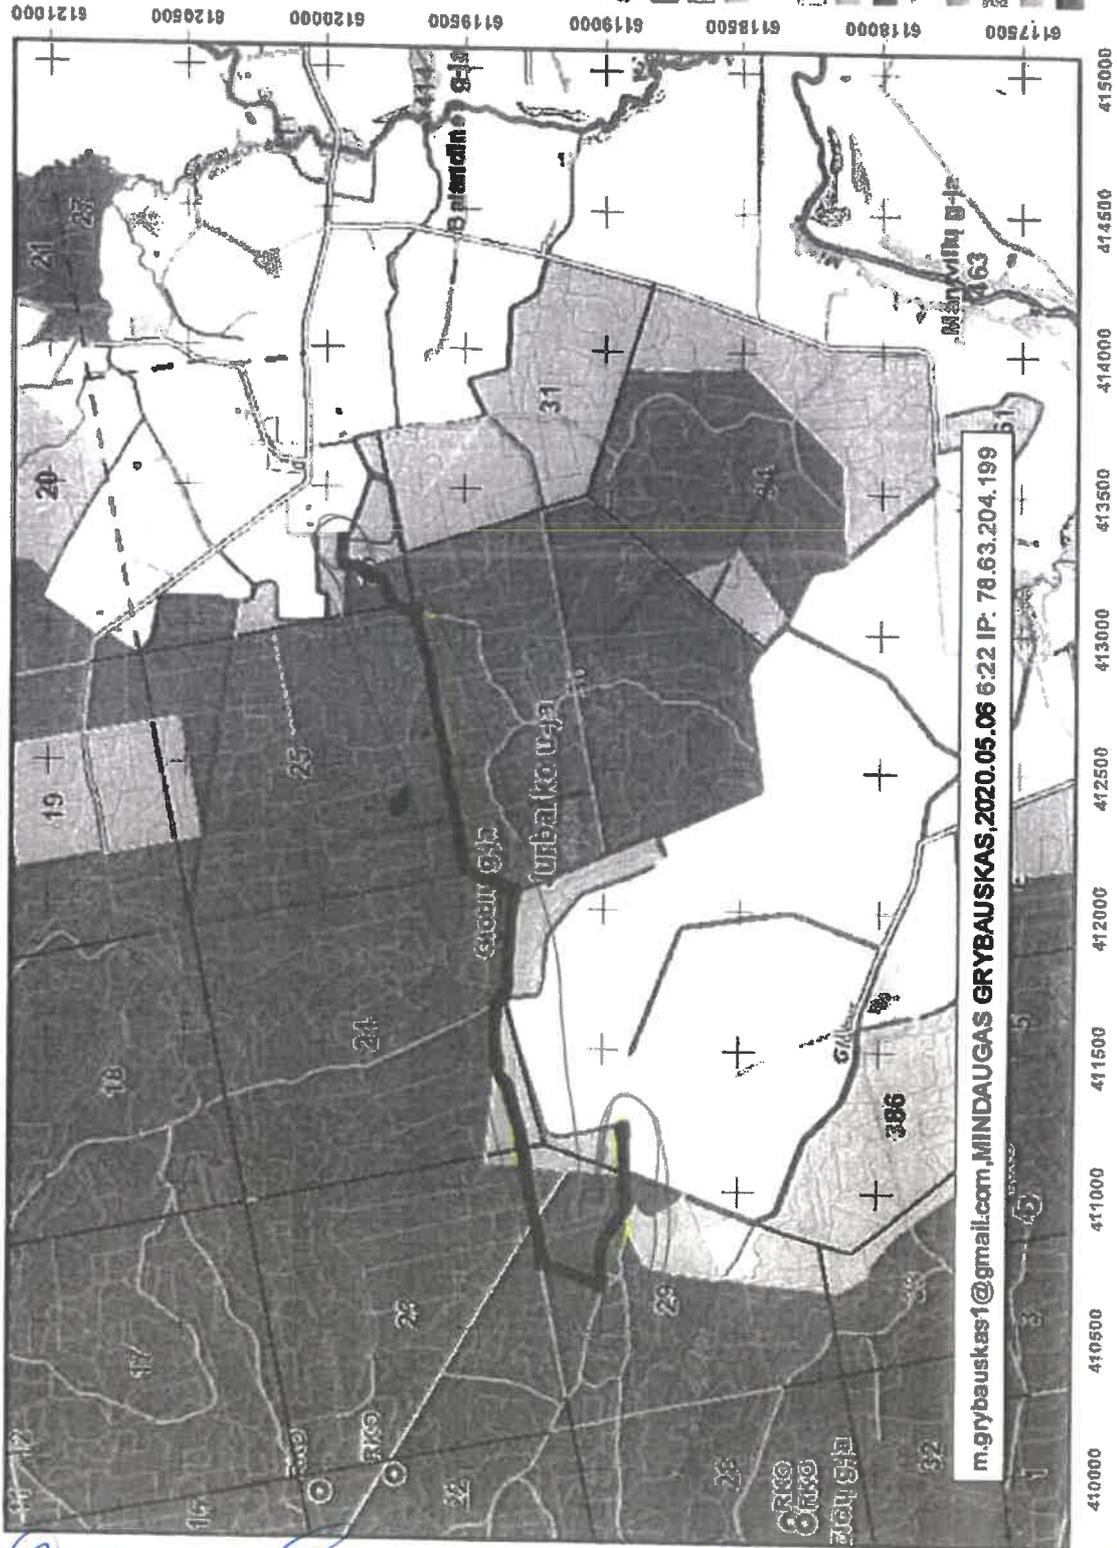

211

- Sutartiniai ženklai**
- Valstos
  - Tekosinių sklypų ribos
  - Miško žemė
  - Ne miško žemė
  - Ne miško žemė apsauginti miškai
  - Koreguojami tekosiniai sklypai
  - I grupė. Rezervaliniai miškai
  - II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
  - II B grupė. Rekreatiniai miškai
  - III grupė. Apsauginiai miškai
  - IV grupė. Ūkiniai miškai
  - Valstybinės reikšmės miškai

**VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA**  
 Pramonės pr. 116, LT-51327, Kaunas, Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251  
 El. paštas: [valst@amvmt.lt](mailto:valst@amvmt.lt), svetainė internetinė: [www.amvmt.lt](http://www.amvmt.lt)

*Bole...*


*...*

2

Smalininkų g-ja, kv. 12 - 38, rem. kelio ilgis - 1,3 km.  
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000


Priedas Nr. 13.

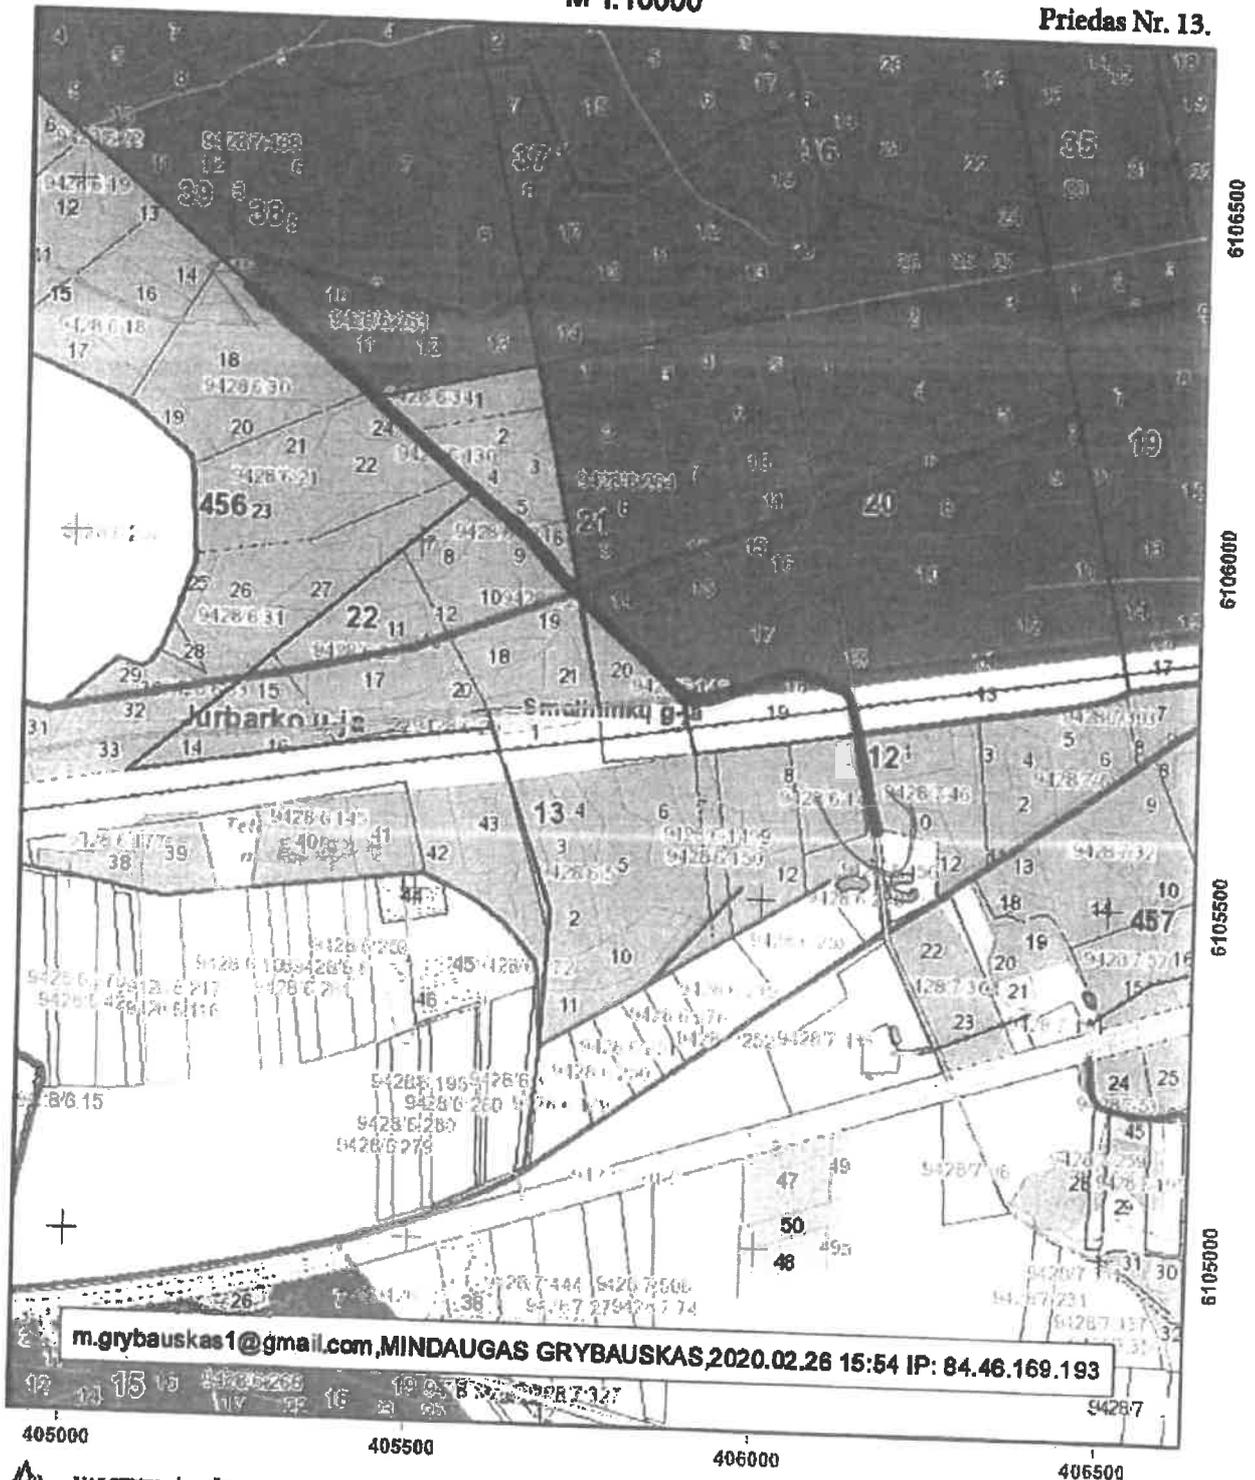

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.02.26 15:54 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA  
Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251  
El. paštas: vmi@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt



Sutartiniai ženklai

- Valdos
- Taksacinių sklypų ribos
- Miško žemė
- Ne miško žemė
- Ne miško žemė apauganti mišku
- Koreguojami taksaciniai sklypai
- I grupė. Rezervatiniai miškai
- II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
- II B grupė. Rekreaciniai miškai
- III grupė. Apsauginiai miškai
- IV grupė. Ūkiniai miškai
- Valstybinės reikšmės miškai

*Blažius*

*Laurens*


3.

Balandinės g-ja, kv. 53-50, rem. kelio ilgis - 3,25 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr.14.

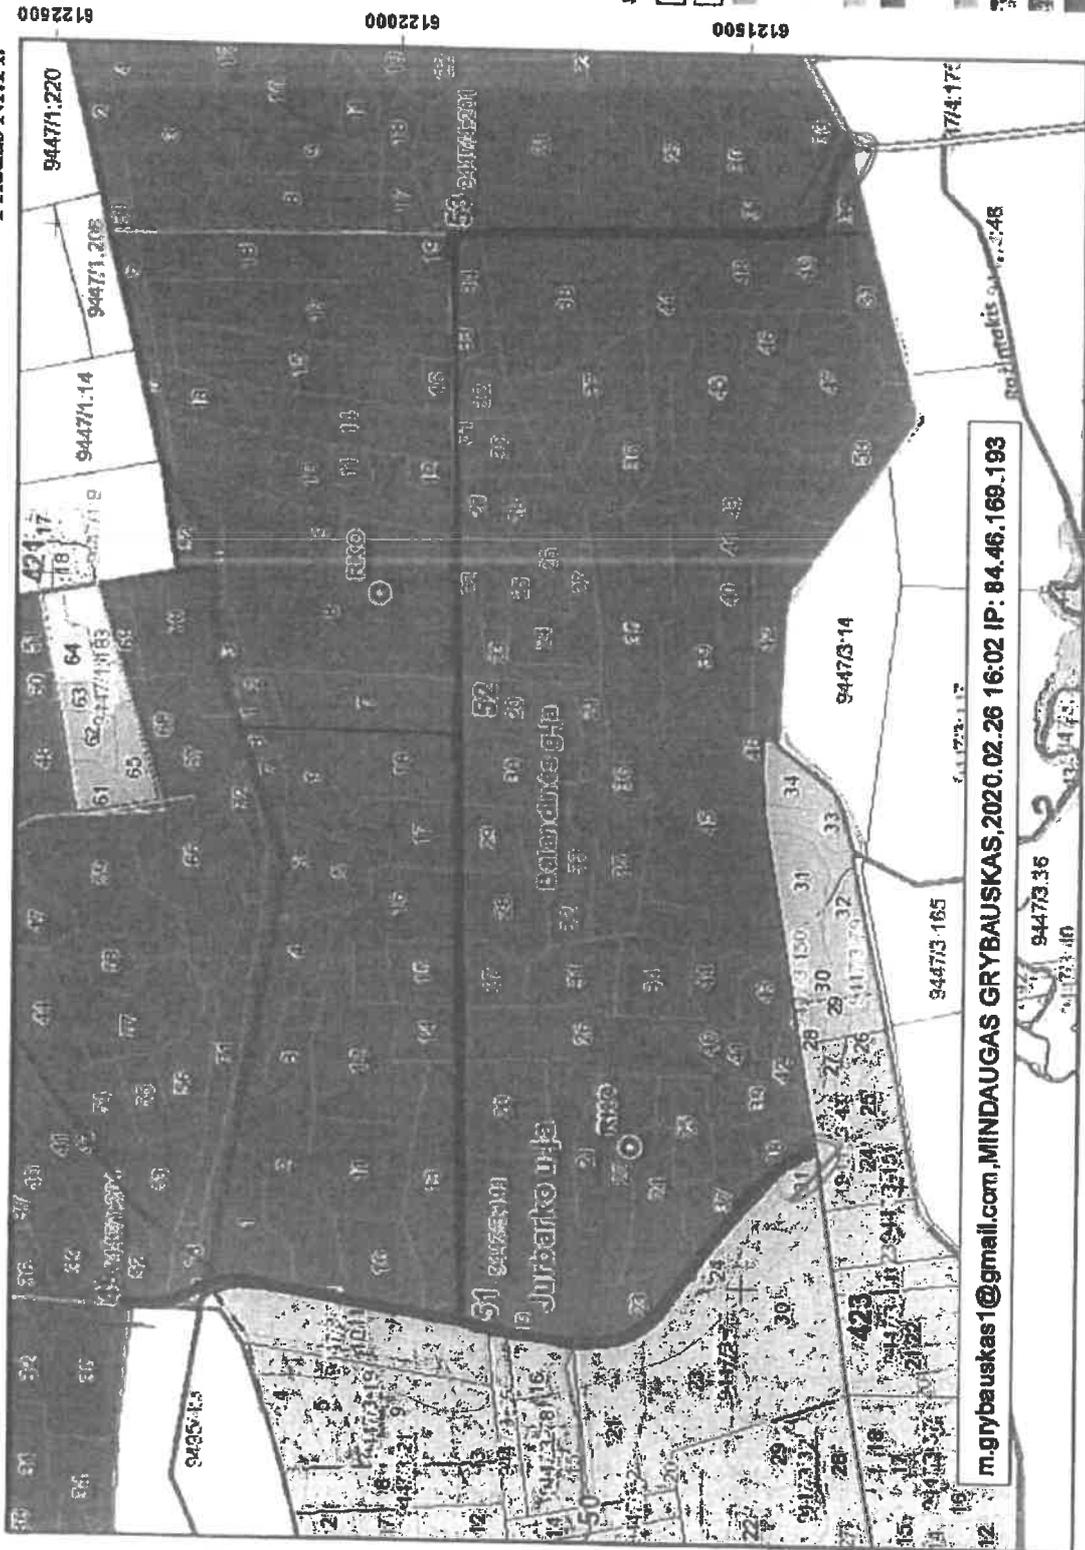

- Sutarbiniai ženklai
- Valdos
  - Taksacinių sėdų ribos
  - Miško žemė
  - Ne miško žemė
  - Ne miško žemė apsauganti miškai
  - Koreguojami taksaciniai sklypai
  - I grupė. Rezervatiniai miškai
  - II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
  - II B grupė. Rekreatiniai miškai
  - III grupė. Apsauginiai miškai
  - IV grupė. Ūkiniai miškai
  - Valstybinės reikšmės miškai

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA  
Pranėmė pr. 11a, LT-51527, Kaunas, Tel.: (837)490252, faks.: (837)490251  
El. paštas: [ymis@arvymt.lt](mailto:ymis@arvymt.lt), svetainė internete: [www.arvymt.lt](http://www.arvymt.lt)



h


24

Globių g-ja, kv. 15 - 20, rem. kelio ilgis - 1,3 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 15

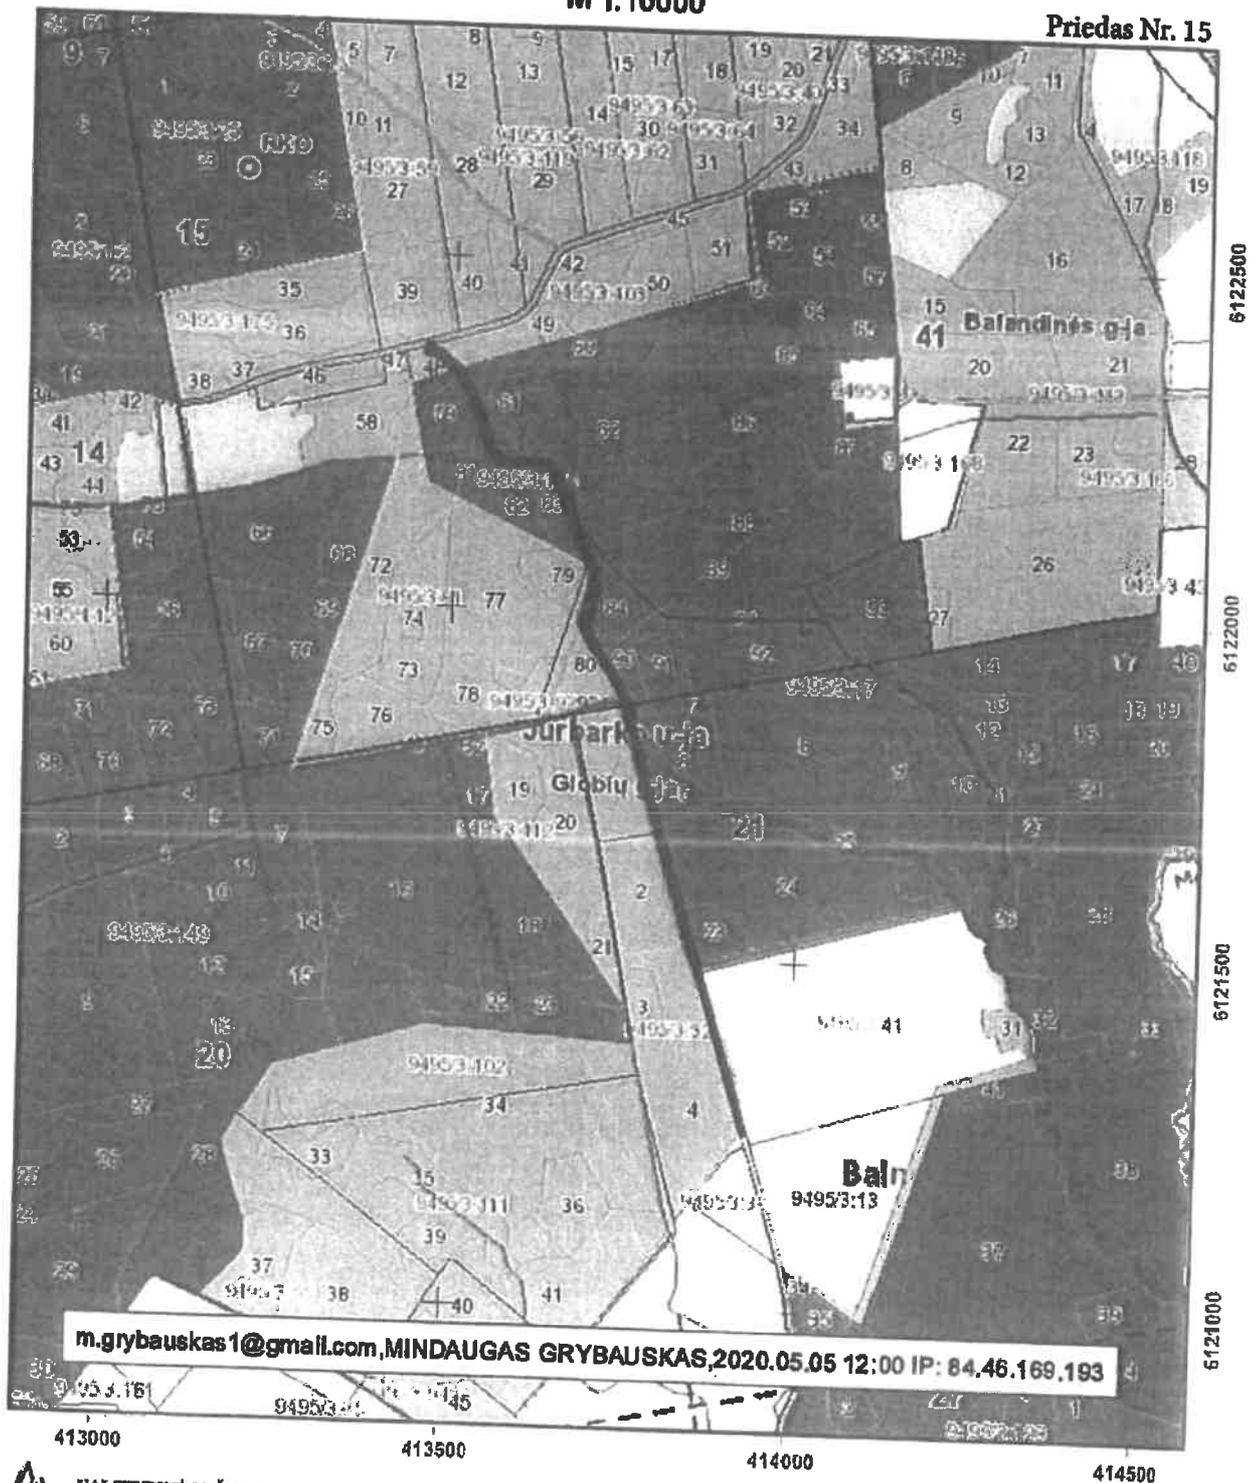

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA  
Pramonės pr. 11A, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251  
El. paštas: ymi@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt



Sutartiniai ženklai

- |                                 |  |                             |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Valdos                          | I grupė. Rezerviniai miškai            | Valstybinės reikšmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos         | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai |                             |
| Miško žemė                      | II B grupė. Rekreaciniai miškai        |                             |
| Ne miško žemė                   | III grupė. Apsauginiai miškai          |                             |
| Ne miško žemė apauganti mišku   | IV grupė. Okiniai miškai               |                             |
| Koreguojami taksaciniai sklypai |  |                             |

*Baumis*

*Kaunas*

5


25

Balandinės g-ja, kv. 35, rem. kelio ilgis -1,1 km.

**LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS**

M 1:10000

Priedas Nr. 16.

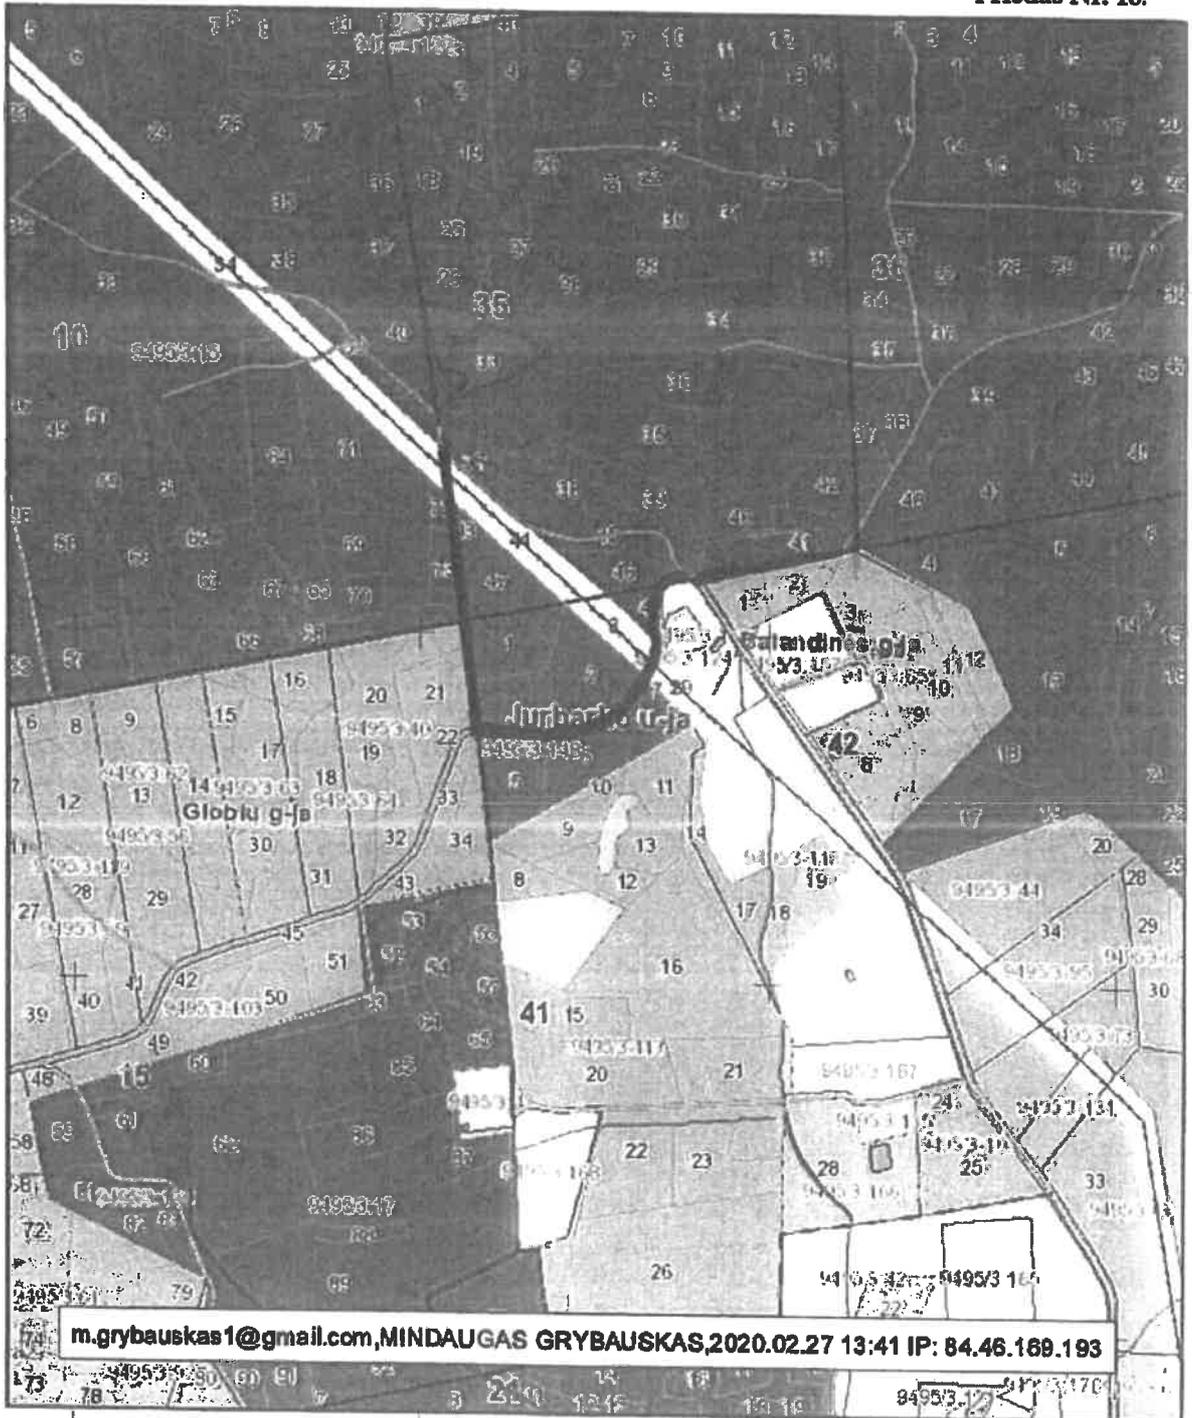

**VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA**  
 Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas, Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251  
 El paštas: [vm@amvmt.lt](mailto:vm@amvmt.lt), svetainė internete: [www.amvmt.lt](http://www.amvmt.lt)



**Sutartiniai ženklai**

- |                                 |  |                             |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Valdosa                         | I grupė. Rezervatiniai miškai          | Valstybinės reikėmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos         | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai |                             |
| Miško žemė                      | II B grupė. Rekreaciniai miškai        |                             |
| Ne miško žemė                   | III grupė. Apsauginiai miškai          |                             |
| Ne miško žemė apauganti mišku   | IV grupė. Ūkiniai miškai               |                             |
| Koreguojami taksaciniai sklypai |  |                             |

*Blaumant*

*[Handwritten signature]*


6

26

Balandinės g-ja, kv. 135-31, rem. kelio ilgis - 6,7 km  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
 KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:25000

Priedas Nr. 17.

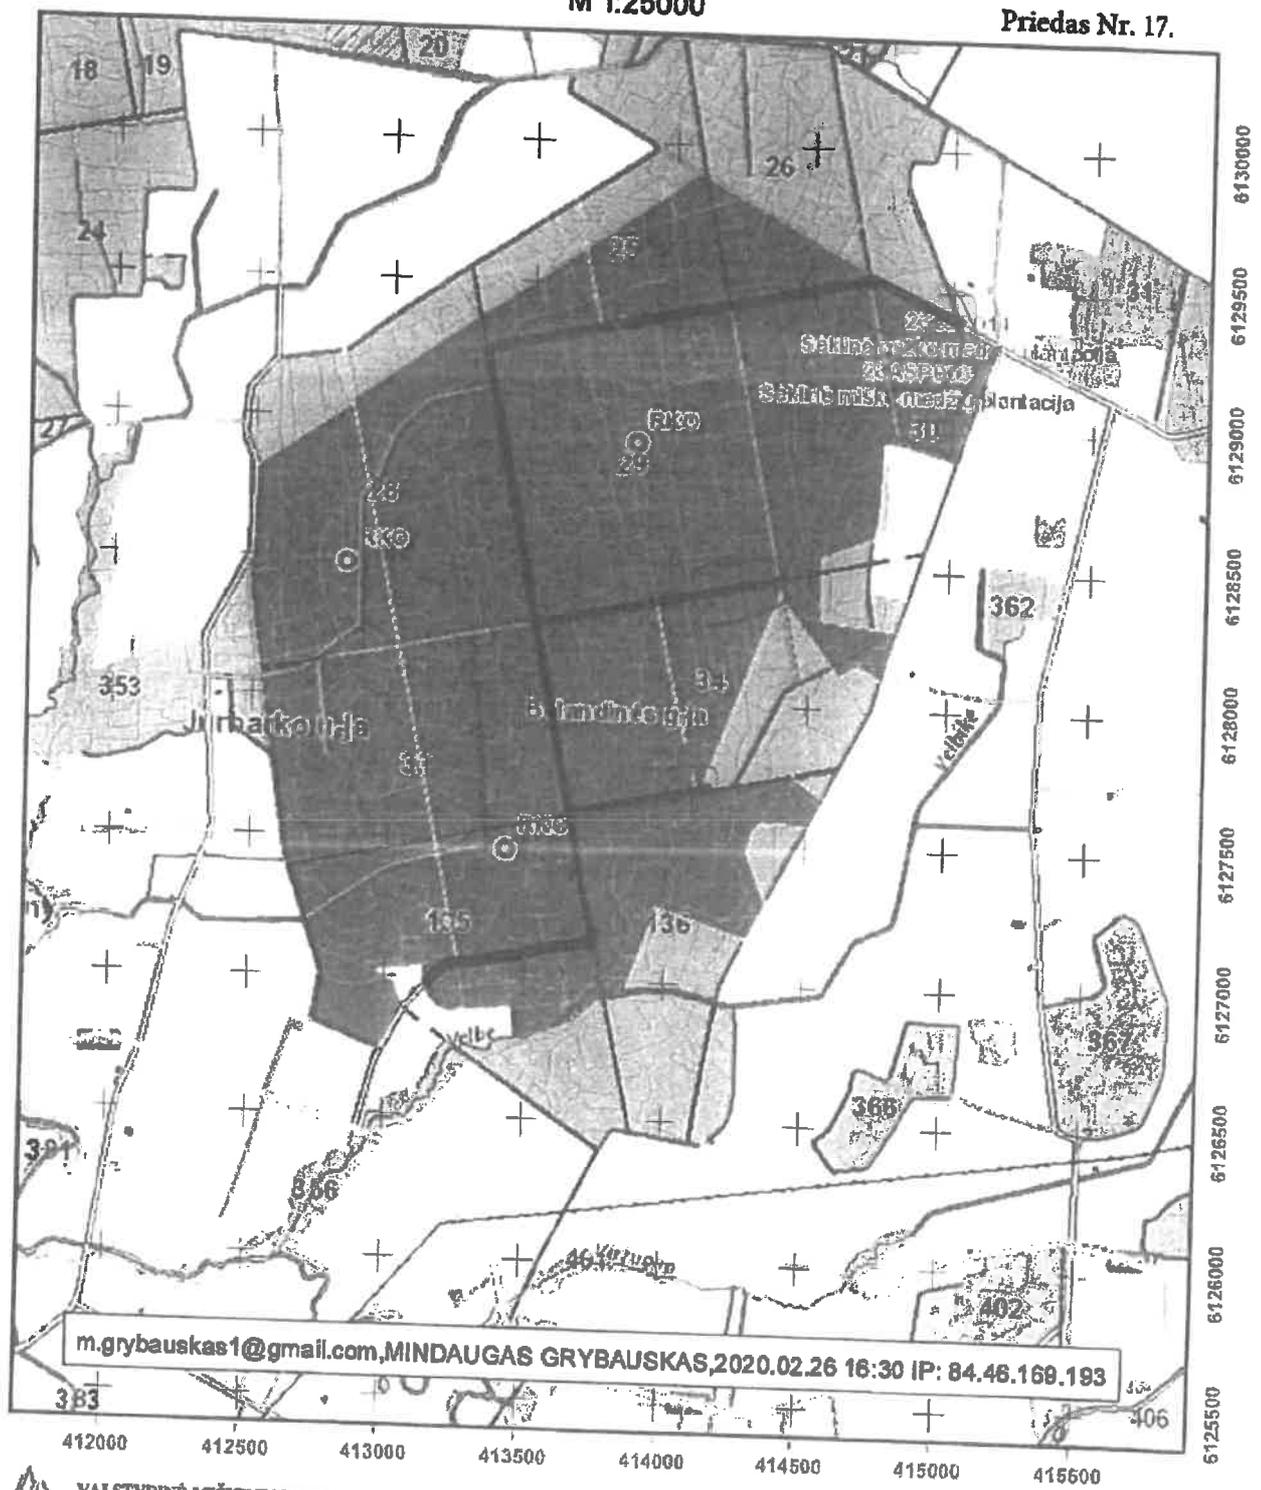

 VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA  
 Pramonto pr. 11a, LT-51327, Kaunas, Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251  
 El. paštas: [vmi@smvmt.lt](mailto:vmi@smvmt.lt), svetainė internete: [www.smvmt.lt](http://www.smvmt.lt)



Sutartiniai ženklai

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Valdosa                         |  I grupė. Rezervatiniai miškai          |  Valstybinės reikšmės miškai |
|  Taksacinių sklypų ribos         |  II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai |   |
|  Miško žemė                      |  II B grupė. Rekreaciniai miškai        |   |
|  Ne miško žemė                   |  III grupė. Apsauginiai miškai          |   |
|  Ne miško žemė apauganti mišku   |  IV grupė. Ūkiniai miškai               |   |
|  Koreguojami taksaciniai sklypai |  |   |

*Braunus*

*[Handwritten signature]*

7


27

Balandinės g-ją, kv. 48-59, rem. kelio ilgis - 2,1 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 18.

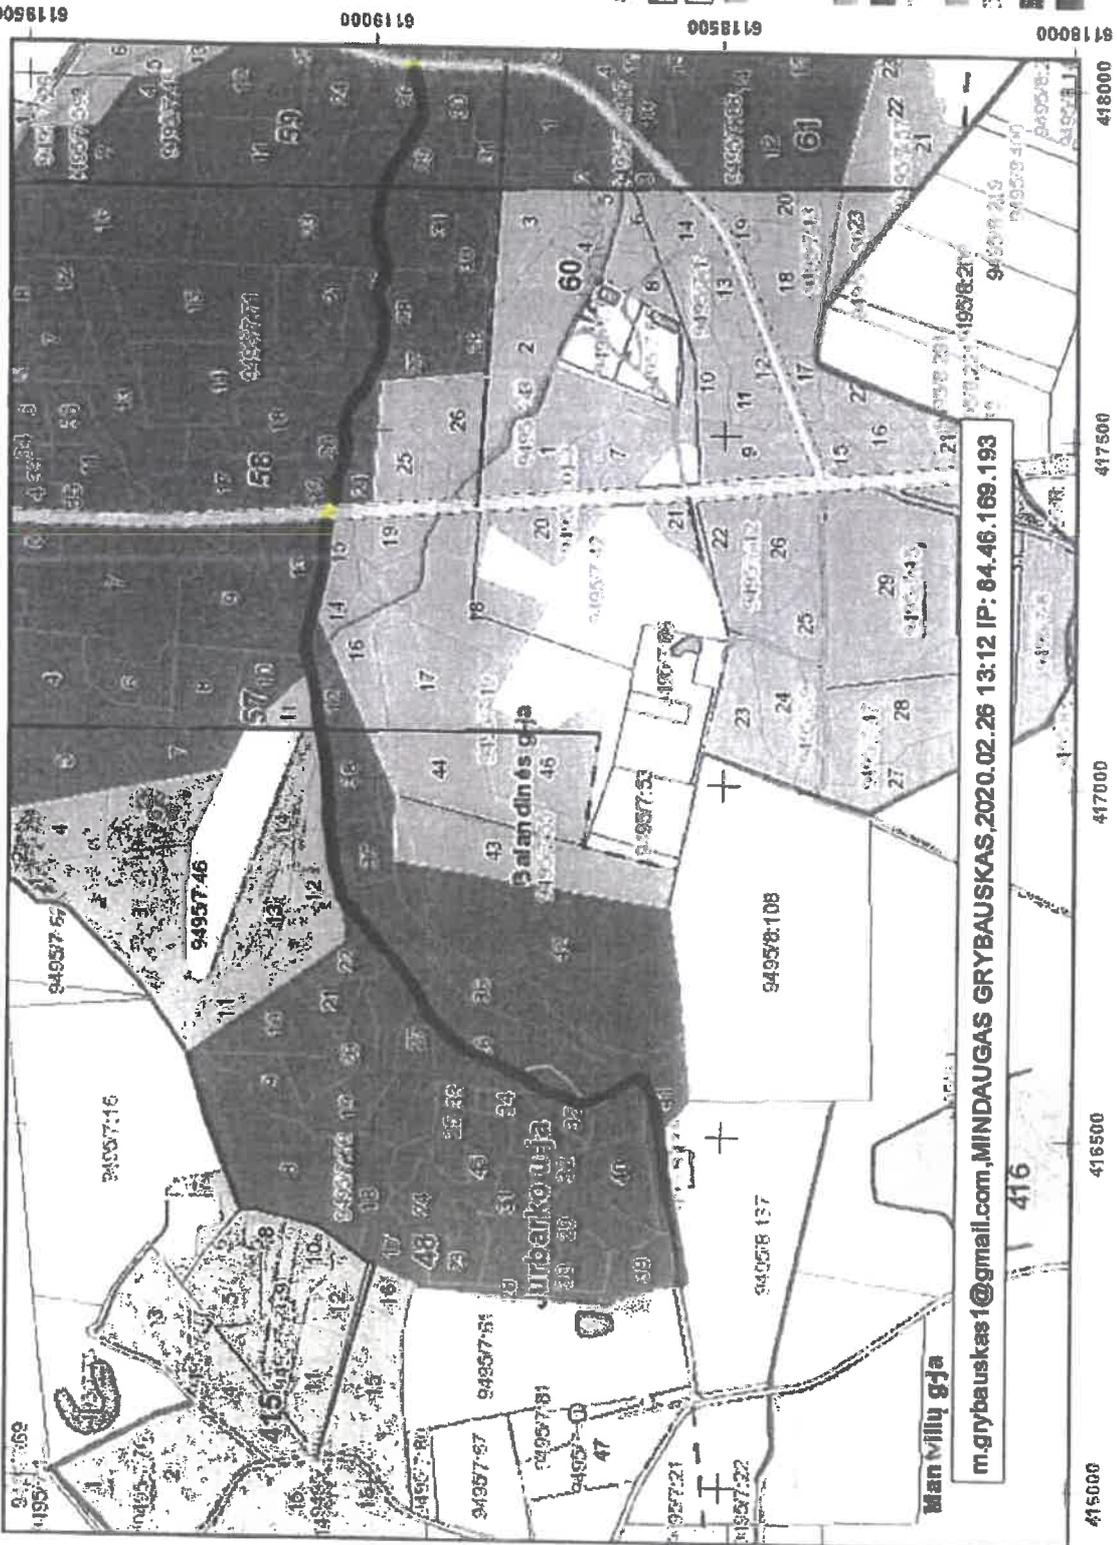

- Sutarfiniai ženkliai
- Valdos
  - Takacinių stūpyų ribos
  - Miško žemė
  - Ne miško žemė
  - Ne miško žemė apsaugamų miškų
  - Koreguojami takaciniai stūpai
  - I grupė. Rezerviniai miškai
  - II grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
  - III grupė. Rekreaciniai miškai
  - IV grupė. Apsauginiai miškai
  - V grupė. Ūkiniai miškai
  - Valstybinės reikšmės miškai

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.02.26 13:12 IP: 84.46.169.193


*Blacum*

*Blacum*

Veliuonos g-ja, 82, 75 - 84, rem. kelio ilgis - 1,2 km.  
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS  
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 8, 19.

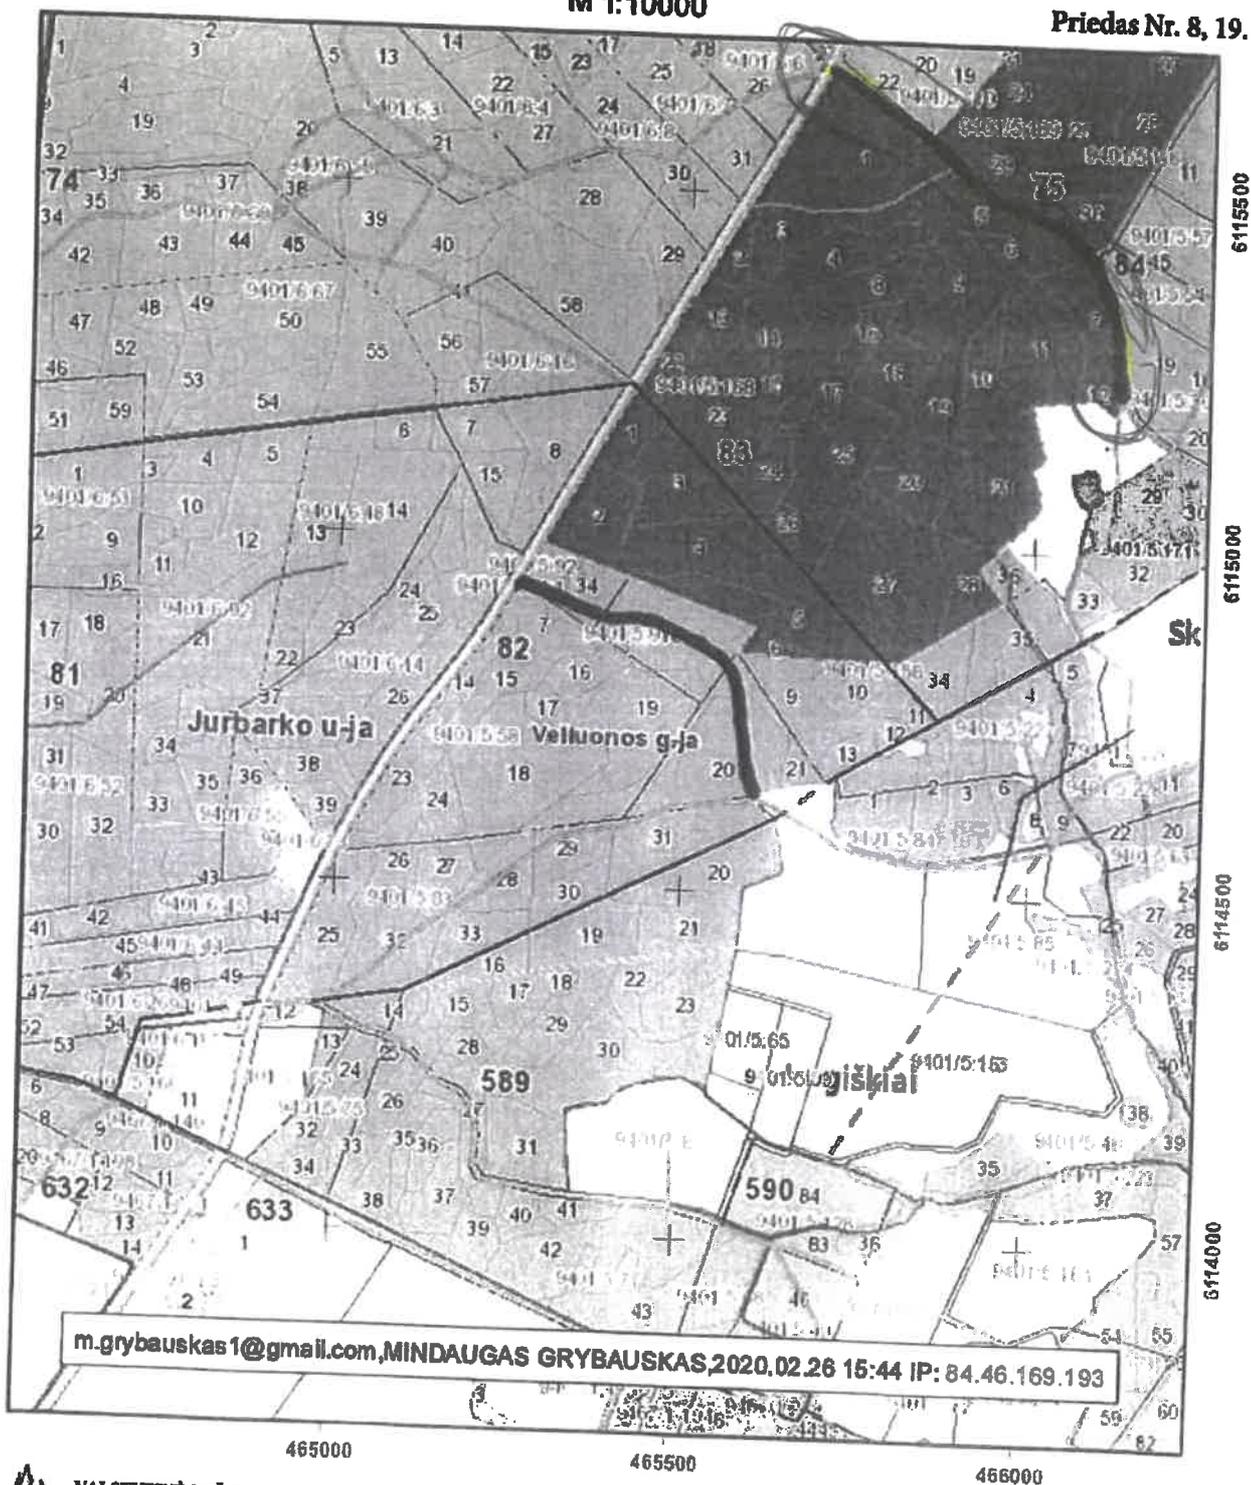

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS 2020.02.26 15:44 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA  
Pramonės pr. 11A, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490252, faks.: (837)490251  
El. paštas: vnt@anvmt.lt, svetainė internete: www.anvmt.lt



Sutarčiai ženkla

- Vaidos
- Taksacinių sklypų ribos
- Miško žemė
- Ne miško žemė
- Ne miško žemė apauganti mišku
- Koreguojami taksaciniai sklypai
- I grupė. Rezerviniai miškai
- II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
- II B grupė. Rekreaciniai miškai
- III grupė. Apsauginiai miškai
- IV grupė. Ūkiniai miškai
- Valstybinės reikėmės miškai

*Baumt*

*Manuy*

**VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS JURBARKO REGIONINIO PADALINIO  
PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ, KURIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO)  
DARBUS 2020 METAIS SIŪLOMA ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)*	Kelio pradžios koordinatės (WGS)	Kelio (ruožo) ilgis, km	Darbu rūšis: priežiūra / taisymas
1	Globių g-ja, kv. 26 skl. 10 - kv. 29 skl. 3	B: 22,6378879; L: 55,207318	3,75	Taisymas
2	Smalininkų g-ja, kv. 12 skl. 10 - kv. 38 skl. 10	B: 22,530378; L: 55,0773754	1,3	Taisymas
3	Balandinės g-ja, kv. 53 skl. 33 - kv. 50 skl. 31	B: 22,7684136; L: 55,2215831	3,25	Taisymas
4	Globių g-ja, kv. 15 skl. 49 - kv. 20 skl. 4	B: 22,6396739; L: 55,2293034	1,3	Taisymas
5	Balandinės g-ja, kv. 35 skl. 46 - kv. 35 skl. 43; kv. 35 skl. 41	B: 22,6538905; L: 55,2358477	1,1	Taisymas
6	Balandinės g-ja, kv. 135 skl. 29 - kv. 31 skl. 17	B: 22,6332823; L: 55,2705427	5,85	Taisymas
7	Balandinės g-ja, kv. 48 skl. 39 - kv. 59 skl. 26	B: 22,6852018; L: 55,1955583	2,1	Taisymas
8	Velluonos g-ja kv. 75 skl. 22 - kv. 84 skl. 19	B: 23,4615087; L: 55,175407	0,7	Taisymas
Iš viso:			19,35	

*Blažius*  
*Blažius*

*Šaunus*  
*Šaunus*

30



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6165

**Remigijus Pužas**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

06739

Išduotas 2013 m. birželio 20 d.  
Pirma karta išduotas 1998 m. rugsejo 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15405

**Remigijus Pužas**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai.  
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

L.e.p. direktorius



Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2015 m. sausio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 15 d.


Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

12101

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

1. Globių g–ja kv. 26 skl. 10 – kv. 29 skl. 3

Situacijos planas M1:25000

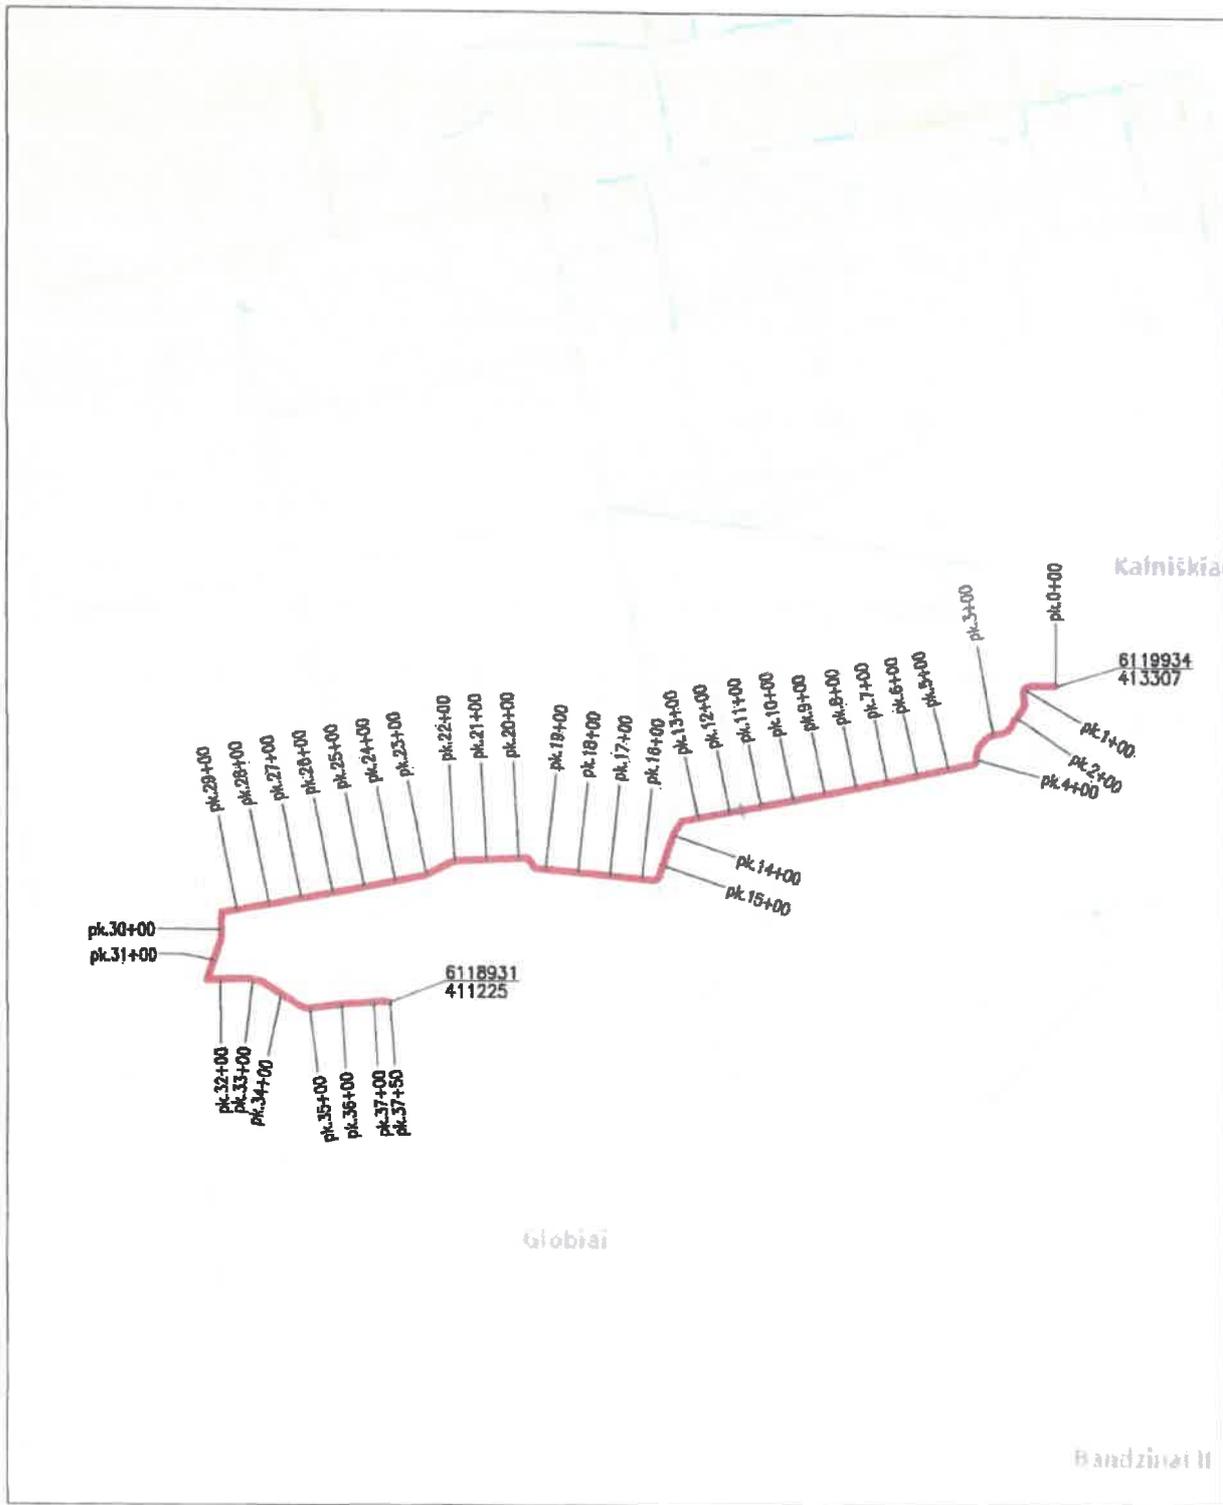

— Remontuojamas kelias


*Borenius*

*Štany*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

2. Smalininkų g–ja kv. 12 skl. 10 – kv. 38 skl. 10

Situacijos planas M1:25000

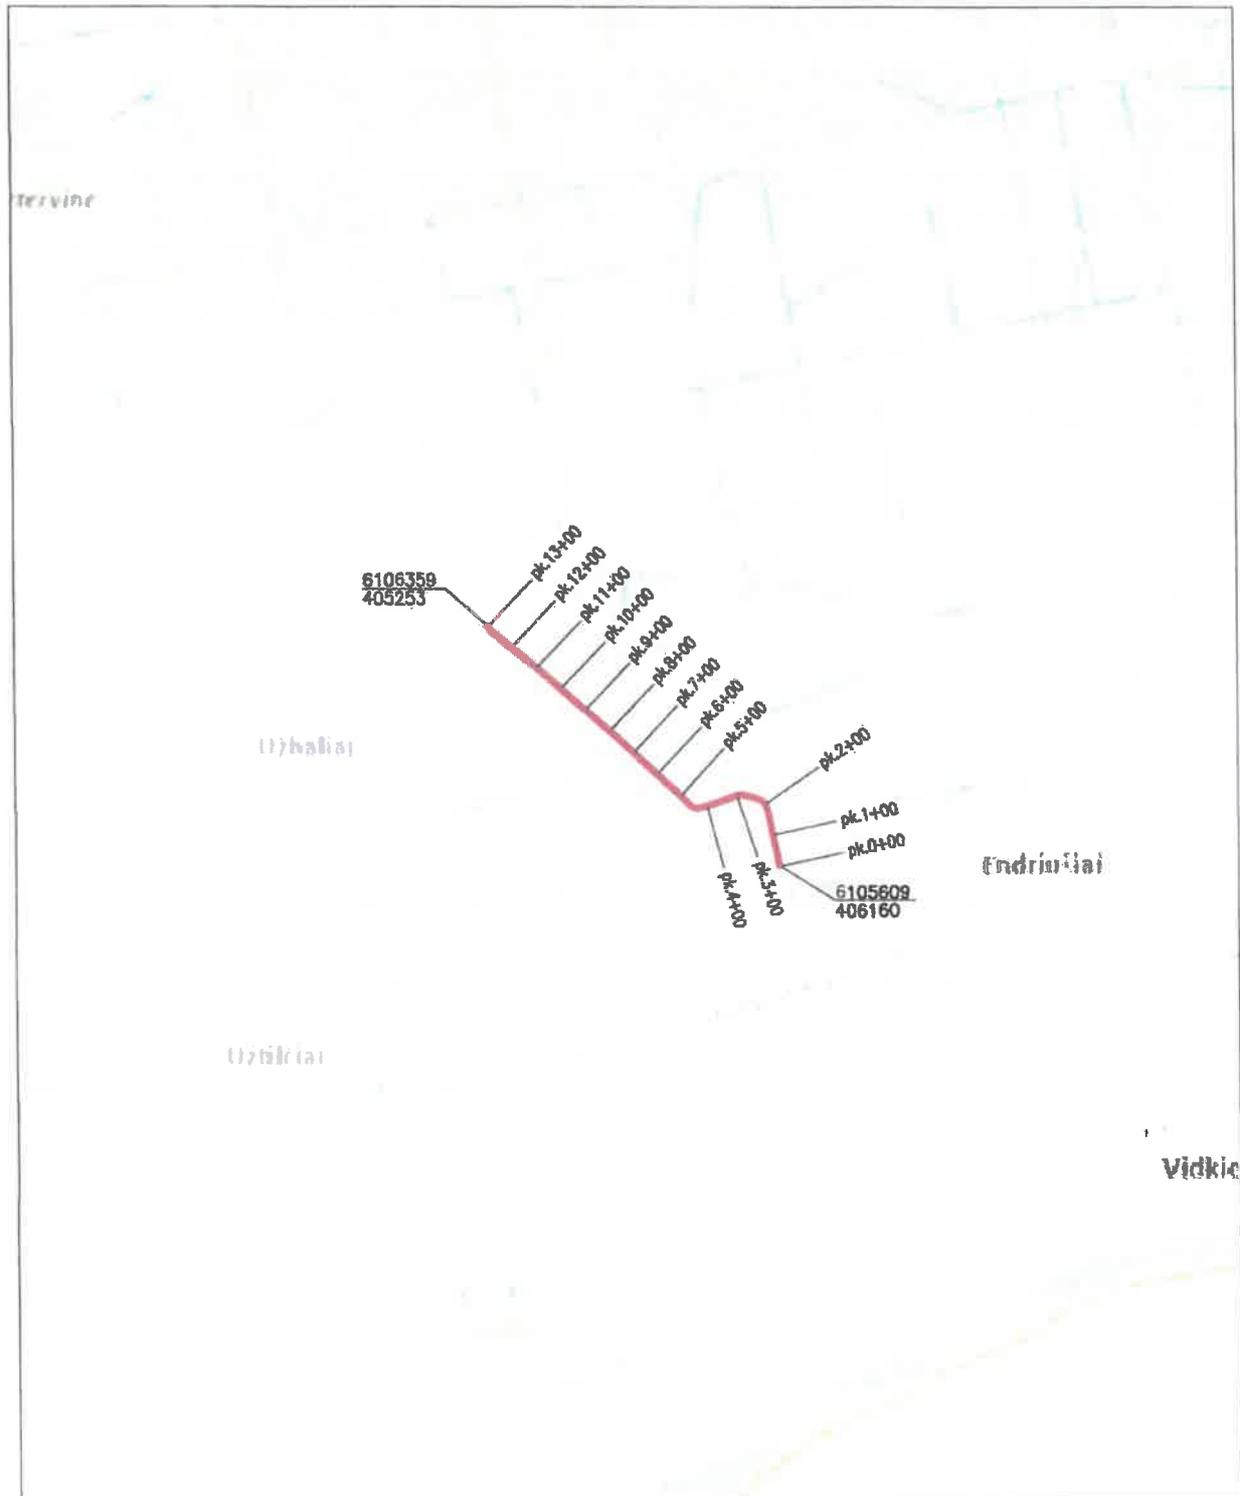

— Remontuojamas kelias


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

V) Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

3. Balandinės g-ja kv. 53 skl. 33 – kv. 50 skl. 31

Situacijos planas M1:25000

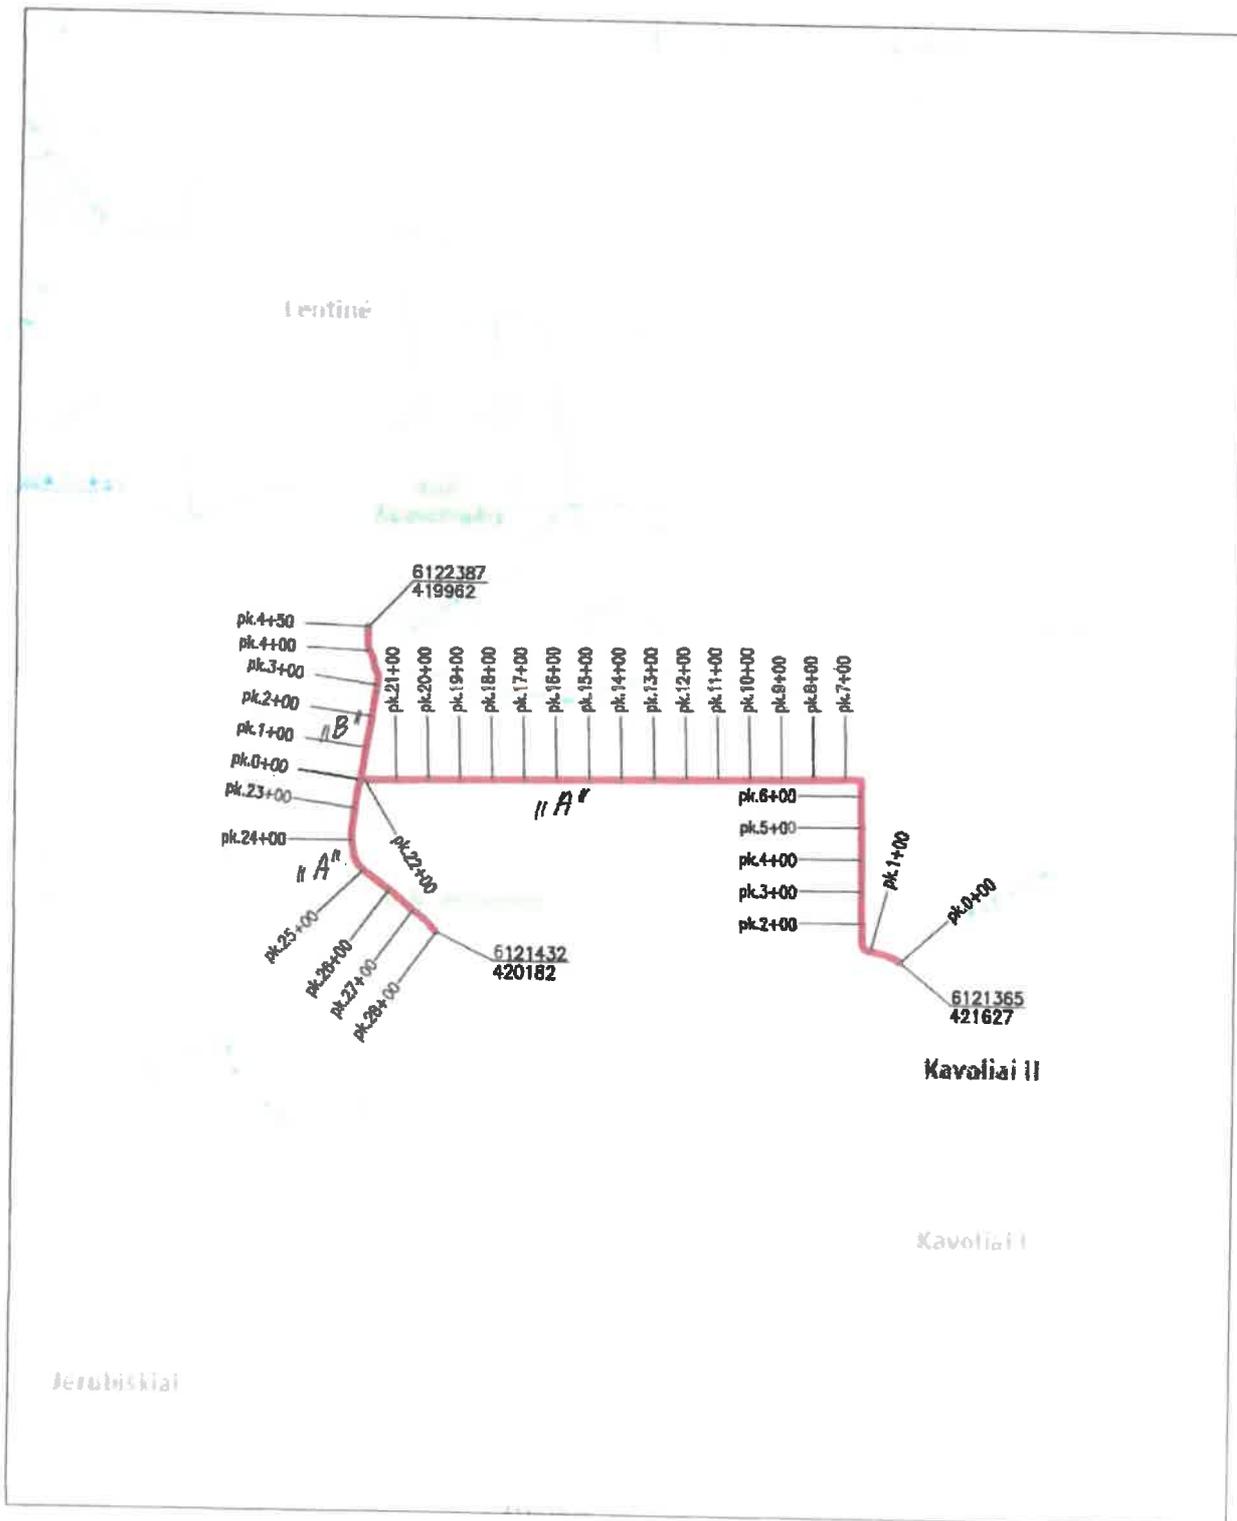


— Remontuojamas kelias

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03-Balandinės girininkija Kv. 53 skl. 33 – Kv. 50 skl. 31

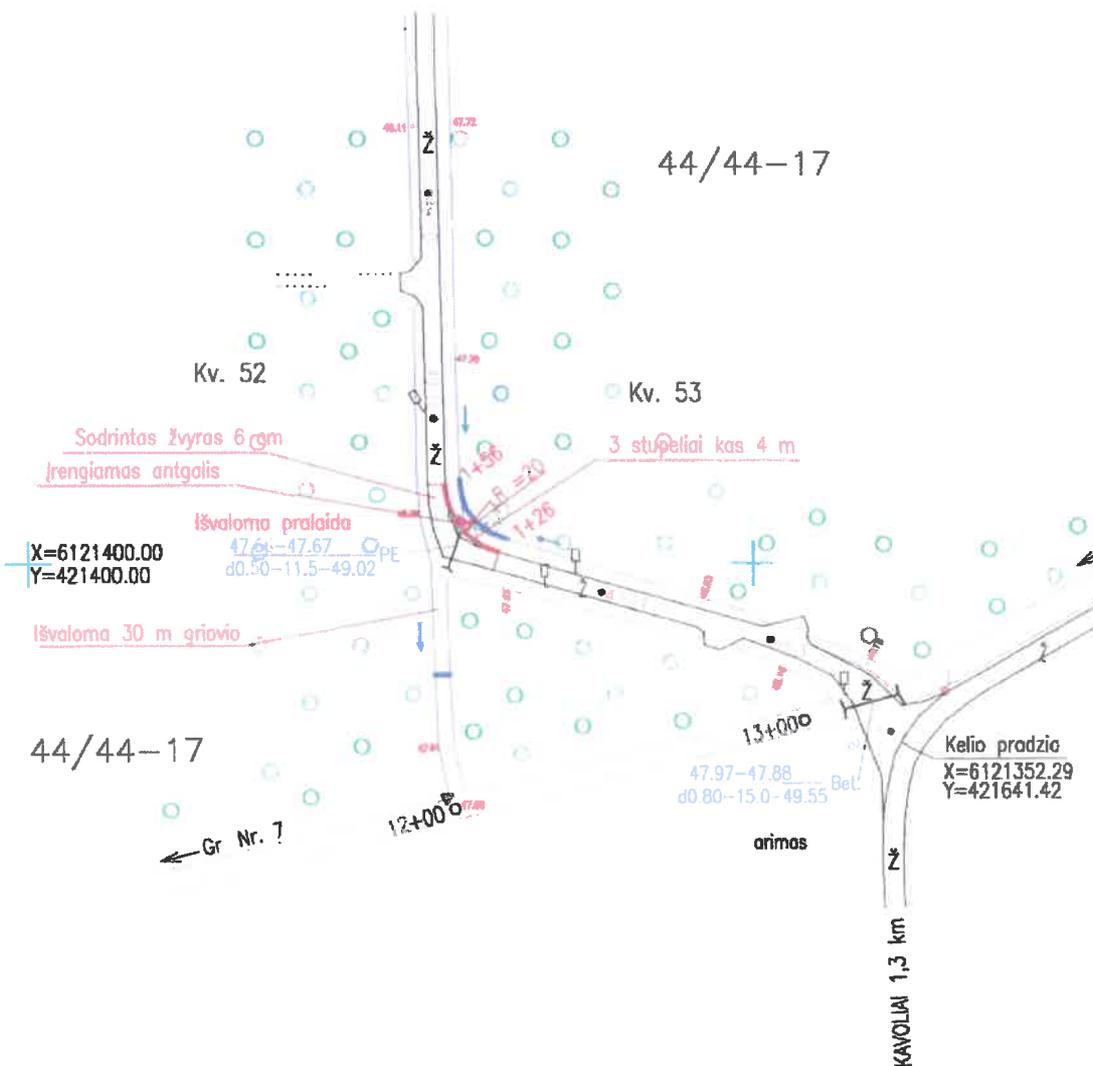


*Beaune*

*Šaunus*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

4. Globių g–ja kv. 15 skl. 49 – kv. 20 skl. 4

Situacijos planas M1:25000

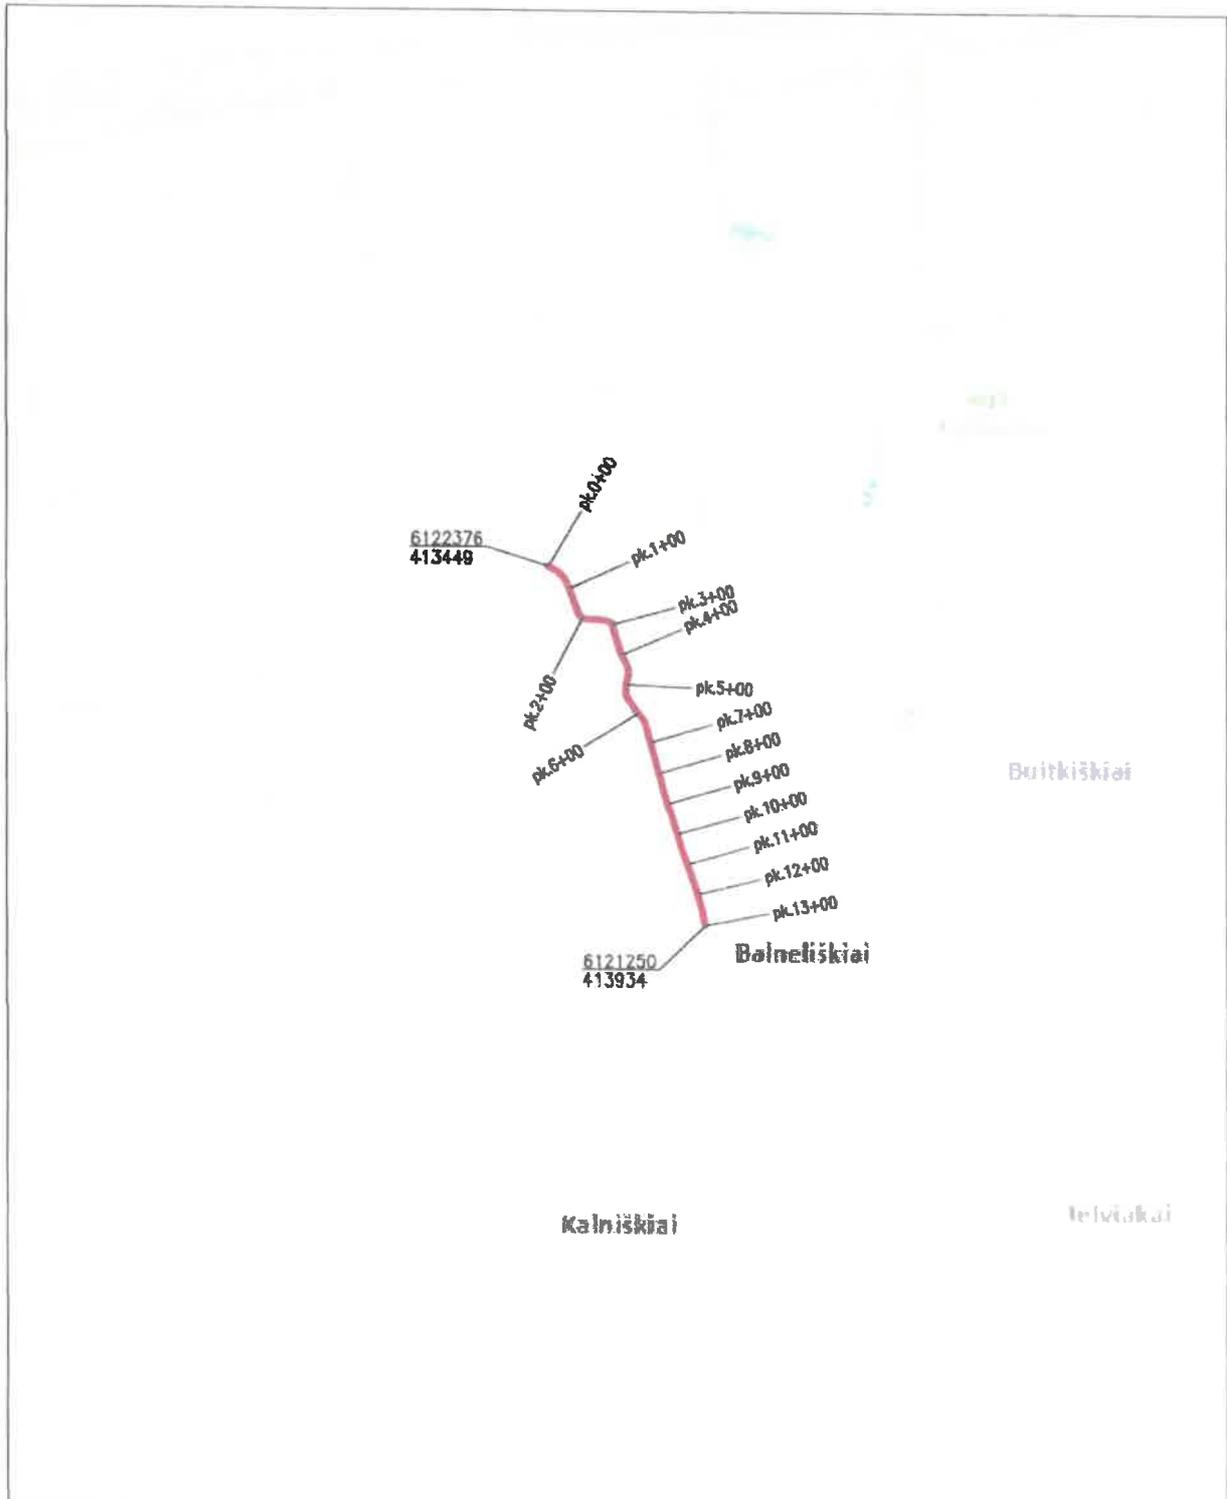

— Remontuojamas kelias


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

5. Balandinės g–ja kv. 35 skl. 46 – kv. 35 skl. 43; kv. 35 skl. 41

Situacijos planas M1:25000

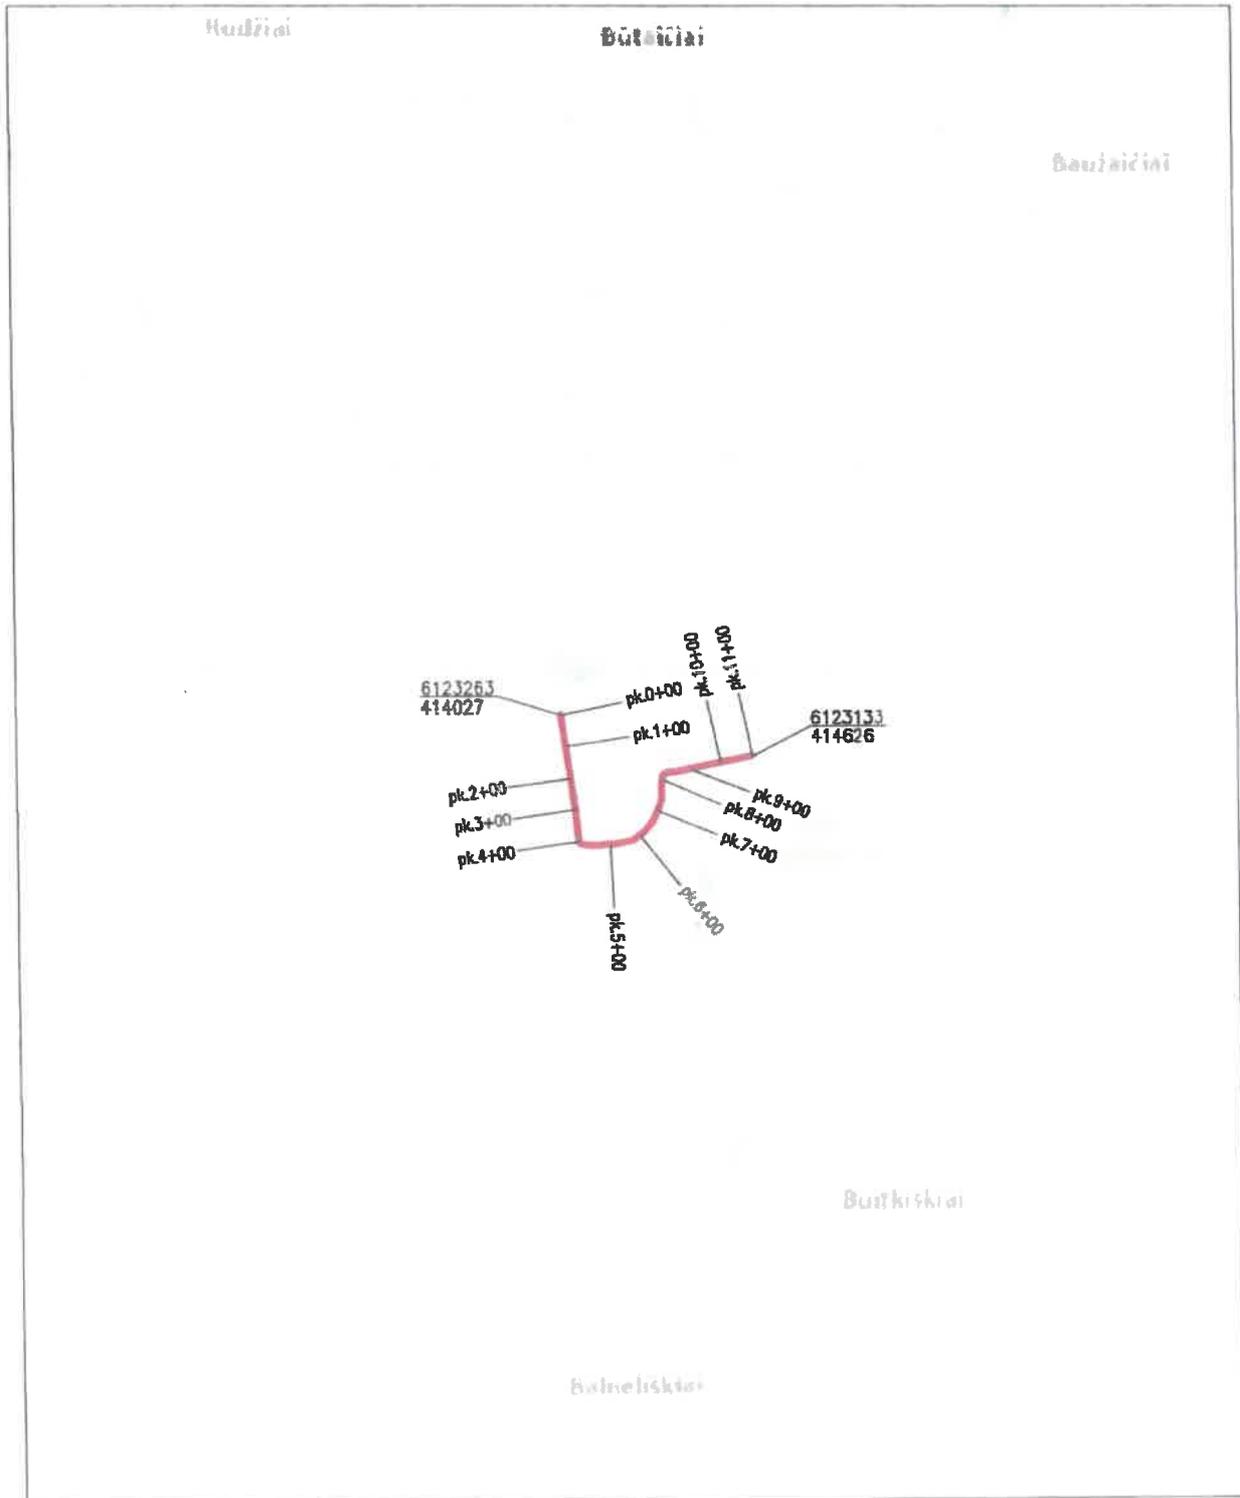

— Remontuojamas kelias


*Beausis*

*Šaukus*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

6. Balandinės g–ja kv. 135 skl. 29 – kv. 31 skl. 17

Situacijos planas M1:25000

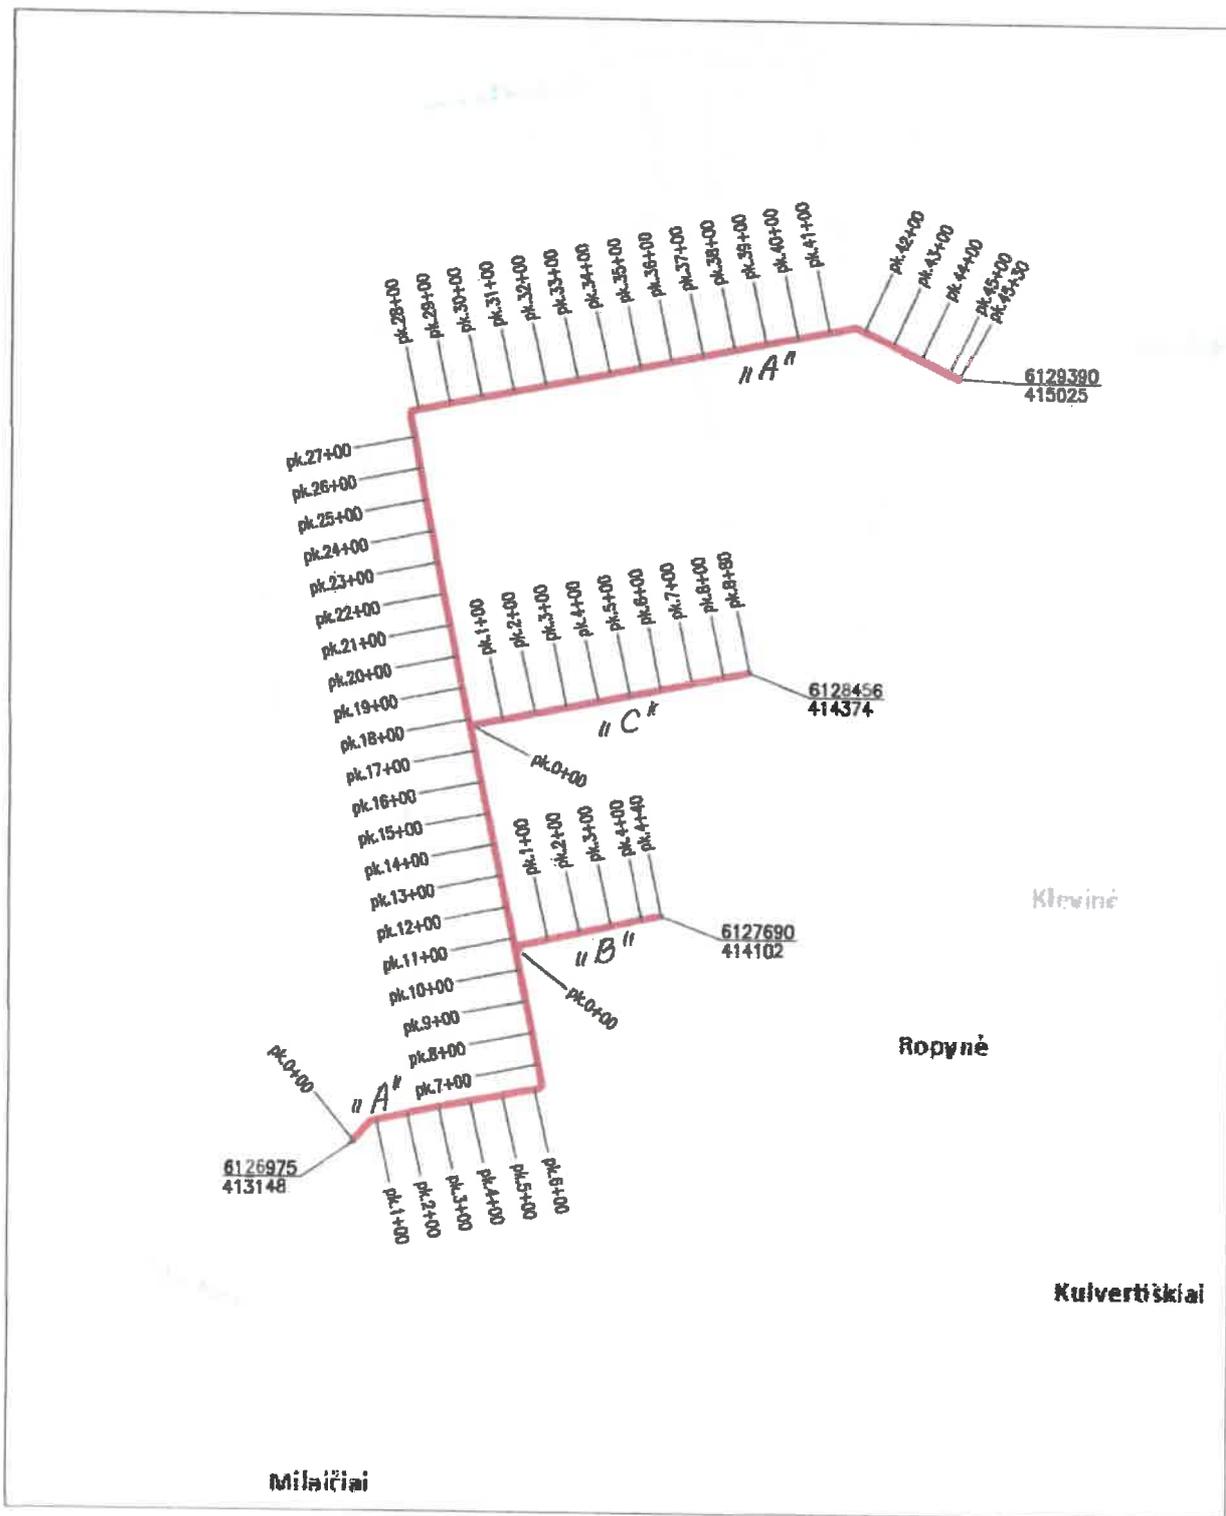

— Remontuojamas kelias


*Bellus*

*Ramus*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

7. Balandinės g–ja kv. 48 skl. 39 – kv. 59 skl. 16

Situacijos planas M1:25000

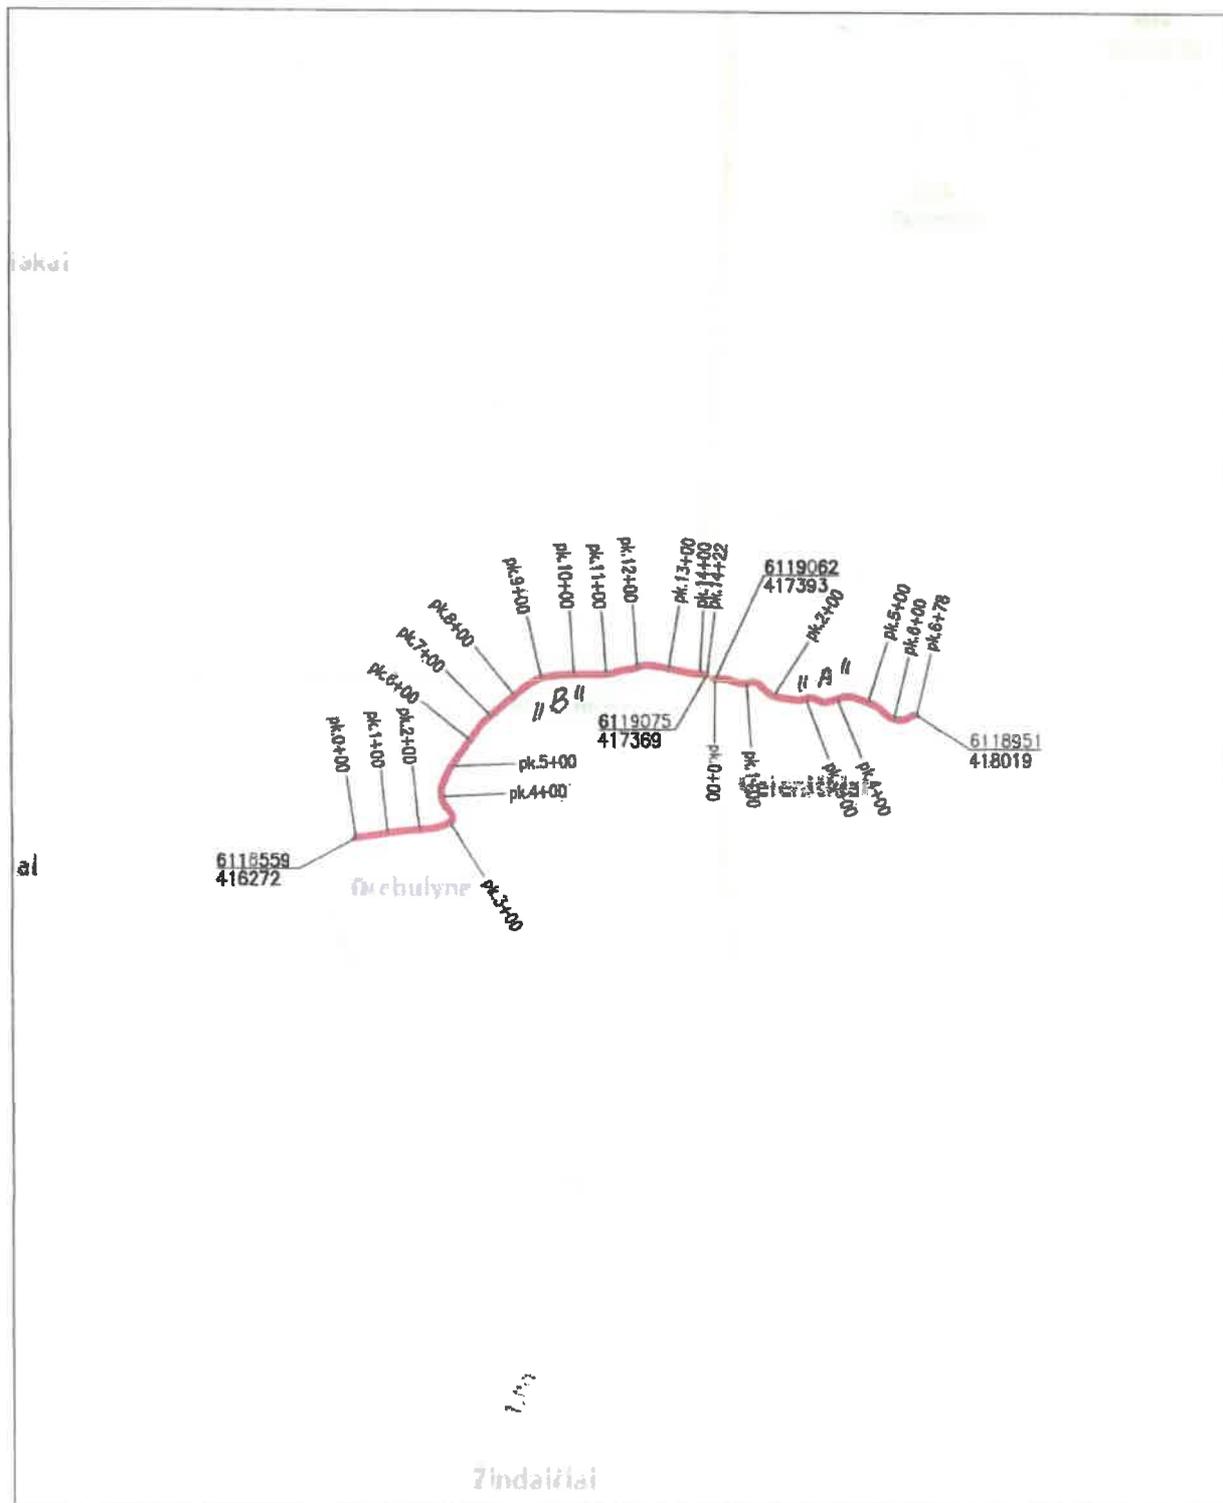

— Remontuojamas kelias


*Baumant*

*Šaunys*

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

8. Veliuonos g–ja kv. 75 skl. 22 – kv. 84 skl. 19

Situacijos planas M1:25000

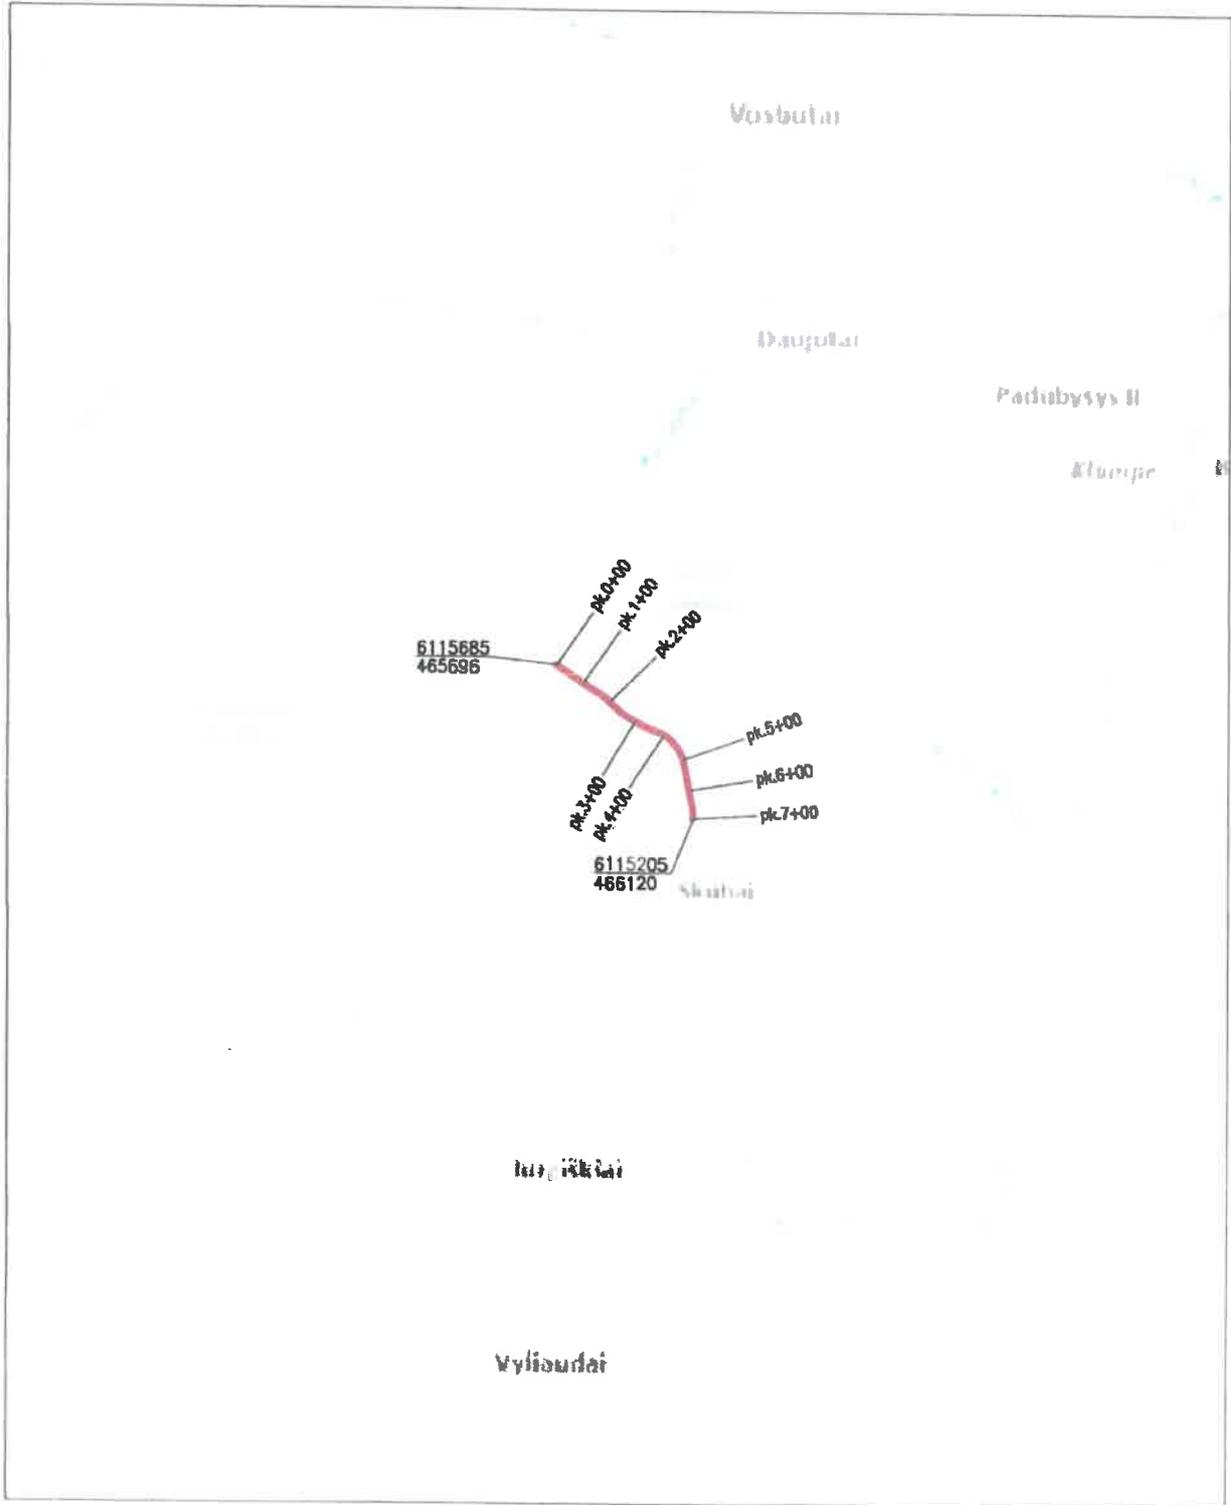

— Remontuojamas kelias

*Baranavičius*

*Baranavičius*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURMELSTA“**  
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas  
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

VĮ Valstybinių miškų urėdija

**PASIŪLYMAS  
DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ  
NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE PIRKIMO**

2021 m. spalio 13 d. Nr. 2-1024  
(Data)  
Jurbarkas  
(Sudarymo vieta)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Jurmelsta“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	158257064
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT582570610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: 1) Tiekėjo vadovas; 2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šios sutarties sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio sutartį ir(ar) ją pasirašys**; 3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. <i>*Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys; **Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.</i>	<b>Būtina nurodyti:</b> 1) Kęstutis Naujokas; 2) Kęstutis Naujokas; 3) Virginija Pocienė.
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	

Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kęstutis Naujokas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	

## 2. INFORMACIJA /APIE ŪKIO SUBJEKTUS/ IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į tikslų Specialiųjų sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.				
2.				

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas <sup>1</sup>	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.			
2.			

## 3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

1 pirkimo objekto dalis Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 18.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina <sup>2</sup> , Eur be PVM
18.	Globių g-ja, kv.15, skl.49 - kv.20, skl.4	
Pasiūlymo kaina <sup>3</sup> (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiuta)
PVM* (nurodyti procentą)		

<sup>1</sup> Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

<sup>2</sup> Vertė įrašoma iš objekto Darbu lokalinės samatos (Specialiųjų sąlygų 4 priedas)





Skelbiamų apklausos Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
<b>Pasiūlymo kaina</b> (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

\* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

2 pirkimo objekto dalis Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 21.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina <sup>2</sup> , Eur be PVM
21.	Balandinės g-ją, kv.48, skl.39 - kv.59, skl.26,.19	
<b>Pasiūlymo kaina<sup>3</sup> (be PVM) (objekto kainų suma)</b>		<u>10861,34 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
<b>PVM* (nurodyti procentą)</b>		<u>2280,88 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
<b>Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)</b>		<u>13142,22 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

\* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

3 pirkimo objekto dalis Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.23

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina <sup>2</sup> , Eur be PVM
23.	Veliuonos g-ją, kv.75, skl.22 - kv.84, skl.	
<b>Pasiūlymo kaina<sup>3</sup> (be PVM) (objekto kainų suma)</b>		<u>3923,48 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
<b>PVM* (nurodyti procentą)</b>		<u>823,93 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
<b>Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)</b>		<u>4747,41 Eur.</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

\* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

#### 4. KITA INFORMACIJA

<sup>2</sup> Vertė įrašoma iš objekto Darbų lokalinės samatos (Specialiųjų sąlygų 4 priedas)

<sup>3</sup> Vertė įrašoma susumavus objekto kainas. Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas laimėjusiam dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Skelbiamų apklausos Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Įgaliojimas	Pasiūlymas	Ne	
2.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai	Pasiūlymas	Ne	
3.	Darbų lokalinės sąmatos	Pasiūlymas	Taip	Kaina

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.15.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar šie reikalavimai keliami nustatyta Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje) patvirtinančių dokumentų. Su jais VMU gali susipažinti\*\*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
1	2	3
2		
3		
...		

\*\*Pildoma, jei VMU jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes esame / nesame (**nereikalingą išbraukti**) laikomi asocijuotais (susijusiais) su VMU pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės ADB „Giensidige“ pasiūlymo laidavimo raštą 150.00 Eur. vertės.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

UAB „Jurmelsta“ direktorius Kestutis Naujokas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Užsakovas: .....  
Rangovas: .....

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
P A Ž Y M A Nr.

2021 m. .... mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AM Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(eurais, ct)									
					Nuo statybos pradžios		Nuo metų pradžios		Per atskaitinį laikotarpį											
					Darbu vertė	PVM	Darbu vertė	PVM	Darbu vertė	PVM		Iš viso	Iš viso							
1		S-000	Rs - 1																	
2			Rs - 2																	
3																				
4																				

Techninis prižiūrėtojas: .....  
Atestato Nr. ....

Užsakovas: .....

2021 m. .... mėn. .... d.

Rangovas: .....  
A. V.  
2021 m. .... mėn. .... d.

