

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE RANGOS SUTARTIS

2021 m. liepos 30 d. Nr. 2021-65-21

Raseiniai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama Raseinių regioninio padalinio vadovo *Gintaro Červoko*, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 1 3 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus *Kęstučio Naujoko*, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas:

1.1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio Birbiliškės ir Viduklės girininkijų miško kelių rangos darbų, kurie vykdomi vadovaujantis Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas), Birbiliškės ir Viduklės girininkijų miško kelių paprastojo remonto aprašu (toliau – Aprašas) (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), (toliau – Darbai) pirkimas-pardavimas.

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės:

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas, nustatytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Kainodaros taisyklių nustatymo metodika).

2.2. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos¹, 2.11 ir 36.2.3 papunkčiuose) yra 12236,29 Eur. (dvylika tūkstančių du šimtai trisdešimt šeši eurai, 29 cent.) be PVM. Sutarties vertė su PVM yra 14805,91 Eur. (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai penki eurai 91 cent.), 21 proc. PVM yra 2569,62 Eur. (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 62 cent.).

2.3. Sutartyje Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys pradinės Sutarties vertės. Į pradinę Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. y. visą riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pradinę Sutarties vertę ar Darbų įkainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės ar Darbų įkainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė ar Darbų įkainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas).

2.5. Šalys susitaria, kad Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti keičiami (koreguojami), suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo atstovų, Miško infrastruktūros skyriaus atstovų ir projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai

galimi, kai užtikrinamos tapačios sprendinių charakteristikos arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą inicijuoja Rangovas ir tai iššaukia būtinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darbų vykdymų pagal keičiamus sprendinius, pradžios savo resursais.

2.6. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

2.7. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaitoma su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai priimami Šalims pasirašant atliktų darbų aktą (toliau – Aktas). Aktą rengia Rangovas. Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – Pažyma) (Sutarties 4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas ir darbų techninis priežiūrėtojas. Užsakovas jam pateiktus šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkis) darbo dienas ir pasirašyti arba pareikšti pastabas.

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu.

3.4. Rangovas įsipareigoja atlikęs Darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovas sąskaitose nurodo šios Sutarties datą bei numerį, taip pat, kad sąskaita „skirta VĮ Valstybinių miškų urėdijos (įrašyti pavadinimą) regioniniam padalinii“. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais², laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

3.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

3.6. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.8. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

4. Užsakovo teisės ir pareigos:

4.1. Pateikti Rangovui Aprašą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti.

4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytomis sąlygomis.

4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus.

4.4. Jei Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Apraše (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus

pašalinti.

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Užsakovo teisėmis.

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas Darbų techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Darbų techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Darbų techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Darbų techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) (pagal darbo sutartį) ar juridinį (-ius) asmenį (-ius).

5. Rangovo teisės ir pareigos:

5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte nurodytu terminu ir baigti per 60 darbo dienų terminą nuo Darbų pradžios. Pastarasis terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui esant šioms aplinkybėms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikelčia Užsakovo poreikis Darbams.

5.2. Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Aprašu (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais.

5.3. Pagal Rangovo pasiūlymą (Sutarties 3 priedas) Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darbų atlikimui naudoti papildomą 61 m³ medžiagos (žvyro) kiekį.

5.4. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba neatitikimus Projekte bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti.

5.6. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir/ar Darbų techninio priežiūrėtojo rašytinius nurodymus.

5.8. Iki Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir Darbų techninio priežiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, privažavimo kelius iki objekto ir aplinkines teritorijas, jei jie buvo sugadinti.

5.9. Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus Darbų trūkumus.

5.10. Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.

5.11. Užtikrinti privažavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkamą eksploatavimą, o sugadinimo atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.

5.12. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų laikymąsi objekte, nekaupiti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų materialinių vertybių apsaugą.

5.13. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu.

5.14. Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų garantinį laiką. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškęjusius per garantinį laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.15. Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų atidavimo naudoti dienos.

5.16. Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, atliktų

Darbų kiekį ir kainas.

5.17. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.

5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

6. Sutarties vykdymas, keltimas, nutraukimas:

6.1. Darbų pradžia – Šalims pasirašius Sutartį.

6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų nuo Darbų pradžios. LR aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo Užsakovui arba Užsakovui neskyrus įmonės lėšų, Darbai nepradedami, ši Sutartis nevykdoma, Šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.

6.3. Sutartis galioja iki abipusio sutartinų įsipareigojimų įvykdymo.

6.4. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų.

6.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

6.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatytais atvejais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susijusias ir pagrįstas Rangovo išlaidas.

6.7. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

6.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus nuostolius ar/ir išlaidas ir/ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.

6.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

6.10. Rangovas negali perleisti kam nors visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, išskyrus Sutarties 9 punkte nurodytą atvejį.

6.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu.

6.12. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

6.13. Vykdamą Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos klaidų šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.14. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas.

7. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą

7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % (nullo ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Šiame punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų, vėliau Rangovui neužbaigus Darbų taikoma 10 % (dešimties procentų) bauda nuo visos pradinės Sutarties vertės, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės 6.9 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % (dešimties procentų) baudą nuo visos pradinės Sutarties vertės, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui

pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką, kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui vieno tūkstančio eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio priežiūrėtojo nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius ir/arba baudą, nurodytus Sutartyje.

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.6. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Užsakovas moka Rangovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą bei, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas.

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur. (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (FORCE MAJEURE)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų neįvykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Subranga:

9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teisę pasitelkti šiuos subrangovus/subtiekėjus: */šiuose punktuose įrašyti, kad subtiekėjai/subrangovai nepasitelkiami arba nurodyti šiuose ūkio subjektas ir užduotis, kurioms jie pasitelkiami/.*

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekėjai gali būti keičiami, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. Subrangovai/subtiekėjai/ gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju galimybė. Toks atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštarauja Sutarties Šalys ir subrangovas/subtiekėjas. Subrangovas/subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos/subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Šiuose punktuose nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

10. Papildomi darbai

10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarties įvykdyti (užbaigti) priežiūros ir taisymo (remonto) darbai, ir Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios Sutarties vertę. Neatliekami darbai – Darbai ar Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas. Šiuose punktuose nurodyti Darbai nepaneigia ir neprieštarauja Sutarties 3.5 punkte nustatytam Rangovo atliktų Darbų įvertinimui ir atsiskaitymui.

10.2. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

10.2.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

10.2.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

10.2.1.2 reikalingų atlikti papildomų darbų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.2.1.3 įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.2.2 ir bent vienai iš šių priežasčių:

10.2.2.1 kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

10.2.2.2 kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

10.3. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsakyti Sutartyje numatytų Darbų daliai.

10.4. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 10.2 punkte, papildomiems darbams įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

10.5. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.5.1 paaiškęs aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projektuotojo suderinimą ir Darbų techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis);

10.5.2 gavęs Sutarties 10.5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis

patelktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.5.3 Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu;

10.5.4 Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.5.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas susiderinęs su Miško infrastruktūros skyriaus atstovais pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

10.5.5 gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, samatiniais skaičlavimais ir kitais būtinais dokumentais.. Visus parengtus dokumentus Darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia projektuotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomus darbus;

10.5.6 Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą;

10.5.7 tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslų papildomų darbų ar apimčių kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.5.1 – 10.5.4 papunkčiuose, Šalys per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.

10.6. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti darbų techninis priežiūrėtojas.

10.7. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu.

10.8. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį ir papildomus darbus.

10.9. Papildomų darbų kaina nustatoma:

10.9.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba;

10.9.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba;

10.9.3 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.1 – 10.9.2 papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo³, galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą (nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente).

10.9.4 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.3 papunktyje nurodytų įkainių. Tokiu atveju įkainių kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar įrengimams išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

10.10. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

10.11. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime.

11. Asmens duomenų tvarkymas:

11.1. Šalys įsipareigoja:

11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios

³ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

11.1.3. neatskleisti ir nesutelkti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;

11.1.5. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją, bus paviešinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Šalis įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikalauja Sutarties tinklei vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

12.2. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui (subrangovui) būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąrašė), šią informaciją gaunantis asmuo privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Užsakovo patvirtintos formos įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos.

12.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, įskaitant ir Rangovo reikalavimo teisę, jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registracijos vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.6. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant Sutartį skiria:

12.6.1 už Sutarties administravimą, vykdymą bei Siskaitu priėmimą atsakingu(-a): *Medienos ruošos ir prekybos vadovas*

12.6.2 už Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę atsakingi: *Viduklės girininkijoje – girininkas*

Birbiliškės girininkijoje – girininkas

Medienos, 0-011-12041, nerijus.0000

12.6.3 už Sutarties, jos pakeitimų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakingu(-a): *Užsakovo Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė*

12.7. Rangovas, sudarant Sutartį, skiria už Sutarties vykdymą atsakingu(-a): *(pareigos, vardas, pavardė, elektroninis paštas ir telefono numeris).*

12.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.9. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Sutarties priedai:

1 priedas. Miško kelio tiesimo (statybos) techninė specifikacija.

2 priedas. Birbiliškės ir Viduklės girininkijų paprastojo remonto aprašas, elektroniniu paštu.

3 priedas. Rangovo pasiūlymas.

4 priedas. Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma.

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys,
Akacijų g. 1, Norgėlių km., Raseinių raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
El. p. raseiniai@vmr.lt
Tel. 8 303 50000

Rangovas

UAB „Jurmelsta“
Pramonės g. 1, Jurbarkas, LT-741111
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas LT582570610
El. p. sekretore@jurmelsta.lt
Tel. 8 315 20000
Bankas AB bankas "Swedbank"
A.s. LT697300010130175336

Sutarties rengėjas (s): Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninis padalinys (toliau – VMU), adresas Akacijų g. 1, Norgėlių k., Raseinių r.sav., Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: medienos ruošos ir prekybos vadovas A. [išbrauktas] (tel. +370 [išbrauktas])
2. OBJEKTAS	VMU prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašo objektai Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23 (toliau – Sąrašas) (Specialiųjų sąlygų 12 priedas).
3. OBJEKTO ADRESAS	VMU teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai II, - IV, kategorijos
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas)
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	Nurodytuose objektuose bus prižiūrimi ir/arba taisomi (remontuojami) miško keliai arba kelio atkarpos pagal parengtus paprastojo remonto aprašus (toliau – Aprašai), (Specialiųjų sąlygų 10 priedas) vadovaujantis 2015 gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisiekiama komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai.
9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	Darbų atlikimo terminas per 60 darbo dienų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo.
10. BVPŽ kodas	45233142-6

Pirkimo objekto dalių aprašymas

1 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše nurodyti objektai Nr. 21,22,23.

VĮ VMU RASEINIŲ REGIONINIO PADALINIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Remontuojamo kelio parametrai pateikti techniniuose rodikliuose, remonto konstrukciniai sprendiniai nurodyti brėžiniuose.

Miško kelio parametrai:

Darbų rūšis	Paprastasis remontas
Kelio kategorija	IVv
Važiuojamosios dalies plotis	2.75-4.30 m
Eismo juostų skaičius	1
Eismo juostų plotis	2.8-4.2
Remontuojamų ruožų ilgis	2,39 km
Važiuojamosios dalies danga	Žvyras, gruntas

Remontuojamiems miško keliams numatyta įrengti 2,8 - 4,20 m pločio žvyro dangą. Bendras remontuojamų kelių ilgis 2,39 km, kelio danga projektuojama su 2.5 % nuolydžiu.

Numatomi atlikti šie miško kelio remonto darbai:

- maksimaliai išsaugant esamo kelio smėlio-žvyro dangą, užlyginamos provėžos, užpilamos duobės kelio dangoje.
- Profiliuojant esamą kelio dangą užlyginamos smulkios dangos duobės ir seklios provėžos.
- Keliams su grunto danga įrengiama žvyro danga.
- Išlyginamas ir suformuojamas skersinis kelio paviršiaus ir esamos dangos profilis, reikalingose vietose atstatomi ar suformuojami šalikelės grioveliai ir sankasos šlaitai.
- esama žvyro danga, pagal poreikį, papildoma 5-10 cm žvyro sluoksniu ir sutankinama volais,
- Pažymėtose vietose atnaujinamos ar įrengiamos nuovažos ar prasilenkimo/apsisukimo aikštelės.

Ant išlygintos esamos dangos numatyta atstatyti (atnaujinti) 2,8-4,2 m pločio važiuojamosios dalies dangą nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu - žvyru 0/32. Keliuose ruožuose įrengiamas smėlio/ žvyro mišiniu išlyginamasis pagrindo sluoksnis. Ties staigesniais kelio posūkiais atstatyti viražus su 4% nuolydžiu į vidinę posūkio pusę. Papildomų (pagal poreikį) prasilenkimo aikštelių bei nuovažų įrengimo vietas derinti su užsakovu.

STANDARTAI

LST EN 206:2013+AI :2017	Betonas. Specifikacija, eksploatacines savybes, gamyba ir atitiktis.
LST 1331:2015	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

ST 188710638.06:2004	Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas. I dalis
----------------------	--

KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

[T ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
Nr. D1-193, nuo 2010 03 15	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
KTR 1.01:2008	Automobilių keliai.
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai
[T ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.
TRA SBR 07	Automobilių kelių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.
TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
MN SSN 15	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai
[T SBR 07	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.

Prieš vykdant statybą ir pasirengiant statybai bei statybos darbų organizavimui Rangovas privalo su užsakovu derinti bei parinkti ir suderinti medžiagų sandėliavimo vietas.

Darbuotojų sauga

Pagal miško kelio remonto darbų specifiką kitus darbus. Darbai, susiję su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai:

1. Žemės darbai šalia iškasų, griovių, keliantys nuslydimo pavojų.

Pagal nedidelę darbų apimtį, statybvietėje vienu metu nedirbs daugiau 20 žmonių ir ne didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. Į statybvietę darbuotojai bus vežiojami, kartu atsivežant geriamo vandens, būtinosios pirmosios pagalbos priemonės, kurios kartu su transporto priemone turi būti visą darbo laiką objekte. Transporto priemonės parinkti tokias, kad jose būtų užtikrinti bent minimalūs higienos reikalavimai, buities sąlygos trumpalaikiam poilsiui ir pavalgymui, pakankamai vietos pralaukti sudėtingas gamtines sąlygas. Esant minusinei temperatūrai, bei tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytą remonto darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi statybvietės darbo vietos įrengimo lauke reikalavimai:

- 1) Stabilitumas ir tvirtumas. Kelio pagrindas turi būti tvirtas, supilto grunto sankasa stabili.
- 2) Turi būti patikrintas darbo vietos stabilumas ir tvirtumas, pakeitus jos aukštį ar gylį.
- 3) Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne.
- 4) Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis.
- 5) Medžiagas, įrenginius, iškastą gruntą laikinai sandėliuoti taip, kad nenuslystų ar nenukristų į pagal kelią iškastą griovį.
- 6) Numatytos kelio remonto žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai (ekskavatorius, buldozeris, autosavivartis, traktorius) turi būti techniškai tvarkingi, neturėti aplinkos,

tinkamai ir teisingai naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti.

- 7) Atkreipti dėmesį į saugų darbą bei nuslydimo ar apsisvertimo pavojų arti kelio sankasos krašto ant supilto grunto (mašinų ar mechanizmų atramos neturi remtis į gruntą arčiau 1,0 m sankasos krašto ar kelio viršaus).
- 8) Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius su ir be variklio, turi būti techniškai tvarkingi, naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami kvalifikuotų darbuotojų. Atliekant kelio remonto darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais ir dokumentais:
 - (a) Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003.Nr.70-3170, Žin., 2007.Nr.69-2720)
 - (b) Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008.Nr.10-362)
 - (c) DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin., 2001.Nr.3-74)
 - (d) Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin., 1998. Nr.43-1188).
 - (e) Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai (Žin., 1998. Nr.70-2240).
 - (f) Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005. NR.26-852)
 - (g) Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (Žin., 1999.Nr.104-3014)
 - (h) Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000.Nr.3-88, Nr.76-2303, Žin.2002)
 - (i) Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2004. Nr.41-1350).
 - (j) Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka (Žin., 2005.Nr.53-1817).

Aplinkosaugos reikalavimai

Atliekant miško kelių remonto darbus maksimaliai išsaugoti esamas reljefo formas bei želdinius. Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (Žin., 2007,Nr.10-403)

Vanduo.

Remonto darbų metu vandens poreikio nebus, nuotekų nėra.

Vandens apsauga.


Avarija statybvietėje gali įvykti dėl technikos gedimo ir tepalų ar kuro nutekėjimo ir patekimo į vandentakus. Tam tikslui statybvietėje dirbančioje technikoje turi būti sorbentų išsiliejusiems teršalams surinkti. Jei išsilieja teršalai, tai užterštas gruntas surenkamas į polietileninį maišą ir kartu su sorbentais, užterštais naftos produktais, pristatomas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Atliekant darbus, būtina griežtai laikytis aplinkosaugos reikalavimų, draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir kelio apsaugos juosta.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
21. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Birbiliškės g.-ja Kv.25 skl.1- Kv.26 skl.2				
21.1	Kategorija		IVv	
21.2	Ilgis*	km	0,95	
21.3	Važiuojamosios dalies plotis	m	3,00	
21.4	Eismo juostų skaičius	vnt.	1	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

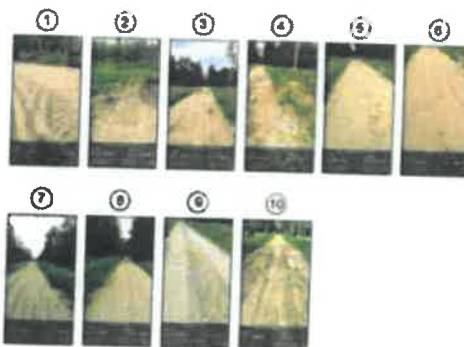



-  Sistemasi setiap produk
-  Rekrutmen tenaga produksi
-  Pemantauan kinerja karyawan/pekerja
-  Rekrutmen tenaga
-  Pemantauan kinerja tenaga ahli/tenaga
-  Pemantauan kinerja tenaga/pekerja

[illegible]

22. Viduklės girinkija Kv.41 skl.16-Kv.41skl.41



Explain strategy



PUTARTILAN SYLAC-MAI



Posttest results: grade 6



References and notes



Fluoranthene, pyrene, and benzo[a]pyrene


Kalle stegar alla

Remuneration not paid by



Rechtschreibung: unversöhnlich

[illegible]

23 . Birbiliškės girinkija Kv.148 skl.6-Kv.149 skl.13

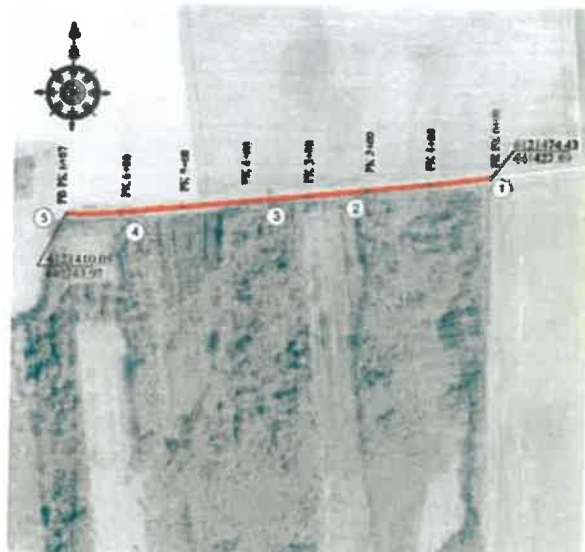

Esamos atkarpų



REKONSTRUOJIMO ŽYMOJIMAI

- Rekonstruojama kelių linija
- Rekonstruojamas profilis
- Rekonstruojama kelių linija
- Rekonstruojama kelių linija
- Rekonstruojama kelių linija

PROJEKTA				VI Vokietijos kelių uždarymo planavimas rekonstrukcijos metu			
PRA				A-3			
PRA				15			

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė G19-MM1 V] Valstybinių miškų urėdijos Raselinių regioninio padalinio miško kelio taisymo (remonto) darbai

Statiny's Birbiliškės girininkija Kv. 25, skl. 1- Kv. 26, skl. 0,95 km ilgio

Žiniaraštis Birbiliškės girininkija Kv. 25, skl. 1- Kv. 26, skl. 2, 0,95 km ilgio

Suma žiniaraščiui EUR be PVM 4715,56									
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR be PVM iš viso	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
						Vieneto kaina			
Kelio dangos atstatymas									
1	MM7-54	Kelių profiliavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15			t.m2	2,85	22,1425	83,11	
3	MM5-28	Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15			100m3	2,14	2174,0421	4652,45	21,0
Vertė įrašom į pasiūlymo 3 formą						Iš viso žiniaraštyje		Eur be PVM 4715,56	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui taikėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Page 1 of 1
Date: 10/10/2019
Time: 10:10:10

Page 1 of 1
Date: 10/10/2019
Time: 10:10:10

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė GI19-MM1 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio miško kelio taisymo (remonto) darbai

Statinyse Viduklės girininkija Kv.41, skl. 16- Kv. 41, skl. 41, 0,75 km ilgio

Žiniaraštis Viduklės girininkija Kv.41, skl. 16- Kv. 41, skl. 41, 0,75 km ilgio

Suma žiniaraščiu EUR be PVM 4325,58									
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR be PVM iš viso	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*	
					Vieneto kaina				
Paruošiamieji darbai									
Kėdžių kirtimas rankiniu būdu, kal krūmai vidutinio tankumo k9=1.15									
1	MM4P-0101		ha	0,072	1134,57		81,69		
Kelio dangos atstatymas									
Kelių profiliavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15									
2	MM7-54		Lm2	3,15	22,1425		69,75		
Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15									
3	MM5-28		100m3	1,92	2174,0313		4174,14	20,0	
Vertė įrašom į pasiūlymo 3 formą				Iš viso žiniaraštyje	Eur be PVM		4325,58		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. punktą.

Sudarė:

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Dokumentą elektroniniu

gim-

[

- 2007

Atsakiniai

3

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė G119-MM1 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio miško kelio taisymo (remonto) darbai

Statiny's Birbiliškės girininkija Kv.148, skl. 6- Kv. 148, skl. 13, 0,69 km ilgio

Žiniaraštis Birbiliškės girininkija Kv.148, skl. 6- Kv. 148, skl. 13, 0,69 km ilgio

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato		Kiekis	Kaina		Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
			vnt			Vieneto kaina	EUR be PVM iš viso	
Kelio dangos atstatymas								
1	MN7-54	Kelių profiliavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15		t.m2	1,932	22,1425	42,78	
2	MN5-26	Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15		100m3	1,45	2174,0453	3152,37	20,0
Vertė įrašom į pasiūlymo 3 formą					iš viso žiniaraštyje		EUR be PVM	3195,15

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
[illegible]

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
[illegible]



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

VĮ Valstybinių miškų urėdija

**PASIŪLYMAS
DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ
NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE PIRKIMO**

2021 m. liepos 23 d. Nr. 84
(Data)
Jurbarkas
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Jurmelta“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	158257064
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT582570610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: 1) Tiekėjo vadovas; 2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šios sutarties sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio sutartį ir(ar) ją pasirašys**; 3) Būhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys; **Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.	Būtina nurodyti: 1) Kęstutis Naujokas; 2) Kęstutis Naujokas; 3) Virginija Pocienė.
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas, Tel. ir faksas (8~447) 70080, sekretore@jurmelta.lt
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB "Luminor" bankas, banko kodas 40100, LT544010044300070326

Skelbiamų apklausos Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kęstutis Naujokas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Daivina Juknevičienė tel. +370 614 70599, daivina@jurmesta.lt

2. INFORMACIJA /APIE ŪKIO SUBJEKTUS/ IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į tikslų Specialiųjų sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)
1.				
2.				

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)
1.			
2.			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

¹ pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodyti objektai Nr. 21, 22, 23

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina ² , Eur be PVM
21	Birbiliškės girininkija Kv. 25, skl. 1-Kv. 26, skl. 2	4715,56
22	Viduklės girininkija Kv. 41, skl. 16-Kv. 41, skl. 41	4325,58
23	Birbiliškės girininkija Kv. 148, skl. 6-Kv. 149, skl. 13	3195,15

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

² Vertė išrašoma iš objekto Darbu lokalinės samtos (Specialiųjų sąlygų 4 priedas)

Skelbiamų apklausos Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo kaina ¹ (be PVM) (objekto kainų suma)	<u>12236.29 Eur</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)	<u>2569.62 Eur</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	<u>14805.91 Eur</u> (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas	Pasiūlymas	Ne	
2.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai	Pasiūlymas	Ne	
3.	Darbų lokalinės sąmatos	Pasiūlymas	Taip	Kaina

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.15.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar šie reikalavimai keliami nustatyta Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje) patvirtinančių dokumentų. Su jais VMU gali susipažinti**.

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
1	2	3
3.		
4.		
...		

**Pildoma, jei VMU jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.

Skelbiamų apklausos Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes esame / mesame ~~(nereikalingą išbraukti)~~ laikomi asocijuotais (susijusiais) su VMU pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės ADB „Giensidige“ pasiūlymo laidavimo raštą 125.00 Eur. vertės.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

UAB „Jurmelsta“ direktorius:

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO 2021-01-03 Nr. 2-4

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo stovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:

Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius



Kęstutis Naujokas

Pramonės g. 1
LT-74111 Jurbarkas
Lietuvos Respublika
El. p. sekretore@jurmelta.lt

Tel.: (8-447) 70080,
Faksas (8-447) 70080



Įm. kodas 158257064
PVM kodas LT582570610

A.s. Nr.
LT544010044300070326
AB Luminor bankas
Jurbarko skyrius
Banko kodas 40100

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė G119-MM1 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio miško kello taisymo (remonto) darbai

Statins Birbiliškės girininkija Kv. 25, skl. 1- Kv. 26, skl. 0,95 km ilgio

Žinlaraštis Birbiliškės girininkija Kv. 25, skl. 1- Kv. 26, skl. 2, 0,95 km ilgio

Sam. el.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui EUR be PVM 4715,56		
					Kaina Vieneto kaina	EUR be PVM Iš viso	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1	MN7-54	Kello dangos atstatymas Kelių profilavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15	Lm2	2.85	22.1425	63,11	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15	100m3	2.14	2174.0421	4652,45	21,0
Vertė įrašom į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žinlaraštyje	EUR be PVM 4715,56	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neįrašytas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialių sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialių sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė G119-MM1 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio miško kello taisymo (remonto) darbai

Statyns Viduklės girininkija Kv.41, skl. 16- Kv. 41, skl. 41, 0,75 km ilgio

Žiniaraštis Viduklės girininkija Kv.41, skl. 16- Kv. 41, skl. 41, 0,75 km ilgio

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM 4325,58			Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	EUR be PVM	Iš viso	
Paruošiamieji darbai								
1	MN4P-0101	Krūmų kirtimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,072	1134,57	81,69		
Kelio dangos atstatymas								
2	MN7-54	Kelių profilavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15	t.m2	3,15	22,1425	69,75		
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15	100m3	1,92	2174,0313	4174,14		20,0
Vertė įrašom į pasilijimo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		4325,58	

* - Tiekėjo siūlymas pagal

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neaplyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, paraša:



LOKALINĖ SĄMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių g. 9-MM1 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio miško kelio taisymo (remonto) darbai

Statiny's žirb kės girininkija Kv.148, skl . 6- Kv. 148, skl. 13, 0,69 km ilgio

Žinlaraštis Birbiliskės girininkija Kv.148, skl . 6- Kv. 148, skl. 13, 0,69 km ilgio

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui EUR be PVM 3195,15		
					Vieneto kaina	EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1	MN7-54	Kelio dangos atstatymas Kelių profilavimas autogreideriais (prieš atstatant žvyro dangą) k9=1.15	t.m2	1.932	22,1425	42,78	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas (nuo 5 iki 10cm) k9=1.15	100m3	1.45	2174,0453	3152,37	20,0
Vertė įrašom į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žinlaraštyje	Eur be PVM	3195,15

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



Užsakovas:
Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2021 m. mėn.

(eurais, ct)												
Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AM Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų					Per ataskaitinį laikotarpį	
						Nuo metų pradžios			Iš viso			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM		Iš viso
1		S-000	Rs - 1									
2												
3												
4												

Techninis prižiūrėtojas:

Techninis priežiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

2021 m. mėn. d.

A. V.

202 m. mėn. d.
