

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/552633

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** Akcinė bendrovė „Vilniaus energetinė statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 222354530, PVM mokėtojo kodas LT223545314, registruotos buveinės adresas Jočionių g. 53, 02300 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-10-28.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E1500015**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  
**(2025-ESO-1290) 0,4 kV OL L-200 iš Tg-216 rekonstravimo (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	<b>TAIP.</b>
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	<b>Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.</b>
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	<b>Aktavimas etapais</b>
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma</b>
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą</b>
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	<b>Vienas etapas</b>
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	<b>Netaikoma</b>
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	<b>per (k.d.) 150</b>
3.11.	* Įtamos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	<b>Nenurodoma</b>
3.12.	* Įtamos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	<b>Nenurodoma</b>

*\*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

#### 4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 95 181,41 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 41 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 78 662,32 EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai 32 ct);
  - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 16 519,09 EUR (šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniolika eurų 09 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

#### 5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

## **6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ**

- 6.1. Darbai atliekami **Vilniaus reg., Vilniaus raj.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu [www.eso.lt](http://www.eso.lt) skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/ljungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu [www.eso.lt](http://www.eso.lt) skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:

- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietas paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

## **7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

## **8. PRIEDAI**

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai,
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 - ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
- 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Grafiko pateikimo terminai;
- 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;
- 8.2.10. Priedas Nr. 10 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
- 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

## 9. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

**Akcinė bendrovė „Vilniaus energetinė statyba“**

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

### Užsakovas

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

## KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

### 1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį [www.eso.lt](http://www.eso.lt) tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

### 2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

- 2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos\* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/ Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

\*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

\*\*gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

\*\*\*kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu.

## Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „GeoMind“ 302758662;	3-geodeziniai darbai, 7-kadastriniai matavimai
AB „Klaipėdos energetika“ 140724749;	Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.2., 3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2, 3.1, 3.4 2-projektavimo darbai 8-elektrotechnikos dalis, procesų valdymo dalis, 9-telekomunikacijų dalis 10- žemės kasimo, statybinių konstrukcijų: gelžbetonio, betono darbai 11- nesudėtingo statinio statybos darbų vadovas vykdyti bendruosius statybos darbus 12-darbų vadovas, VK (iki 10 kV arba aukštesnės įtampos) kategorija
Nežinomas;	Žemės darbai; gerbūvio sutvarkymas; betranšėjinis vamzdžių klojimas
UAB "GILESTA" 162559093;	Žemės darbai; gerbūvio sutvarkymas; betranšėjinis vamzdžių klojimas
Uždaroji akcinė bendrovė "EKO-L" 163105040;	Žemės darbai; gerbūvio sutvarkymas; betranšėjinis vamzdžių klojimas

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Aedilis“ 300056767;	Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 2-projektavimas, 8-elektrotechnikos dalis, procesų valdymo dalis, 9-telekomunikacijų dalis
UAB „GeoMind“ 302758662;	3-geodeziniai darbai, 7-kadastriniai matavimai
UAB „Borta“ 302531903;	5-melioracija;
UAB „Statybų archeologija“ 302612383;	4-archeologiniai tyrinėjimai
AB „Klaipėdos energetika“ 140724749;	Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.2., 3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 5.2, 3.1, 3.4 2-projektavimo darbai 8-elektrotechnikos dalis, procesų valdymo dalis, 9-telekomunikacijų dalis 10- žemės kasimo, statybinių konstrukcijų: gelžbetonio, betono darbai 11- nesudėtingo statinio statybos darbų vadovas vykdyti bendruosius statybos darbus 12-darbų vadovas, VK (iki 10 kV arba aukštesnės įtampos) kategorija
Nežinomas;	Žemės darbai; gerbūvio sutvarkymas; betranšėjinis vamzdžių klojimas

**RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI**

<b>Ei l. Nr</b>	<b>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mat o vnt.</b>	<b>Kiek is</b>
1	1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x150	m	1278

**Pastabos:**

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal [www.eso.lt](http://www.eso.lt) tinklapyje pateiktą tvarką „**Užsakovo teikiamų medžiagų perdavimo sąlygos**“. Šią tvarką rasite skiltyje:

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

**AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra pateikti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) tinklapyje skiltyje**

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

**Tiekėjų kontaktai nurodyti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) tinklapyje skiltyje.**

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.](#)

**MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS**

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju.

<b>Bendrinė ESO teikiamų medžiagų informacija:</b>
Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo medžiagų atsiėmimo punkto.
Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO tinklalapyje: Elektros darbai - „ <a href="#">Partneriams</a> “ -> <a href="#">Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -&gt; Sutarčių valdymas -&gt; Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.</a> Dujų darbai - „ <a href="#">Partneriams</a> “ -> <a href="#">Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -&gt; Sutarčių valdymas -&gt; Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.</a>
Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos sutarties pasirašymo.
Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m.
Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju.
Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę.



**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**


\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)


\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)


**Grafiko pateikimo terminai**


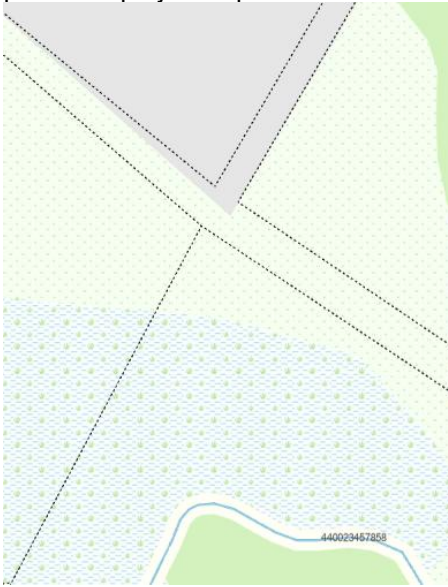
<b>Grafikas pateikiamas per (k.d.):</b>	<b>Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):</b>
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

<i>Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*</i>	<i>Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas</i>	<i>Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas</i>	<i>Atsakymai</i>
2. Aiškinamasis raštas	4.3 <i>Projektuojamų darbų aprašymas</i>	„Po rekonstrukcijos dalis OL L-200 išmontuojama. Dalis atramų paliekama dėl gatvių apšvietimo.“  Prašome paaiškinti kaip laikysis apšvietimo laidai, kai bus išmontuotos atramos ?	Atsakome, jog seniūnija buvo išreiškusi pageidavimą palikti atramas su apšvietimo tinklais, tad reikia, kad atramos atkarpoje 200/1-200/22 būtų nedemontuojamos.
4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 2 demontavimo schema.	Demontavimo schemoje parodyta kad demontuojamos visos atramos, nors AR buvo parašyta kad dalis atramų paliekama. Prašome patikslinti, kurios atramos lieka ? Ir patikslinti demontuojamų medžiagų žiniaraštį, nes dabar numatyta demontuoti visas atramas	Atsakome, jog seniūnija buvo išreiškusi pageidavimą palikti atramas su apšvietimo tinklais, tad reikia, kad atramos atkarpoje 200/1-200/22 būtų nedemontuojamos. Žiniaraštis nebus koreguojamas dėl jau anksčiau nurodytų priežasčių.
4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 2 demontavimo schema.	Demontavimo schemoje parodyta kad demontuojamos visos atramos. Atramoje 200/15 yra gandalizdis. Prašome patikslinti ar atrama nr. 200/15 su gandalizdžiu paliekama ? Ar gandalizdis bus perkeliamas į kitą vietą ? Jei gandalizdis bus perkeliamas, prašome pateikti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą perkėlimui.  	Atrama 200/15 nebus demontuojama, gandalizdis paliekamas.

4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 1	Principinėje sujungimų schemoje, parodyta kad iš KS/KAS-3 prijungiamas esamas objekto nr. 17032015, (Dainavos g. 11) kabelis. Prašome patikslinti schemą, nes sklypas Dainavos g. 11, šiuo metu tuščias, nėra esamo kabelio. Dabar tikslinga būtų netiesti abonentinio kabelio, o palikti tik pajungimo vietą.	Namas nuo elektros tinklų atjungtas. Vartotojo apskaita iš 200/5 KAS perkeliama į KS/KAS-3. Abonentinį kabelį reikia nutiesti iki namo, ant namo perkelti ir dėžutę su kištukiniais lizdais ir viską sujungti.
4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 2	Atramoje nr. 200/5 sumontuotas KAS ir laikino prijungimo įvadas. Demontavimo schemoje nenumatytas KAS 200/5 demontavimas, ir nėra numatytas naujas įvadas. Prašome patikslinti sprendinius dėl 200/5 KAS ? 	Kaip ir paminėta atsakant į 4-ą klausimą, vartotojo apskaita iš 200/5 KAS perkeliama į KS/KAS-3.
4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 2	Spinta KS/KAS-11 numatyta, dviem objektams adresu Dainavos g. 36. Šiuo metu tikrai nėra įvadinių kabelių į pastatą Dainavos g. 36. Šiuo metu nėra tikslo tiesti abonentinių kabelių, nes neaišku kur prijungti. Abonentinių kabelių netiesiame, paliekame prijungimo vietas ?	Atsakome, kad abonentinį kabelį reikia nutiesti iki namo sumontuoti sujungimo dėžutę ir namo neprijungti.

			
4.1 Principinės schemos	BR-02 lapas 2	Principinėje sujungimų schemoje, parodyta kad iš KS/KAS-13 prijungiamas esamas objekto nr. 17032035, (Dainavos g. 53) kabelis. Šiuo metu Dainavos g. 53 abonentinis kabelis nutiestas iš priešingos pusės, nuo atramos nr. 200/18. Prašome patikslinti projekto sprendinius?	Atsakome, kad pakoreguota Principinė schema. Esant poreikiui tokius patikslinimus vertėtų atlikti po darbų įgyvendinimo atsižvelgiant į išpildomąją.
4. 2. Trasos brėžiniai	Br-01 lapas 7	Abonentinis kabelis tiesiams iki atramos nr. 202/4 ir sujungiamas su esamu abonentiniu kabeliu. Prašome patikslinti, ar atramą nr. 202/4 reikia palikti, kad prijungti prie esamos abonentinės OKL ? Tikslinti projekto sprendinius	Atsakome, kad kabelis tiesiamas iki pastato. Pakoreguotas dokumentas Trasos brėžiniai.
4. 2. Trasos brėžiniai	Br-01 lapas 6	Kabelio tiesimas nuo koordinacių x=6039537,49; y=605930,53 iki koordinacių x=6039612,83; y=605820,97 numatytas atviru būdu vamzdyje. Krūmų šalimas projekte nenumatytas. Prašome patikslinti, ar bus papildomai apmokėta krūmų	Pakoreguotas trasų brėžinys atkarpoje, pakeičiant į uždaro gręžimo būdą.

		<p>šalinimas ? Arba papildyto projekto sprendinius</p> 	
4. 2. Trasos brėžiniai	Br-01 lapas 6	<p>Kabelio tiesimas nuo koordinacių x=6039537,49; y=605930,53 iki koordinacių x=6039612,83; y=605820,97 numatytas atviru būdu vamzdyje. Vietoje yra pelkėta ir šlapia. Prašome patikslinti, ar bus papildomai apmokėta už kabelio klojimą uždaru būdu, jei nepavyktų kabelio kloti atviru būdu? Arba patikslinti projekto sprendinius</p> 	<p>Toponuotaukoje pelkė nepažymėta ir vasaros laikotarpiu vizualiai jos nesimatė. Žemėlapiuose greta yra žymima šlapia vieta, tikėtina, kad gali būti šlapia, ypač ne vasaros laikotarpiu. Pakoreguotas trasų brėžinys atkarpoje, pakeičiant į uždaro gręžimo būdą.</p>
*Kita	*Kita	<p>Pranešime Nr. 423354 nurodyta, kad lieka atramos nuo 200/1 iki 200/22. Prašome nurodyti kiek atramų tiksliai reikia demontuoti?</p>	<p>Atsakome, kad demontuojamos 9 atramos (įskaitant ir 201/1 demontuojamą).</p>
