

PASIŪLYMO FORMA

2016-01-18

**TILTO PER VERSEKĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 127
BABRIŠKĖS-VARĖNA-EIŠIŠKĖS 40,316 KM REKONSTRAVIMAS**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Viadukas“; Įmonės kodas 111441125
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Tunelio g. 4a, LT-03153 Vilnius
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Gediminas Juozas Marinskas
Telefono numeris	(8-5) 213 89 31
Fakso numeris	(8-5) 238 45 42
E. pašto adresas	info@viadukas.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias kainas:

1.	Darbu atlikimo kaina be PVM:	759.372,41 Eur
2.	PVM 21%	159.468,21 Eur
3.	Pasiūlymo kaina su PVM (1+2)	918.840,62 Eur (devyni šimtai aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų, 61 ct.)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant draudimo išlaidas.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje su PVM, Eur

Informacija apie subtiekejus ir kitus pasitelkiamus asmenis:

Eil. Nr.	Subtiekejo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurais su PVM ir dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus ir kitus asmenis
1.	UAB „Tiltų ekspertų centras“ 226148570, T.Ševčenkos g. 16 A, Vilnius	Projektavimo darbai	25.652,00 Eur. su PVM/ 3 proc.

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
1	Projektuotojas PV Saulius Anusas Darbo sutartis

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo (*bylos*) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo (*bylos*) pavadinime nenurodo „neviešinama“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Darbų kiekių žiniaraštis 1 priedas
2.	VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) 2016-01-07, Nr.253351
3.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija
4.	UAB „Viadukas“ įmonės atestatas Nr.0472
5.	Subrangovo Projektuotojo UAB „Tiltų ekspertų centras“ dokumentacija
6.	UAB „Viadukas“ balansas 2004 m.
7.	Atliktų darbų sąrašas per 5 pastaruosius metus, su Užsakovų pažymomis 8 priedas
8.	Tinkamai įvykdytų ypatingų transporto statinių sąrašas ne mažesnės kaip 801 tūkst. Eur. vertės (su Užsakovų pažymomis) 9 priedas
9.	Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas 7 priedas
10.	UAB Viadukas Statinio statybos vadovo Aleksandr Batiuškov patirtį įrodantys dokumentai
11.	Aleksandr Batiuškov atestatas
12.	Sergejaus Pučinskio atestatas
13.	Akredituotos laboratorijos UAB „Alzida“ dokumentacija

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame AAS „Gjensidige Baltic“ pasiūlymo laidavimo draudimo raštas, sumai 55000 Eur.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus užbaigti per 15 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. I darbų atlikimo laikotarpi neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda einamųjų kalendorinių metų gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

Gediminas Juozas Marinskas

parašas

Gediminas Juozas Marinskas

vardas ir pavardė



GJENSIDIGE

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas

Kodas 300633222

PVM mokėtojo kodas LT100005166018

T. Ševčenkos g. 21, LT-03111 Vilnius, Lietuva

Tel. 1626 (iš užsienio +370 5 239 2010)

Faks. +370 5 239 2018

El. paštas info@gjensidige.lt, www.gjensidige.lt

A. s. LT 734010042401156565, AB DNB bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijai
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. B1T02269

2016-01-15

Vilnius

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. B1T02269.

Šiuo laidavimo raštu klientas UAB „Viadukas“, kodas 111441125, Tunelio g. 4A, (toliau – Tiekėjas) ir laiduotojas AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, kodas 300633222, adresas T. Ševčenkos g. 21, LT-03111 Vilnius (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija) 55.000 EUR (Penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį. Šis įsipareigojimas yra privalomas Laiduotojui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Laiduotojo parašu ir antspaudu 2016-01-15.

KADANGI Tiekėjas pateikė raštišką pasiūlymą teikti paslaugas (toliau – Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas viešajame pirkime „TILTO PER VERSEKĄ VALSTYBINĖS REIKSMĖS KRAŠTO KELIO NR. 127 BABRIŠKĖS-VARĖNĄ-EIŠIŠKĖS 40,316 KM REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS“,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

1. Tiekėjas atsisako savo Pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors Pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

2. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

3. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavus Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą.

Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Tiekėjas neįvykdė, bet turi nurodyti, kurią iš aukščiau minėtų sąlygų pažeidė.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytų šiame laidavimo draudimo rašte, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Tiekėjo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo viešojo pirkimo vokų atplėšimo dienos nuo 2016-01-18 ir galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t. y. iki 2016-03-18. Perkančiajai organizacijai nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir/arba Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo raštas išduotas Laiduotojo patvirtintų Laidavimo draudimo taisyklių Nr. 521, galiojančių nuo 2015-01-01, (toliau vadinama „Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui.

Vyr. draudimo produktų vadovė



Danguolė Ausiejienė



GJENSIDIGE

Laidavimo draudimo liudijimas

Bonds insurance policy



AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas
Įm. kodas 300633222, PVM mokėtojo kodas LT100005166018
T. Ševčenkos g. 21, LT-03111 Vilnius, Lietuva
Tel. 1626, faks. (8 5) 239 2018, el. paštas info@gjensidige.lt, www.gjensidige.lt

AAS "Gjensidige Baltic", kodas 50003210451, Brivibas iela 39, Ryga, LV-1010, Latvija
Tel. +371 671 12 222, faks. +371 671 06 444, el. paštas info@gjensidige.lv, www.gjensidige.lv

Draudimo grupė: Laidavimo draudimas.
Draudimo rūšis: Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 521.
Draudimo objektas: Naudos gavėjo turiniais interesais, susiję su
Draudėjo prievolių nevykdymu arba netinkamu vykdymu.

Draudimo liudijimo numeris
Policy number

B1T02269

Draudėjas
Policy holder

VIADUKAS UAB, įm. kodas 111441125
TUNELIO G. 4A, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV., tel. 868743774
el. paštas info@viadukas.lt

Konkurso rengėjas
(Naudos gavėjas)
Tender organizer (Beneficiary)

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS, įm.
kodas 188710638
J. BASANAČIAUS G. 36, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis
Period of validity of the insurance contract

Nuo	2016-01-18 00:00	Iki	2016-03-18 23:59	Trukmė dienomis	61
From		To		Duration in days	

Draudimo sutartis
Insurance agreement

Nauja

Laidavimo draudimo tipas
Bonds insurance type

Pasiūlymo laidavimas

Konkurso (pirkimo) pavadinimas
Tender (purchase) name

**„TILTO PER VERSEKĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 127
BABRIŠKĖS–VARĖNA–EIŠIŠKĖS 40,316 KM REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS“**

Pirkimo numeris
Tender number

Konkurso data
Tender date

2016-01-18

Draudimo suma
Sum insured

55 000,00 EUR

Bendra draudimo įmoka
Total insurance premium

165,00 EUR (569,71 LTL)

Įmokos mokėjimo grafikas
Premium payment schedule

Eil. Nr. 1
No.

Įmokos suma, EUR 165,00
Premium amount, EUR

Sumokėti iki 2016-01-18
Due date

Papildomos sąlygos
Additional conditions

Mokėjimo informacija
Pay to account information

Mokėjimo dokumente būtina nurodyti draudimo liudijimo numerį B1T02269

Bankų sąskaitos
Bank accounts

AB Citadele bankas, a.s. LT24 7290 0000 0546 7675

AB DNB bankas, a.s. LT73 4010 0424 0115 6565

Nordea Bank Lietuva, a.s. LT96 2140 0300 0001 9356

AB SEB bankas, a.s. LT37 7044 0600 0124 3263

UAB Medicinos bankas, a.s. LT11 7230 0000 0046 2023

AB Swedbank, a.s. LT53 7300 0100 8423 8170

UAB Medicinos bankas, a.s. LT11 7230 0000 0046 2023



GJENSIDIGE

Laidavimo draudimo liudijimas
Bonds insurance policy



Draudimo liudijimo numeris **B1T02269**
The insurance policy number

AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas
Įm. kodas 300633222, PVM mokėtojo kodas LT100005166018
T. Ševčenkos g. 21, LT-03111 Vilnius, Lietuva
Tel. 1626, faks. (8 5) 239 2018, el. paštas info@gjensidige.lt, www.gjensidige.lt

AAS "Gjensidige Baltic", kodas 50003210451, Brivibas iela 39, Ryga, LV-1010, Latvija
Tel. +371 671 12 222, faks. +371 671 06 444, el. paštas info@gjensidige.lv, www.gjensidige.lv

Kita informacija
Additional information

Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos dalies sumokėjimu, t. y. draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai Draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa ar pirmą draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas įmokos ar pirmos jos dalies atidėjimas. Jei Draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmą jos dalį, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą, draudimo sutartis įsigalioja Laidavimo draudimo taisyklėse Nr. 521 numatyta tvarka.

Pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį draudimo paslaugos neapmokestinamos PVM.

Ši sutartis sudaryta elektroniniu būdu ir galioja be draudėjo parašo. Sutartis yra saugoma elektroniniu formatu.

- ☒ Sutinku, kad Draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal mano nurodytą kontaktinę informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų informaciją apie Draudiko siūlomas paslaugas ir pan. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad Draudikas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, bei žinau, kad šis sutikimas galioja iki raštiško jo atšaukimo.
- ☐ Nesutinku, kad Draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal mano nurodytą kontaktinę informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų informaciją apie Draudiko siūlomas paslaugas ir pan. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę sutikti, kad Draudikas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, bei žinau, kad šis nesutikimas galioja iki raštiško jo atšaukimo.

Atsitikus įvykiui
In case of claim

Atsitikus įvykiui apie patirtą žalą Lietuvoje galite pranešti tel. 1626, skambindami iš užsienio tel. +370 5 239 2010 arba internetu www.gjensidige.lt

Draudikas
Insurer

AAS "Gjensidige Baltic"
Lietuvos filialas
Kęstutis Motiejūnas
Produktų kainodaros ir žalos vertinimo
departamento direktoriaus pavaduotojas

K. Motiejūnas



Draudimo liudijimą išdavė
Policy issued by

AON BALTIC UADBB
RENATA RUIBIENĖ
Tel. +37052526000
El. paštas renata.ruibiene@aon.lt

Draudėjas / Draudėjo įgaliotas asmuo
Policy holder / On behalf of policy holder

Draudimo įmokos (pirmosios jos dalies) sumokėjimas reiškia Draudėjo patvirtinimą, kad:

- Draudėjas prieš draudimo sutarties sudarymą buvo tinkamai supažindintas su Laidavimo draudimo rūšies taisyklėmis Nr. 521, ir jam yra įteikta jų kopija
- Draudėjui yra aiškios ir suprantamos visos draudimo sutarties (draudimo taisyklių, draudimo liudijimo, laidavimo rašto, jeigu yra - ir draudimo liudijimo priedų bei prašymo sudaryti laidavimo rašto draudimo sutartį) sąlygos; Draudėjas jokių pastabų dėl draudimo sutarties sąlygų neturi;
- Visi šiame draudimo liudijime (jeigu yra - taip pat ir jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį) nurodyti duomenys yra teisingi.

VIADUKAS UAB
Tel. 868743774
El. paštas info@viadukas.lt

Draudimo liudijimo
išdavimo data ir vieta
Policy issued date and place

2016-01-15, T. Ševčenkos g. 21, LT-03111 Vilnius

LAISVOS FORMOS TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-01-15

Vilnius

Atsakydami į supaprastinto atviro konkurso sąlygų 11.4 p. ir 11.5 p. nurodome, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, ir nesiekia susitarimo su kreditoriais.

Direktorius Gediminas Juozas Marinskas *Gediminas Juozas Marinskas*



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.472

UAB "VIADUKAS"

Įmonės kodas: 111441125

Tunelio g. 4A, LT-03153 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, vandens
uostų statiniai, kiti transporto statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.


Pirmą kartą išduotas 1998 m. gegužės 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01070

ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr	Darbų pavadinimas	Per metus tiekėjo savo jėgomis atliktų darbų vertė (tūkst. Eur be PVM)	Užsakovas
1	2	3	4
2012 M.			
1	Transeuropinio tinklo kelio E85 Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas sutartis Nr.2 geležinkelio viadukas ties 2.406 km. statybos darbai	615,12	AB „Panevėžio keliai“, S Kerbedžio g 7, LT - 35104 Panevėžys Tel. –370 45 502 601
2	Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda -Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija "Metalinių tiltų per Perkaso ir Veiviržo upes rekonstravimo darbai"	879,89	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g.12, LT-03603, Vilnius, tel. Telefonas: (8 5) 2692038
Viso 2012 m.		1.495,01	
2013 M.			
3	Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda -Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija "Metalinių tiltų per Perkaso ir Veiviržo upes rekonstravimo darbai"	41,67	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g.12, LT-03603, Vilnius, tel. Telefonas: (8 5) 2692038
4	Tilto per Danės upę „Pilies gatvėje, Klaipėdoje kapitalinis remontas	121,79	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 , Klaipėda Tel. (8 46) 39 61 71
Viso 2013 m.		163,46	
2014 M.			
5	Geležinkelio linijos Kaišiadorys -Kybartai geležinkelio ruožas Jiesia -Kaunas rekonstrukcija (4statinys). Objektai Tiltas per Sausvagę 42+943 km. ir pralaida, Tiltas per Nemuną 37+301 km. ruože Jiesia –Kaunas, Tiltas per Jiesią 42+502 km. ruože Jiesia –Kaunas. Paveldo tvarkomieji darbai: Tiltas per Nemuną 37+301 km. (unik. kodas 22215), Pralaida 38+152 km. (unik. kodas 35714) Pralaida 41+292 km. (unik. kodas 35713)	3.912,00	UAB "Hidrostatyba", Gamyklos g. 4, Gargždai LT-96155, Tel (846) 470 930
6	Tilto per Danės upę „Pilies gatvėje, Klaipėdoje kapitalinis remontas	1.719,77	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 , Klaipėda Tel. (8 46) 39 61 71
Viso 2014 m.		5.631,77	
2015 M.			
7	Geležinkelio linijos Kaišiadorys -Kybartai geležinkelio ruožas Jiesia -Kaunas rekonstrukcija (4statinys). Objektai Tiltas per Sausvagę 42+943 km. ir pralaida, Tiltas per Nemuną 37+301 km. ruože Jiesia –Kaunas, Tiltas per Jiesią 42+502 km. ruože Jiesia –Kaunas. Paveldo tvarkomieji darbai: Tiltas per Nemuną 37+301 km. (unik. kodas 22215), Pralaida 38+152 km. (unik. kodas 35714) Pralaida 41+292 km. (unik. kodas 35713)	1.104,46	UAB "Hidrostatyba", Gamyklos g. 4, Gargždai LT-96155, Tel (846) 470 930
8	Tilto per Danės upę „Pilies gatvėje, Klaipėdoje kapitalinis remontas	26,23	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 , Klaipėda Tel. (8 46) 39 61 71
Viso 2015 m.		1.130,69	
Iš viso		8.420,93 tūkst. Eurų	

Direktorius Gediminas Juozas Marinskas 

Pažyma

Nr. *0205/0003*

2014 – 01 - 13

DĖL UAB „VIADUKAS“ ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Viadukas“ statybos rangos sutartyje Nr.7.0.4./11/101 numatytą objektą „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas.Sutartis Nr.2. Geležinkelio viaduko ties 2,406 km. statybos darbai (per Kirtimų g. Vilniuje)“ atliko tinkamai ir sutartyje nurodytu terminu.

Sutarties vertė **2.123.876,31 Lt. be PVM.**


Darbai buvo įvykdyti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigtos.

Projektų direktorius

2.8
Audrius Butkūnas

AB "Panevėžio keliai", S.Kerbedžio g. 7, LT - 35104 Panevėžys, Lietuva/Lithuania
Juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas /
Register of Legal Entities, Code of Legal Entity 147710353
PVM kodas/VAT Payer LT477103515
Tel./telephone +370 45 502 601, +370 45 508 646, faks./fax +370 45 502 602
El. p./e-mail info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr./Bank Account No.: LT02 4010 0412 0009 0263, AB DNB bankas/AB DNB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code AGBLLT2X
A.s. Nr./Bank Account No.: LT05 7044 0600 0263 5207, AB SEB bankas/AB SEB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code CBVILT2X
A.s. Nr./Bank Account No.: LT37 7300 0100 0235 8430, AB Swedbank/AB Swedbank, S.W.I.F.T.(BIC) code HABALT22
A.s. Nr./Bank Account No.: LT08 2150 0510 0001 5167, Pohjola Bank Plc Lietuvos filialas/Lithuanian Branch,
S.W.I.F.T.(BIC) code OKOYLT2X



**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA**

UAB „Viadukas“

2013-04-08 Nr. *4/A1/-893*

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

DĖL STATYTOJO VERTINIMO

Pranešame, kad UAB „Viadukas“ pagal 2011-06-16 pasirašytą rangos darbų sutartį sėkmingai įgyvendina projektą *Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda - Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija*, kurio metu rekonstruojami du metaliniai geležinkelio tiltai, esantys linijos Klaipėda - Pagėgiai 24+628 km per Perkastos (Piktvardės) ir 27+566 km per Veiviržo upes. Darbai vykdomi pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei sutartyje numatytais terminais, planuojama juos užbaigti 2013-04-19. Sutarties vertė - 4.072.753,82 Lt be PVM.

Įmonės personalas sutarties įgyvendinimo metu teikė tikslią informaciją apie projekto eigą, operatyviai ir kvalifikuotai sprendė iškilusias problemas. Bendravimas su šios įmonės vadovais ir techniniais darbuotojais palieka gerą įspūdį.

Pagal VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras SIA 1-4 formą pateikiame tokį Statytojo vertinimą:

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai.

Įmonės atestuatų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.

Įmonė turi pakankamai atestuatų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname gerai.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas-
Geležinkelių infrastruktūros direktorius



Albinas Ragauskis

D. Šalkauskė, 269 3852

Akcinė bendrovė
„Lietuvos geležinkeliai“
Mindaugo g. 12
LT-03603 Vilnius

Geležinkelių infrastruktūros direkcija Tel. (8 5) 269 3353
Mindaugo g. 12 Faks. (8 5) 269 3332
LT-03603 Vilnius El.p.infrastruktura@litrail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT 100538411

Forma DB-28
Patvirtinta
LG 2012 m.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HIDROSTATYBA“

PAŽYMA

2015-08-11

Užsakovas: UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, Gargždai

Rangovas: UAB „Viadukas“, Tunelio g. 4A, Vilnius

Darbų atlikimo vieta: **GELEŽINKELIO RUOŽO MARIJAMPOLĖ – KAZLŲ RŪDA – KAUNAS REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PAPILDOMĄ 1435 MM VĖŽĖS PLOČIO KELIĄ PALEI ESAMĄ GELEŽINKELIO LINIJĄ ARBA 1435 MM/1520 MM VĖŽĖS PLOČIO SUGRETINTĄ KELIĄ. 2 – 4 STATINIAI: GELEŽINKELIO LINIJOS KAIŠIADORYS – KYBARTAI GELEŽINKELIO RUOŽŲ KAZLŲ RŪDA – KAUNAS REKONSTRUKCIJA. 3-OJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – GELEŽINKELIO LINIJOS KAIŠIADORYS – KYBARTAI GELEŽINKELIO RUOŽE JIESIA – KAUNAS REKONSTRUKCIJA (4 STATINYS).**

Objektų rekonstrukcija: *Tiltas per Sausvagę 42+943 km. ir pralaida, Tiltas per Nemuną 37+301 km. ruože Jiesia –Kaunas, Tiltas per Jiesią 42+502 km. ruože Jiesia –Kaunas. Paveldo tvarkomieji darbai: Tiltas per Nemuną 37+301 km. (unik. kodas 22215), Pralaida 38+152 km. (unik. kodas 35714) Pralaida 41+292 km. (unik. kodas 35713)*

Atliktų darbų vertė (be PVM): 17.320.835,38 Lt. (5.016.460,66 Eur.)

Darbų vykdymo pradžia: 2014-01-10

Darbų vykdymo pabaiga: 2015-06-30

Patvirtiname, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti (yra pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas arba statybos užbaigimo aktas).

Generalinis direktorius

Algirdas Žukauskas



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Viadukas“
Tunelio g. 4A LT-03513 Vilnius

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ RANGOS SUTARTĮ**

2015-01-07 Nr. *(4.39.)-RL-114*
Klaipėda

Pažymime, kad UAB „Viadukas“ pagal rangos sutartį Nr. J9-1092 2013-10-22, papildomų rangos darbų sutartis Nr. J9-985 2014-08-12, Nr. J9-1348 2014-12-12 ir Nr. J9-1318 2015-08-14 atliko objekto „TILTO PER DANĖS UPĘ, PILIES GATVĖJE KLAIPĖDOJE“ kapitalinio remonto subrangos darbus.

UAB „Viadukas“ statusas vykdant sutartį – subrangovas.

Darbų pradžia – 2013 m. lapkričio mėn., darbų pabaiga – 2015 m. rugpjūčio mėn.

UAB „Viadukas“ atliktų darbų vertė 1 867 790,00 Eur be PVM.

Gatvės kategorija – B1.

Statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Vaida Lendraitienė, tel. (8 46) 39 63 03

Budžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 138710823

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė (tūkst. Eur be PVM)	Tiekėjo dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tilto per Danės upę .Pilies gatvėje, Klaipėdoje kapitalinis remontas	2.751,58	1.867,79	2013m.lapkričio mėn.-2015 m. rugpjūčio mėn.	Metalinis tiltas. Pakeliamas. Bendras ilgis l= 46,7 m. Bendras plotis b= 20,5 m.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda Alma Montvilienė Miesto tvarkymo skyriaus vyr.specialistė Alma.Montviliene@klaipeda.lt Tel. (8 46) 39 60 87

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

Gediminas Juozas Marinskas
(parašas)

Gediminas Juozas Marinskas
(vardas ir pavardė)

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

Ed. Nr.	Pastelyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 11.11 punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatų išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas	Įgyta profesinė patirtis (Sutarties / projekto pavadinimas)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas, įgydamas profesinės patirties, ėjo tokias pareigas, nurodant datą (būtina nurodyti laikotarpį, kai specialistas sutartyje/projekte pareigų neįjo)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas pareigas įvykdė tinkamai, papildomai nurodant datą
	Aleksandr Batiuškov	Statinio statybos vadovas; susisiekimu komunikacijos: kiti transporto statiniai	UAB „Viadukas“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 12842, atestatas išduotas 2013 m. liepos 12 d., galiojimo terminas nenurodytas. Atestatas pirmą kartą išduotas 2003 m. birželio 2 d.	6 mėn. Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva-Prickulė-Drežižiai 2,612 km projektavimas ir remontas	Isakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo statybos objekte“ Nr. 34, 2015 m. gegužės 19 d.	Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. 20015-10-19 TVA-18, 2015 m. spalio 15 d.
					10 mėn. Filtro per Žvirdrę, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2240 Laigiai-Pažvelsis 3,65 km. rekonstravimas	Isakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo statybos objekte“ Nr. 1, 2013 m. sausio 7 d.	Užbaigtų statybos darbų aktas Nr. TVA-14 2013-10-23, 2013 m. spalio 15 d.
					24 mėn. Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija. Metalinių tiltų per Perkasos ir Veiviržio upes rekonstravimo darbai	Isakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo statybos objekte“ Nr. 19, 2011 m. rugpjūčio 4 d.	Per Perkasos upę: Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130807-00182, 2013 m. rugpjūčio 7 d. Per Veiviržio upę: Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130807-00183, 2013 m. rugpjūčio 7 d.

					11 mėn. Tilto per Minią, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai- Vėžaičiai 7,69 km, remontas	Įsakymas „Dėl atsakingo asmens skyrimo statybos objekte“ Nr. 5a, 2011 m. kovo 7 d.	Užbaigtų statybos darbų aktas Nr. TV/A-1, 2012 m. sausio 10 d.
2	Sergėjus Pučinskis	Statinio statybos vadovas; susisiekimo komunikacijos : keliai	UAB „Viadukas“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 22108, atestatas išduotas 2013-06-28, galiojimo terminas nenurodytas. Atestatas pirma kartą išduotas 2008-05-27			

Direktorius
(įgalinto asmens pareigos)

Sergėjus Pučinskis
(parašas)

Gediminas Juozas Marinkas
(vardas ir pavardė)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE

2015 m. gegužės 19 d. Nr. 34
Vilnius

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte: „*Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva-Priekulė-Dreižiai 2,612 km projektavimas ir remontas*“:

s k i r i u Inžinierių ALEKSANDR BATIUSKOV (kvalifikacijos atestatas Nr. 12842) statinio statybos vadovu šiame objekte, atsakingu už darbų vykdymą, bendrovės darbuotojų, rangovų ir subrangovų darbo koordinavimą, higienos ir saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos ekologinės apsaugos organizavimą ir užtikrinimą.

į p a r e i g o j u:


1. Statinio statybos vadovą Aleksandr Batiuškov koordinuoti ir kontroliuoti bendrovės darbuotojų bei rangovinių organizacijų darbą, užtikrinant tinkamą higienos ir saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos ekologinės apsaugos organizavimą. Esant gamybiniam būtinumui, darbus organizuoti poilsio dienomis savo nuožiūra pasirenkant reikalingų darbininkų skaičių ir užtikrinant, kad darbuotojai turėtų pagal įstatymą priklausančią poilsio laiką.

2. Meistrą Aleksej Vorobjov tiesioginių statinio statybos vadovo Aleksandr Batiuškov nurodymų vykdymą.

3. Klaipėdos skyriaus viršininką Arvydą Biesevičių užtikrinti tinkamą saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą.

Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u Klaipėdos skyriaus viršininkui Arvydui Biesevičiui.

Direktorius



Gediminas Juozas Marinskas

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:

Aleksandr Batiuškov

(parašas, data)

Aleksej Vorobjov

(parašas, data)

Arvydas Biesevičius

(parašas, data)

Techninio sk. viršininkas
Vidmantas Gamulėnas
Atest. Nr. 20664

2015-05-19

Rangovo atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

PRALAIIDOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2203
DITUVA-PRIEKULĖ-DREIŽIAI 2,612 KM. REMONTAS, SUTARTIS NR. S-456 2015-05-18
(kelio, tilto, viaduko pavadinimas ir vieta, sutarties Nr. ir data)

RANGOVO ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2015 m. ~~spalio 15~~ m. d. Nr. ~~2015-10-15 VTA-18~~

Klaipėdos rajonas.

(vieta)

1. Komisija paskirta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015m. rugsėjo mėn. 22 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Gediminas Viršilas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Tiltų skyriaus vedėjas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Saulius Rulys

LAKD prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo skyriaus vedėjas

Vilius Karieta

UAB „Tiltų ekspertų centras“ projektų vadovas

Kęstutis Pralgauskas

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

(v., pavardė)

(pareigos)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

3.1. rangovas UAB „Viadukas“, Klaipėdos sk. viršininkas Arvydas Biesevičius, at. Nr. 30753,
(įmonės pavadinimas, pareigos v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. statinio statybos vadovas UAB „Viadukas“ inžinierius Aleksandr Batiuškov, at. Nr. 12842

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.3. techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“, techninis prižiūrėtojas, Raimondas Ubis, at. Nr. 301

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2203 Dituva-Priekulė-Dreižiai 2,612 km remonto darbai,

(kelio Nr., pavadinimas, ruožas, tilto vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

Darbai vyko pagal projektą, kurį 2015m. parengė UAB „Tiltų ekspertų centras“ Kvalifikacijos atestatas Nr.3304, projekto vadovas Vilius Karieta, kv. at. Nr. 33265

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, projekto parengimo metai, projekto vadovas, projektą ekspertavusi įmonė, ekspertizės išvadų data ir Nr.)

ir patvirtino.....

(kas, kada, dokumento Nr.)

Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė:

(kas, kada, dokumento Nr.)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius

Darbus atliko:
rangovas UAB „Viadukas“ kvalifikacijos atestato Nr.472.
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

Subrangovai UAB „Šilutės automobilių keliai“ kvalifikacijos atestato Nr.1073.
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

Darbai pradėti 2015m. rugpjūčio mėn.

Statinio (kelio) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			
2. Kelio ruožo ilgis	km		
3. Žemės sankasos plotis	m		
4. Važiuojamosios dalies plotis	m		
5. Kelio dangos tipas	-		
6. Kelio dangos storis	cm		
7. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Tilto (viaduko) ilgis	m		
2. Pločio gabaritas	m		
3. Aukščio gabaritas	m		
4. Deformaciniai pjūviai	m		
5. Atraminiai guoliai			
6. Turėklai			
7. Atitvarai			
8. Skaičiuojamoji apkrova			
9. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Pralaidos tipas			
2. Pralaidos tipas pagal medžiagą		Metalinė, gofruotas vamzdis	
3. Elementų (žiedų) skaičius	vnt.	4	
4. Skerspjūvis	m	1,84x1,39	
5. Angų skaičius	vnt.	1	
6. Antgalių konstrukcija įtek./ištek.		Gelžbetonis/gelžbetonis	
7. Pamato tipas		Smėlio-žvyro sluoksnis	
8. Pralaidos ilgis	m	25,591	
9. Izoliacijos tipas			
10. Altitudės: įtek./ištek.		8,19/7,79	
11. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur	172.484,72	

Pastaba: Lentelės „Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai“ ir lentelės „Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai“ duomenys pildomi tuo atveju, kai priimamas objektas yra su kelio statiniais (tiltais, viadukais, estakadomis ir pralaidomis).

Bendra atliktų statybos darbų kaina:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur	172 484,72	

Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės yra įvykdytos.

Atlikti statybos darbai atitinka projekto reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Objekto sutvarkymo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti pagal šio akto priedą Nr. 2.

Komisija pripažįsta, kad atlikti Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2203 Dituva-Priekulė-Dreizių 2,612 km remonto darbai.

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo atliktus statybos darbus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus (5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis).

4. Akto priedai:

- 4.1. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (1 priedas).
4.2. Objekto sutvarkymo ir kitų papildomų darbų žiniaraštis (2 priedas).

Komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

G.Viršilas
(v., pavardė)

Komisijos nariai

.....
(parašas)

S.Rulys
(v., pavardė)

.....
(parašas)

V.Karieta
(v., pavardė)

.....
(parašas)

K.Pralgauskas
(v., pavardė)

Rangovas

.....
(parašas)

A.Biesevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

.....
(parašas)

A.Batiuskov
(v., pavardė)

Techninis prižiūrėtojas

.....
(parašas)

R.Ubis
(v., pavardė)

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, vykdymo dokumentaciją priėmė nuolat saugoti valstybinės reikšmės kelią prižiūrinti valstybės įmonė.

Objektą priėmė ir jo priežiūrą pradeda vykdyti valstybinės reikšmės kelią prižiūrinti valstybės įmonė.

Priėmė:

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

(valstybės įmonė)

direktorius pavaduotojas-
vyriausiasis inžinierius
(pareigos)



K.Pralgauskas
(v., pavardė)

Perdavė:

UAB „Viadukas“

(įmonė)

Klaipėdos skyriaus viršininkas...

(pareigos)

(parašas)

A.Biesevičius

(v., pavardė)

2015 m.d.

Rangovo atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui) akto
1 priedas

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas

„UAB Viadukas“ perdavė
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ priėmė
(valstybinės reikšmės kelių priežiūrinčios valstybės įmonės pavadinimas)

**Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2203 Dituva-Priekulė-Dreizių 2,612 km
remonto darbai**
(pavadinimas, vieta)

saugoti šią dokumentaciją:

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius
1	Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-173	1
2	Leidimas riboti eismą Nr. 14-184	1
3	Techninis darbo projektas Nr.368-00-TDP	3
4	Medžiagų sertifikatai ir deklaracijos	1 byla
5	Paslėptų darbų priėmimo aktai. Kontrolinių matavimų žiniaraščiai	1 byla

Perdavė:

„UAB „Viadukas“
(įmonė)

Klaipėdos sk. viršininkas
(pareigos)

(parašas)

A.Biesevičius
(v., pavardė)

Priėmė:

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“
(valstybės įmonė)

direktoriaus pavaduotojas
vyriausiasis inžinierius

(pareigos)



K. Pralgauskas
(v., pavardė)

Objekto sutvarkymo ir kitų papildomų darbų žiniaraštis
Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2203 Dituva-Priekulė-Dreižiai 2,612 km
remonto darbai
(pavadinimas, vieta)

20 15 m. d.

[illegible]

Biesevičius
(v., pavarde)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVO PASKYRIMO

2011 m. kovo 7 d. Nr. 59

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte „*Tilto per Miniją valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai 7,69 km remontas*“:

s k i r i u Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov (Kvalifikacijos atestatas Nr. 12842) atsakingu už bendrovės darbuotojų, rangovų ir subrangovų darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir užtikrinimą;

į p a r e i g o j u:

1. Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov koordinuoti ir kontroliuoti bendrovės darbuotojų bei rangovinių organizacijų darbą, užtikrinant tinkamą saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą.

2. Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov esant gamybiniam būtinumui, darbus organizuoti poilsio dienomis savo nuožiūra pasirenkant reikalingų darbininkų skaičių. Darbus organizuoti taip, kad darbuotojai turėtų pagal įstatymą priklausančią poilsio laiką.

p a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę statybos/techniniam direktoriui Arvydui Miškūnui.


Direktorius




Gediminas Marinskas

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:

Arvydas Miškūnas

 2011 03 07
(parašas ir data)

Aleksandr Batiuškov

 2011 03 07
(parašas ir data)

Tilto per Minią valstybinės reikšmės kelio Nr.228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 7,69 km
remontas, Nr. S-72, 2011-03-07

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas ir vieta, sutarties Nr. ir data)

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ AKTAS *✓ SA-1*

2012 m. sausio mėn. 10 d.

(vieta)

1. Komisija paskirta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu 2011 m. gruodžio mėn. 07 d. Nr. V-512 „Dėl rangovo užbaigtų statybos darbų priėmimo komisijos sudarymo“

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas G. Viršilas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Tiltų skyriaus vedėjas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

P. Verbickas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo skyriaus – vyriausiasis inspektorius

P. Kaučikas

VI „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius

M. Tvysa

UAB „Kelprojektas“ projekto vadovas

G. Kučinskas

Klaipėdos apskrities VPK, Kelių policijos biuro vyresnysis specialistas

(v., pavardė)

(pareigos)

dalyvaujant:

rangovui

UAB „Viadukas“, Techniniam direktoriui A. Miškūnui, kv. at. nr. 21211

(įmonės pavadinimas, pareigos v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

statinio statybos vadovui UAB „Viadukas“, Klaipėdos sk. viršininkui A. Batiuškov, kv. at. Nr. 12842

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtoji AB „Problematika“, techniniam prižiūrėtoji R. Ubiui, kv. at. nr. 3182

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti tilto per Minią valstybinės reikšmės krašto kelio

Nr.228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 7,69 km remonto

darbai,

(kelio Nr., pavadinimas, ruožas, tilto vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal projektą, kurį 2010 m. parengė UAB „Kelprojektas“, projekto vadovas M. Tvysa, kv. at. Nr. 18387, projekto ekspertizę vykdė UAB „Statybos ekspertų biuras“, ekspertizės aktas Nr.338/10-2

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, projekto parengimo metai, projekto vadovas, projektą ekspertavusi įmonė, ekspertizės išvadų data ir Nr.)

ir patvirtino Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2010-12-17,
Nr. T-47

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė:

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Basanavičiaus 36/2, LT-03109 Vilnius

4. Darbus atliko:

rangovas UAB „Viadukas“, kv. at. Nr. 0472

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

subrangovai UAB „Lemminkainen Lietuva“ atliko asfaltbetonio dangos klojimo darbus,

kv. at. Nr. 3076; UAB „Tiltuva“ atliko deformacinio pjūvio įrengimo darbus, kv. at. Nr. 1210

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Darbai pradėti 2011 m. balandžio mėn.

6. Statinio (kelio) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			
2. Kelio ruožo ilgis	km		
3. Žemės sankasos plotis	m		
4. Važiuojamosios dalies plotis	m		
5. Kelio dangos tipas	-		
6. Kelio dangos storis	cm		
7. Faktinė kaina	tūkst. Lt		
8. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
9. Bendra kaina	tūkst. Lt		

7. Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Tilto (viaduko) ilgis	m	86,70	
2. Pločio gabaritas	m	10,00	
3. Aukščio gabaritas	m	>5,00	
4. Deformaciniai pjūviai	m	47,80	
5. Atraminiai guoliai	Metaliniai atraminiai guoliai		
6. Turėklai	Metaliniai cinkuoti turėklai T-5 – 86 sekcijos		
7. Atitvarai	Metaliniai atitvarai 176,00 m		
3. Skaičiuojamoji apkrova	Pagal LST EN 1991-2:2005		
4. Faktinė kaina	tūkst. Lt	1012,77206	
5. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
6. Bendra kaina	tūkst. Lt	1012,77206	

Bendra statybos (rekonstravimo) kaina

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Faktinė kaina	tūkst. Lt		
2. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
3. Bendra statybos (rekonstravimo) kaina	tūkst. Lt		

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės yra įvykdytos.

9. Atlikti statybos (rekonstravimo) darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti techninėje dokumentacijoje. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Objekto sutvarkymo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti reikalaujama užbaigti pagal priedą Nr.2

11. Komisija pripažįsta, kad atlikti Tilto per Miniją valstybinės reikšmės kelio Nr.228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 7,69 km remonto darbai

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

12. Rangovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t.y. 5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Akto priedai:

1. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (priedas Nr.1).
2. Objekto sutvarkymo ir kitų papildomų darbų žiniaraštis (priedas Nr.2).

Komisijos pirmininkas

(parašas)

G. Viršilas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

P. Verbickas

Dirbtorius pavaduotojas
P. Kaučikas

Kęstutis Pralgauskas
atest. Nr. 13913

M. Tvysa

G. Kučinskas

Rangovas

A. Miškūnas

Statinio statybos vadovas

A. Batiuškov

Techninis prižiūrėtojas

R. Ubis

(parašas)

(v., pavardė)

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolatinei saugoti.

Šį objektą priėmė patikėjimo teise valdyti, naudoti, disponuoti ir prižiūrėti:

VI „Klaipėdos regiono
keliai“
(įmonė)

Direktorius

(pareigos)



*Direkcinis paveduotojas-
vykdymo įstatytojas
Klaipėdos Krašto kelių
direkt. Nr. 13913*

P. Kaučikas

(v., pavardė)


Perdavė:

UAB „Viadukas“
(įmonė)

Techninis direktorius
(pareigos)

(parašas)

A. Miškūnas
(v., pavardė)



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE

2013 m. sausio 07 d. Nr. 1
Vilnius

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte: „*Tilto per Žvizrę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2240 Laigiai-Pažvelsis 3,65 km rekonstravimas*“:

sk ir iu:

1. Aleksandr Batiuškov (Kvalifikacijos atestatas Nr.12842) statybos darbų vadovu ir atsakingu už bendrovės darbuotojų, rangovų ir subrangovų darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir užtikrinimą.

2. Inžinierių Kazį Česnauską statybos darbų vadovo Aleksandr Batiuškov padėjėju, be parašo teisės už bendrovės ribų.

į p a r e i g o j u:

1. Statybos darbų vadovą Aleksandr Batiuškov koordinuoti ir kontroliuoti bendrovės darbuotojų bei rangovinių organizacijų darbą, užtikrinant tinkamą saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą.

2. Statybos darbų vadovą Aleksandr Batiuškov esant gamybiniam būtinumui, darbus organizuoti poilsio dienomis savo nuožiūra pasirenkant reikalingų darbininkų skaičių. Darbus organizuoti taip, kad darbuotojai turėtų pagal įstatymą priklausančią poilsio laiką.

3. Inžinierių Kazį Česnauską užtikrinti tinkamą saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir tiesioginių statybos darbų vadovo Aleksandr Batiuškov nurodymų vykdymą.

p a v e d u:

Įsakymo vykdymo kontrolę statybos/techniniam direktoriui Arvydui Miškūnui.

Direktorius



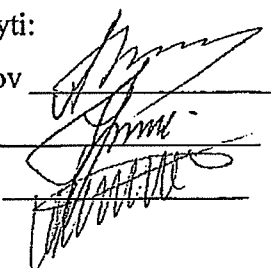
Gediminas Juozas Marinskas

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:

Aleksandr Batiuškov

Kazys Česnauskas

Arvydas Miškūnas



**TILTO PER ŽVIZDRĘ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2240
LAIGIAI-PAŽVELSIS 3.65 KM. REKONSTRAVIMAS, SUTARTIS NR. S-7, 2013-01-07**

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas ir vieta, sutarties Nr. ir data)

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ AKTAS 68A-14 2013-10-23

2013 m. spalio mėn. 14 d.

Vilnius
(vieta)

1. Komisija paskirta 2013 m. spalio mėn. 2 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu 2013 m. spalio mėn. 2 d. Nr. V-407 „Dėl rangovo užbaigtų statybos darbų priėmimo komisijos sudarymo“

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas G.Viršilas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Tiltų skyriaus vedėjas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

P.Verbickas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo skyriaus Vyriausiasis inspektorius

S.Anusas

UAB Tiltų ekspertų centras Projektų vadovas

K. Pralgauskas

Valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

V.Lukšas

Klaipėdos AVPK Klaipėdos raj. PK Kelių policijos poskyrio specialistas

(v., pavardė)

(pareigos)

dalyvaujant:

rangovui UAB „Viadukas“ techniniam direktoriui Arvydui Miškūnui, at. Nr.21211

(įmonės pavadinimas, pareigos v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

statinio statybos vadovui UAB Viadukas inžinieriui Aleksandr Batiuškov at. Nr.12842

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui AB Problematika techniniam prižiūrėtojui Raimondui Ubiui at. Nr. 3182

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti tilto per Žvizdrę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2240 Laigiai-Pažvelsis 3.65 km. rekonstravimo darbai,

(kelio Nr., pavadinimas, ruožas, tilto vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal projektą, kurį 2013 m. parengė UAB „Tiltų ekspertų centras“, projekto vadovas Saulius Anusas, kv. at. Nr. 25332, projekto ekspertizę vykdė UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, ekspertizės aktas Nr. 99-39(12)-SPEC/EB(12)/1/2012, 2013 m. kovo mėn. 29 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, projekto parengimo metai, projekto vadovas, projektą ekspertavusi įmonė, ekspertizės išvadų data ir Nr.)

ir patvirtino Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymas T-13.

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013 m. balandžio 12 d. NR. LNS-34-130412-00238

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Basanavičiaus 36/2, LT-03109 Vilnius

4. Darbus atliko:

rangovas UAB „Viadukas“, at. Nr. 0472

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

subrangovai

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Darbai pradėti 2013 m. gegužės mėn.

6. Statinio (kelio) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			
2. Kelio ruožo ilgis	km		
3. Žemės sankasos plotis	m		
4. Važiuojamosios dalies plotis	m		
5. Kelio dangos tipas	-		
6. Kelio dangos storis	cm		
7. Faktinė kaina	tūkst. Lt		
8. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
9. Bendra kaina	tūkst. Lt		

7. Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Pralaidos tipas			
2. Pralaidos tipas pagal medžiagą		Metalinė gofruota	
3. Elementų (žiedų) skaičius	vnt.		
4. Skerspjuvis	m	5,655x1,505	
4. Angų skaičius	vnt.	1	
5. Antgalių konstrukcija: įtek/ištek	Betoniniai sparnai		
6. Pamato tipas	Spraustiniai poliai, betoniniai pamatai		
7. Pralaidos ilgis	m	8,422	
8. Izoliacijos tipas			
9. Altitudės: įtek/ištek	m	100,31/100,23	
10. Faktinė kaina	tūkst. Lt	599,83621	
11. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
12. Bendra kaina	tūkst. Lt	599,83621	

Bendra statybos (rekonstravimo) kaina

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Faktinė kaina	tūkst. Lt	599,83621	
2. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt		
3. Bendra statybos (rekonstravimo) kaina	tūkst. Lt	599,83621	

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės yra įvykdytos.

9. Atlikti statybos (rekonstravimo) darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti techninėje dokumentacijoje. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Objekto sutvarkymo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti reikalaujama užbaigti pagal priedą Nr.2

11. Komisija pripažįsta, kad atlikti tilto per Žvizardę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2240 Laigiai-Pažvelsis 3,65 km. rekonstravimo darbai
(kelio, tilto, viaduko pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

12. Rangovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t.y. 5 metai (metai pagal sutartyje numatytas sąlygas), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Akto priedai:

1. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (priedas Nr.1).
2. Objekto sutvarkymo ir kitų papildomų darbų žiniaraštis (priedas Nr.2).

Komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Gediminas Viršilas
(v., pavardė)

Komisijos nariai

.....
.....
.....
.....
.....

Petras Verbickas
Saulius Anusas
Kęstutis Pralgauskas
Vaidas Lukšas

Rangovas

.....

Arvydas Miškūnas

Statinio statybos vadovas

.....

Aleksandr Batiuškov

Techninis prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Raimondas Ubis
(v., pavardė)


Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolatinei saugoti.

Šį objektą priėmė patikėjimo teise valdyti, naudoti, disponuoti ir prižiūrėti:

VĮ „Klaipėdos regiono
keliai“

(įmonė)

Direktoriaus
pavadootojas –
vyriausiasis
inžinierius
(pareigos)



Kęstutis
Pralgauskas


(v., pavardė)

Perdavė:

UAB „Viadukas“

(įmonė)

Techninis
direktorius
(pareigos)



Arvydas
Miškūnas

(v., pavardė)

KETINIMO PROTOKOLAS

2016-01-12

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė "ALZIDA" atstovaujama atstovaujama vedančiojo inžinieriaus Zenono Reikos, pavaduojančio direktorių pagal 2016-01-08 įsakymo Nr. PER16-01, uždaroji akcinė bendrovė "VIADUKAS" atstovaujama direktoriaus Gedimino Juozo Marinsko pasirašo šį ketinimo protokolą dėl sutartyje numatytų savikontrolės darbų vykdytinų projekte **TILTO PER VERSEKĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 127 BABRIŠKĖS–VARĖNA–EIŠIŠKĖS 40,316 KM REKONSTRAVIMAS**

UAB "VIADUKAS" ketina, laimėjus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskelbtą konkursą dėl darbų vykdytinų **TILTO PER VERSEKĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 127 BABRIŠKĖS–VARĖNA–EIŠIŠKĖS 40,316 KM REKONSTRAVIMAS** pavesti atliekamų šiame projekte numatytų darbų laboratorinę kontrolę uždarajai akcinei bendrovei „Alzida“.


UAB „Alzida“ sutinka atlikti savo profiliui priklausančius laboratorinius tyrimus, pagal UAB „Viadukas“ užsakymą, apmokant pagal faktiškus darbų kiekius ir tuo metu galiojančius įkainius.

Ketinimų protokolą įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš pasirašusių pusių.

Priedai: Laboratorijos akreditavimo ir atestavimo pažymėjimai

UAB "VIADUKAS", Vilnius, Tunelio g. 4, tel. (5) 213 89 31 faksas „ (5) 238 45 42, įmonės kodas 111441125; Atsiskaitomoji sąskaita LT 64 7044 0600 0015 9578 AB Vilniaus bankas banko kodas 70440

UAB "ALZIDA", Vilnius, Savanorių pr.221, tel. (5) 2647588,faksas (5) 2647681, įmonės kodas 122270615;


UAB "VIADUKAS"

Direktorius

Gediminas Juozas Marinskas


A.V. [illegible]


UAB "ALZIDA"

Vedantysis inžinierius,

pavaduojantis direktorių,

Zenonas Reika





**NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS**

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.008

Galioja iki 2020-11-29

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos liudija, kad

UAB „Alzida“

Savanorių pr. 221, 02300 Vilnius

atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005

reikalavimus ir akredituota atlikti


***medžiagų ir gaminių, naudojamų statyboje ir kitose srityse, bandymus
ir ėminių ėmimą (1 priedas)***

***plytelių klijų eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo procedūras
pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011
reikalavimus (2 priedas)***

Akreditavimo sritys pateiktos pažymėjimo prieduose

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 1997-04-18

Direktorius



2015-11-30

Jurgis Šarmavičius

SERTIFIKATAS



patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Viadukas“
Tunelio g. 4A
LT-03153 Vilnius
Lietuva

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų statinių: geležinkelio ir automobilių tiltų ir viadukų (neribojant statinio ilgio), nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, tunelių, pralaidų, hidrotechnikos statinių statyba, rekonstrukcija, techninė priežiūra ir bendrieji statybos darbai

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 11182
TIC 15 104 5167

Galioja iki: 2017-03-12
Galioja nuo: 2014-03-13

Audito ataskaitos Nr: 3330 22XW M0

Pirminis sertifikavimas: 2001//2005

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

A. Doeberl


TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2014-03-13



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-05-01
D-ZM-16006-05-02



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma

Del sertifikato galiojimo galite pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • zertifizierung@tuev-thueringen.de

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016-01-14

Vilnius

Mes, žemiau pasirašę, UAB Viadukas, įmonės kodas 111441125, atstovaujama direktoriaus Gedimino Juozo Marinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (Toliau Rangovas), iš vienos pusės ir UAB Tiltų ekspertų centras (toliau Subrangovas), atstovaujama techninio direktoriaus Stasio Maciukevičiaus, įmonės kodas 226148570, iš kitos pusės, sudarėme šį ketinimų bendradarbiauti susitarimą.

Šiuos susitarimu UAB „Tiltų ekspertų centras“ patvirtina, kad tuo atveju jeigu UAB „Viadukas“ laimės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skelbtą atvirą supaprastintą konkursą:

Tilto per Verseką valstybinės reikšmės kelio Nr.127 Babriškės –Varėna-Eišiškės 40,316 km. rekonstravimas skelbtas CVP IS priemonėmis, vykdys atitinkamą sutarties dalį: projektavimo darbus.

Tikslūs subrangovo sutarties terminai ir sąlygos bus numatyti vėliau pasirašytoje subrangos sutartyje. Iki Rangos sutarties sudarymo, Šalys susitaria ir patvirtina kad:

1. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja tokiais pajėgumais: finansiniais, ekonominiais, techniniais ir personalo ištekliais, kurie reikalingi projektavimo darbams, bei ekspertizei atlikti;
2. Rangovas patvirtina kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Subrangovo atliktus darbo projektą ir ekspertizę;
3. Subrangovas patvirtina kad yra pilnai susipažinęs su Konkurso Sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais, bei patvirtina, kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti reikalingus Darbus;
4. Viso projektavimo kaina 21200,00 Eur. be PVM.
5. Galutinė Projekto parengimo kaina gali kisti Projektavimo darbų sutarties pasirašymo metu.

UAB „Viadukas“
Įmonės kodas 111441125
PVM mokėtojo kodas LT114411219
Tunelio 4 A, Vilnius LT03153

tel. 8 5 213 86 31
UAB „Viadukas“
direktorius Gediminas Juozas Marinskas

UAB „Tiltų ekspertų centras“
Įmonės kodas 226148570
PVM mokėtojo kodas LT261485716
T.Ševčenkos g.16a/ Vytenio g. 14,
Vilnius LT03111
tel. 8 5 210 53 19
UAB „Tiltų ekspertų centras“
Techninis direktorius Stasys Maciukevičius

A.V.



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“
DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE**

2007 m. gegužė 17 d. Nr. 17
Vilnius

Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte: „*Kretingos rajonas, tilto per Akmeną valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2306 Kūlupėnai – Darbėnai 11,49 km remontas*“.

S k i r i u:

1. Aleksandr Batiuškov, kvalifikacijos atestatas Nr. 12842, statybos darbų vadovu ir asmeniu atsakingu už darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir darbuotojų instruktavimus darbo vietoje.

Direktorius

Gediminas Marinskas

Gediminas Marinskas

Susipažinau ir sutinku:

A. Batiuškov

[Signature] 2007 05 17

Statinio pavadinimas Tiltas per Akmenos upę

(tiltas/viadukas, kertama kliūtis)

Statinio adresas kelias Nr. 2306 Kūlupėnai-Darbėnai 11,49 km

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) km)

Statinio kategorija ypatingas

(ypatingas/neypatingas)

Kultūros paveldo statinys ne

(taip/ne)

Statybos rūšis paprastasis remontas

(nauja statyba/ rekonstravimas/kapitalinis remontas/paprastasis remontas)

Nr. S-81, 2007 kovo 19 d

(sutarties Nr. ir data)

pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

Kretingos rajono savivaldybė

(savivaldybė)

2008m. vasario mėn. 06 d.

Priėmimo komisija, paskirta 2007 m. gruodžio mėn. 12 d. Lietuvos automobilių kelių direk-
cijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. V-457 šios sudėties:

komisijos pirmininkas LAKD tiltų skyriaus vedėjas G.Viršilas

(pareigos, v., pavardė)

nariai:

generalinio projektuotojo UAB "Kelprojektas" projekto vadovas J.Plavinskas

kelius prižiūrinčios valstybės įmonės VI "Klaipėdos regiono keliai" direktorius

P.Kaučikas

LAKD Projektų įgyvendinimo skyriaus vyr. inspektorius P.Verbickas

Kretingos RPK VP VTS viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio viršininkas

Algirdas Budginas

dalyvaujant:

rangovui UAB „Viadukas“ techniniam/statybos direktoriui A.Miškūnui, kvalifikacijos
atestato Nr. 8388

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui VI "Problematika" techniniam prižiūrėtojui R.Jautakiui
kvalifikacijos atestato Nr. 10824

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

apžiūrėjo pateiktą priimti tiltą per Akmenos upę kelyje Nr. 2306 Kūlupėnai-Darbėnai
11,49 km

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) vieta)

patikrino jo rekonstravimo (remonto) projektinę bei darbų vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Rekonstravimas (remontas) vyko pagal projektą, kurį parengė UAB „Kelprojektas“,
atestato Nr.0473

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
ir patvirtino Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, generalinio direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius
(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą vykdyti darbus išdavė VI „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai V.Gružas, 2007 m. gegužės mėn. 30 d. Nr. 04-18

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 32/2

4. Rekonstravimo (remonto) darbus atliko:
Rangovas Remonto darbus atliko UAB „Viadukas“ atestato Nr.0472

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
Subrangovai asfaltbetonio klojimo darbus atliko UAB „Žemaitijos keliai“ atestato Nr.0186

(įmonių ir jų atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)

5. Rekonstravimas (remontas) pradėtas 2007 m. rugpjūčio mėn.

6. Priimamo naudoti tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Kelio ruožo ilgis	m		
2. Tilto (viaduko) ilgis	m	22,90	
3. Gabaritas	m	7,4+2x0,75	
4. Skaičiuojamoji apkrova	-	A11; AR80	
5. Statybos darbų kaina	tūkst. Lt	527,00920	
6. Projektavimo darbų kaina	tūkst. Lt	73,816	
7. Techninės priežiūros darbų kaina	tūkst. Lt	3,95108	
8. Bendra kaina	tūkst. Lt	604,77634	

7. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atliktieji rekonstravimo (remonto) darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

9. Patvirtinto projekto pakeitimų bei nuokrypų nebuvo ir nėra.

10. Darbus, kuriuos leista atidėti, reikalaujama užbaigti pagal priedą Nr.2

11. Priėmimo komisija pripaįsta, kad tiltą per Akmenos upę kelyje Nr. 2306 Kūlupėnai-Darbėnai 11,49 km

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) vieta)

tenkina nustatytus reikalavimus ir priima tiltą (viaduką) naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruodamas statinį nekilnojamo turto registre.


Akto priedai:

1. Perduodama techninė ir vykdymo dokumentacija (priedas Nr.1) I tomas.

2. Kelio, tilto (viaduko) sutvarkymo ir papildomų darbų žiniaraštis (priedas Nr.2).

3. Valstybinės priežiūros institucijų pažymos _____ lapų.

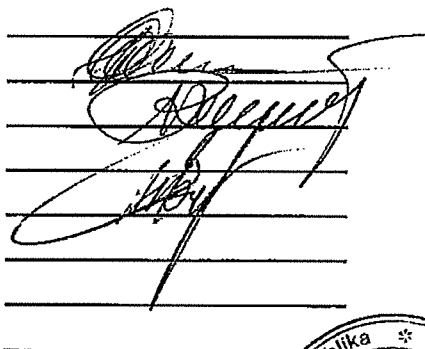
Komisijos pirmininkas


(parašas)

G. Viršilas

(v., pavardė)

Komisijos nariai




J. Plavinskas

P. Kaučikas

P. Verbickas

A. Budginas

Rangovas



A. Miškūnas

Techninis priežiūrėtojas

R. Jautakis

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE

2011 m. rugpjūčio 04 d. Nr.19

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas ir tinkamą darbų organizavimą atliekant darbus objekte „Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija. Metalinių tiltų per Perkastos ir Veiviržo upes rekonstravimo darbai“ sutarties Nr.SP-229, 2011-06-16 atsakingais priskiriami šie darbuotojai:

Projekto vadovas (grupės vadovas)	Gediminas Juozas Marinskas , at. Nr. 22107;
Tiltų statybos vadovas	Aleksandr Batiuškov, at. Nr.12842;
Geležinkelio statybos darbų vadovas	subrangovas UAB „Plungės Jonis-S“ darbuotojas Rimas Rašinskas at. Nr. 22666;
Istorinio paveldo specialistas	Vidmantas Gamulėnas, at. Nr.1485

Priedas: UAB „Plungės Jonis-S“ įsakymas dėl statybos darbų vadovo skyrimo-1 lapas


Direktorius



Gediminas Juozas Marinskas

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:

A. Batiuškov


(parašas)

V. Gamulėnas

(parašas)

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2013 m. rugpjūčio 7 d. Nr. *sur-30-130807-00182*

Gargždai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės 2013 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. P3-1505

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Dalytė Rapalienė- VTPSI prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai: Sigitas Dambrauskas-AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ direktoriaus pavaduotojas kelių ūkiui;
Kristina Juozėnaitė –Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus Vyriausioji inspektorė ;
Kęstutis Pralgauskas –VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas;
Virginijus Skumanas-Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Algirdas Vaitkus –Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros vedėjas;
Egidijus Zykas-Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektorius;

3. Statybos adresas: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija (pagrindinio geležinkelio kelio Klaipėda –Pagėgiai Nr.1, ruože 24+628 km.)

4. Statytojas : AB „Lietuvos geležinkeliai“, į.k. 110053842

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Statinio pavadinimas: geležinkelio tiltas per Perkaso (Piktvardės) upę pagrindiniame geležinkelio kelio Klaipėda –Pagėgiai Nr.1, kurio unikalus Nr.4400-0669-3396, ruože 24+628 km. (Kultūros vertybių registre įregistruoto objekto unikalus kodas 34651)
Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai (geležinkelio tiltas)
Unikalus Nr.: 4400-0669-3396
Statinio kategorija: Ypatingas statinys
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

1.1. Techninis darbo projektas Nr. SP(DI)-08-TDP-GTV Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda – Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija. Tilto per Perkaso upę 24+628 km rekonstrukcija, parengtas 2010 m. su žyma „Taip pastatyta“ (popierinis variantas):

1.2. Bendroji dalis BD, tomas 01;

1.3. Architektūros - konstrukcijų dalis AK, tomas 02;

1.4. Susisiekimo. Geležinkelio kelias SGK, 03 tomas;

1.5. Paveldo tvarkomieji darbai PTD, 04 tomas;

1.6. Aplinkos apsaugos AA, 05 tomas;

1.7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SDO, 06 tomas;

1.8. Darbų kiekių žiniaraščiai DKZ, 07 tomas;

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio Vyriausioji specialistė
Dalytė Rapalienė

- 1.9. Papildomi brėžiniai, 1 byla, 20 lapų.
 2. Statybą leidžiantys dokumentai:
 - 2.1. Statybos leidimas 2011-03-09 Nr.LNS-34-110309-00127, 1 lapas;
 3. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos:
 - 3.1. Statybos dalyvių Kvalifikacijos atestatų kopijos, 14 lapų;
 - 3.2. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso PZULT Nr.1310058 kopija, 3 lapai;
 - 3.3. Statybinių rizikų draudimo poliso PZULT Nr.1310072 kopija, 2 lapai;
 - 3.4. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo PZULT Nr.1539707 kopija, 3 lapai.
 - 3.5. Statybinių rizikų draudimo poliso PZULT Nr.1539713 kopija, 3 lapai;
 - 3.6. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų VR Nr.001509 ir SPCA Nr.021783 kopijos, 7 lapai;
 4. Tiltų per Perkaso ir Veiviržo upes statiniai ir dinaminiai priimamieji bandymai, 1 byla;
 5. Kadastro ir registro dokumentų byla, Nr.55/59678, 1 vnt.
 6. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas, 2013-06-04, 1 lapas;;
 7. *Tilto per Perkaso upę 24+628 km* statybos darbų žurnalai (popierinis variantas), 4 vnt.;
 8. *Tilto per Perkaso upę 24+628 km* statybos techninė ir projektinė dokumentacija, 1 byla:
 - 8.1. Geodezinės kontrolinės nuotraukos (F-15);
 - 8.2. Projektinės dokumentacijos pakeitimai (F-5);
 - 8.3. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymo aktai (F-55);
 - 8.4. Pažymos ir kt. dokumentai (F-56):
 - statybos darbų žurnalas Nr.1*
 - 8.4.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Leidimas rekonstruoti statinį 2011-03-09, Nr. LNS-34-110309-00127, 1 lapas;
 - 8.4.2. Aktas-leidimas statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje, 4 lapai;
 - 8.4.3. Leidimas vykdyti žemės darbus, 8 lapai;
 - 8.4.4. Statybietės perdavimo-priėmimo aktas, 2012-02-27, 2 lapai;
 - 8.4.5. Montажinių sujungimų stipriaisiais varžtais įrengimo žurnalas, 16 lapų;
 - 8.4.6. Atramų stiprinimas injektuojant cementiniu skiediniu žurnalas, 26 lapai;
 - statybos darbų žurnalas Nr.2*
 - 8.4.7. Grunto priėmimo pažyma, 1 lapas;
 - 8.4.8. Atliktų darbų patikrinimo aktas, 2 lapai;
 - 8.4.9. Materialinių vertybių perdavimo – priėmimo aktas, 3 lapai;
 - 8.4.10. Pažyma dėl medžiagų grąžinimo, 4 lapai;
 - 8.4.11. Gabaritų žiniaraštis, 5 lapai;
 - statybos darbų žurnalas Nr.3*
 - 8.4.12. Statybinio gelžbetoninio laužo pridavimo-priėmimo aktas, 2 vnt., 3 lapai;
 - statybos darbų žurnalas Nr.4*
 - 8.4.13. Statybinio laužo pridavimo-priėmimo aktai 2013-01-15 Nr. 13/01/15,2013-04-12 Nr. 13/04/12, 2 vnt., 3 lapai;
 - 8.4.14. Grunto perdavimo-priėmimo pažyma, 3 lapai;
 - 8.4.15. Tilto techninis pasas, 4 lapai.
9. *Tilto per Perkaso upę 24+628 km* atitikties deklaracijos, 1 byla;

10. Tilto per Perkaso upę 24+628 km statybos produktų ir įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai bei sertifikatai (F-54), 1 byla:

10.1. statybos darbų žurnalas Nr.1;

10.2. statybos darbų žurnalas Nr.2;

10.3. statybos darbų žurnalas Nr.3;

10.4. statybos darbų žurnalas Nr.4.

11. Tilto per Perkaso upę 24+628 km techninė dokumentacija, 1 byla;

12. Pažyma apie statinio atitiktį projektui, Nr.1, 2013-06-25, 1lapas.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

Mindaugas Papatulis

9.2. statinio projekto vadovas

Antanas Popovas

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Klaipėdos skyriaus
viršininkas

9.4. statinio statybos vadovas

Aleksandr Batiuškov

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

9.6.1.

Andrius Laga

9.6.2.

Valentinas Smirnovas

9.7. kiti


asmenys:

Modestas Banešius


UDB „Viadukas“ Radvilas Bieševičius


10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas


Dalytė Rapalienė  2013-08-07


Komisijos nariai:


Sigitas Dambrauskas  2013-07-30

Kristina Juozėnaitė  2013-07-30


Kęstutis Pralgauskas  2013-07-30

Virginijus Skumanas  2013-07-30

Algirdas Vaitkus  2013-07-30

Egidijus Zykas  2013-07-30

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Direkoriaus pavaduotojas kelių ūkiu
Sigitas Dambrauskas  2013.07.30 Projekto vadovas
Mindaugas Papakulis
(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)


STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	75,71	75,70
5.1	Plotis	m	5,47	5,47


NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodomas.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Direkoriaus pavaduotojas kelių ūkiu
Sigitas Dambrauskas  2013.07.30 Projekto vadovas
Mindaugas Papakulis
(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

DALYTĖ RAPALIENĖ  2013-08-07
(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2013 m. *2013-08-07* d. Nr. *SUR-30-130807-00103*

Gargždai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės 2013 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. P3-1538
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Dalytė Rapalienė - VTPSI prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai: Egidijus Černeckis - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas;
Sigitas Dambrauskas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ direktoriaus pavaduotojas kelių ūkiui;
Kristina Juozėnaitė – Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus vyriausioji inspektorė;
Kęstutis Jaudzemas - AB "Lesto" Šilutės - Šilalės skyriaus viršininkas;
Galina Misevičienė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros vedėja;
Žilvinas Perminas – AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas;
Bernardas Skersis – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Sigitas Šeputis - Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;
Algirdas Vaitkus – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros vedėjas;
Egidijus Zykas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektorius;
Arūnas Venspolis – TEO LT AB Tinklo resursų ir statybos skyriaus Klaipėdos tinklo eksploatavimo centro vyresnysis inžinierius.

3. Statybos adresas: Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorija (pagrindinio geležinkelio kelio Klaipėda –Pagėgiai Nr.1, ruože 27+566 km.)

4. Statytojas : AB „Lietuvos geležinkeliai“, į. k. 110053842

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

- 5.1. Statinio pavadinimas: geležinkelio tiltas per Veiviržo upę pagrindiniame geležinkelio kelio Klaipėda –Pagėgiai Nr.1, kurio unikalūs Nr.4400-0669-3396, ruože 27+566 km. (Kultūros vertybių registre įregistruoto objekto unikalūs kodas 34652)
Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai (geležinkelio tiltas)
Unikalūs Nr.: 4400-0669-3396
Statinio kategorija: Ypatingas statinys

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

1. Techninis darbo projektas Nr. SP(DI)-08-TDP-GTP Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda – Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija. Tilto per Veiviržo upę 27+566 km rekonstrukcija, parengtas 2011 m. su žyma „Taip pastatyta“ (popierinis variantas):
 - 1.1. Bendroji dalis BD, tomas 01;
 - 1.2. Architektūros - konstrukcijų dalis AK, tomas 02;
 - 1.3. Susisiekimo. Geležinkelio kelias SGK, 03 tomas;
 - 1.4. Paveldo tvarkomieji darbai PTD, 04 tomas;
 - 1.5. Aplinkos apsaugos AA, 05 tomas;
 - 1.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SDO, 06 tomas;
 - 1.7. Darbų kiekių žiniaraščiai DKZ, 07 tomas;
 - 1.8. Papildomi brėžiniai, 1 byla, 28 lapai.
2. Statybą leidžiantys dokumentai:
 - 2.1. Statybos leidimas 2011-01-25 Nr.LNS-37-110117-00003, 1 lapas;
 - 2.2. Statybos leidimas 2011-03-18 Nr.LNS-34-110318-00164, 1 lapas.
3. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos:
 - 3.1. Statybos dalyvių Kvalifikacijos atestatų kopijos, 14 lapų;
 - 3.2. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso PZULT Nr.1310058 kopija, 3 lapai;
 - 3.3. Statybinių rizikų draudimo poliso PZULT Nr.1310072 kopija, 2 lapai;
 - 3.4. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo PZULT Nr.1539707 kopija, 3 lapai.
 - 3.5. Statybinių rizikų draudimo poliso PZULT Nr.1539713 kopija, 3 lapai;
 - 3.6. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų VR Nr.001509 ir SPCA Nr.021783 kopijos, 7 lapai;
4. Tiltų per Perkaso ir Veiviržo upes statiniai ir dinaminiai priimamieji bandymai, 1 byla;
5. Kadastro ir registro dokumentų byla, Nr.55/59678, 1 vnt.
6. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas ,2013-06-04, 1 lapas;
7. Tilto per Veiviržo upę 27+566 km statybos darbų žurnalai (popierinis variantas), 2 vnt.;
8. Tilto per Veiviržo upę 27+566 km statybos techninė ir projektinė dokumentacija, 1 byla:
 - 8.1. Geodezinės kontrolinės nuotraukos (F-15);
 - 8.2. Projektinės dokumentacijos pakeitimai (F-5);
 - 8.3. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymo aktai (F-55);
 - 8.4. Pažymos ir kt. dokumentai (F-56);

statybos darbų žurnalas Nr.1

- 8.4.1. Šilutės r. savivaldybės administracijos Leidimas rekonstruoti statinį 2011-01-25, Nr. LNS-37-110117-00003, 1 lapas;
- 8.4.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Leidimas rekonstruoti statinį 2011-03-18, Nr. LNS-34-110318-00164, 1 lapas;
- 8.4.3. Aktas-leidimas statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje, 4 lapai;
- 8.4.4. Leidimas vykdyti žemės darbus, 5 lapai;
- 8.4.5. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, 8 lapų;
- 8.4.6. Montažinių sujungimų stipriaisiais varžtais įrengimo žurnalas, 11 lapų;

8.4.7. Atramų stiprinimas injektuojant cementiniu skiediniu žurnalas, 18 lapai;

statybos darbų žurnalas Nr.2

8.4.8. Grunto priėmimo pažyma, 1 lapas;

8.4.9. Atliktų darbų patikrinimo aktas, 2 lapai;

8.4.10. Materialinių vertybių perdavimo – priėmimo aktas, 3 lapai;

8.4.11. Pažyma dėl medžiagų gražinimo, 4 lapai;

8.4.12. Gabaritų žiniaraštis, 5 lapai;

8.4.13. Statybinio laužo pridavimo-priėmimo aktas, 2 vnt., 13 lapų;

8.4.14. Tilto techninis pasas, 8 lapai.

9. Tilto per Veiviržo upę 27+566 km atitikties deklaracijos, statybos produktų ir įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai bei sertifikatai (F-54), 1 byla:

9.1. statybos darbų žurnalas Nr.1;

9.2. statybos darbų žurnalas Nr.2;

10. Tilto per Veiviržo upę 27+566 km techninė dokumentacija, 2 bylos;

11. Pažyma apie statinio atitiktį projektui, Nr. 2(KI)-267, 2013-06-25, 2 lapai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nulaužimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo:

AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Kelių projektų sektoriaus projekto vadovas Mindaugas Papakulis _____

9.2. statinio projekto vadovas Gintaras Bajoras _____

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Gintaras Bajoras _____

9.4. statinio statybos vadovas Aleksandr Batiuškov _____

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas _____

9.6.1. Antanas Latakas _____

9.6.2. Valentinas Šniras _____

9.7. kiti
asmenys:

UAB Viadukas Klaipėdos skyriaus viršininkas Arvydas
Biesevičius 2013-07-30

UAB Viadukas techninio skyriaus viršininkas Vidmantas
Gamulėnas 2013-07-30

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):
Komisijos pirmininkas

Dalytė Rapalienė 2013-08-07

Komisijos nariai:

Egidijus Černeckis 2013-07-30

Sigitas Dambrauskas 2013-07-30

Kristina Juozėnaitė 2013-07-30

Kęstutis Jaudzemas 2013-07-30

Galina Misevičienė 2013-07-30
Vyresnysis valstybinis aplinkos
apsaugos inspektorius
Valentinas Ščervėninas

Žilvinas Perminas 2013-07-30

Bernardas Skersis 2013-07-30

Sigitas Šeputis 2013-07-30

Algirdas Vaitkus 2013-07-30

Egidijus Zykas 2013-07-30

Arūnas Venspolis 2013-07-30

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išpareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Sigitas Dambrauskas-AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“
direktorius pavaduotojas kelių ūkiui 2013-07-30

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jei įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

Projekto vadovas
Mindaugas Pipakulis

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	63,95	64,00
5.1	Plotis	m	5,47	5,47

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Sigitas Dambrauskas-AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“
direktoriaus pavaduotojas kelių ūkiui *[Signature]* 2013.07.30, Projekto vadovas
(vardas, pavardė, parašas, data) *Mindaugas Papakulis*

Komisijos
pirmininkas

Dalytė Rapalienė

(vardas, pavardė, parašas, data)

2013-08-02

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE**

2008 m. birželio 18 d. Nr. 12
Vilnius

Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant tinkamai užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte: „Tilto per Tenenį kelio Nr. 4206 Sakūčiai – Žematkiemis 6,70 km rekonstravimas“,

s k i r i u l. e. Klaipėdos skyriaus viršininko pareigas Aleksandr Batiuškov, kvalifikacijos atestatas Nr. 12842, statybos darbų vadovu ir asmeniu atsakingu už darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir darbuotojų instruktavimą darbo vietoje.

Direktorius

Gediminas Marinskas

Gediminas Marinskas

Susipažinau ir sutinku

A. Batiuškov

A. Batiuškov
(parašas)

2008 06 18
(data)

Statinio pavadinimas Tiltas per Tenenio upę

(tiltas/viadukas, kertama kliūtis)

Statinio adresas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4206

Sakūčiai- Žemaitkiemis 6,7 km.

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) km)

Statinio kategorija ypatingas

(ypatingas/ncypatingas)

Kultūros paveldo statinys ne

(taip/ne)

Statybos rūšis rekonstrukcija

(nauja statyba/ rekonstravimas/kapitalinis remontas/paprastasis remontas)

Nr. S-835, 2008-06-20

(sutarties Nr. ir data)

pripažinimo tinkamu naudoti

AKTAS

2008-12-30 Nr. VTA-163

(akto registracijos data ir Nr.)

Šilutės rajono

(savivaldybė)

2008 m. gruodžio mėn 22 d.

Priėmimo komisija, paskirta 2008m. gruodžio mėn 08d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. V-492 šios sudėties:

komisijos pirmininkas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

Tiltų skyriaus vedėjas G. Viršilas

(pareigos, v., pavardė)

nariai:

Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros vedėjas V. Ščerveninas

apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiasis specialistas K. Galickas

generalinio projektuotojo UAB „Tiltų ekspertų centras“ direktorė O. Jokubauskienė

kelius prižiūrinčios valstybės įmonės VI „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius P. Kaučikas

LAKD Projektų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius P. Verbickas

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas G. Armonas

rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas S. Šeputis

dalyvaujant:

rangovui UAB „Viadukas“ techninis direktorius A. Miškūnas kvalifikacijos atestato Nr.2121

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui VI „Problematika“ techninės priežiūros inžinierius R. Jautakis kvalifikacijos atestato Nr. 10824

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

apžiūrėjo pateiktą priimti Kelias 4206 Sakūčiai-Žemaitkiemis tilto per Tenenio upę, Šilutės raj. sav., Žemaitkiemio k.

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) vieta)

patikrino darbų projektinę bei darbų vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai buvo vykdomi pagal projektą, kurį parengė UAB „Tiltų ekspertų centras“, Nr. 3304

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir patvirtino LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinis direktorius V. Puodžiukas 2008-04-16 Nr. T-13

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą vykdyti darbus išdavė Šilutės rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas S. Šepu-tis 2008-08-07 Nr. 08(1)1-118

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius

4. Darbus atliko:

Rangovas UAB „Viadukas“ Tunelio g. 4a, Vilnius. Kvalifikacijos atestato Nr. 0472

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

Subrangovai nėra

(įmonių ir jų atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Darbai pradėti 2008 m. birželio mėn.

6. Priimamo naudoti tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Tilto (viaduko) ilgis	m	42,75	
2. Pločio gabaritas	m	9,6	
3. Aukščio gabaritas	m	3,0	
4. Deformaciniai pjūviai	m	0,3 m pločio	Bituminiai elastiniai
5. Turėklai			
6. Atitvarai	VMIM-1,33, VMIM-2, VMM-2, VMM-1,33		
7. Skaičiuojamoji apkrova	1-asis apkrovos modelis RA-90 t		
8. Statybos darbų kaina	tūkst. Lt		
9. Projektavimo darbų kaina	tūkst. Lt		
10. Techninės priežiūros darbų kaina	tūkst. Lt		
11. Galutinė kaina	tūkst. Lt		

7. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atliktieji rekonstravimo (remonto) darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

9. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos buvo ir yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Darbus, kuriuos leista atidėti, reikalaujama užbaigti pagal priedą Nr.2
11. Priėmimo komisija pripažįsta, kad kelio 4206 Sakūčiai-Žemaitkiemis tiltas per Tenenio upe, Šilutės raj. sav., Žemaitkiemio k.

(kelio Nr., pavadinimas, tilto (viaduko) vieta)


tenkina nustatytus reikalavimus ir priima tiltą (viaduką) naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruodamas statinį nekilnojamo turto registre.

Akto priedai:

1. Perduodama techninė ir vykdymo dokumentacija (priedas Nr.1) 34 tomų (lapų).
2. Kelio, tilto (viaduko) sutvarkymo ir papildomų darbų žiniaraštis (priedas Nr.2).
3. Valstybinės priežiūros institucijų pažymos lapų.

Komisijos pirmininkas

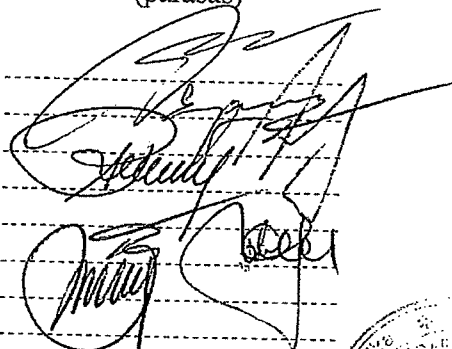


(parašas)

G. Viršilas

(v., pavardė)

Komisijos nariai



V. Ščerveninas

K. Galickas

O. Jokubauskienė

P. Kaučikas

P. Verbickas

G. Armonas


S. Šeputis

Rangovas

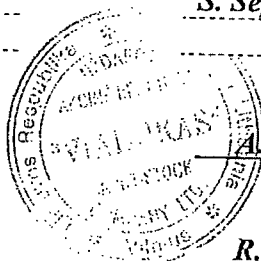


A. Miškūnas

Techninis prižiūrėtojas



R. Jautakis



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“
DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE**

2007 m. rugsėjis 26 d. Nr. 29
Vilnius

Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte: *„Kretingos rajonas, g/b pralaidos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga 130,6 km keitimas į metalinę“.*

S k i r i u:

1. Aleksandr Batiuškov, kvalifikacijos atestatas Nr. 12842, statybos darbų vadovu ir asmeniui atsakingu už darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir darbuotojų instruktavimus darbo vietoje.


Direktorius



Gediminas Marinskas

Susipažinau ir sutinku:

A. Batiuškov


(parašas)

20070928
(data)

Generalinio direktoriaus
pavadootojas
Petras Tekorius

TVIRTINU

(parašas)

(vardas, pavardė, pareigos)

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

2008 m. rugsio mėn. 06 d.

2008-09-10 02A-3Y

Kretingos raj.

(savivaldybė)

UAB "Viadukas" Tunelio g. 4A, LT-03153 Vilnius

(rangovo pavadinimas, adresas, kodas)

atstovaujama direktoriaus Gedimino Marinsko

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
 J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109

atstovaujama tiltų skyriaus vedėjo Gedimino Viršilo

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant VĮ "Klaipėdos regiono keliai" Tilžės g. 54, Klaipėda LT-91110

(keliaų priežiūrinčios įmonės pavadinimas, adresas, kodas)

atstovaujama _____

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

priima atliktus darbus pagal 2007-08-21, Nr. S-910 sutartį "Kretingos rajonas, g/b
 pralaidos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga 130,6 km
 keitimas į metalinę"

(sutarties data, Nr., pavadinimas)

Atliktieji darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimus

Darbai vyko pagal projektą, kurį parengė UAB "Tiltų ekspertų centras"
 techninis direktorius S. Maciukevičius

(projektavimo įmonės pavadinimas, projekto vadovo vardas, pavardė)

Techninę darbų priežiūrą vykdė VĮ "Problematika"

techninės priežiūros inžinierius R. Jautakis

(įmonės pavadinimas, techninės priežiūros inžinieriaus vardas, pavardė)

Pralaidos pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika (pavadinimas)
1. Atstatomo (irengiamo) kelio atkarpa	m		
2. Pralaidos tipas			
3. Pralaidos tipas pagal medžiagą			gofruota metalinė (su betono užpylimu)
4. Elementų (žiedų) skaičius	vnt.		2 segmentai po 6,0 m ilgio ir 2 po 5,0 m ilgio
5. Skerspjūvio forma, diametras			skersmuo 1,20 m
6. Angų skaičius	vnt		1
7. Antgalių konstrukcija			
8. Pamato tipas			
9. Pralaidos ilgis	m		22
10. Izoliacijos tipas			
11. Altitudės: įtek/ištek			
12. Statybos darbų kaina	tūkst.Lt	324,08110	
13. Projektavimo darbų kaina	tūkst.Lt		
14. Techninės priežiūros darbų kaina	tūkst.Lt	6,42244	
15. Galutinė darbų kaina	tūkst.Lt	330,56354	

Projektas ir kita techninė dokumentacija perduodama saugoti kelią prižiūrinčiai įmonei.

Šis aktas surašytas trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienam dalyviui.

Užsakovas

tiltų skyriaus vedėjas
(užsakovo atstovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Viršilas
(vardas, pavardė)

Rangovas

Direktorius
(rangovo atstovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Marinskas
(vardas, pavardė)


Kelią prižiūrinti įmonė

(įmonės atstovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Direktorius pavaduotojas
kelių priežiūrai
VYTAUTAS GRUŽAS



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIADUKAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO STATYBOS OBJEKTE

2010 m. kovo 20 d. Nr. 9

Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“ ir siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas atliekant darbus objekte „*tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4216 Užliekniai-Paleičiai, Šilutės rajonas, 3,36 km projektavimas ir rekonstravimas*“:

s k i r i u Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov atsakingu už bendrovės darbuotojų, rangovų ir subrangovų darbo koordinavimą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą, ir užtikrinimą;

į p a r e i g o j u:

1. Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov koordinuoti ir kontroliuoti bendrovės darbuotojų bei rangovinių organizacijų darbą, užtikrinant tinkamą saugos ir sveikatos darbą, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos organizavimą.

2. Klaipėdos skyriaus viršininką Aleksandr Batiuškov esant gamybiniam būtinumui, darbus organizuoti poilsio dienomis savo nuožiūra pasirenkant reikalingų darbininkų skaičių. Darbus organizuoti taip, kad darbuotojai turėtų pagal įstatymą priklausančią poilsio laiką.

3. Inžinierių Kazį Česnauską ir techninio padalinio darbuotojus užtikrinti tinkamą saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos (gamtos) saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir tiesioginių Klaipėdos skyriaus viršininko Aleksandr Batiuškov nurodymų vykdymą.

P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę statybos/techniniam direktoriui Arvydui Miškūnui.


Direktorius




Gediminas Marinskas

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:


A. Miškūnas

 2010 03 20
(parašas ir data)


A. Batiuškov

 2010 03 20
(parašas ir data)

K. Česnauskas

 2010 03 20
(parašas ir data)

R. Batiuškov

 (parašas ir data)

**TILTO PER KANALĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR.4216
UŽLIEKNIAI-PALEIČIAI (UNIKALUS NR.: 4400-2094-5528), ŠILUTĖS RAJONAS,
3,36 KM. PROJEKTAVIMAS IR REKONSTRAVIMAS, SUTARTIES NR.S-79, 2010-**

03-20

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas ir vieta, sutarties Nr. ir data)

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ AKTAS

2010 m. lapkričio mėn. 25 d.

Kaleričius
(vieta)

1. Komisija, paskirta 2010 m. lapkričio mėn. 4 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu 2010 m. lapkričio mėn. 4 d. Nr. V-317 „Dėl rangovo užbaigtų statybos darbų priėmimo komisijos sudarymo“
2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Tiltų skyriaus vedėjas Gediminas Viršilas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Odeta Jokubauskienė	UAB Tiltų ekspertų centras direktorė
Ričardas Vinciūnas	Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuro specialistas
Petras Verbickas	LAKD Projektų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius
Kęstutis Pralgauskas	VĮ Klaipėdos regiono keliai direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

dalyvaujant:

rangovui UAB „Viadukas“ techniniam direktoriui Arvydui Miškūnui, kval.at. Nr.21211

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

statinio statybos vadovui UAB „Viadukas“, Klaipėdos sk. virš. Aleksandr Batiuškov kval.at. Nr. 12842

ir techniniam prižiūrėtojui VĮ „Problematika“ techniniam prižiūrėtojui Arvydui Andriejauskui kval.at. Nr. 3731

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4216 Užliekniai-Paleičiai 3,36 km. projektavimo ir rekonstravimo darbai

(kelio Nr., pavadinimas, ruožas, tilto vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal projektą, kurį 2010 m. parengė UAB Tiltų ekspertų centras, kval. at. Nr. 3304, galioja iki 2010-12-16, 2010 m. projekto vadovas Algirdas Notkus, at. Nr. 1942

Projekto ekspertizę vykdė UAB „Darbasta“, ekspertizės aktas Nr. BG 10-77, 2010-06-07

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., ir galiojimo data, projekto parengimo metai, projekto vadovas, projektą ekspertavusi įmonė, ekspertizės išvadų data ir Nr.)

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė Šilutės r. savivaldybės administracija, 2010-07-20, Nr.LNS-37-100720-00118

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Basanavičiaus g.36/2, LT-03109 Vilnius

4. Darbus atliko:

rangovas UAB „Viadukas“, at. Nr. 0472

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

subrangovai _____

(įmonių ir jų atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Darbai pradėti 2010 m. rugpjūčio mėn. 03 d.

6. Statinio (kelio) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristika
1. Kelio kategorija			
2. Kelio ruožas ilgis	km		
3. Žemės sankasos plotis	m		
4. Važiuojamosios dalies plotis	m		
5. Kelio dangos tipas	-		
6. Kelio dangos storis	cm		
7. Faktinė kaina	tūkst.Lt.		
8. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst.Lt.		
9. Bendra kaina	tūkst. Lt		

7. Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai (unikalus Nr.: 4400-2094-5528):

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Tilto (viaduko) ilgis	m	8,6	
2. Gabaritas	-		
3. Skaičiuojamoji apkrova	-		
4. Faktinė kaina	tūkst. Lt		
5. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt	41,000/	
6. Bendra kaina	tūkst. Lt		

Bendra statybos (rekonstravimo) kaina

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
1. Faktinė kaina	tūkst. Lt		
2. Projektavimas ir kiti darbai	tūkst. Lt	41,000/	
3. Bendra kaina	tūkst. Lt		

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės įvykdytos.

9. Atlikti statybos (rekonstravimo) darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatytą tvarka suderinti bei nurodyti techninėje dokumentacijoje. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Objekto sutvarkymo ir kitus darbus ,kurios komisija leido atidėti reikalaujama užbaigti pagal priedą Nr. 2.

11. Komisija pripažįsta ,kad atlikti tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4216 Užliekniai-Paleičiai , Šilutės raj. 3,36 km. projektavimo ir rekonstravimo darbai
(kelio, tilto, viaduko pavadinimas)


tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus

12. Rangovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus t.y. 5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*)., paslėptų statinio elementų (konstrukcijų vamzdynų ir kt.)- 10 metų , o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų -20 metų garantinis laikotarpis.

Akto priedai:

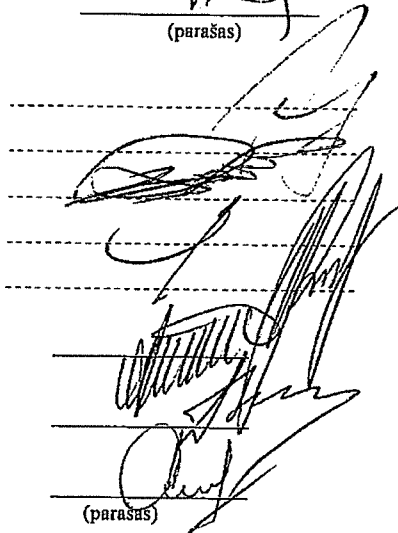
1. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (priedas Nr.1)
2. Objekto sutvarkymo ir papildomų darbų žiniaraštis (priedas Nr.2).

Komisijos pirmininkas


(parašas)

Gediminas Viršilas
(v., pavardė)

Komisijos nariai



Odeta Jokubauskienė

Ričardas Vinciūnas

Petras Verbickas

Kęstutis Pralgauskas

Rangovas

Arvydas Miškūnas

Statinio statybos vadovas

Aleksandr Batiuškov

Techninis prižiūrėtojas

Arvydas Andriejauskas
(v.,pavardė)

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolatinei saugoti

Šį objektą priėmė pasitikėjimo teise valdyti, naudoti, disponuoti ir prižiūrėti:

VI „Klaipėdos regiono keliai“


(įmonė)

direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

(pareigos)

Kęstutis Pralgauskas

(v.pavardė)



Perdavė:


UAB „Viadukas“ techninis direktorius

(įmonė)

(pareigos)

Arvydas Miškūnas

(v.pavardė)



2010 m. lapriočio mėn. 15

(data)

LAISVOS FORMOS TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-01-18

Vilnius

Atsakydami į supaprastinto atviro konkurso sąlygų 11.3 p. nurodome, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime

Direktorius Gediminas Juozas Marinskas *Gediminas Marinskas*



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2012-02-01 Nr. (6.12)2-513
Vilnius

Pažymime, kad

UAB „Viadukas“

tiesėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)

sėkmingai įvykdė sutartį Nr. S-72 (2011-03-07)

tilto per Miniją valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 7,69 km remontas

Darbų atlikimo vertė – 1 225 454,19 Lt su PVM; atliktų darbų pradžios ir pabaigos data – 2011 m. balandžio mėn. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d., atlikimo vieta – Klaipėdos raj.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktoriaus pavaduotojas

Petras Tekorius

G.Viršilas, tel. (8 5) 232 9730, el.p. gediminas.virsilas@lakd.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Faks. (8 5) 232 9609
El. p. lakd@lakd.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

