

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. d.

Utena

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“, ir UAB „Rokmelsta“, įmonės kodas 173726394, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama – „Rangovu“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SĄVOKOS

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai. Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.

Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos užbaigus.

Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas, sąrašas.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis pagal šią Sutartį darbus.

Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

Subrangovas – ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui ir/ar Sutartyje kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.

Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį

atliktą darbą.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas – „Vietinės reikšmės viešųjų kelių profiliavimas ir išdaužų užtaisymas Tauragnų seniūnijoje“.

1.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi atlikti vietinės reikšmės viešųjų kelių profiliavimo ir išdaužų užtaisymo darbus Tauragnų seniūnijoje (toliau - Darbai), o Užsakovas pagal poreikį užsako Darbus, Sutartyje numatyta tvarka priima tinkamą Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui už faktinį darbų atlikimo kiekį pagal Sutartyje numatytus įkainius.

1.3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

1.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.

1.5. Rangovas Darbus vykdo 35 (trisdešimt penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal faktinį Užsakovo poreikį.

1.6. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.7. Darbus Rangovas atlieka pagal seniūnijos seniūno ar seniūną pavaduojančio darbuotojo užsakymą. Užsakymas darbams atlikti pateikiamas raštu ir/ar el. p. Rangovas, gavęs seniūnijos seniūno ar seniūną pavaduojančio darbuotojo užsakymą, pradeda darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo išsiuntimo dienos.

1.8. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantijos naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

2. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus įsipareigoja mokėti fiksuotą įkainį **39,93** Eur (trisdešimt devyni eurai, 93ct) su PVM už 1 km nuprofiluoto vietinės reikšmės viešojo kelio ir išdaužų užtaisymą, 1 km panaudojant ne mažiau kaip 1 m³ žvyro.

2.2. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.

2.3. Sutarties kaina su PVM neturi viršyti **21964,50** Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 50ct.).

2.4. Sutarties kaina su PVM, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį tinkamai atliktų Darbų apimties, bet neturi viršyti numatytos Sutarties kainos.

2.5. Darbų įkainis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimas žemiau nurodytais atvejais:

2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio pasikeitimas, susietas su PVM

pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos;

2.5.2. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.

2.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis taikomas darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis.

2.5.2.4. Pirmoji Darbų įkainio peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Darbų įkainis gali būti peržiūrimas ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

2.5.2.5. Vėlesnis Darbų įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis neperskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (kai

Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.6. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį kiekvieną mėnesį sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas, jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:

2.6.1. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;

2.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

2.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą faktūrą ar kitą atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).

2.8. Už atliktų Darbų dalį Rangovui mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą atsiskaito - Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija (mokėtojas), kodas 188705833, adresas: A. Musteikio g. 35, Tauragnai, Utenos r. sav., a. s. Nr. LT734010051005601996, Luminor bankas, banko kodas 40100.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų;

3.1.3. Tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo laikydamasis ir taikydamasis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus/ar Darbai vykdomi pagal pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu tokie buvo nustatyti.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir pridurtus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sulgtą užmokestį;

3.2.2. Užsakovo atsakingas atstovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:

3.2.2.1. Kokie nors Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 1.2 punkto nuostatų. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą atitinkamai sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų dalies sudėtį; ir (arba)

3.2.2.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokią nors Darbų sudėtinę dalį arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba)

3.2.2.3. Užsakovas motyvuotai raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.2.3. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.2.2. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų perdavimo-priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovas pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai;

3.2.4. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;

3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka;

3.4.2. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pateikto raštiško Darbų užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir apimtis ir juos vykdyti nepertraukiamai, kol bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui.

3.4.3. Darbus atlikti vadovaujantis teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytais reikalavimais Darbams;

3.4.4. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą;

3.4.5. Iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti darbų vadovą (jeigu tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) ir apie tai raštu informuoti Užsakovą;

3.4.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas;

3.4.7. Nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai sandėliuoti;

3.4.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;

3.4.9. Be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;

3.4.10. Atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas prieš 7 kalendorines dienas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo atliktų Darbų sudėtį.

3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

3.4.12. Užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytą aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi/aplinkos apsaugos kriterijų atitikimą, jeigu tokie pirkimo dokumentuose/Sutartyje buvo nustatyti;

3.4.13. Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

3.4.14. Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

3.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitarkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti atlikti Darbus Sutarties 3.4.2. punkte nurodytu terminu, Užsakovas surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą, Rangovas sumoka baudą lygią 5% (penkiems) procentams sutarties kainos be PVM.

4.2. Jeigu Rangovui nesumokama, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu, tai Rangovui Užsakovas moka delspinigius, kurių dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino pabaigos ir skaičiuojami iki visiško mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo siuntimo dienos jų nesumoka, Užsakovas turi delspinigius atskaityti iš sumų už atliktą Darbų dalį.

4.4. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.

4.5. Delspinigių pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

4.6. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo atstovui nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nurodytu adresu. Užsakovas turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos raštu pateikti Rangovui atsiliepimą.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdamas šią Sutartį, įteikiami Sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.10. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos seniūnas Alvydas Danauskas, tel. +370 687 83 597, el. p. alvydas.danauskas@utena.lt.

5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – direktorius Jonas Smalinskas, tel. +370 698 04670, el. p. info@rokmelsta.lt.

5.12. Nepasitelkiama.

***Pastaba: 5.12 punktą pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.**

5.13. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus ar pasitelkiamus naujus (jeigu pasiūlyme buvo nurodyta galimybė pasitelkti nežinomus) subrangovus, ar jeigu raštu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos

reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą minėtą subrangovą pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.

5.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.

5.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.

5.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

5.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.

5.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.

5.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

6.2. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.2.1 punkte.

7. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Šios Sutarties priedai:

9.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (užduotis) „Vietinės reikšmės viešųjų kelių profiliavimas ir išdaužų užtaisymas Tauragnų seniūnijoje“, 2 lapai.

9.1.2. Priedas Nr. 2 – Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašas, 2 lapai.

9.1.3. Priedas Nr. 3 – Tauragnų seniūnijos kelių schema, 1 lapas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenio a. 4, 28503 Utena

Įstaigos kodas: 188710442

Ne PVM mokėtoja

A. s. LT95 4010 0510 0560 0727

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8 389) 61620

El. p. info@utena.lt

Administracijos direktorius

Paulius Čyvas

(parašas, data) A.V.

Rangovas

UAB „Rokmelsta“

Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio r.

Įmonės kodas 173726394

PVM mokėtojo kodas LT737263917

A. s. LT707044060003077424

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. (8 458) 68003

El. p. info@rokmelsta.lt

Įmonės direktorius

Jonas Smalinskas

(parašas, data) A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - UŽDUOTIS

VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ PROFILIAVIMAS IR IŠDAUŽŲ UŽTAISYMAS TAURAGNŲ SENIŪNIJOJE

1. Rangos darbų pavadinimas: „Vietinės reikšmės viešųjų kelių profilavimas ir išdaužų užtaisymas Utenos r. Tauragnų seniūnijoje“.
2. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
3. Rangos darbų vieta – Utenos rajono savivaldybės administracija, Tauragnų seniūnija.
4. Rangos darbų tikslas: atliekant rangos darbus, profiluoti ir užtaisyti išdaužas Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

Atliekant darbus vadovautis Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių bei jų priklausinių Priežiūros vadovu, patvirtintu 2017 m. gegužės 25 d. Utenos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Atliekami darbai:

1. Profilavimas turi būti atliekamas Utenos r. Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešiesiems keliams, kurių ilgis – 152,46 kilometrai (Tauragnų seniūnijos vietiniai reikšmės viešieji keliai nurodyti pridedame priede).
2. Numatoma nuprofiluoti ir užtaisyti išdaužas ne mažiau 50 km ir ne daugiau 550 km Utenos r. Tauragnų sen. vietinės reikšmės viešųjų žvyruotų kelių.
3. Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, darbų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato Tauragnų seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas telefonu ar elektroniniu paštu.
4. Rangovas turi pateikti atsakingų už užsakymo priėmimą asmenų sąrašą ir jų telefonų numerius. Užsakovas ir Rangovas turi suderinti laiką ir tarpusavyje užfiksuoti, kada užsakymas yra pateiktas ir darbus pradėti ne vėliau nei per 2 dienas po užsakymo pateikimo.
5. Profilavimo darbai turi būti atliekami specializuota technika su galiojančia technine apžiūra.
6. Profiluojant kelius pirmą kartą sezone, būtinas reikalavimas – verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro-velėnos volus. To neatlikus, darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos nebus apmokama.
7. Kelio dangos skersinis nuolydis po profilavimo turi būti nuo 3 proc. iki 5 proc. dvišlaitis, o virązuose – vienslaitis.

8. Prieš profiluojant duobėtus kelius, išdaužų užtaisymui 1 km panaudoti ne mažiau kaip 1 m³ žvyro, žvyro frakcija ne smulkesnė kaip 0/32.

9. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, Rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūnijos seniūno nurodytą vietą.

10. Numatomas sutarties galiojimo laikotarpis – 36 mėn., darbų atlikimas – 35 mėn.

11. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, taikant 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: atliekant darbus nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai – Rangovas turi užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos reikalavimo, t. y. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų atlikimo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

Administracijos direktorius

Paulius Čyvas

(parašas, data) A.V.

Įmonės direktorius

Jonas Smalinskas

(parašas, data) A.V.

TAURAGNŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠAS

Kelio numeris	Kelio pavadinimas	Kelio ilgis	Kelio danga, km			Kelio kategorija
			Asfaltas	Žvyras	Gruntas	
Tauragnų seniūnija						
Ta-01	Avižieniškis–Pašilinio miškas	0,88			0,88	IIIv
Ta-02	Tauragnai–Palabės g.	1,77	0,21	0,91	0,65	IIIv
Ta-03	Tauragnų k., Miško g.	0,56			0,56	IIIv
Ta-04	Tauragnų kapinių apvažiavimo kelias	0,36		0,36		IIIv
Ta-05	Labės poilsiavietės kelias	0,87			0,87	IIIv
Ta-06	Tauragnų k., Kuoleliškių g.	1,79			1,79	IIIv
Ta-07	Vyturių g.–Tauragnų rytinis apvažiavimas	0,18		0,18		IVv
Ta-08	Tauragnų rytinis apvažiavimas	0,61			0,61	IIIv
Ta-09	Tauragnų šiaurinis apvažiavimas	0,87			0,87	IIIv
Ta-10	Tauragnų k., Politiškių g.	1,54			1,54	IIIv
Ta-11	Nečioniškio kaimo kelias	0,62			0,62	IIIv
Ta-12	Politiškės–Šeduikiai	2,88			2,88	IIIv
Ta-13	Nečioniškis–Klykiai	2,81			2,81	IIIv
Ta-14	Klykių k., Žvejų g.	0,49			0,49	IIIv
Ta-15	Klykių k., Ažuolų g.	0,65	0,65			IIIv
Ta-16	Klykių k., Ažukalnės g.	1,02			1,02	IIIv
Ta-17	Klykiai–Klykių vienkiemio kelias	0,22			0,22	IVv
Ta-18	Vilkablauzdė–Politiškės	1,28			1,28	IIIv
Ta-19	Vilkablauzdės k., Lauko g.	0,22			0,22	IIIv
Ta-20	Musteikių k. kelias	0,75			0,75	IIIv
Ta-21	Vilkablauzdė–Ruzgiškės	4,22			4,22	IIIv
Ta-22	Vidžiūnai–Spitrėnai	1,37			1,37	IIIv
Ta-23	Vidžiūnai–Kalviai	1,49			1,49	IIIv


Ta-24	Musteikiai–Rukšėnai	2,87			2,87	IIIv
Ta-25	Musteikiai–Bajorai	2,57		2,57		IIv
Ta-26	Bajorų k. kelias	0,55			0,55	IIIv
Ta-27	Sirvydžių kapinių kelias	0,14			0,14	IIIv
Ta-28	Sirvydžių k., Klevų g.	0,97			0,97	IIIv
Ta-29	Gaidžių k., Gojaus g.	0,32			0,32	IVv
Ta-30	Lukošiūnų k., Medžiotojų g.	0,71			0,71	IIIv
Ta-31	Lukošiūnai–Nečėnai	4,67			4,67	IIIv
Ta-32	Antabaltė–Balčiai	1,65			1,65	IIIv
Ta-33	Antabaltės vienk. kelias	0,70			0,70	IVv
Ta-34	Antabaltės k. kelias	1,00			1,00	IIIv
Ta-35	Lukošiūnai–Balčiai	1,89		1,89		IIIv
Ta-36	Balčiai–Rūgšteliskis	1,42			1,42	IIIv
Ta-37	Stūgliai–Duobulė	2,81			2,81	IIIv
Ta-38	Stūgliai–Musteikiai	0,90			0,90	IIIv
Ta-39	Stūglių k., Aukštalaukio g.	0,74			0,74	IIIv
Ta-40	Pilkeniai–Stučiai	2,41		2,41		IIIv
Ta-41	Pilkenių k., Gandrų g.	0,67			0,67	IIIv
Ta-42	Stučių k., Kazio Musteikio g.	0,80			0,80	IIv
Ta-43	Stučių k., Ažugirio g.	0,98			0,98	IIIv
Ta-44	Šeimatis k. kelias	0,56			0,56	IIIv
Ta-45	Šeimatis–Varpiškės	1,42			1,42	IIIv
Ta-46	Šeimatis k., Girininkijos g.	1,10			1,10	IIIv
Ta-47	Šeimatis k., Skaistulės g.	1,51			1,51	IIIv
Ta-48	Stučiai–Varniškės	4,99			4,99	IIIv
Ta-49	Daunoriai–Varniškės	3,88			3,88	IIIv
Ta-50	Daunorių k., Dubuliakalnio g.	0,87			0,87	IIIv
Ta-51	Daunorių k., Eigulių g.	0,91			0,91	IIIv
Ta-52	Šeimatis k., Žiezulnio g.	0,97			0,97	IIIv

Ta-53	Šeimatis–Minčia	4,75			4,75	IIIv
Ta-54	Žiezulnos tiltas–Minčiakampis	2,83			2,83	IIIv
Ta-55	Minčia–Aukštaglynis (rajono riba)	3,94			3,94	IIIv
Ta-56	Vaišnoriškė–ež. Baltelė (rajono riba)	1,76			1,76	IIIv
Ta-57	Vaišnoriškė–Užusienis	1,25			1,25	IIIv
Ta-58	Daunoriai–Šuminai	9,66		9,66		IIv
Ta-59	Šuminų k. kelias	1,94			1,94	IIIv
Ta-60	Vyžiai –Vaišnoriškė	1,07			1,07	IIIv
Ta-61	Vyžių k., Galinių g.	1,86			1,86	IIIv
Ta-62	Vyžių k., Pukokalnio g.	0,50			0,50	IIIv
Ta-63	Vyžių k., Ineigos g.	1,57			1,57	IIIv
Ta-64	Vyžių k., Kauprinių g.	1,28			1,28	IIIv
Ta-65	Vyžių k., Akmenaupės g.	0,61			0,61	IIIv
Ta-66	Vyžiai–Skroblai	2,28			2,28	IIIv
Ta-67	Sėlė–Varniškės	3,25			3,25	IIIv
Ta-68	Sėlės k., Piliakalnio g.	0,83			0,83	IVv
Ta-69	Sėlė–Stripeikiai	2,40	0,14		2,26	IIIv
Ta-70	Sėlės k.kelias	0,37			0,37	IIIv
Ta-71	Sėlės k., Laukų g.	1,71			1,71	IIIv
Ta-72	Sėlės k., Ežero g.	1,03			1,03	IIIv
Ta-73	Šimkūnai–Taurapolis	2,46			2,46	IIIv
Ta-74	Taurapilio k., M. Balčiūno g.	0,37			0,37	IIIv
Ta-75	Tauragnai–Taurapolis	2,47			2,47	IIIv
Ta-76	Tauragnai–Žiezdriai	3,29		3,29		IIIv
Ta-77	Žiezdriai–Akmeniškės	0,54			0,54	IIIv
Ta-78	Sėlė–Gaideliai	3,28		3,28		IIv
Ta-79	Grašiai–Šiaudiniškis	3,77			3,77	IIv
Ta-80	Grašiai–Maleckažemis	4,35			4,35	IIIv
Ta-81	Kamšos k., Kanapienių g.	0,85			0,85	IVv

Ta-82	Tauragnų k., Dvaro g.	0,74			0,74	IIIv
Ta-83	Papirčiai–Kazokiškis	1,87			1,87	IIIv
Ta-84	Maleckažemis–Aviniškis	3,75			3,75	IIv
Ta-85	Maleckažemio k., Guobų g.	0,32			0,32	IVv
Ta-86	Pavarlio k. kelias	1,20			1,20	IIIv
Iš viso Tauragnų seniūnijoje:		146,58	1,0	24,55	121,03	

Miestelio pavadinimas	Gatvės numeris	Gatvės pavadinimas	Gatvės kategorija	Gatvės ilgis	Asfaltas, akmenų grindinys	Žvyras	Gruntas
Tauragnų mstl.	1	Kaštonų	D	0,68	0,68		
	2	Naujoji	D	0,49	0,09		0,40
	3	Aukštutinė	D	0,21			0,21
	4	Ateities skg.	D	0,11			0,11
	5	Ežero	D	0,71			0,71
	6	Kranto	D	0,38	0,38		
	7	Medžiotojų	D	0,11	0,11		
	8	Vyturių	D	0,41	0,41		
	9	Aušros	D	0,24			0,24
	10	Pušų	D	0,26	0,26		
	11	Smėlio	D	0,26	0,26		
	12	Lauko	D	0,44	0,44		
	13	Ateities	D	0,67	0,67		
	14	Stučių	D	0,91	0,82	0,09	
Iš viso:				5,88	4,12	0,09	1,67
Bendras ilgis, km				5,88	4,12	0,09	1,67

TAURAGNŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SCHEMA

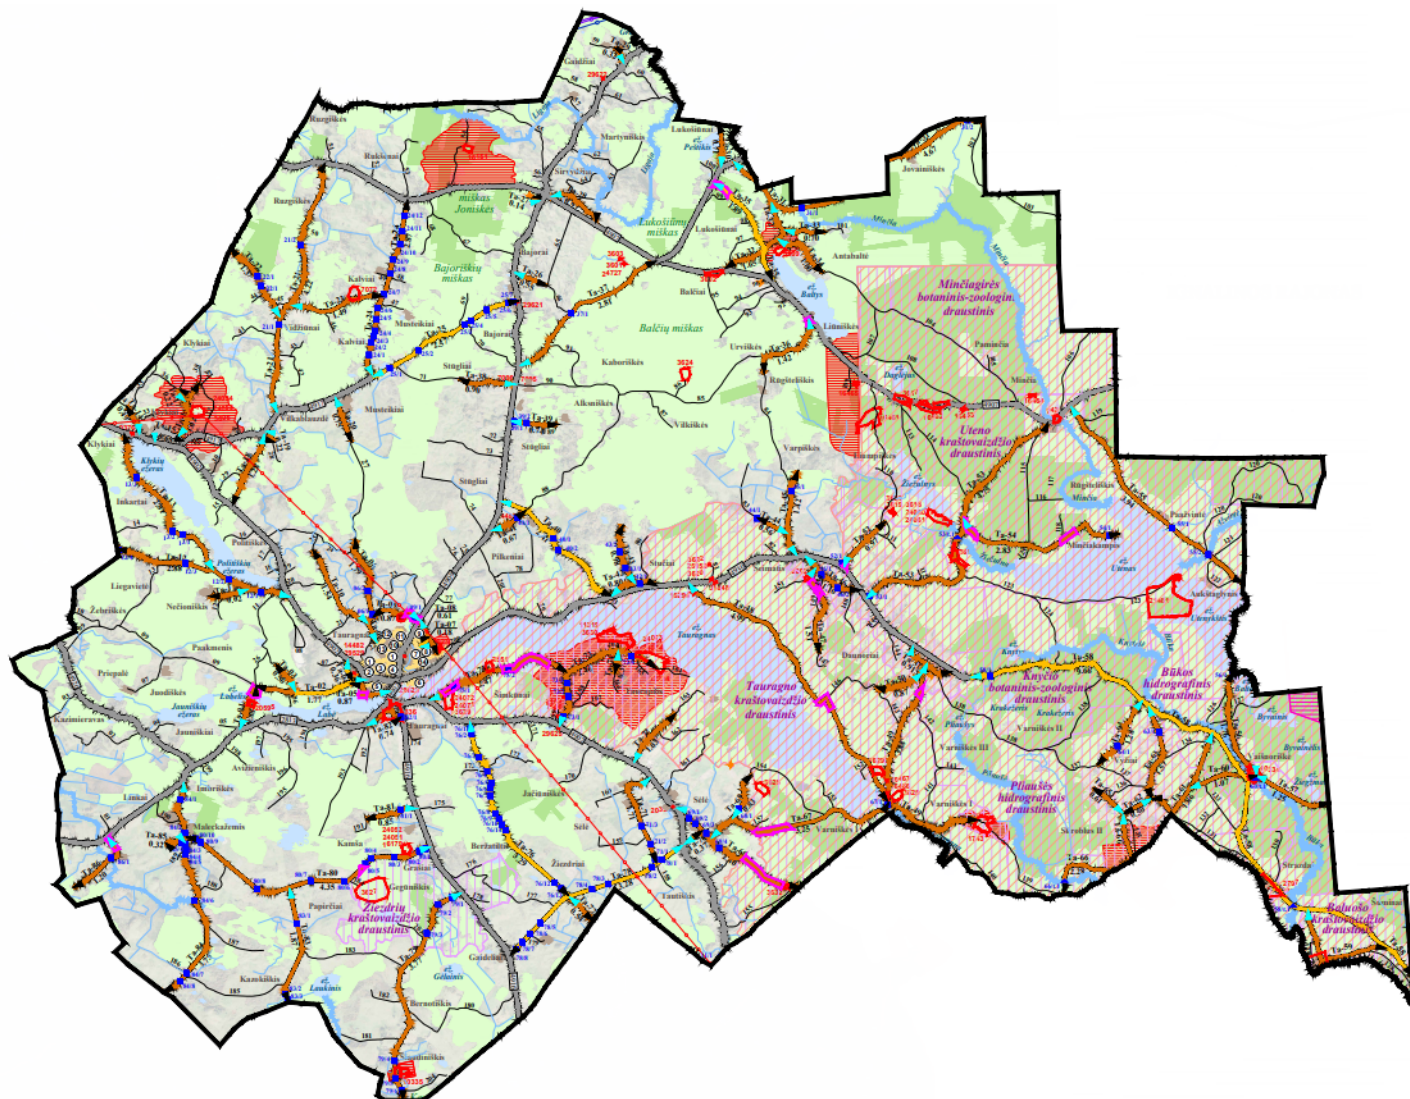

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Rokmelsta“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vietinės reikšmės kelių profiliavimas ir išdaužų užtaisymas Tauragnų seniūnijoje
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-06 Nr. S6-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Čyvas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 12:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-05 12:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-12 13:26 - 2024-10-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JONAS,SMALINSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 15:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-07 15:20 - 2027-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Grażina Lilionienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 09:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-04 11:41 - 2025-03-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-06 nuorašą suformavo Eglė Matonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
